CONTRATO DE OBRA No 203 DE 2023

INFORME DE OBRA

FINAL [ ] [X] **PARCIAL No 5**

PERIODO DEL INFORME: 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE

Nombre del Contratista: CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA		**Contrato No:** 203 DE 2023	
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		**Valor Inicial:** $ 1.059.600.000,00 **Valor Adicional:** $ 227.463.780,00 **Valor Total:** $ 1.287.063.780,00 **Fecha Aprobación Pólizas:** 29 de diciembre de 2023 **FVCP**: 21 de febrero de 2025	
Duración:	PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO DE OBRA.	**Municipio:**	PAICOL - DEPARTAMENTO DEL HUILA
Nombre del Supervisor: ING. YESID ROJAS PEÑA			
Nombre del Interventor:	N A SERVICE S.A.S	**Contrato No:** 208 DE 2023	
Objeto: Ejecutar la interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para le ejecución del proyecto de obra denominado "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".		**Valor:** $ 105.960.477,00 **Valor adicional:** $ 227.463.780,00 **Valor total:** $ 1.287.063.780,00	

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto

- **Localización**

El Proyecto se localiza en la vereda Alto Granadillo, en la zona limítrofe entre los municipios de Paicol y El Agrado.
La vereda Alto Granadillo se segrego de la Vereda El Vergel, y de acuerdo al proyecto de EOT que fue concertado con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, tiene un área tiene un área de 547 Has.
El área del proyecto se ubica en la zona sur del municipio de Paicol, localizado en la vereda Alto Granadillo, a una distancia de 18 Km aproximados de la zona urbana de Paicol, por la vía que conduce desde Paicol – La Lajita – El Carmen – La Línea - Alto Granadillo.

La vereda Alto Granadillo predomina áreas cultivas con café, frutales, pocas áreas dedicadas a la ganadería y espacios naturales con rastrojos.

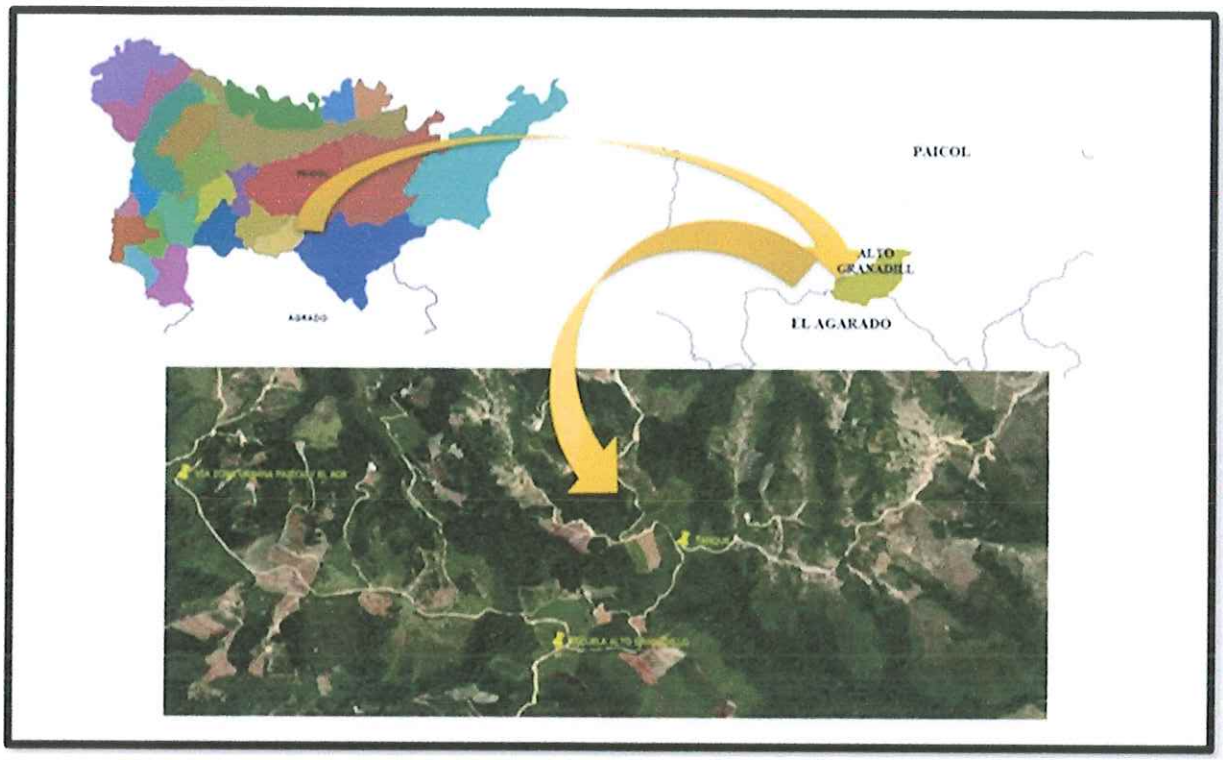


Imagen 1. Localización Vereda Alto Granadillo.

Durante este período, se llevó a cabo el transporte de materiales y el acopio necesario para las estructuras de la bocatoma, el muro de contención, el desarenador y el tanque. Asimismo, se inició la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestión Integral de Obras (PGIO), además de proceder con la construcción de la estructura de captación

1. CONSTRUCCION BOCATOMA - DESARENADOR Y TANQUE DE BOMBEO

- **Concreto Ciclópeo 3000 PSI:** Se completó la construcción de la estructura de la bocatoma, utilizando concreto ciclópeo con una resistencia de 3000 PSI
- **Concreto de Fc=280 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas:** Se fundió el canal de aducción y los muros de la cámara de recolección en la bocatoma con concreto de resistencia de 280 kg/cm², adecuado para estructuras enterradas y semienterradas. Esta actividad incluyó la preparación, vertido y curado del concreto.
- **Acero de refuerzo figurado:** Se procedió a la instalación de acero de refuerzo figurado para el desarenador, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto
- **Suministro e instalación de cinta PVC:** Se realiza la instalación de la cinta PVC en el desarenador, con el objetivo de mejorar la impermeabilización y la protección, así como lo establece el diseño.

2. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PARTE DE BOCATOMA Y DESARENADOR

- **Excavación manual en material** común Se realizó la excavación manual en material común para la construcción del muro de contención, con una longitud de 12,33 metros lineales
- **Concreto para solado, limpieza:** Se ejecutó el concreto para el solado y la limpieza del área del muro de contención. Este concreto garantiza una base sólida y limpia para el muro de contención en concreto ciclópeo
- **Concreto Ciclópeo 3000 PSI:** Se completó la construcción del muro de contención de 12,33 metros lineales en concreto ciclópeo, según diseño contractual, de una altura de 2 metros, tomando 0,5 metros de zarpa y 1,5 metros de vástago

3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO

- **Excavación manual en material** común Se realizó la excavación manual en material común para la construcción del tanque de almacenamiento semienterrado. Esta actividad incluyó la remoción del suelo y la preparación del terreno para las siguientes etapas de construcción
- **Concreto para solado, limpieza:** Se ejecutó el concreto para el solado y la limpieza del área del tanque. Este concreto garantiza una base sólida y limpia para el tanque de almacenamiento, siguiendo los estándares de calidad requeridos.
- **Acero de refuerzo figurado:** Se instaló acero de refuerzo figurado en las estructuras del tanque de almacenamiento, asegurando su resistencia y durabilidad.
- **Suministro e instalación de cinta PVC** Se realiza la instalación de la cinta PVC en el desarenador, con el objetivo de mejorar la impermeabilización y la protección, así como lo establece el diseño.
- **Concreto de Fc=280 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas:** Se fundió tanque de almacenamiento o distribución, en diferentes etapas, primero se fundió la placa base del tanque, seguidamente los muros, para finalizar con la placa superior del tanque, se cuenta con el resultado de la resistencia obtenida por medio de cilindros de concreto.
- **Suministro e Instalación de Mortero Relación 1:2. Impermeabilizado:** Se aplico el pañete impermeabilizado por el interior de los muros del tanque, para defender la estructura del agua que va a estar en constante almacenamiento, para distribución entre los 27 usuarios.

4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

- **Excavación manual en material** común Se realizó la excavación manual en material común para la construcción de la placa soporte de la planta de tratamiento de agua potable, y para la viga de cimentación de esta
- **Concreto para solado, limpieza:** Se ejecutó el concreto para el solado y la limpieza del área de la placa soporte de la planta de tratamiento de agua potable y para la viga de cimentación de esta
- **Acero de refuerzo figurado:** Se instaló acero de refuerzo figurado en la viga de cimentación y en la placa soporte de la planta de tratamiento de agua potable
- **Concreto de Fc=280 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas:** Se fundió la viga de cimentación y la placa soporte de la planta de tratamiento de agua potable
- **Suministro e intalacion de planta de tratamiento compacta 2LPS con todos los procesos del RAS (adicion de quimicos, mezcla, aireacion, floculacion, sedimentacion, filtracion y fluoración):** Se realizo la instalación de la planta de tratamiento compacta de agua potable encima de la placa soporte

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Durante el periodo se realizó el PMS con el fin de minimizar el impacto ambiental mediante el control de erosión, gestión adecuada de residuos, protección de recursos hídricos, y regulación de ruido y emisiones. Incluye monitoreo ambiental, capacitación del personal y comunicación con la comunidad para asegurar el cumplimiento de normativas y la protección del entorno durante la construcción.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS (PGIO)

Durante el periodo se llevó a cabo El PGIO con el fin de identificar, evaluar y mitigar los impactos operacionales de un proyecto. Incluye medidas para prevenir efectos negativos en el entorno, como la gestión de residuos, control de emisiones y protección de recursos naturales. El plan también abarca procedimientos para monitorear y ajustar las operaciones según las normativas vigentes y las necesidades del entorno, asegurando así la sostenibilidad y el cumplimiento ambiental.

1.2 Estado y Avance Físico Del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Acta de inicio de obra	07/05/2024	146 días		03/11/2024

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de inicio	1	07 de mayo de 2024

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

Estado y Avance Presupuestal De Obra.
La ejecución presupuestal del contrato, al final del periodo registra un valor ejecutado de $702.336.280,90 que corresponde al 66.28% % del valor total del contrato, con un tiempo de 146 días en ejecución.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ANTERIORES		PRESENTE INFORME		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	CONSTRUCCION BOCATOMA - DESARENADOR Y TANQUE DE BOMBEO										
1,1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	dia	1,00	$ 887.927,63	$ 887.927,63	1,00	$ 887.928,00		$ -	1,00	$ 887.928,00
1,2	Excavación a todo costo en roca (taladro manual). Incluye: mano de obra, materiales y equipo, incluye retiro de material de la zanja a mano sin disposición final.	m3	32,56	$ 33.199,20	$ 1.080.965,95	22,98	$ 762.918,00	8,58	$ 284.849,00	31,56	$ 1.047.767,00
1,3	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	32,56	$ 33.199,20	$ 1.080.965,95	22,98	$ 762.918,00	8,58	$ 284.849,00	31,56	$ 1.047.767,00
1,4	Manejo de agua; para excavaciones con nivel freatico alto ; Incluye: motobomba con manguera , mano de obra, y equipo.	dia	10,00	$ 175.122,18	$ 1.751.221,80	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,5	Retiro de material sobrante, transporte no convencional (mula/tarabita)	m3	65,12	$ 87.512,22	$ 5.698.795,77	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,6	Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.10 metros.	m2	43,28	$ 59.497,14	$ 2.575.036,22	20,66	$ 1.229.211,00	20,74	$ 1.233.971,00	41,40	$ 2.463.182,00
1,7	Concreto Ciclópeo de 3000 PSI a todo costo para presa y muro de contencion. 60% CONCRETO NORMAL F'C=210 KGF/CM2, 40% PIEDRA.	m3	26,74	$ 817.678,57	$ 21.864.724,96	19,19	$ 15.691.252,00	5,96	$ 4.873.364,00	25,15	$ 20.564.616,00
1,8	Concreto de Fc=280 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas.	m3	11,65	$ 1.225.498,76	$ 14.277.060,55	0,40	$ 490.200,00	3,86	$ 4.730.425,00	4,26	$ 5.220.625,00
1,9	Suministro e Instalación de Mortero Relación 1:2. Impermeabilizado	m2	58,44	$ 45.068,04	$ 2.633.776,26	3,08	$ 138.810,00	8,59	$ 387.134,00	11,67	$ 525.944,00
1.10	Suministro e instalacion de cinta PVC de 0.15 metros para junta de construccion en tanques.	m	25,00	$ 54.261,00	$ 1.356.525,00	9,00	$ 488.349,00	16,00	$ 868.176,00	25,00	$ 1.356.525,00
1,11	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	kg	2432,64	$ 9.776,37	$ 23.782.388,72	334,46	$ 3.269.805,00	1.462,25	$ 14.295.497,00	1.796,71	$ 17.565.302,00
1,12	Suministro e instalación rejilla de captación. Marco en angulo de 1-1/2"x1/4" y barras de 3,8" en acero. De sección 0.3x.0,33 metros.	und	1,00	$ 167.609,96	$ 167.609,96	1,00	$ 167.610,00		$ -	1,00	$ 167.610,00
1,13	Suministro e instalacion de valvula de bola de 2 pulgadas	und	1,00	$ 165.937,99	$ 165.937,99	0,00	$ -	1,00	$ 165.938,00	1,00	$ 165.938,00
1,14	Suministro e instalacion de valvula de bola de 3 pulgadas	und	2,00	$ 675.462,15	$ 1.350.924,30	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,15	Suministro e instalacion de valvula de bola de 4 pulgadas	und	2,00	$ 736.427,73	$ 1.472.855,46	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,16	Instalación de tubería PVC de 4 pulg. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	12,00	$ 3.260,86	$ 39.130,32	12,00	$ 39.130,00		$ -	12,00	$ 39.130,00
1,17	Instalación de tubería PVC de 3 pulg. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	13,00	$ 45.239,09	$ 588.108,17	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

1,18	Instalación de tubería PVC de 2 pulg. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	13,00	$ 26.825,00	$ 348.725,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,19	Suministro e instalacion de pasos escalera en hierro de 1/2 pulg L=1 m	kg	7,00	$ 28.449,33	$ 199.145,31	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.20	Suministro e instalacion de tapas en lamina alfajor de 1/4, angulo 2x2x1/8 pulg de 1x1 m, con marco en angulo 2x2*1/8, con bisagra, aros y candado	und	1,00	$ 690.461,09	$ 690.461,09	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,21	Suministro e instalacion de tapas en lamina alfajor de 1/4, angulo 2x2x1/8 pulg de 0,6*0,6x1 m, con marco en angulo 2x2*1/8, con bisagra, aros y candado	und	1,00	$ 476.375,68	$ 476.375,68	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP 1.22	Acarreo Mular	kg	0,00	$ 640,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				VALOR TOTAL CAPITULO	$ 82.488.662,09		$ 23.928.131,00		$ 27.124.203,00		$ 51.052.334,00
2	SISTEMA DE BOMBEO										$ -
2,1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	m	532,00	$ 2.157,32	$ 1.147.694,24	532,00	$ 1.147.694,00		$ -	532,00	$ 1.147.694,00
2,2	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	78,48	$ 33.199,20	$ 2.605.473,22	23,04	$ 764.910,00	53,76	$ 1.784.789,00	76,80	$ 2.549.699,00
2,3	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra (REDES)	m3	65,40	$ 33.199,20	$ 2.171.227,68	4,49	$ 149.064,00	45,35	$ 1.505.584,00	49,84	$ 1.654.648,00
2,4	Instalación de tubería PVC de 2-1/2 pulg. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	532,00	$ 7.523,21	$ 4.002.347,72	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,5	Suministro e instalación de arena para base de tubería PVC, incluye materiales , equipo y mano de obra para su correcta instalación	m3	13,08	$ 33.199,20	$ 434.245,54	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,6	Suministro e instalación electrobomba de superficie con capacidad para un caudal de 2 LPS con una altura de 130 metros en columna de agua con motor de 1.5 HP incluido la conexión eléctrica e hidráulica	und	1,00	$ 14.500.756,20	$ 14.500.756,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,7	Suministro e instalación válvula ventosa de triple acción y a de 3" con accesorios	und	1,00	$ 751.418,09	$ 751.418,09	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,8	Suministro e instalación válvula de purga de 3 pulg	und	1,00	$ 309.044,73	$ 309.044,73	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,9	Suministro e instalacion de valvula de cheque 2-1/2	und	1,00	$ 245.130,73	$ 245.130,73	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2.10	Cajilla de protección para válvulas de 0,50X0,5X0,50 m. libres. Espesor: 0.10 m., en concreto simple de 3000 PSI, tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8", separados cada 0.15 m. en ambos sentidos a todo costo. Incluye: suministro de materiales, uso de equipos y herramienta, instalación de accesorios, suministro e instalación de chorotes y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	und	1,00	$ 467.257,07	$ 467.257,07	0,00	$ -	1,00	$ 467.257,00	1,00	$ 467.257,00
2,11	Cajilla de protección para válvulas de 1.00X1.00X1.00m. libres. Espesor: 0.10 m., en concreto simple de 3000 PSI, tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8", separados cada 0.15 m. en ambos sentidos a todo costo. Incluye: suministro de materiales, uso de equipos y herramienta, instalación de accesorios, suministro e instalación de chorotes y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	und	1,00	$ 1.036.481,83	$ 1.036.481,83	0,00	$ -	1,00	$ 1.036.482,00	1,00	$ 1.036.482,00
2,12	Construccion a todo coste de Caseta de equipos según diseño	und	1,00	$ 3.423.003,47	$ 3.423.003,47	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				VALOR TOTAL CAPITULO	$ 31.094.080,52		$ 2.061.668,00		$ 4.794.112,00		$ 6.855.780,00

3	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Q= 2,0 LPS**										
3,1	Localización y replanteo para Estructuras de Acueducto	m2	15,00	$ 2.878,05	$ 43.170,75	15,00	$ 43.171,00		$ -	15,00	$ 43.171,00
3,2	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	4,50	$ 33.199,20	$ 149.396,40	6,96	$ 231.066,00		$ -	6,96	$ 231.066,00
3,3	Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.10 metros.	m2	15,00	$ 51.045,90	$ 765.688,50	0,00	$ -	15,00	$ 765.689,00	15,00	$ 765.689,00
3,4	Concreto de Fc=280 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas.	m3	3,75	$ 1.173.724,59	$ 4.401.467,21	0,00	$ -	3,75	$ 4.401.467,00	3,75	$ 4.401.467,00
3,5	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	kg	240,00	$ 9.776,37	$ 2.346.328,80	0,00	$ -	221,24	$ 2.162.924,00	221,24	$ 2.162.924,00
3,6	Suministro e intalacion de planta de tratamiento compacta 2LPS con todos los procesos del RAS (adicion de quimicos, mezcla, aireacion, floculacion, sedimentacion, filtracion y fluoracion	und	1,00	$ 163.803.780,00	$ 163.803.780,00	0,00	$ -	1,00	$ 163.803.780,00	1,00	$ 163.803.780,00
					VALOR TOTAL CAPITULO $ 171.509.831,66		**$ 274.237,00**		**$ 171.133.860,00**		**$ 171.408.097,00**
4	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEMIENTERRADO**										
4,1	Localización y replanteo para Estructuras de Acueducto	m2	18,49	$ 2.878,05	$ 53.215,14	18,49	$ 53.215,00		$ -	18,49	$ 53.215,00
4,2	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	29,20	$ 33.199,20	$ 969.416,64	29,20	$ 969.417,00		$ -	29,20	$ 969.417,00
4,3	Concreto de Fc=280 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas.	m3	10,95	$ 1.173.724,59	$ 12.852.284,26	10,95	$ 12.852.284,00		$ -	10,95	$ 12.852.284,00
4,4	Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.10 metros.	m2	18,49	$ 51.045,90	$ 943.838,69	18,40	$ 939.245,00		$ -	18,40	$ 939.245,00
4,5	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	kg	2261,35	$ 9.776,37	$ 22.107.794,30	2261,00	$ 22.104.373,00		$ -	2.261,00	$ 22.104.373,00
4,6	Suministro e Instalación de Mortero Relación 1:2. Impermeabilizado	m2	51,20	$ 45.068,04	$ 2.307.483,65	51,20	$ 2.307.484,00		$ -	51,20	$ 2.307.484,00
4,7	Suministro e instalacion de cinta PVC de 0.15 metros para junta de construccion en tanques.	m	16,00	$ 54.261,00	$ 868.176,00	16,00	$ 868.176,00		$ -	16,00	$ 868.176,00
4,8	Suministro e intalacion de pasos escalera en hierro de 1/2 pulg L=1 m	kg	8,00	$ 22.449,33	$ 179.594,64	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,9	Suministro e instalacion de tapas en lamina alfajor de 1/4, angulo 2x2x1/8 pulg de 1x1 m, con marco en angulo 2x2*1/8, con bisagra, aros y candado	und	1,00	$ 690.461,09	$ 690.461,09	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4.10	Suministro e Instalación de tubería PVC de 2 pulg. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	13,00	$ 26.825,00	$ 348.725,00	13,00	$ 348.725,00		$ -	13,00	$ 348.725,00
4,11	Suministro e instalacion de valvula de bola de 2 pulgadas	und	1,00	$ 190.043,48	$ 190.043,48	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,12	Suministro e instalador de macromedidor volumentrico bridado de 2 pulgadas	und	1,00	$ 5.393.649,81	$ 5.393.649,81	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,13	Suministro e instalacion de flotador en cobre de 2 pulgadas	und	1,00	$ 551.308,73	$ 551.308,73	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
					VALOR TOTAL CAPITULO $ 47.455.991,43		**$ 40.442.919,00**		**$ -**		**$ 40.442.919,00**
5	**CERRAMIENTO DE PROTECCION**										
5,1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes	m	69,00	$ 2.157,32	$ 148.855,08	69,00	$ 148.855,00		$ -	69,00	$ 148.855,00

	y planos record.										
5,2	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	3,15	$ 33.199,20	$ 104.577,48	0,00	$ -	3,15	$ 104.577,00	3,15	$ 104.577,00
5,3	Concreto de Fc=210 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas, Viga de cimentacion.	m3	3,15	$ 1.160.064,82	$ 3.654.204,18	0,00	$ -	3,15	$ 3.654.204,00	3,15	$ 3.654.204,00
5,4	Concreto de Fc=210 kg/CM2, para estructuras enterradas y semienterradas. Columnetas	m3	0,50	$ 1.160.064,82	$ 580.032,41	0,00	$ -	0,38	$ 440.825,00	0,38	$ 440.825,00
5,5	Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	kg	143,00	$ 9.776,37	$ 1.398.020,91	0,00	$ -	143,00	$ 1.398.021,00	143,00	$ 1.398.021,00
5,6	Muros en bloque hueco 5 pañetado	m2	16,00	$ 100.497,30	$ 1.607.956,80	0,00	$ -	12,00	$ 1.205.968,00	12,00	$ 1.205.968,00
5,7	Suministro e instalacion de malla calibre 10 eslabonada soportes en tuberia galvanizada de ø=2" con pie de amigos en las esquinas (incluyen tapon)	m2	64,00	$ 189.624,82	$ 12.135.988,48	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5,8	Suministro e instalacion de porton de 2 m x 3m en tubo galvanizado de 2" y malla calibre 10 eslabonada	m2	6,00	$ 317.413,73	$ 1.904.482,38	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5,9	Suministro y colocación de gravilla en área de cerramiento	m2	35,00	$ 30.246,71	$ 1.058.634,85	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				VALOR TOTAL CAPITULO	**$ 22.592.752,57**		**$ 148.855,00**		**$ 6.803.595,00**		**$ 6.952.450,00**
6	**RED DE DISTRIBUCION**										
6,1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record.	m	8963,54	$ 2.157,32	$ 19.337.224,11	8963,54	$ 19.337.224,00		$ -	8.963,54	$ 19.337.224,00
6,2	Excavación manual en material comun; incluye mano de obra materiales y equipo	m3	965,27	$ 33.199,20	$ 32.046.191,78	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,3	Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	m3	2341,98	$ 33.199,20	$ 77.751.862,42	1518,48	$ 50.412.321,00	823,70	$ 27.346.181,00	2.342,18	$ 77.758.502,00
6,4	Relleno, tapado y apisonado a todo factor, incluye: material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y mano de obra (REDES)	m3	2933,46	$ 33.199,20	$ 97.388.525,23	1370,97	$ 45.515.107,00	1.562,49	$ 51.873.418,00	2.933,46	$ 97.388.525,00
6,5	Suministro e instalación de arena para base de tuberia PVC, incluye materiales , equipo y mano de obra para su correcta instalación	m3	358,56	$ 33.199,20	$ 11.903.905,15	147,31	$ 4.890.574,00	193,76	$ 6.432.677,00	341,07	$ 11.323.251,00
6,6	Instalación de tuberia PVC de 1/2 pulg RDE 13,5. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	4894,80	$ 1.937,69	$ 9.484.605,01	1175,99	$ 2.278.704,00	3.305,75	$ 6.405.519,00	4.481,74	$ 8.684.223,00
6,7	Instalación de tuberia PVC de 1/2 pulg RDE 9. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	1285,00	$ 1.937,69	$ 2.489.931,65	870,46	$ 1.686.682,00	414,54	$ 803.250,00	1.285,00	$ 2.489.932,00
6,8	Instalación de tuberia PVC de 1 pulg RDE 21. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	1974,24	$ 2.197,87	$ 4.339.122,87	1974,23	$ 4.339.101,00		$ -	1.974,23	$ 4.339.101,00
6,9	Instalación de tuberia PVC de 1 -1/2 pulg RDE 21. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	m	795,70	$ 2.715,99	$ 2.161.113,24	643,10	$ 1.746.653,00	152,60	$ 414.460,00	795,70	$ 2.161.113,00
6.10	Instalación de tuberia PVC de 2 pulg RDE 21. Incluye: arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, limpiador, lubricante, instalación de accesorios y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la	m	3,70	$ 3.106,07	$ 11.492,46	96,00	$ 298.183,00		$ -	96,00	$ 298.183,00

	obra.										
6,11	Suminsitro e instalcion de Valvula de bola de 1 pulg para sectorizacion	und	3,00	$ 83.547,76	$ 250.643,28	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,12	Suminsitro e instalcion de Valvula de bola de 1/2 pulg para sectorizacion y lavado	und	8,00	$ 32.021,27	$ 256.170,16	0,00	$ -	3,00	$ 96.064,00	3,00	$ 96.064,00
6,13	Suminsitro e instalcion de Valvula de bola de 1- 1/2 pulg para sectorizacion	und	2,00	$ 159.869,36	$ 319.738,72	0,00	$ -	2,00	$ 319.739,00	2,00	$ 319.739,00
6,14	Suministro e intalacion de T PVC 2 Presion	und	1,00	$ 30.080,27	$ 30.080,27	0,00	$ -	1,00	$ 30.080,00	1,00	$ 30.080,00
6,15	Suministro e intalacion de T PVC 1/2 Presion	und	15,00	$ 6.538,28	$ 98.074,20	8,00	$ 52.306,00	5,00	$ 32.691,00	13,00	$ 84.998,00
6,16	Suminstro e intalacion Reduccion de 2 a 1/2 Presion	und	1,00	$ 18.993,05	$ 18.993,05	0,00	$ -	1,00	$ 18.993,00	1,00	$ 18.993,00
6,17	Suminstro e intalacion Reduccion de 1-1/2 a 1 Presion	und	4,00	$ 14.715,03	$ 58.860,12	2,00	$ 29.430,00	2,00	$ 29.430,00	4,00	$ 58.860,00
6,18	Suminstro e intalacion Reduccion de 1 a 1/2 Presion	und	10,00	$ 14.715,03	$ 147.150,30	6,00	$ 88.290,00	4,00	$ 58.860,00	10,00	$ 147.150,00
6,19	Cajilla de protección para válvulas de 1.00X1.00X1.00m. libres. Espesor: 0.10 m., en concreto simple de 3000 PSI, tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8", separados cada 0.15 m. en ambos sentidos a todo costo. Incluye: suministro de materiales, uso de equipos y herramienta, instalación de accesorios, suministro e instalación de chorotes y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	und	14,00	$ 1.036.481,83	$ 14.510.745,62	0,00	$ -	3,00	$ 3.109.445,00	3,00	$ 3.109.445,00
6,20	Cajilla de protección para válvulas de 0,50X0,5X0,50 m. libres. Espesor: 0.10 m., en concreto simple de 3000 PSI, tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8", separados cada 0.15 m. en ambos sentidos a todo costo. Incluye: suministro de materiales, uso de equipos y herramienta, instalación de accesorios, suministro e instalación de chorotes y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	und	11,00	$ 467.257,00	$ 5.139.827,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.336.285,00	5,00	$ 2.336.285,00
6,21	Suministro e instalacion de valvula de ventosa de 1 pulg	und	6,00	$ 395.133,55	$ 2.370.801,30	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,22	Suministro e Instalación acometidas domiciliarias. Incluye: Tubería de 1/2" PF+UAD, Registro anti fraude, Registro de bola de Incorporación de 1/2", micromedidor de 1/2", cajilla plástica con llave de seguridad y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	27,00	$ 380.723,73	$ 10.279.540,71	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,23	Suminstro e intalacion Reduccion de 2 a 1 Presion	und	1,00	$ 12.693,69	$ 12.693,69	0,00	$ -	1,00	$ 12.694,00	1,00	$ 12.694,00
6,24	Suminstro e intalacion Reduccion de 2 a 1- 1/2 Presion	und	1,00	$ 12.677,64	$ 12.677,64	0,00	$ -	1,00	$ 12.678,00	1,00	$ 12.678,00
6,25	Suministro e intalacion de T PVC 1 Presion	und	8,00	$ 9.240,64	$ 73.925,12	2,00	$ 18.481,00	6,00	$ 55.444,00	8,00	$ 73.925,00
6,26	Suministro e intalacion de T PVC 1- 1/2 Presion	und	6,00	$ 17.397,64	$ 104.385,84	3,00	$ 52.193,00	3,00	$ 52.193,00	6,00	$ 104.386,00
6,31	Suministro de tubería PVC de 2 pulg RDE 21.	m	3,70	$ 22.105,95	$ 81.792,02	0,00	$ -	3,70	$ 81.792,00	3,70	$ 81.792,00
				VALOR TOTAL CAPITULO	**$ 290.680.072,96**		**$ 130.745.249,00**		**$ 99.521.893,00**		**$ 230.267.143,00**
7	**SISTEMA ELECTRICO**										
7.1	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA EH-514 N2 DE RETENCION ARRANQUE Y TERMINAL, CRUCETAS, DIAGONALES, HERRAJES YA ISLADORES	und	2,00	$ 1.713.135,00	$ 3.426.270,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.2	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA EH-510 N2 DE PASO INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES, HERRAJES YA ISLADORES	und	2,00	$ 1.099.403,00	$ 2.198.806,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

7.3	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA EH-512 N2 DE RETENCION INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES, HERRAJES YA ISLADORES	und	1,00	$ 1.521.285,00	$ 1.521.285,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.4	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA EH-515 N2 DOBLE RETENCION INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES, HERRAJES YA ISLADORES	und	1,00	$ 2.250.024,00	$ 2.250.024,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.5	ESTRUCTURA 710 MONTAJE TRANFORMADOR MONOFASICO	und	1,00	$ 3.902.811,00	$ 3.902.811,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.6	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA DE PASO EN BAJA TENSION CON PERNOS Y CINTA BANDIT	und	1,00	$ 236.568,00	$ 236.568,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTACIRCUITO 15 KV 100 A CON FUSIBLE INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES Y HERRAJES	und	4,00	$ 468.950,00	$ 1.875.800,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.8	SUMINISTRO Y MONTAJE DPS 2 KV - 10 KA INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES Y HERRAJES	und	4,00	$ 420.146,00	$ 1.680.584,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.9	CABLE TRENZADO 2 x 35 + 1 x 50	m	60,00	$ 42.107,00	$ 2.526.420,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.10	CAJA DE PUESTA A TIERRA CON TAPA PARA INSPECCION (TRANSFORMADOR Y DPS) INCLUYE DOBLE LINEA A TIERRA	und	1,00	$ 426.020,00	$ 426.020,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.11	CONDUCTOR ACSR No. 2 ACSR CABLE ECOLOGICO POR MT.	m	1200,00	$ 30.941,00	$ 37.129.200,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.12	LAMPARAS LED DE 60W CON FOTOCELDA ALUMBRADO EXTERIOR PARA SEGURIDAD DEL TRANSFORMADOR - EQUIPO DE MEDIDA Y CASETA MOTOBOMBA	und	2,00	$ 926.045,00	$ 1.852.090,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.13	POSTE DE CONCRETO 8 M X 510 KGF REFORZADO Y VIBRADO	und	1,00	$ 1.580.173,00	$ 1.580.173,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.14	POSTES DE CONCRETO 12 M X 750 KGF REFORZADO Y VIBRADO	und	3,00	$ 2.426.832,50	$ 7.280.497,50	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.15	POSTES DE CONCRETO 12 M X 510 KGF REFORZADO Y VIBRADO	und	3,00	$ 2.426.832,50	$ 7.280.497,50	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.16	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA 13,8 KV / 220 / 127 V.	und	1,00	$ 12.124.061,00	$ 12.124.061,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.17	TEMPLETES DIRECTOS A TIERRA	und	4,00	$ 634.983,00	$ 2.539.932,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.18	TABLERO DE MEDIDA Y PROTECCION (CERTIFICADO RETIE) INCLUYE MURETE PARA SU INSTALACION	und	1,00	$ 13.442.979,00	$ 13.442.979,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.19	CONTADOR BIFASICO TRIFILAR Proyectado con Tecnologia AMI - 2 x 20 / 100 A. 2 x 120 / 208 V. Clase 1 incluye totalizador general de 2 x 40 A	und	1,00	$ 5.802.876,00	$ 5.802.876,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.20	Suministro y montaje de acometidas Trifilares (2No.4+1No.6+8T) THHN-AWG En ducto de 1½" IMC desde Medidor hasta T.A. Caseta Motobomba	m	50,00	$ 212.384,00	$ 10.619.200,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.21	Suministro y montaje de tablero de 8 circuitos Bifasico, incluye Breakers. (Interruptores enchufables 2 de 1 x 20 A - 1 de 2 x 30 A y 1 de 2 x 40 A Totalizador General)	und	1,00	$ 814.339,97	$ 814.339,97	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.22	Suministro y montaje de ducto galvanizado diamtero 1½" IMC, (Bajante acometidas) incluye codos.	m	20,00	$ 93.278,00	$ 1.865.560,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.23	Malla a tierra area proteccion caseta motobomba Incluye Alambre de Cu desnudo No.2, y 4 Varillas de puesta a tierra 2,44 x 5/8"	und	1,00	$ 4.762.266,00	$ 4.762.266,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.24	Suministro e Instalación de 9 Placas de identificación norma Electrohuila (estructuras e identificacion placa del transformador) (Incluye cinta band it y hebillas) con suministro de materiales y elementos necesarios.	und	1,00	$ 1.298.848,80	$ 1.298.848,80	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
					$ -		$ -		$ -		$ -
				VALOR TOTAL CAPITULO	$ 128.437.108,77		$ -		$ -		$ -

	COSTO DIRECTO				**$ 774.258.500,00**		**$ 197.601.059,00**		**$ 309.377.663,000**		**$ 506.978.723,000**
	A . (23%)		23%		$ 178.079.455,00		$ 45.448.243,57		$ 71.156.862,490		$ 116.605.106,290
	I. (2%)		2%		$ 15.485.170,00		$ 3.952.021,18		$ 6.187.553,260		$ 10.139.574,460
	U. (5%)		5%		$ 38.712.925,00		$ 9.880.052,95		$ 15.468.883,150		$ 25.348.936,150
	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE: Inspeccion electrica para 1 transformador, 512 mts red media tension 2 # 2 ACSR Cable Ecologico, 50 mts red baja tension, 1 Caseta Motobomba - motor 7,5 HP				$ 9.800.000,00						
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 26.267.050,00	1,00	$ 26.267.050,00		$ 26.267.050,00	1	$ 26.267.050,000
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS (PGIO)				$ 16.996.900,00	1,00	$ 16.996.900,00		$ 16.996.900,00	1	$ 16.996.900,000
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 1.059.600.000,00**		**$ 300.145.326,70**		**$ 445.454.911,900**		**$ 702.336.289,900**

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

Durante el mes de septiembre, el avance fue considerable, lo que nivelo el avance programado con el ejecutado, con el avance, se espera culminar en la fecha del cronograma, se mantuvieron las 2 cuadrillas de obra civil, 1 de redes hidráulicas y la cuadrilla eléctrica, con lo que se logró avanzar en cada una de las actividades del cronograma de obra

2. INFORME BÁSICO

2.1 Estado Financiero del Contrato de obra

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo de obra	21/05/2024			$423.840.000.00

Se recibió un anticipo de 40% equivalentes a $423,840,000.00 al valor total inicial del contrato ,con los cuales hasta la fecha se ha dispuesto en gastos de mano de obra calificada y no calificada para las labores de construcción y supervisión de obras, insumos y materiales necesarios para la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, transportes realizados a los lugares de intervención, alquiler de vehículos, oficina, papelería y equipos de cómputo, para garantizar el seguimiento y avance de las obras hasta la fecha.

A continuación, se relaciona movimientos de la cuenta del anticipo del Contrato de obra:

VALOR CONTRACTUAL:	$	1,059,600,000.00
VALOR ANTICIPO (40%)	$	423,840,000.00
RETENCION (5%)	$	21,192,000.00
SALDO INICIAL FIDUCIA	$	402,648,000.00

FECHA	TIPO TRANF	A NOMBRE DE	DETALLE	VALOR GIRADO	GMF GENERADO
24/05/2024	PAGO A TERCEROS	ACUATECNICA SAS	OP1 - ANTICIPO 50% PLANTA DE TRATAMIENTO	$ 55,000,000.00	$ 220,000.00
24/05/2024	REEMBOLSO	CONENERGIA	OP2 - REEMBOLSO CEMENTO	$ 58,000,000.00	$ -
5/06/2024	PAGO A TERCEROS	ENERGY CG COLOMBIA SAS	OP3 - ANULADA	$ -	$ -
7/06/2024	PAGO A TERCEROS	ENERGY CG COLOMBIA SAS	OP4 - ANTICIPO MANO DE OBRA ELECTRICA - GRANADILLO	$ 20,000,000.00	$ 80,000.00
18/07/2024	PAGO A TERCEROS	CONSTRUIMOS DEL HUILA	OP5- MATERIALES DE OBRA (CANC FACT FEN 38953-39101-39121-39219-39217-39402-39367)	$ 30,423,610.00	$ 121,694.44
18/07/2024	PAGO A TERCEROS	INVERSIONES PROIN SAS	OP6- MATERIALES OBRA (CANC FAC FEN40800)	$ 4,239,999.00	$ 16,960.00
18/07/2024	PAGO A TERCEROS	EDWAR JAIR CABRERA	OP7- TRANSPORTE CANCELA FAC EJCM-247	$ 7,711,770.00	$ 30,847.08
18/07/2024	PAGO A TERCEROS	MILTON JAVIER LUGO PEREZ	OP8- TRANSPORTE CANCELA DSE1740	$ 8,910,000.00	$ 35,640.00
18/07/2024	PAGO A TERCEROS	CONSTRUEQUIPOS DEL HUILA SAS	OP9- ALQUILER DE EQUIPOS CANCELA FACT (5888-5999-6011-6012-6013)	$ 9,873,695.00	$ 39,494.78
29/07/2024	PAGO A TERCEROS	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA	OP10- ANTICIPO MATERIAL PETREO	$ 27,163,809.00	$ 108,655.24
29/07/2024	PAGO A TERCEROS	JESUS PALOMA	OP11- MANO DE OBRA	$ 6,000,000.00	$ 24,000.00

2/08/2024	PAGO A TERCEROS	CONSTRUIMOS DEL HUILA	OP12- ANTICIPO MATERIALES FERRETERÍA; ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL;ANTICIPO ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 37,778,582.00	$ 151,114.33
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	CONSTRUEQUIPOS DEL HUILA SAS	OP13- ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 2,392,700.00	$ 9,570.80
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	LAURA CATALINA GUTIERREZ SERRANO	OP14- ANTICIPO MATERIALES PETREOS	$ 13,283,191.00	$ 53,132.76
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	VICTORIA EUGENIA SERRANO DIAZ	OP15- TRANSPORTE DE MATERIALES AL SITIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS	$ 39,698,230.00	$ 158,792.92
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	WILLINTON MONTEALEGRE PERDOMO	OP16- ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL	$ 1,018,025.00	$ 4,072.10
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	NATHALIE LOPEZ CORREA	OP16- ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL	$ 1,880,000.00	$ 7,520.00
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	ALEXANDER RODRIGUEZ LOSADA	OP17- ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL	$ 17,389,977.00	$ 69,559.91
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL SAS	OP18- ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPOS (MEZCLADORAS, EQUIPOS DE COMPACTACIÓN MECÁNICA, VIBRADORES DE CONCRETO)	$ 17,884,412.00	$ 71,537.65
2/08/2024	PAGO A TERCEROS	ACUATECNICA SAS	OP19- ANTICIPO ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL	$ 44,000,000.00	$ 176,000.00
			VL TOTAL PAGADO	**$ 402,648,000.00**	
			SALDO A LA FECHA	**$ -**	**$ 1,378,592.00**

2.3. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ID	CARGO
1	William Parra Olaya	12.123.891	Asesor Estructural
2	Alejandro Ramírez Ramírez	1.080.291.947	Residente de obra
3	Roberto Castañeda Pardo	1.075.247.872	Asesor Hidráulico
4	William Parra Olaya	12.123.891	Asesor Estructural
5	Kelly Johana Trujillo Hernández	26.421.244	Asesor Sisoma
6	Alexandra Marcela Arredondo	89.165.844	Inspector de obra

PERSONAL TÉCNICO

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	CARGO
1	William Parra Olaya	12.123.891	Asesor Estructural
2	Ricardo Andres Sierra	1.079.390.683	Residente de obra
3	Roberto Castañeda Pardo	1.075.247.872	Asesor Hidráulico
4	William Parra Olaya	12.123.891	Asesor Estructural
5	Kelly Johana Trujillo Hernández	26.421.244	Asesor Sisoma
6	Alexandra Marcela Arredondo	89.165.844	Inspector de obra
7	Luis Javier Tovar Palomo	83.169.973	Topógrafo
8	John Fredy Cervera Peña	1.081.155.462	Conductor
9	Armando Canacue	7.695.431	Oficial de Obra
10	Jesús Antonio Falla Florez	7.691.364	Oficial de Obra
11	Armando Cerquera	83.252.474	Oficial de Obra
12	Jhon Jairo Triviño Marín	83.227.084	Oficial de Obra
13	Olmes Norberto Salinas Ordoñez	1.079.508.676	Ayudante de Obra
14	Alexis Gamboa Acevedo	88.307.005	Ayudante de Obra
15	Deivis Andres Canacue Quiroga	1.075.793.416	Ayudante de Obra
16	Jairo Cubillos	12.255.665	Ayudante de Obra
17	Kehener Urbina Torres	1.001.900.644	Ayudante de Obra
18	Jorge Luis Villanueva Trujillo	1.079.388.799	Ayudante de Obra
19	Aleider Salinas Cadena	1.079.508.606	Ayudante de Obra
20	Duverney Naveros Narvaez	1.079.391.391	Ayudante de Obra
21	Beymar Gamboa Acevedo	1.094.368.239	Ayudante de Obra
22	Jose Francisco Barrios	1.123.400.129	Ayudante de Obra
23	Jeiser Jose Moreno Espinosa	1.133.601.294	Ayudante de Obra
24	Reinel Noguera	12.257.916	Ayudante de Obra

Equipo:
Dos (2) Mezcladora de concreto.
Dos (2) vibradores de concreto
Una (2) Planta eléctrica.
Una (1) Motobomba.
Un (1) demoledor para concreto
Dos (2) Saltarín (Canguro)
Un (1) Retrocargador
Dos (2) Volquetas sencillas
Un (1) Camioneta.
Un (1) Equipo topográfico.
Una (1) pulidora
Una (1) sierra eléctrica

Herramienta Menor (pulidoras, barras, palas, picas, baldes, etc.).

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

De acuerdo con en el desarrollo del contrato de obra No 023-2023 se hace necesario realizar un ajuste en las cantidades de obra; se prevén mayores y menores cantidades de obra, y la creación de ítems nuevos manteniendo las condiciones técnicas y el alcance del contrato.

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Obligaciones Del Contratista De Obra:

El contratista está cumpliendo con el objeto contractual del presente contrato denominado: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA". Se realiza el** pago de impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal. El contratista cumple a cabalidad los requisitos definidos con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. Se tienen todas las garantías vigentes que amparan el contrato en los términos del mismo mediante las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil contractual. Se han presentado los informes necesarios para el buen desarrollo de la obra, financieros y constructivos. Los recursos utilizados para la ejecución del contrato mediante el anticipo recaudado son de uso exclusivo del presente y gracias a ello se ha logrado realizar la construcción de la obra sin ninguna demora. Mediante las actas de inicio de obra se han dado a conocer la información del personal, con la respectiva afiliación y pago de seguridad social, pensión y ARL. Se ha dado a conocer por parte del contratista el plan de demarcación y señalización en obra, plan de manejo de tráfico, programas de trabajo en alturas y salud y seguridad en el trabajo, plan de manejos ambientales y de contingencia, entregados desde el inicio de obra el cual se mantiene en práctica durante la ejecución de las obras. El personal asistió a la reunión de inicio de obra donde se dejaron claras las condiciones de seguimiento. Se realizaron las actas de vecindad para proceder con la inspección y visitas de estas.

Se cumple con la normatividad legal vigente especialmente lo propuesto en el reglamento técnico de agua potable y saneamiento RAS. Se tiene personal capacitado y se cumple rigurosamente el pago de salarios y prestaciones sociales el cual se encuentra anexado en el informe. La evidencia de visitas y capacitaciones realizadas durante el transcurso de la obra serán anexadas al informe con el fin de demostrar la veracidad de estas. Hasta la fecha no se han reportado daños o afectaciones a terceros mediante el transcurso de las obras. Hasta la fecha se ha participado en los comités de obra dejando como constancia las actas. Se garantiza la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por Aguas del Huila, durante la ejecución del contrato y en caso de un reemplazo se deberá realizar el cambio con personal de perfil igual o superior del anterior. Las memorias y bitácoras se encuentran actualizadas al

igual que la evidencia de las obras, este registro se lleva a diario para tener evidencia actual de todo lo realizado en el contrato.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

Se han realizado toma de muestras de cilindro a las fundidas de elementos estructurales

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Los resultados de laboratorio emitidos por SEND suelos y concretos S.A.S, evidencian que los cilindros tomados en campo, en las diferentes fundidas de elementos estructurales, han superado la resistencia solicitada en el contrato de obra, dando tranquilidad de que se está cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas del contrato de obra

SEND Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005

V.01

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
SOLICITADO POR:	CONCRETOS Y ENERGIA LTDA - CONENERGIA LTDA
LOCALIZACION:	Placa piso tanque de almacenamiento concreto 4000 PSI
NORMA ASOCIADA:	ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673 — FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 8/08/2024
EQUIPO UTILIZADO:	EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY

Cilindro Nº	Nº Prensa	Localizacion	Peso	Altura	Diametro	Area cm^2	Densidad kg/m3	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa
18594		Placa piso tanque de almacenamiento concreto 4000 PSI	13,36	30,30	15,50	188,69	2329,75	05/08/24	12/08/24	7	468,50 kN	3600,21 PSI	24,83 MPa	4	3600,21 PSI	24,83 MPa
18595			13,16	30,40	15,30	183,85	2354,56	05/08/24	19/08/24	14	551,50 kN	4349,55 PSI	30,00 MPa	5	4349,55 PSI	30,00 MPa
18596			12,74	30,30	15,30	183,85	2287,30	05/08/24	02/09/24	28	586,40 kN	4624,80 PSI	31,89 MPa	N.F	4624,80 PSI	31,89 MPa

PROBETAS ENSAYADAS POR EL CLIENTE / NORTEC S.A.S 2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de 2 o más cilindros de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'c

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673



TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Cono Bien Formados En Ambos Extremos	Cono Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro, Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Vertical Columnar Que Abarca Ambos Extremos, No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas A Través De Los Extremos, Se Ha Colocado Con Mortero Para Refrentado De Tipo 1	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrentar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Terminan A A Través De La Superficie Del Cilindro

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS GAS 10-2024-0053

4.3. Comentarios y Conclusiones

Con la construcción del sistema de acueducto, se busca lograr una cobertura efectiva en los sistemas de servicios públicos de agua potable, garantizando el acceso a la comunidad rural y mejorando así el bienestar de los habitantes de la vereda Alto Granadillo, ubicada en los municipios de Agrado y Paicol, en el departamento del Huila.

4.4. Comité de Obra

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité (Describir)

5. INFORME AMBIENTAL

5.1 Identificación de situaciones Ambientales

-Disposición final de residuos. Se está utilizando de acuerdo con el plan ambiental que entrego el contratista de obra.

Existen bases sólidas sobre el tema de reciclaje debido a las recomendaciones ambientales realizadas a los trabajadores y realizan una buena clasificación de basuras, se realizan brigadas de orden y aseo que mejoran la finalización y entrega de las obras.
Se está cumpliendo con el plan ambiental propuesto por el contratista inicialmente.

5.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

A la fecha no se han reportado daños o afectaciones a terceros mediante el transcurso de las obras.

6. PAGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1 Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.

Se evidencia un buen manejo en la políticas de higiene y seguridad industrial en cumplimiento al plan de calidad PAGA, plan adaptado de gestión ambiental propuesto por el equipo profesional de contratista de obra, se tiene implementado un sistema mediante instrucciones que establecen los procedimientos y normas de seguridad específicos para cada actividad, oficio o tarea, así como los criterios de ejecución y prioridades para las acciones programadas en materia de seguridad, se realizan charlas periódicamente y pausas activas, todo el personal está debidamente dotado con sus elementos de protección personal y existe un control permanente para el uso de los mismos. Se compara el plan de seguridad industrial planteado inicialmente por el contratista y efectivamente se está cumpliendo hasta el momento con lo propuesto.
El personal cuenta con lugares de descanso, alimentación, y zonas de hidratación.

Es política del contratista prohibir que cualquier trabajador pueda ingresar o permanecer en las instalaciones si se encuentra bajo la influencia del alcohol o drogas o si presenta indicios de estar bajo la influencia de dichas sustancias, la tolerancia del nivel de alcohol y drogas es de cero por lo tanto es causal de despido.

6.2 Pagos de la seguridad integral y otros.

Se anexa al presente informe la seguridad social del equipo de trabajo propuesta.

6.3 Descripción de Actividades Desarrolladas en el Periodo

Ver imágenes adjuntas

6.4. Registro Fotográfico.

FUNDIDA DE MURO DE CONTENCION, PARTE DE BOCATOMA Y DESARENADOR



EXCAVACION MANUAL PARA TANQUE DE BOMBEO



INSTALACION DE TUBERIA CON CAMA DE ARENA, SUPERVISION DE INTERVENTORIA




INSTALACION DE ACERO PARA PLACA SUPERIOR DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO



PLACA SUPERIOR DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO FUNDIDA



EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA DE ADUCCION DE 2"

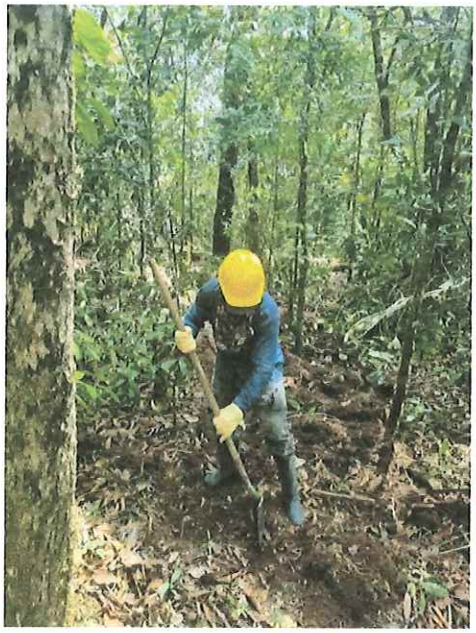

PLACA DE SOPORTE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE



FUNDIDA DE PLACA DE TANQUE DE BOMBEO



INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE



CONENERGIA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
R.L NELSON GUTIERREZ CUELLAR

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000608
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2024-10-01
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-19486513
NOMBRE EMPLEADO	NELSON GUTIERREZ CUELLAR
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	31143563
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-09
PERÍODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1701001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0052200	$ 6.800	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$ 318.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 30911646

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2024-10-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	WILLIAM PARRA OLAYA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12123891	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 17 NO 6 52	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	MARLIODUSSAN@GMAIL.COM	TELÉFONO	3153217351
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	obras
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		30911646

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12123891	59	No	No	No	41	1	1711001	Salario	PARRA OLAYA WILLIAM	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12123891																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12123891	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12123891	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12123891	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.800	0	$0	$0	$6.800	0	$0	$6.800	0	$0	$0	$6.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$377.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075247872
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ROBERTO CASTANEDA PARDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO. 11-08	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7939276720		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2024
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024-09-23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		930997033

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1075247872	CASTAÑEDA PARDO ROBERTO	INDEPENDIENTE: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 107524787	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.300**

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000608
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2024-10-01
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1081155462
NOMBRE EMPLEADO	JOHN FREDY CERVERA PEÑA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	31143563
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-09
PERÍODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4492301
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0435000	$ 56.600	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 56.600	$ 52.000	$ 368.600

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000608
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2024-10-01
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1035436676
NOMBRE EMPLEADO	ALEXANDRA MARCELA ARREDONDO RAMIREZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	31143563
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-09
PERÍODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1701001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		
																					X	10/09/24	15/09/24					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
24	1.408.000	0,1600000	$ 225.300	$ 0	$ 0	$ 225.300	$ 0	$ 0	$ 0
6	352.000	0,1600000	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
24	1.408.000	0,0400000	$ 56.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
6	352.000	0,0400000	$ 14.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
24	1.408.000	0,0052200	$ 7.400	1
6	352.000	0,0000000	$ 0	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
24	1.408.000	0,0400000	$ 56.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0
6	352.000	0,0400000	$ 14.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 281.700	$ 70.500	$ 7.400	$ 70.500	$ 430.100

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000608
SUCURSAL	32
FECHA PAGO	2024-10-01
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-83169973
NOMBRE EMPLEADO	LUIS JAVIER TOVAR PALOMO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	31104867
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-09
PERÍODO SALUD	2024-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5422001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.360.000	0,1600000	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.360.000	0,0400000	$ 54.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.360.000	0,0696000	$ 94.700	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.360.000	0,0400000	$ 54.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 217.600	$ 54.400	$ 94.700	$ 54.400	$ 421.100

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 31129139

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2024-10-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	41	NOMBRE SUCURSAL	CTO 203 2023 ACU ALTO GRANADILLO ADMI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$13.256.667		31129139

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1123400129	01	3	No	No	41	13	5422001	Fijo	BARRIOS MANGONES JOSE FRANCISCO	$1.300.000
CC-7695431	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	CANACUE CHALA ARMANDO	$1.500.000
CC-1075793416	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	CANACUE QUIROGA DEIVIS ANDRES	$1.300.000
CC-12255665	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	CUBILLOS JAIRO	$1.300.000
CC-7691364	01	1	No	No	41	1	5422001	Fijo	FALLA FLOREZ JESUS ANTONIO	$1.500.000
CC-1133601294	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	MORENO ESPINOSA JEISER JOSE	$1.300.000
CC-12257916	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	NOGUERA REINEL	$1.300.000
CC-1079390683	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	SIERRA ALVARADO RICARDO ANDRES	$2.500.000
CC-26421244	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	TRUJILLO HERNANDEZ KELLY JOHANNA	$1.300.000
CC-1001900644	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	URBINA TORRES KEHENER	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1123400129	X	2024-09-03	X	2024-09-26																									0		
CC - 7695431																													0		
CC - 1075793416																													0		
CC - 12255665			X	2024-09-26																									0		
CC - 7691364																													0		
CC - 1133601294	X	2024-09-03	X	2024-09-26																									0		
CC - 12257916	X	2024-09-09	X	2024-09-26																									0		
CC - 1079390683																													0		
CC - 26421244																													0		
CC - 26421244																X	2024-09-14	2024-09-16											0		
CC - 1001900644			X	2024-09-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1123400129	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 7695431	COLPENSIONES	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075793416	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 12255665	COLPENSIONES	26	$1.126.667	0.1600000	$180.300	$0	$0	$180.300	$0	$0	$0
CC - 7691364	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1133601294	COLPENSIONES	24	$1.040.000	0.1600000	$166.400	$0	$0	$166.400	$0	$0	$0
CC - 12257916	COLFONDOS	18	$780.000	0.1600000	$124.800	$0	$0	$124.800	$0	$0	$0
CC - 1079390683	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 26421244	PORVENIR	27	$1.170.000	0.1600000	$187.200	$0	$0	$187.200	$0	$0	$0
CC - 26421244	PORVENIR	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1001900644	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1123400129	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	$0	0	$0	0	$0	24	$1.040.000	5422001	0.0696000	$72.400
CC - 7695431	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	5422001	0.0696000	$104.400
CC - 1075793416	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5422001	0.0696000	$90.500
CC - 12255665	NUEVA E.P.S. S.A.	26	$1.126.667	0.0400000	$45.100	$0	0	$0	0	$0	26	$1.126.667	5422001	0.0696000	$78.500
CC - 7691364	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	5422001	0.0696000	$104.400
CC - 1133601294	EPS CAJACOPI	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	$0	0	$0	0	$0	24	$1.040.000	5422001	0.0696000	$72.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12257916	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$780.000	0.0400000	$31.200	$0	0	$0	0	$0	18	$780.000	542200 1	0.0696000	$54.300
CC - 1079390683	SANITAS	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	542200 1	0.0696000	$174.000
CC - 26421244	SANITAS	27	$1.170.000	0.0400000	$46.800	$0	0	$0	0	$0	27	$1.170.000	542200 1	0.0696000	$81.500
CC - 26421244	SANITAS	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	542200 1	0.0000000	$0
CC - 1001900644	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	542200 1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1123400129	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7695431	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075793416	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12255665	COMFAMILIAR DEL HUILA	26	$1.126.667	0.0400000	$45.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7691364	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1133601294	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12257916	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$780.000	0.0400000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079390683	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-26421244	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$1.170.000	0.0400000	$46.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26421244	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001900644	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	4	$794.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$794.700
PORVENIR	2	$416.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$416.000
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLFONDOS	1	$124.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$124.800
PROTECCION	1	$400.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$400.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	$104.000	$0	0	$0	0	$0	$104.000	0	$0	$0	$104.000	$0	0	$0	$0	$104.000	$0	$0	$104.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$196.300	$0	0	$0	0	$0	$196.300	0	$0	$0	$196.300	$0	0	$0	$0	$196.300	$0	$0	$196.300
SANITAS	2	$152.000	$0	0	$0	0	$0	$152.000	0	$0	$0	$152.000	$0	0	$0	$0	$152.000	$0	$0	$152.000
EPS CAJACOPI	1	$41.600	$0	0	$0	0	$0	$41.600	0	$0	$0	$41.600	$0	0	$0	$0	$41.600	$0	$0	$41.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$41.600	$0	0	$0	0	$0	$41.600	0	$0	$0	$41.600	$0	0	$0	$0	$41.600	$0	$0	$41.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	10	$922.900	0	$0	$0	$922.900	0	$0	$922.900	0	$0	$0	$922.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$530.300	0	$0	$530.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$535.500
PENSIONES	4	$1.735.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$922.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$530.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.724.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31106889
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	40	NOMBRE SUCURSAL	CTO 203 2023 ACU ALTO GRANADILLO HUILA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.600.000		31106889

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88307005	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	GAMBOA ACEVEDO ALEXIS	$1.300.000
CC-1079508676	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	SALINAS ORDOÑEZ OLMES NORBERTO	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88307005																													0		
CC - 1079508676																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88307005	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1079508676	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88307005	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	542201	0.0696000	$90.500
CC - 1079508676	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	542201	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88307005	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079508676	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
SANITAS	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$181.000	0	$0	$0	$181.000	0	$0	$181.000	0	$0	$0	$181.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$104.000	0	$0	$104.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$104.000
PENSIONES	2	$416.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$181.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$104.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$805.000

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31113786
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	42	NOMBRE SUCURSAL	CTO 203 2023 ACU ALTO GRANADILLO OPE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$7.200.000		31113786

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-83252474	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	CERQUERA ARMANDO	$1.500.000
CC-1094368239	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	GAMBOA ACEVEDO BEYMAR	$1.300.000
CC-1079391391	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	NAVEROS NARVAEZ DUVERNEY	$1.300.000
CC-1079508606	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	SALINAS CADENA ALEIDER	$1.300.000
CC-83227084	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	TRIVIÑO MARIN JHON JAIRO	$1.500.000
CC-1079388799	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	VILLANUEVA TRUJILLO JORGE LUIS	$1.300.000
CC-91436740	01	No	No	No	41	13	5422001	Fijo	YARBOS RAMOS OLFIO	$1.500.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 83252474																													0		
CC - 1094368239																													0		
CC - 1079391391																													0		
CC - 1079508606			X	2024-09-15																									0		
CC - 83227084			X	2024-09-15																									0		
CC - 1079388799																													0		
CC - 91436740	X	2024-09-19	X	2024-09-26																									0		
CC - 91436740													X	2024-09-22	2024-09-22														0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 83252474	COLFONDOS	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1094368239	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1079391391	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1079508606	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 83227084	PORVENIR	15	$750.000	0.1600000	$120.000	$0	$0	$120.000	$0	$0	$0
CC - 1079388799	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 91436740	COLPENSIONES	7	$350.000	0.1600000	$56.000	$0	$0	$56.000	$0	$0	$0
CC - 91436740	COLPENSIONES	1	$50.000	0.1200000	$6.000	$0	$0	$6.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 83252474	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	542200 1	0.0696000	$104.400
CC - 1094368239	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	542200 1	0.0696000	$90.500
CC - 1079391391	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	542200 1	0.0696000	$90.500
CC - 1079508606	SANITAS	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	542200 1	0.0696000	$45.300
CC - 83227084	EPS-S AIC CAUCA	15	$750.000	0.0400000	$30.000	$0	0	$0	0	$0	15	$750.000	542200 1	0.0696000	$52.200
CC - 1079388799	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	542200 1	0.0696000	$90.500
CC - 91436740	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$350.000	0.0400000	$14.000	$0	0	$0	0	$0	7	$350.000	542200 1	0.0696000	$24.400
CC - 91436740	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$50.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	1	$50.000	542200 1	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83252474	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1094368239	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079391391	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079508606	COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83227084	COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$750.000	0.0400000	$30.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079388799	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91436740	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$350.000	0.0400000	$14.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91436740	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$50.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$448.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$448.000
PORVENIR	4	$640.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$640.000
COLPENSIONES	1	$62.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$62.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$14.000	$0	0	$0	0	$0	$14.000	0	$0	$0	$14.000	$0	0	$0	$0	$14.000	$0	$0	$14.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$112.000	$0	0	$0	0	$0	$112.000	0	$0	$0	$112.000	$0	0	$0	$0	$112.000	$0	$0	$112.000
SANITAS	3	$130.000	$0	0	$0	0	$0	$130.000	0	$0	$0	$130.000	$0	0	$0	$0	$130.000	$0	$0	$130.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S AIC CAUCA	1	$30.000	$0	0	$0	0	$0	$30.000	0	$0	$0	$30.000	$0	0	$0	$0	$30.000	$0	$0	$30.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$497.800	0	$0	$0	$497.800	0	$0	$497.800	0	$0	$0	$497.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$286.000	0	$0	$286.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$286.000
PENSIONES	3	$1.150.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$497.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$286.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.219.800
