

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1		**1**	**CTO-316-2023_TUNJUELITO_CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C._21062024**	**283 días**	***jue 14/09/23***	***lun 14/10/24***			**$ 5.548.611.617**
2		*1.1*	*Firma del Acta de Inicio*	*0 días*	*jue 14/09/23*	*jue 14/09/23*		*3*	*$ 0*
3		1.2	FASE DE PRECONSTRUCCION (REVISION Y/O APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS)	23 días	jue 14/09/23	lun 16/10/23	2	4	$ 0
4		*1.3*	*Apropiacion de estudios y diseños al 100%*	*0 días*	*lun 16/10/23*	*lun 16/10/23*	*3*	*6*	*$ 0*
5		**1.4**	**FASE DE OBRA**	**283 días**	***jue 14/09/23***	***lun 14/10/24***			**$ 5.548.611.617**
6		*1.4.1*	*Inicio de actividades de obra*	*0 días*	*lun 16/10/23*	*lun 16/10/23*	*4*	*9;34CC+1 ms;128CC;129C*	*$ 0*
7		**1.4.2**	**CIV 6001440 - SAN BENITO**	**259 días**	***mar 17/10/23***	***vie 11/10/24***			**$ 1.605.880.102**
8		**1.4.2.1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	***mar 17/10/23***	***lun 23/10/23***			**$ 1.491.193**
9		1.4.2.1.1	3007 - Replanteo General	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	6	50;11	$ 1.491.193
10		**1.4.2.2**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE RED MENOR DE ACUEDUCTO**	**45 días**	***mar 24/10/23***	***lun 25/12/23***			**$ 70.091.930**
11		1.4.2.2.1	4390 - Excavacion Manual en Material Comun	35 días	mar 24/10/23	lun 11/12/23	9;134;216;287;343	12	$ 6.561.336
12		1.4.2.2.2	3024 - Relleno para redes en Arena de Peña	5 días	mar 12/12/23	lun 18/12/23	11	13	$ 4.002.383
13		1.4.2.2.3	3234 - Instalacion de tuberia PVC D = 4"	5 días	mar 19/12/23	lun 25/12/23	12	14CC	$ 8.136.784
14		1.4.2.2.4	3257 - Instalacion de Tee HD Extremo Liso 8" x 4	5 días	mar 19/12/23	lun 25/12/23	13CC	15CC	$ 1.642.231
15		1.4.2.2.5	4402 - Instalacion de Valvula compuerta elástica	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23	14CC	16	$ 1.865.988
16		1.4.2.2.6	4978 - Construccion de caja para valvula D = 4"	4 días	mié 20/12/23	lun 25/12/23	15	17CC	$ 1.068.775
17		1.4.2.2.7	3589 - Instalacion de tapo HD Extremo liso D = 4	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	16CC	18CC	$ 484.088
18		1.4.2.2.8	3305 - Instalacion de Codo HD 45° Extremo liso	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	17CC	19CC	$ 1.472.967
19		1.4.2.2.9	3293 - Instalacion de Codo HD 90° Extremo Liso	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	18CC	20CC	$ 1.316.026
20		1.4.2.2.10	3602 - Instalacion de Union PVC Tipo UM 4"	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	19CC	21CC	$ 813.510
21		1.4.2.2.11	4982 - Acometida Domiciliaria de 1/2" incluye tuberia PF D = 1/2", registros y accesorios	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23	20CC	22CC	$ 2.571.180
22		1.4.2.2.12	4984 - Relocalizacion de medidor de acueducto D = 1/2"	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23	21CC	23CC	$ 4.515.636
23		1.4.2.2.13	5172 - Incorporacion de acometida domiciliaria 4" a 1/2"	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23	22CC	24CC	$ 6.293.162
24		1.4.2.2.14	N.P. - Empate para red de acueducto de 4" incluye anclaje en seco	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23	23CC	25CC	$ 3.654.196
25		1.4.2.2.15	4422 - Instalacion de acople universal union alfa o multiusos D = 4"	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23	24CC	26CC	$ 2.362.992
26		1.4.2.2.16	*3391 - Instalacion de Codo HD 22.5° para PVC 4"*	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	25CC	27CC	$ 478.418
27		1.4.2.2.17	*3531 - Instalacion de Codo G.Rad PVC 22.5° D =*	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	26CC	28CC	$ 464.636
28		1.4.2.2.18	*3523 - Instalacion de Codo G.Rad PVC 45° D = 4"*	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	27CC	29CC	$ 581.796
29		1.4.2.2.19	*3282 - Instalacion de Tee HD Ext. Liso 4"x4" para PVC*	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	28CC	30CC	$ 699.748
30		1.4.2.2.20	*4424 - Instalacion de Acople Universal Union Alfa o multiusos D = 8"*	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	29CC	31	$ 2.130.776
31		1.4.2.2.21	*5999 - Ejecucion de prueba hidrostatica en tuberias hasta 12"*	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23	30	32;52;138;220;290;347	$ 2.618.000
32		1.4.2.2.22	NP - Instalacion de tuberia para cruce en acero al carbol si constura SCH40 D = 8"	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23	31		$ 16.357.304
33		**1.4.2.3**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES SECA**	**185,4 días**	***lun 20/11/23***	***lun 5/08/24***			**$ 85.247.593**
34		1.4.2.3.1	4390 - Excavacion manual en material comun	14 días	lun 20/11/23	jue 7/12/23	6CC+1 ms	35CC+8 días	$ 5.395.918
35		1.4.2.3.2	4104 - Construccion de caja de inspeccion para alumbrado publico CS274	12 días	jue 30/11/23	vie 15/12/23	34CC+8 días	36CC+3 días	$ 3.432.632
36		1.4.2.3.3	3024 - Relleno para redes en arena de peña	4 días	mar 5/12/23	vie 8/12/23	35CC+3 días	37CC+1 día	$ 842.049
37		1.4.2.3.4	3159 - Instalacion de canalizacion 2 ductos D = 3" PVC EB CS207	4 días	mié 6/12/23	lun 11/12/23	36CC+1 día	38CC	$ 1.923.348
38		1.4.2.3.5	3413 - Instalacion de adaptador terminal campana PVC D = 3"	4 días	mié 6/12/23	lun 11/12/23	37CC	39	$ 205.302
39		1.4.2.3.6	3203 - Instalacion de concreto 2500 psi hecho en obra para anclaje de poste	2 días	mar 12/12/23	mié 13/12/23	38	42;43CC;40;41	$ 910.958
40		1.4.2.3.7	3350 - Instalacion de Poste en concreto AP; H = 10 m	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	39	42;43CC	$ 1.810.094
41		1.4.2.3.8	8119 - Instalacion de sistema puesta a tierra para barrajes preformados Baja Tension CS340	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	39	42;43CC	$ 670.767
42		1.4.2.3.9	8173 - Instalacion de luminaria LED 70W	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23	40;39;41	43CC	$ 1.458.510
43		1.4.2.3.10	7658 - Instalacion de tuberia conduit galvanizada 3"	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23	40CC;42CC;39CC;41CC	44CC	$ 512.057
44		1.4.2.3.11	7624 - Instalacion de accesorios de instalacion adicionales: Conduletas, conectores rectos, adaptador PVC a EMT, cajas metalicas 5800 entre otros	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23	43CC	45	$ 137.553
45		1.4.2.3.12	5838 - Instalacion de acometida monofasica (12+12+14T AWG-THHN-600V-CU)	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23	44	46CC	$ 4.668.097
46		1.4.2.3.13	5779 - Instalacion de acometida trifasica (3 No. 4 + 1 No. 4 + 1 No. 4T AWG THHN-600V-CU)	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23	45CC	47FC+5,85 mss	$ 7.754.552
47		1.4.2.3.15	NP - Traslado de Poste y redes de media tension CIV 6001414 - San Benito (Av. Boyacá,	10 días	mié 3/07/24	mié 17/07/24	46FC+5,85 mss	48CC+20 días	$ 50.890.711
48		*1.4.2.3.14*	*NP-041 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS 280 (INCLUYE BASE, MUROS, PASOS, PAÑETE, CUBIERTA, ARO Y TAPA)*	*3 días*	*mié 31/07/24*	*lun 5/08/24*	*47CC+20 días*		*$ 4.635.048*
49		**1.4.2.4**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PUI**	**204 días**	***mar 24/10/23***	***vie 2/08/24***			**$ 251.233.600**
50		1.4.2.4.1	5196 - Demolicion de concreto 8cm a 15 cm (Andenes)	22 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	9;134;216;287;343	51;59CC;146CC	$ 7.037.593
51		1.4.2.4.2	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	170 días	jue 23/11/23	mié 17/07/24	50;345	52CC+4 días	$ 40.617.793
52		1.4.2.4.3	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de Andenes	158 días	vie 22/12/23	mar 30/07/24	51CC+4 días;31	53CC+2 días	$ 18.271.505
53		1.4.2.4.4	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	155 días	mar 26/12/23	lun 29/07/24	52CC+2 días	54CC+2 días	$ 10.507.670
54		1.4.2.4.5	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	140 días	jue 28/12/23	mié 10/07/24	53CC+2 días	55CC+10 días	$ 21.411.158
55		1.4.2.4.6	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	143 días	jue 11/01/24	lun 29/07/24	54CC+10 días	56CC	$ 7.878.202
56		1.4.2.4.7	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	147 días	jue 11/01/24	vie 2/08/24	55CC	57CC	$ 86.871.881
57		1.4.2.4.8	6047- Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	147 días	jue 11/01/24	vie 2/08/24	56CC	109FC+15 días;115FC+2 días;116FC+2 días	$ 58.637.800
58		**1.4.2.5**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**205 días**	***mar 24/10/23***	***lun 5/08/24***			**$ 368.257.457**
59		1.4.2.5.1	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	22 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	50CC;136CC;218CC;345C	60;76	$ 13.621.986

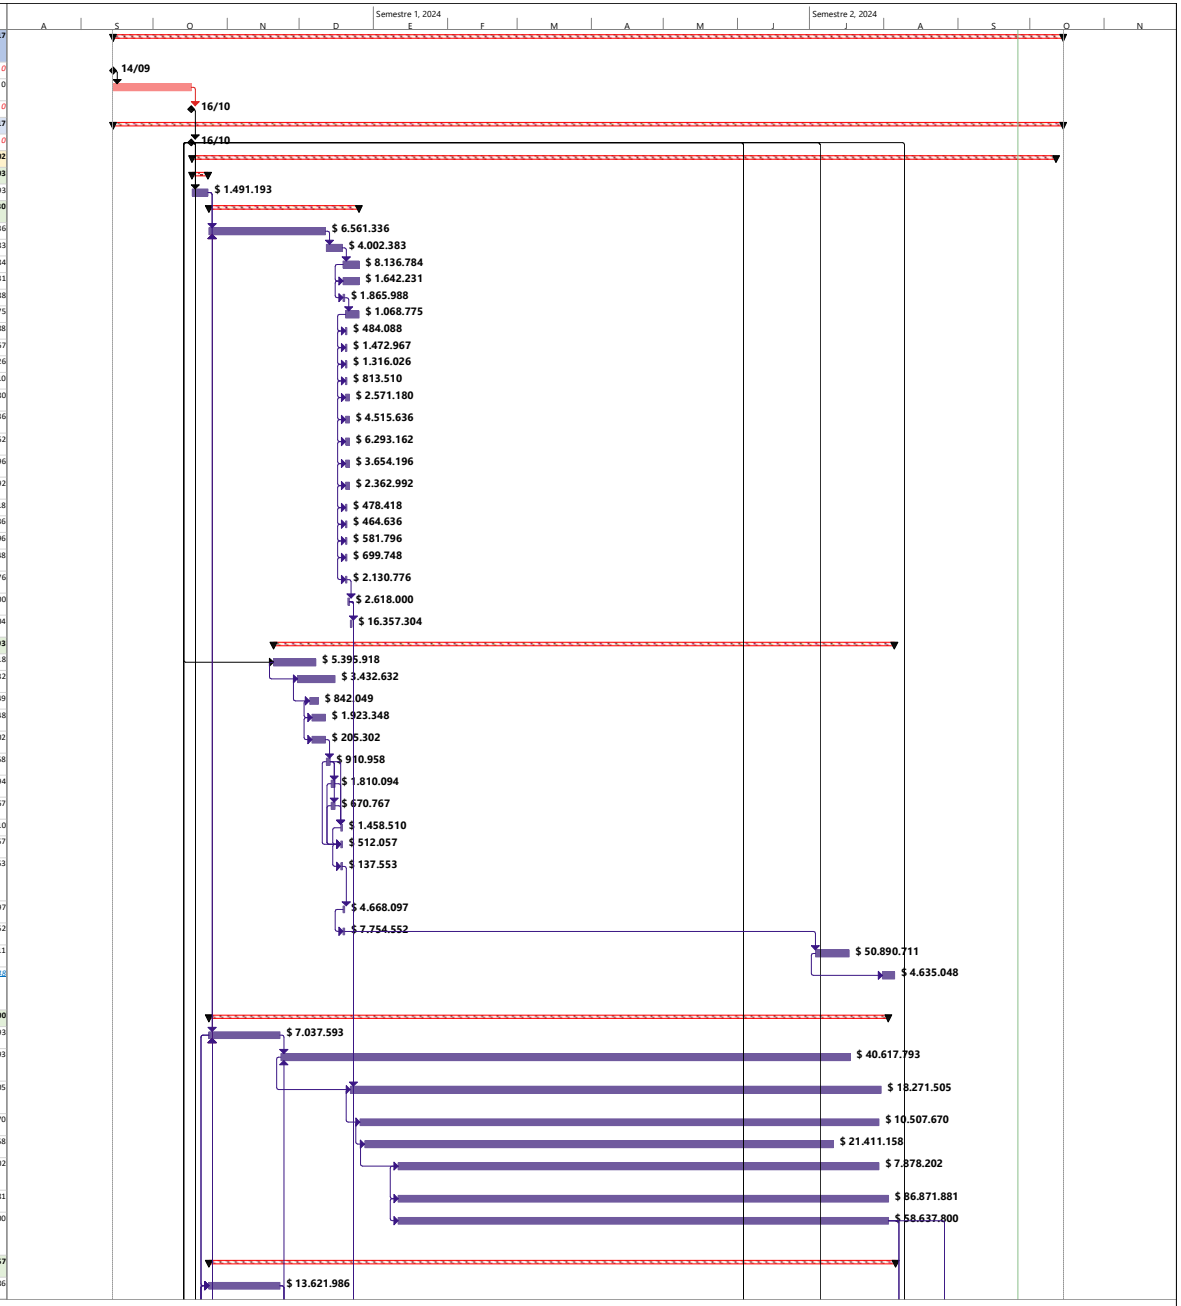

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
60		1.4.2.5.2	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	180 días	jue 23/11/23	mié 31/07/24	59;355	61CC+4 días;62CC+19 días;87CC+21 días	$ 4.212.378
61		1.4.2.5.3	3017 - Transporte y Disposicion Final	170 días	mié 29/11/23	mar 23/07/24	60CC+4 días	62CC	$ 38.837.237
62		1.4.2.5.4	6016 - Estabilizacion de la Subrasante con rajor	103 días	mié 20/12/23	vie 10/05/24	60CC+19 días;61CC	63CC+1 día	$ 30.043.890
63		1.4.2.5.5	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	160 días	jue 21/12/23	mié 31/07/24	62CC+1 día	64CC+8 días	$ 4.805.851
64		1.4.2.5.6	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	92 días	mar 2/01/24	mié 8/05/24	63CC+8 días	65CC+1 día	$ 15.095.689
65		1.4.2.5.7	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calza	92 días	mié 3/01/24	jue 9/05/24	64CC+1 día	66CC+18 días;68CC+4 días	$ 29.217.727
66		1.4.2.5.8	4054 - Instalacion de Sardinel A10	121 días	lun 29/01/24	lun 15/07/24	65CC+18 días	67CC+8 días	$ 23.254.964
67		1.4.2.5.9	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa A85	126 días	jue 8/02/24	jue 1/08/24	66CC+8 días	69CC+1 día	$ 2.878.932
68		1.4.2.5.10	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	148 días	mar 9/01/24	jue 1/08/24	65CC+4 días	69CC;71CC;70CC	$ 30.005.672
69		1.4.2.5.11	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	125 días	vie 9/02/24	jue 1/08/24	67CC+1 día;68CC	71CC;70CC	$ 16.441.464
70		1.4.2.5.16	APU NP - Construccion de losas en concreto MR	125 días	vie 9/02/24	jue 1/08/24	68CC;69CC	72CC+1 día;74CC+1 día	$ 122.736.717
71		1.4.2.5.12	NP-042 - CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR43 ACELERADO A 7 DIAS	125 días	vie 9/02/24	jue 1/08/24	68CC;69CC	72CC+1 día;74CC+1 día	$ 20.594.688
72		1.4.2.5.13	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	125 días	lun 12/02/24	vie 2/08/24	71CC+1 día;70CC+1 día	73CC+1 día	$ 4.138.400
73		1.4.2.5.14	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	125 días	mar 13/02/24	lun 5/08/24	72CC+1 día		$ 9.461.900
74		1.4.2.5.15	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	125 días	lun 12/02/24	vie 2/08/24	71CC+1 día;70CC+1 día	118FC+15 días	$ 2.909.962
75		**1.4.2.6**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA**	**161 días**	**jue 23/11/23**	**jue 4/07/24**			**$ 189.527.732**
76		1.4.2.6.1	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Muro de Contencion	25 días	jue 23/11/23	mié 27/12/23	59;146;227;355	77CC+1 día	$ 2.529.720
77		1.4.2.6.2	3017 - Transporte y Disposicion Final	25 días	vie 24/11/23	jue 28/12/23	76CC+1 día	78CC	$ 23.323.255
78		1.4.2.6.3	3776 - Instalacion de Entibado Discontinuo En Madera	70 días	vie 24/11/23	jue 29/02/24	77CC	79CC	$ 2.466.636
79		1.4.2.6.4	9109 - Instalacion de concreto de limpieza o solado, para construccion de zapata y dentellon muro de contencion	70 días	vie 24/11/23	jue 29/02/24	78CC	80CC+1 día	$ 15.016.797
80		1.4.2.6.5	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para zapata, dentellon y vastago muro de contencion	100 días	lun 27/11/23	vie 12/04/24	79CC+1 día	81CC+3 días	$ 62.869.487
81		1.4.2.6.6	5421 - Construccion de muro en concreto estructural de 4000 psi, incluye formaleteado, alineado, plomado, y fundida	100 días	jue 30/11/23	mié 17/04/24	80CC+3 días	82FC+28 días	$ 56.955.939
82		1.4.2.6.7	4009 - Instalacion de geotextil NT3000 para subdrenes y filtros	2 días	mar 28/05/24	mié 29/05/24	81FC+28 días	83CC	$ 1.179.211
83		1.4.2.6.8	4905 - Instalacion de geodren vial de 100 mm x 1 m para filtro frances	2 días	mar 28/05/24	mié 29/05/24	82CC	84	$ 3.334.199
84		1.4.2.6.9	4556 - Lleno de muro en SBG A, suministro, extendido y compactacion manual	25 días	jue 30/05/24	mié 3/07/24	83	85CC+1 día	$ 19.671.414
85		1.4.2.6.10	8655 - Instalacion de gravilla de 3/4" para filtro frances	25 días	vie 31/05/24	jue 4/07/24	84CC+1 día		$ 2.181.076
86		**1.4.2.7**	**ACTIVIDADES DE OBRAS HIDRAULICAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y**	**199,5 días**	**vie 22/12/23**	**jue 26/09/24**			**$ 184.471.051**
87		1.4.2.7.1	4262 - Excavacion Mecanica para redes h (0 a 3	20 días	vie 22/12/23	jue 18/01/24	60CC+21 días;147CC+21 d	88CC+0,5 días;93CC;90CC	$ 1.523.898
88		1.4.2.7.2	3017 - Transporte y Disposicion Final	20 días	vie 22/12/23	vie 19/01/24	87CC+0,5 días	93CC+10 días	$ 14.050.118
89		1.4.2.7.3	4850 - Demolicion de pozos de alcantarillado	20 días	vie 22/12/23	vie 19/01/24	87CC+0,5 días	91CC+1 día;92CC+1 día	$ 5.309.333
90		1.4.2.7.4	4848 - Demolicion de tuberias de alcantarillado	10 días	vie 22/12/23	vie 5/01/24	87CC+0,5 días	91CC+1 día;92CC+1 día	$ 1.630.440
91		1.4.2.7.5	5710 - Instalacion de gravilla 1/2" para camas y	20 días	lun 25/12/23	lun 22/01/24	89CC+1 día;90CC+1 día	95CC+1 día	$ 5.851.722
92		1.4.2.7.18	3443 - Lleno de cajas de tuberia en B200	20 días	lun 25/12/23	lun 22/01/24	89CC+1 día;90CC+1 día	95CC+1 día	$ 23.451.050
93		1.4.2.7.6	3473 - Instalacion de Placa de Fondo para pozo D = 1.70 m	20 días	vie 5/01/24	vie 2/02/24	87CC;88CC+10 días	94CC+4 días	$ 3.986.402
94		1.4.2.7.7	3471 - Cilindro Pozo de inspeccion en mamposteria	20 días	jue 11/01/24	jue 8/02/24	93CC+4 días	95CC+2 días;102;104	$ 7.586.496
95		1.4.2.7.8	3045 - Instalacion de tuberia Novafort 12"	20 días	lun 15/01/24	lun 12/02/24	91CC+1 día;94CC+2 días	97CC;96CC	$ 25.328.359
96		1.4.2.7.9	3044 - Instalacion de tuberia Novafort 10"	40 días	lun 15/01/24	lun 11/03/24	95CC	103	$ 11.147.070
97		1.4.2.7.10	3043 - Instalacion de tuberia Novafort 8"	40 días	lun 15/01/24	lun 11/03/24	95CC	102	$ 865.091
98		1.4.2.7.11	3779 - Construccion de caja de inspeccion 60x6	20 días	mié 3/01/24	mar 30/01/24	87CC+8 días	100CC;99CC;104	$ 1.522.584
99		1.4.2.7.12	5015 - Construccion de caja de inspeccion 80x8	20 días	mié 3/01/24	mar 30/01/24	98CC	100CC;104	$ 8.549.580
100		1.4.2.7.13	3042 - Instalacion de tuberia Novafort 6" Conexiones Domiciliarias	40 días	mié 3/01/24	mar 27/02/24	98CC;99CC	101CC	$ 5.642.979
101		1.4.2.7.14	4879 - Conexión Silla Yee de 6" a 8"	40 días	mié 3/01/24	mar 27/02/24	100CC	102	$ 3.780.774
102		1.4.2.7.15	4252 - Instalacion de placa superior en concreto D = 1.70 m	20 días	lun 11/03/24	lun 8/04/24	94;97;101		$ 12.430.759
103		1.4.2.7.16	4558 - Construccion de sumidero lateral en via	20 días	lun 11/03/24	lun 8/04/24	96	104	$ 34.869.641
104		1.4.2.7.17	8227 - Cañuela especial	9 días	lun 8/04/24	vie 19/04/24	94;98;99;103	105FC+4,5 mss	$ 802.466
105		1.4.2.7.20	NP-046 - INSTALACIÓN DE PASOS PARA ESCALERA DE GATO PP	6 días	mié 18/09/24	jue 26/09/24	104FC+4,5 mss	107CC+2 días;106CC+2 días	$ 4.326.560
106		1.4.2.7.21	NP-052 - LAVADO DE REDES CON EQUIPO VACT	4 días	vie 20/09/24	jue 26/09/24	105CC+2 días		$ 7.170.350
107		1.4.2.7.19	NP-051 - INSPECCIÓN DE REDES CON EQUIPO C	4 días	vie 20/09/24	jue 26/09/24	105CC+2 días		$ 4.645.379
108		**1.4.2.8**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**48 días**	**mié 7/08/24**	**vie 11/10/24**			**$ 48.758.406**
109		1.4.2.8.1	3396 - Instalacion de banca en concreto tipo M	22 días	lun 26/08/24	mar 27/08/24	57FC+15 días	110CC+31 días	$ 3.853.754
110		1.4.2.8.2	4290 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	1 día	mar 8/10/24	mar 8/10/24	109CC+31 días	111CC	$ 8.698.997
111		1.4.2.8.3	7353 - Construccion de contenedor de raices Tipo B23	3 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	110CC	112CC+1 día	$ 24.289.794
112		1.4.2.8.4	3548 - Instalacion de Bolardo en hierro tipo M6	3 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	111CC+1 día	113CC	$ 4.478.194
113		1.4.2.8.5	8094 - Siembra de individuo arboreo tipo Pino Romeron H = 1.50 m	3 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	112CC	114CC	$ 2.949.981
114		1.4.2.8.6	4884 - Siembra de individuo arboreo tipo Nogal H = 1.50 m	3 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	113CC		$ 1.604.781
115		1.4.2.8.7	4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm	8 días	mié 7/08/24	vie 16/08/24	57FC+2 días		$ 2.625.000
116		1.4.2.8.8	NP-048 - ACTUALIZACIÓN SIGAU POR SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS	10 días	mié 7/08/24	mar 20/08/24	57FC+2 días		$ 257.906
117		**1.4.2.9**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**3,3 días**	**lun 26/08/24**	**jue 29/08/24**			**$ 31.076.171**
118		1.4.2.9.20	NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24	74FC+15 días	119CC+0,3 días;120CC	$ 1.875.292
119		1.4.2.9.18	NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN (ml)	1 día	lun 26/08/24	mar 27/08/24	118CC+0,3 días		$ 4.816.766
120		1.4.2.9.21	NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24	118CC	121CC+0,3 días	$ 1.521.022
121		1.4.2.9.19	NP-025 - PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES	1 día	lun 26/08/24	mar 27/08/24	120CC+0,3 días	122CC	$ 2.997.254

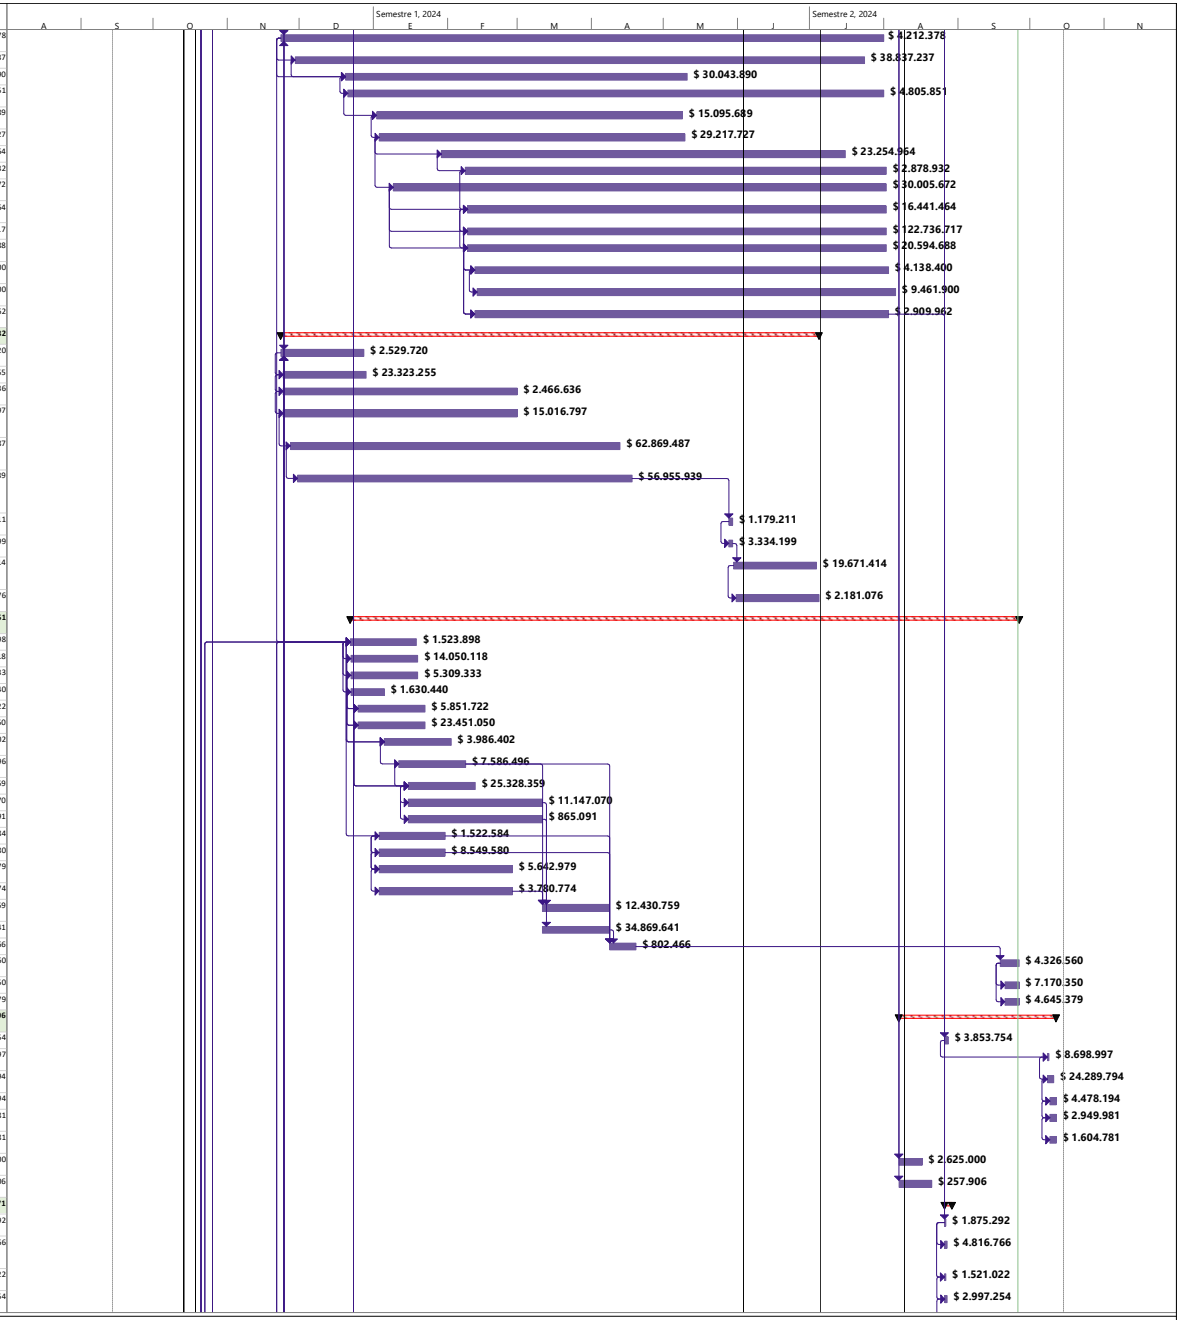

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
122		1.4.2.9.5	NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL [un]	1 día	lun 26/08/24	mar 27/08/24	121CC	123CC	$ 1.137.775
123		1.4.2.9.6	NP-032 - INSTALACIÓN DE BANDA SONORA EN ESTOPERQUES	1 día	lun 26/08/24	mar 27/08/24	122CC	124CC	$ 342.432
124		1.4.2.9.14	NP-029 - DESMONTE DE SEÑAL VERTICAL	1 día	lun 26/08/24	mar 27/08/24	123CC	125CC+1 día	$ 9.156
125		1.4.2.9.15	NP-030 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO	2 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	124CC+1 día	127CC;126CC	$ 1.723.464
126		1.4.2.9.22	NP-031 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO	2 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	125CC		$ 1.127.320
127		1.4.2.9.16	NP-050 - CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS EN AGREGADO	2 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	125CC		$ 15.525.690
128		*1.4.2.10*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*6CC*		*$ 340.696.483*
129		*1.4.2.11*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*6CC*		*$ 27.102.331*
130		*1.4.2.12*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*6CC*	131FC+1 día	*$ 7.926.154*
131		*1.4.3*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6001440 - San Benito*	*0 días*	*vie 11/10/24*	*vie 11/10/24*	*130FC+1 día*		*$ 0*
132		**1.4.4**	**CIV 6000446 - ISLA DEL SOL No. 2**	**259 días**	**mar 17/10/23**	**vie 11/10/24**			**$ 547.274.888**
133		**1.4.4.1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 17/10/23**	**lun 23/10/23**			**$ 571.095**
134		1.4.4.1.1	3007 - Replanteo General	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	6	50;11;136;210CC;211CC;2	$ 571.095
135		**1.4.4.2**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**224 días**	**mar 24/10/23**	**vie 30/08/24**			**$ 65.693.081**
136		1.4.4.2.1	5196 - Demolicion de concreto 8cm a 15 cm (Andenes)	22 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	134	137;59CC;146CC	$ 1.139.032
137		1.4.4.2.2	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	170 días	jue 23/11/23	mié 17/07/24	136	138CC+4 días	$ 6.561.336
138		1.4.4.2.3	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de Andenes	155 días	vie 22/12/23	jue 25/07/24	137CC+4 días;31	139CC+2 días	$ 3.715.206
139		1.4.4.2.4	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	155 días	mar 26/12/23	lun 29/07/24	138CC+2 días	140CC+2 días	$ 1.257.651
140		1.4.4.2.5	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	155 días	jue 28/12/23	mié 31/07/24	139CC+2 días	141CC+10 días	$ 4.681.993
141		1.4.4.2.6	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	145 días	jue 11/01/24	mié 31/07/24	140CC+10 días	142CC	$ 1.726.354
142		1.4.4.2.7	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	145 días	jue 11/01/24	mié 31/07/24	141CC	143CC	$ 22.861.021
143		1.4.4.2.8	6047- Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	165 días	jue 11/01/24	mié 28/08/24	142CC	144;196FC+20 días	$ 23.161.931
144		1.4.4.2.9	4855 - Construccion de franja de ajuste en concreto premezclado 3000 psi	2 días	jue 29/08/24	vie 30/08/24	143		$ 588.558
145		**1.4.4.3**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**224,4 días**	**mar 24/10/23**	**lun 2/09/24**			**$ 143.742.690**
146		1.4.4.3.1	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	22 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	50CC;136CC;345CC	147;76;163	$ 434.929
147		1.4.4.3.2	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	190 días	jue 23/11/23	mié 14/08/24	146	148CC+4 días;149CC+19 días;87CC+21	$ 2.017.167
148		1.4.4.3.3	3017 - Transporte y Disposicion Final	187 días	mié 29/11/23	jue 15/08/24	147CC+4 días	149CC	$ 18.597.726
149		1.4.4.3.4	6016 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	172 días	mié 20/12/23	jue 15/08/24	147CC+19 días;148CC	150CC+1 día	$ 23.939.296
150		1.4.4.3.5	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	172 días	jue 21/12/23	vie 16/08/24	149CC+1 día	151CC+8 días	$ 3.874.654
151		1.4.4.3.6	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	164 días	mar 2/01/24	vie 16/08/24	150CC+8 días	152CC+1 día	$ 3.304.661
152		1.4.4.3.7	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calza	163 días	mié 3/01/24	vie 16/08/24	151CC+1 día	153CC+18 días;155CC+3,6	$ 9.126.533
153		1.4.4.3.8	4054 - Instalacion de Sardinel A10	134,18 días	lun 29/01/24	vie 2/08/24	152CC+18 días	154CC+8 días	$ 5.350.967
154		1.4.4.3.9	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa A85	120 días	jue 8/02/24	mié 24/07/24	153CC+8 días	156CC+1 día	$ 397.293
155		1.4.4.3.10	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	75 días	jue 2/05/24	jue 15/08/24	152CC+3,6 mss	158CC;156CC	$ 11.995.418
156		1.4.4.3.16	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	75 días	jue 2/05/24	jue 15/08/24	154CC+1 día;155CC	158CC;157CC+82 días	$ 8.563.263
157		1.4.4.3.11	NP-045 - ANCLAJE EPOXICO CON VARILLA DE 1/2 " (ZANJAS DE TUBERÍAS) REPOSICIÓN MR	2 días	lun 26/08/24	mié 28/08/24	156CC+82 días		$ 2.803.500
158		1.4.4.3.12	APU NP - Construccion de losas en concreto MR	85 días	jue 2/05/24	jue 29/08/24	155CC;156CC	159CC+1 día;161CC+1 día	$ 48.145.342
159		1.4.4.3.13	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	85 días	vie 3/05/24	vie 30/08/24	158CC+1 día	160CC+1 día	$ 1.353.848
160		1.4.4.3.14	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	84 días	lun 6/05/24	vie 30/08/24	159CC+1 día	213	$ 3.095.393
161		1.4.4.3.15	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	86 días	vie 3/05/24	lun 2/09/24	158CC+1 día	204FC+26 días	$ 742.700
162		**1.4.4.4**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR**	**189 días**	**jue 23/11/23**	**mar 13/08/24**			**$ 113.323.108**
163		1.4.4.4.1	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Muro de Contencion	25 días	jue 23/11/23	mié 27/12/23	146	164CC+1 día	$ 1.536.488
164		1.4.4.4.2	3017 - Transporte y Disposicion Final	25 días	vie 24/11/23	jue 28/12/23	163CC+1 día	165CC	$ 11.495.822
165		1.4.4.4.3	3776 - Instalacion de Entibado Discontinuo En Madera	70 días	vie 24/11/23	jue 29/02/24	164CC	166CC	$ 3.843.723
166		1.4.4.4.4	9109 - Instalacion de concreto de limpieza o solado, para construccion de zapata y dentellon muro de contencion	70 días	vie 24/11/23	jue 29/02/24	165CC	167CC+1 día	$ 3.977.879
167		1.4.4.4.5	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para zapata, dentellon y vastago muro de contencion	100 días	lun 27/11/23	vie 12/04/24	166CC+1 día	168CC+3 días	$ 36.072.983
168		1.4.4.4.6	5421 - Construccion de muro en concreto estructural de 4000 psi, incluye formaleteado, alineado, plomado, y fundida	100 días	jue 30/11/23	mié 17/04/24	167CC+3 días	169FC+75 días	$ 38.575.223
169		1.4.4.4.7	4009 - Instalacion de geotextil NT3000 para subdrenes y filtros	2 días	jue 1/08/24	vie 2/08/24	168FC+75 días	170CC	$ 1.073.136
170		1.4.4.4.8	4905 - Instalacion de geodren vial de 100 mm x 1 m para filtro frances	3 días	jue 1/08/24	lun 5/08/24	169CC	171	$ 3.250.844
171		1.4.4.4.9	4556 - Lleno de muro en SBG A, suministro, extendido y compactacion manual	3 días	mar 6/08/24	jue 8/08/24	170	172CC+1 día	$ 11.665.199
172		1.4.4.4.10	8655 - Instalacion de gravilla de 3/4" para filtro frances	5 días	mié 7/08/24	mar 13/08/24	171CC+1 día	213	$ 1.831.811
173		**1.4.4.5**	**ACTIVIDADES DE OBRAS HIDRAULICAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y**	**199,25 días**	**vie 22/12/23**	**jue 26/09/24**			**$ 65.057.360**
174		1.4.4.5.1	4262 - Excavacion Mecanica para redes h (0 a 3.5 metros)	20 días	vie 22/12/23	jue 18/01/24	147CC+21 días	175CC+0,5 días;179CC;176CC+0,5	$ 351.032
175		1.4.4.5.2	3017 - Transporte y Disposicion Final	20 días	vie 22/12/23	vie 19/01/24	174CC+0,5 días	179CC+10 días	$ 3.236.437
176		1.4.4.5.3	4850 - Demolicion de pozos de alcantarillado	20 días	vie 22/12/23	vie 19/01/24	174CC+0,5 días	177CC+1 día;178CC+1 día	$ 386.037
177		1.4.4.5.4	5710 - Instalacion de gravilla 1/2" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	20 días	lun 25/12/23	lun 22/01/24	176CC+1 día	183;182;181	$ 1.263.189
178		1.4.4.5.5	4158 - Instalacion de BGA para lleno de tuberia de alcantarillado	20 días	lun 25/12/23	lun 22/01/24	176CC+1 día	183;182;181	$ 2.156.889

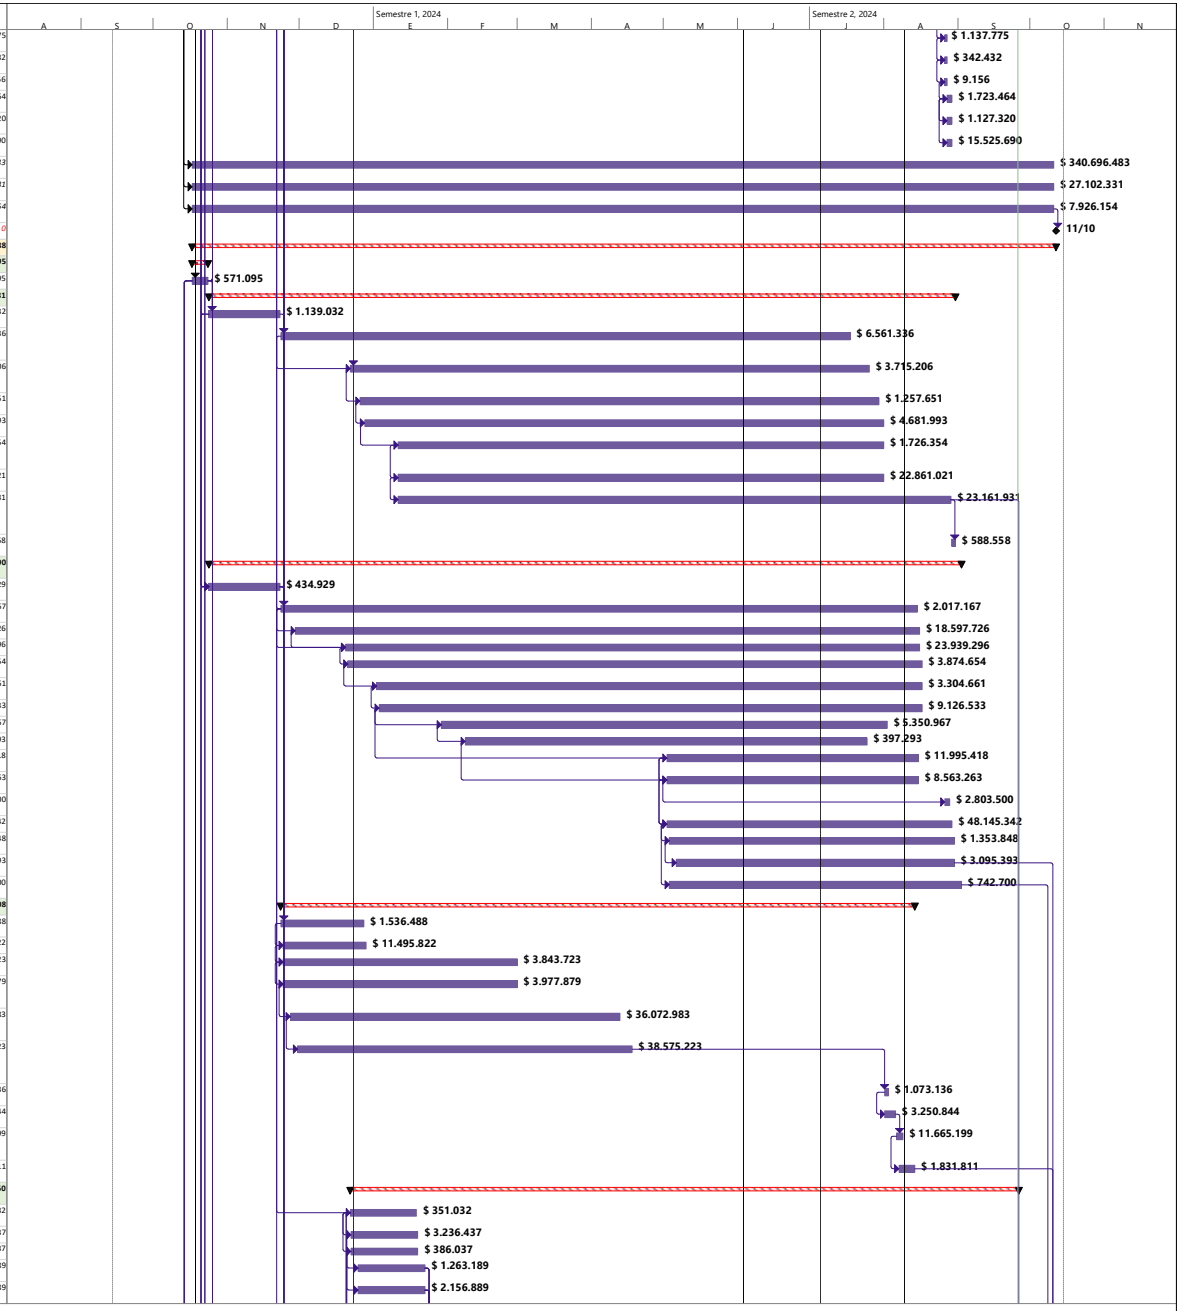

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
179		1.4.4.5.6	3473 - Instalacion de Placa de Fondo para pozo D = 1.70 m	20 días	vie 5/01/24	vie 2/02/24	174CC;175CC+10 días	180CC+4 días	$ 1.708.458
180		1.4.4.5.7	3471 - Cilindro Pozo de inspeccion en mamposteria	20 días	jue 11/01/24	jue 8/02/24	179CC+4 días	189;191	$ 2.210.196
181		1.4.4.5.18	3043 - Instalacion de tuberia Novafort 8"	140 días	lun 22/01/24	lun 5/08/24	177;178	184CC;185CC	$ 3.616.600
182		1.4.4.5.17	3044 - Instalacion de tuberia Novafort 10"	140 días	lun 22/01/24	lun 5/08/24	177;178	184CC;185CC	$ 4.180.030
183		1.4.4.5.8	3045 - Instalacion de tuberia Novafort 12"	140 días	lun 22/01/24	lun 5/08/24	177;178	184CC;185CC	$ 4.689.492
184		1.4.4.5.9	4892 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 10" para sumideros	120 días	lun 22/01/24	lun 8/07/24	183CC;182CC;181CC	190	$ 5.948.269
185		1.4.4.5.10	4896 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 12" para red Pluvial	140 días	lun 22/01/24	lun 5/08/24	183CC;182CC;181CC	190	$ 9.948.634
186		1.4.4.5.11	3779 - Construccion de caja de inspeccion 60x6	160 días	mié 3/01/24	mar 13/08/24	174CC+8 días	187CC+6 mss;191	$ 761.292
187		1.4.4.5.12	3042 - Instalacion de tuberia Novafort 6" Conexiones Domiciliarias	10 días	mar 23/07/24	lun 5/08/24	186CC+6 mss	188CC	$ 1.041.140
188		1.4.4.5.13	4879 - Conexión Silla Yee de 6" a 8"	10 días	mar 23/07/24	lun 5/08/24	187CC	189CC	$ 420.086
189		1.4.4.5.14	4252 - Instalacion de placa superior en concreto D = 1.70 m	20 días	mar 23/07/24	lun 19/08/24	180;188CC	213	$ 7.103.291
190		1.4.4.5.15	4558 - Construccion de sumidero lateral en via	10 días	lun 5/08/24	lun 19/08/24	184;185	191	$ 9.962.755
191		1.4.4.5.16	8227 - Cañuela especial	7 días	lun 19/08/24	mié 28/08/24	180;186;190	213;192FC+2 sem.	$ 343.914
192		1.4.4.5.19	NP-046 - INSTALACIÓN DE PASOS PARA ESCALERA DE GATO PP	6 días	vie 13/09/24	lun 23/09/24	191FC+2 sem.	193CC+6 días	$ 1.081.640
193		1.4.4.5.20	NP-052 - LAVADO DE REDES CON EQUIPO VAC	1 día	lun 23/09/24	mar 24/09/24	192CC+6 días	194	$ 2.820.618
194		1.4.4.5.21	NP-051 - INSPECCIÓN DE REDES CON EQUIPO C	2 días	mar 24/09/24	jue 26/09/24	193		$ 1.827.364
195		**1.4.4.6**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**12 días**	**jue 26/09/24**	**vie 11/10/24**			**$ 28.324.258**
196		1.4.4.6.1	4290 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	3 días	jue 26/09/24	lun 30/09/24	143FC+20 días	197CC	$ 2.174.749
197		1.4.4.6.2	7353 - Construccion de contenedor de raices Tipo B23	10 días	jue 26/09/24	mié 9/10/24	196CC	198CC+6 días	$ 20.454.564
198		1.4.4.6.3	3548 - Instalacion de Bolardo en hierro tipo M6	2 días	vie 4/10/24	lun 7/10/24	197CC+6 días	199CC	$ 995.154
199		1.4.4.6.4	8094 - Siembra de individuo arboreo tipo Pino Romeron H = 1.50 m	2 días	vie 4/10/24	lun 7/10/24	198CC	200CC	$ 2.359.985
200		1.4.4.6.5	4884 - Siembra de individuo arboreo tipo Nogal H = 1.50 m	2 días	vie 4/10/24	lun 7/10/24	199CC	201	$ 1.426.472
201		1.4.4.6.6	4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm	2 días	mar 8/10/24	mié 9/10/24	200	213;202	$ 696.150
202		1.4.4.6.7	NP-048 - ACTUALIZACIÓN SIGAU POR SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS	2 días	jue 10/10/24	vie 11/10/24	201		$ 217.184
203		**1.4.4.7**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**3 días**	**mar 8/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 5.058.320**
204		1.4.4.7.7	NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	161FC+26 días	205CC+0,3 días;206CC	$ 541.389
205		1.4.4.7.8	NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO, METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN (ml)	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	204CC+0,3 días		$ 1.668.766
206		1.4.4.7.9	NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	204CC	207CC	$ 859.050
207		1.4.4.7.11	NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (un)	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	206CC	208CC	$ 173.195
208		1.4.4.7.12	NP-032 - INSTALACIÓN DE BANDA SONORA EN ESTOPEROLES	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	207CC	209	$ 666.944
209		1.4.4.7.14	NP-030 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	208		$ 1.148.976
210		*1.4.4.8*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*134CC*	*213*	*$ 113.804.300*
211		*1.4.4.9*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*134CC*	*213*	*$ 9.053.078*
212		*1.4.4.10*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*134CC*	*213*	*$ 2.647.598*
213		*1.4.5*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6000446 - Isla del Sol No*	*0 días*	*vie 11/10/24*	*vie 11/10/24*	*160;172;189;191;201;210*		*$ 0*
214		**1.4.6**	**CIV 6000461 - ISLA DEL SOL No. 2**	**259 días**	**mar 17/10/23**	**vie 11/10/24**			**$ 359.609.717**
215		**1.4.6.1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 17/10/23**	**lun 23/10/23**			**$ 333.139**
216		1.4.6.1.1	3007 - Replanteo General	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	6	50;11;218;281CC;282CC;2	$ 333.139
217		**1.4.6.2**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**222 días**	**mar 24/10/23**	**mié 28/08/24**			**$ 76.671.857**
218		1.4.6.2.1	5196 - Demolicion de concreto 8cm a 15 cm (Andenes)	22 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	216	219;59CC;227CC	$ 195.263
219		1.4.6.2.2	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	170 días	jue 23/11/23	mié 17/07/24	218	220CC+4 días	$ 8.592.225
220		1.4.6.2.3	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de Andenes	155 días	vie 22/12/23	jue 25/07/24	219CC+4 días;31	221CC+2 días	$ 5.051.462
221		1.4.6.2.4	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	155 días	mar 26/12/23	lun 29/07/24	220CC+2 días	222CC+2 días	$ 3.113.257
222		1.4.6.2.5	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	155 días	jue 28/12/23	mié 31/07/24	221CC+2 días	223CC+10 días	$ 4.537.487
223		1.4.6.2.6	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	145 días	jue 11/01/24	mié 31/07/24	222CC+10 días	224CC	$ 3.404.068
224		1.4.6.2.7	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	165 días	jue 11/01/24	mié 28/08/24	223CC	225CC	$ 32.005.430
225		1.4.6.2.8	6047- Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	165 días	jue 11/01/24	mié 28/08/24	224CC	264FC+27 días	$ 19.772.666
226		**1.4.6.3**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**219,4 días**	**mar 24/10/23**	**lun 26/08/24**			**$ 105.646.968**
227		1.4.6.3.1	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	22 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	218CC	228;76;243	$ 269.656
228		1.4.6.3.2	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	117 días	jue 23/11/23	vie 3/05/24	227	229CC+4 días;230CC+19 días;87CC+21	$ 1.771.024
229		1.4.6.3.3	3017 - Transporte y Disposicion Final	113 días	mié 29/11/23	vie 3/05/24	228CC+4 días	230CC	$ 16.328.569
230		1.4.6.3.4	4161 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	103 días	mié 20/12/23	vie 10/05/24	228CC+19 días;229CC	231CC+1 día	$ 24.189.296
231		1.4.6.3.5	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	104 días	jue 21/12/23	mar 14/05/24	230CC+1 día	232CC+8 días	$ 3.823.295
232		1.4.6.3.6	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	92 días	mar 2/01/24	mié 8/05/24	231CC+8 días	233CC+1 día	$ 3.133.259
233		1.4.6.3.7	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calzada	92 días	mié 3/01/24	jue 9/05/24	232CC+1 día	235CC+18 días;236CC+3,6	$ 6.363.794
234		1.4.6.3.15	4054 - Instalacion de Sardinel A10	121 días	lun 29/01/24	lun 15/07/24	233CC+18 días		$ 5.459.103
235		1.4.6.3.8	4088 - Instalacion de Sardinel A85	121 días	lun 29/01/24	lun 15/07/24	233CC+18 días		$ 190.010
236		1.4.6.3.9	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	75 días	jue 2/05/24	jue 15/08/24	233CC+3,6 mss	237CC;238CC	$ 2.967.136
237		1.4.6.3.10	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	75 días	jue 2/05/24	jue 15/08/24	236CC	238CC	$ 5.251.952

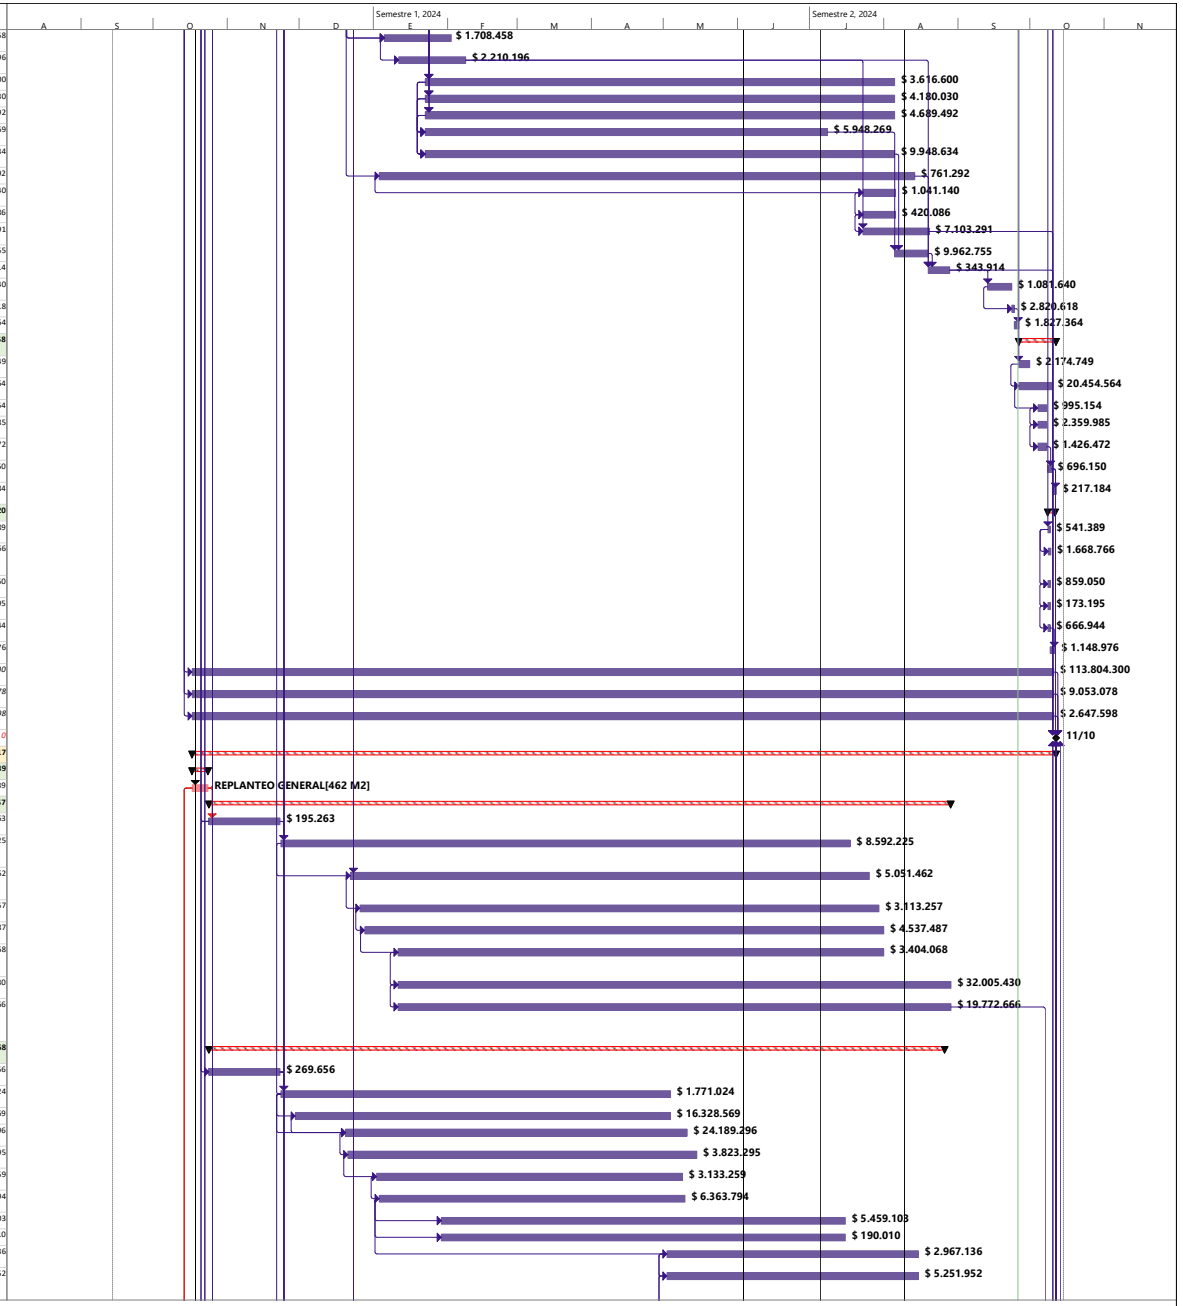

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
238		1.4.6.3.11	APU NP - Construccion de losas en concreto MR43	75 días	jue 2/05/24	jue 15/08/24	236CC;237CC	239CC+1 día;241CC+1 día	$ 32.501.496
239		1.4.6.3.12	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	80 días	vie 3/05/24	vie 23/08/24	238CC+1 día	240CC+1 día	$ 881.125
240		1.4.6.3.13	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	80 días	lun 6/05/24	lun 26/08/24	239CC+1 día	284	$ 2.014.574
241		1.4.6.3.14	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	80 días	vie 3/05/24	vie 23/08/24	238CC+1 día	273FC+33 días	$ 502.681
242		**1.4.6.4**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA**	**191 días**	**jue 23/11/23**	**jue 15/08/24**			**$ 51.033.690**
243		1.4.6.4.1	3776 - Instalacion de Entibado Discontinuo En Madera	70 días	jue 23/11/23	mié 28/02/24	227	244CC	$ 942.607
244		1.4.6.4.2	9109 - Instalacion de concreto de limpieza o solado, para construccion de zapata y dentellon muro de contencion	70 días	jue 23/11/23	mié 28/02/24	243CC	245CC+1 día	$ 1.422.686
245		1.4.6.4.3	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para zapata, dentellon y vastago muro de contencion	100 días	vie 24/11/23	jue 11/04/24	244CC+1 día	246CC+3 días	$ 20.092.565
246		1.4.6.4.4	5421 - Construccion de muro en concreto estructural de 4000 psi, incluye formaleteado, alineado, plomado, y fundida	100 días	mié 29/11/23	mar 16/04/24	245CC+3 días	247FC+80 días	$ 21.437.027
247		1.4.6.4.5	4009 - Instalacion de geotextil NT3000 para subdrenes y filtros	2 días	mié 7/08/24	jue 8/08/24	246FC+80 días	248CC	$ 369.819
248		1.4.6.4.6	4905 - Instalacion de geodren vial de 100 mm x 1 m para filtro frances	2 días	mié 7/08/24	jue 8/08/24	247CC	249	$ 1.333.680
249		1.4.6.4.7	4556 - Lleno de muro en SBG A, suministro, extendido y compactacion manual	2 días	vie 9/08/24	lun 12/08/24	248	250CC+1 día	$ 4.790.508
250		1.4.6.4.8	8655 - Instalacion de gravilla de 3/4" para filtro frances	4 días	lun 12/08/24	jue 15/08/24	249CC+1 día	284	$ 644.797
251		**1.4.6.5**	**ACTIVIDADES DE OBRAS HIDRAULICAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y**	**200,7 días**	**vie 22/12/23**	**vie 27/09/24**			**$ 26.622.190**
252		1.4.6.5.1	4262 - Excavacion Mecanica para redes h (0 a 3.5 metros)	20 días	vie 22/12/23	jue 18/01/24	228CC+21 días	253CC+0,5 días;255CC	$ 84.341
253		1.4.6.5.2	3017 - Transporte y Disposicion Final	20 días	vie 22/12/23	vie 19/01/24	252CC+0,5 días	255CC+10 días;254CC+1 d	$ 888.277
254		1.4.6.5.3	5710 - Instalacion de gravilla 1/2" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	20 días	lun 25/12/23	lun 22/01/24	253CC+1 día	258CC+1 día;257CC+1 día;256CC+1 día;259CC+1	$ 310.113
255		1.4.6.5.4	3473 - Instalacion de Placa de Fondo para pozo D = 1.70 m	20 días	vie 5/01/24	vie 2/02/24	252CC;253CC+10 días		$ 1.138.972
256		1.4.6.5.8	4892 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 10" para sumideros	120 días	mar 26/12/23	mar 11/06/24	254CC+1 día		$ 2.391.264
257		1.4.6.5.7	3044 - Instalación tubería 10" Novafort Alcantarillado	120 días	mar 26/12/23	mar 11/06/24	254CC+1 día		$ 1.069.310
258		1.4.6.5.5	3045 - Instalación tubería 12" Novafort Alcantarillado	120 días	mar 26/12/23	mar 11/06/24	254CC+1 día	260	$ 3.881.647
259		1.4.6.5.9	3722 - Nivelación de pozo hasta rasante	1 día	mar 26/12/23	mié 27/12/23	254CC+1 día		$ 116.870
260		1.4.6.5.6	4558 - Construccion de sumidero lateral en via	20 días	mar 11/06/24	mar 9/07/24	258	261FC+2,3 mss	$ 14.944.132
261		1.4.6.5.10	*NP-052 - LAVADO DE REDES CON EQUIPO VAC*	1 día	mar 24/09/24	mié 25/09/24	260FC+2,3 mss	262	$ 1.090.666
262		1.4.6.5.11	*NP-051 - INSPECCIÓN DE REDES CON EQUIPO C*	2 días	mié 25/09/24	vie 27/09/24	261		$ 706.598
263		**1.4.6.6**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**5 días**	**lun 7/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 11.173.957**
264		1.4.6.6.1	3396 - Instalacion de banca en concreto tipo M3	1 día	lun 7/10/24	lun 7/10/24	225FC+27 días	265CC	$ 1.926.877
265		1.4.6.6.2	4920 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	1 día	lun 7/10/24	lun 7/10/24	264CC	266CC	$ 1.087.375
266		1.4.6.6.3	7353 - Construccion de contenedor de raices Tipo B23	5 días	lun 7/10/24	vie 11/10/24	265CC	267CC	$ 5.113.641
267		1.4.6.6.4	3548 - Instalacion de Bolardo en hierro tipo M61	1 día	lun 7/10/24	lun 7/10/24	266CC	268CC	$ 995.154
268		1.4.6.6.5	8094 - Siembra de individuo arboreo tipo Pino Romeron H = 1.50 m	1 día	lun 7/10/24	lun 7/10/24	267CC	269CC	$ 589.996
269		1.4.6.6.6	4884 - Siembra de individuo arboreo tipo Nogal H = 1.50 m	1 día	lun 7/10/24	lun 7/10/24	268CC	270	$ 356.618
270		1.4.6.6.8	*4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm*	2 días	mar 8/10/24	mié 9/10/24	269	213;271	$ 1.050.000
271		1.4.6.6.9	*NP-048 - ACTUALIZACIÓN SIGAU POR SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS*	2 días	jue 10/10/24	vie 11/10/24	270		$ 54.296
272		**1.4.6.7**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**2,3 días**	**mié 9/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 6.375.580**
273		1.4.6.7.6	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	241FC+33 días	274CC+0,3 días;275CC	$ 468.791
274		1.4.6.7.7	*NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN (ml)*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	273CC+0,3 días		$ 1.444.990
275		1.4.6.7.8	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	273CC	276CC+0,3 días	$ 953.282
276		1.4.6.7.9	*NP-025 - PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	275CC+0,3 días	277CC	$ 376.337
277		1.4.6.7.10	*NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (un)*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	276CC	278CC	$ 188.940
278		1.4.6.7.11	*NP-032 - INSTALACIÓN DE BANDA SONORA EN ESTOPERIOLES*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	277CC	279CC	$ 666.944
279		1.4.6.7.13	*NP-030 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO*	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	278CC	280CC	$ 1.148.976
280		1.4.6.7.14	*NP-031 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO*	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	279CC		$ 1.127.320
281		*1.4.6.8*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*216CC*	*284*	*$ 74.130.831*
282		*1.4.6.9*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*216CC*	*284*	*$ 5.896.931*
283		*1.4.6.10*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*216CC*	*284*	*$ 1.724.574*
284		*1.4.7*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6000461 - Isla del Sol No*	*0 días*	*jue 10/10/24*	*jue 10/10/24*	*240;250;281;282;283*	*853FC+2 días*	*$ 0*
285		**1.4.8**	**CIV 6000478 - ISLA DEL SOL No. 2**	**259 días**	**mar 17/10/23**	**vie 11/10/24**			**$ 283.178.789**
286		**1.4.8.1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 17/10/23**	**lun 23/10/23**			**$ 323.044**
287		1.4.8.1.1	3007 - Replanteo General	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	6	50;11;337CC;338CC;339C	$ 323.044
288		**1.4.8.2**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**222 días**	**mar 24/10/23**	**mié 28/08/24**			**$ 73.963.885**
289		1.4.8.2.2	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	170 días	mar 24/10/23	lun 17/06/24	287	290CC+4 días	$ 5.289.686
290		1.4.8.2.3	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de Andenes	155 días	vie 22/12/23	jue 25/07/24	289CC+4 días;31	291CC+2 días	$ 4.414.396
291		1.4.8.2.4	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	155 días	mar 26/12/23	lun 29/07/24	290CC+2 días	292CC+2 días	$ 4.418.926
292		1.4.8.2.5	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	155 días	jue 28/12/23	mié 31/07/24	291CC+2 días	293CC+10 días	$ 3.479.703
293		1.4.8.2.6	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	145 días	jue 11/01/24	mié 31/07/24	292CC+10 días	294CC	$ 2.593.230
294		1.4.8.2.7	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	165 días	jue 11/01/24	mié 28/08/24	293CC	295CC	$ 34.549.404

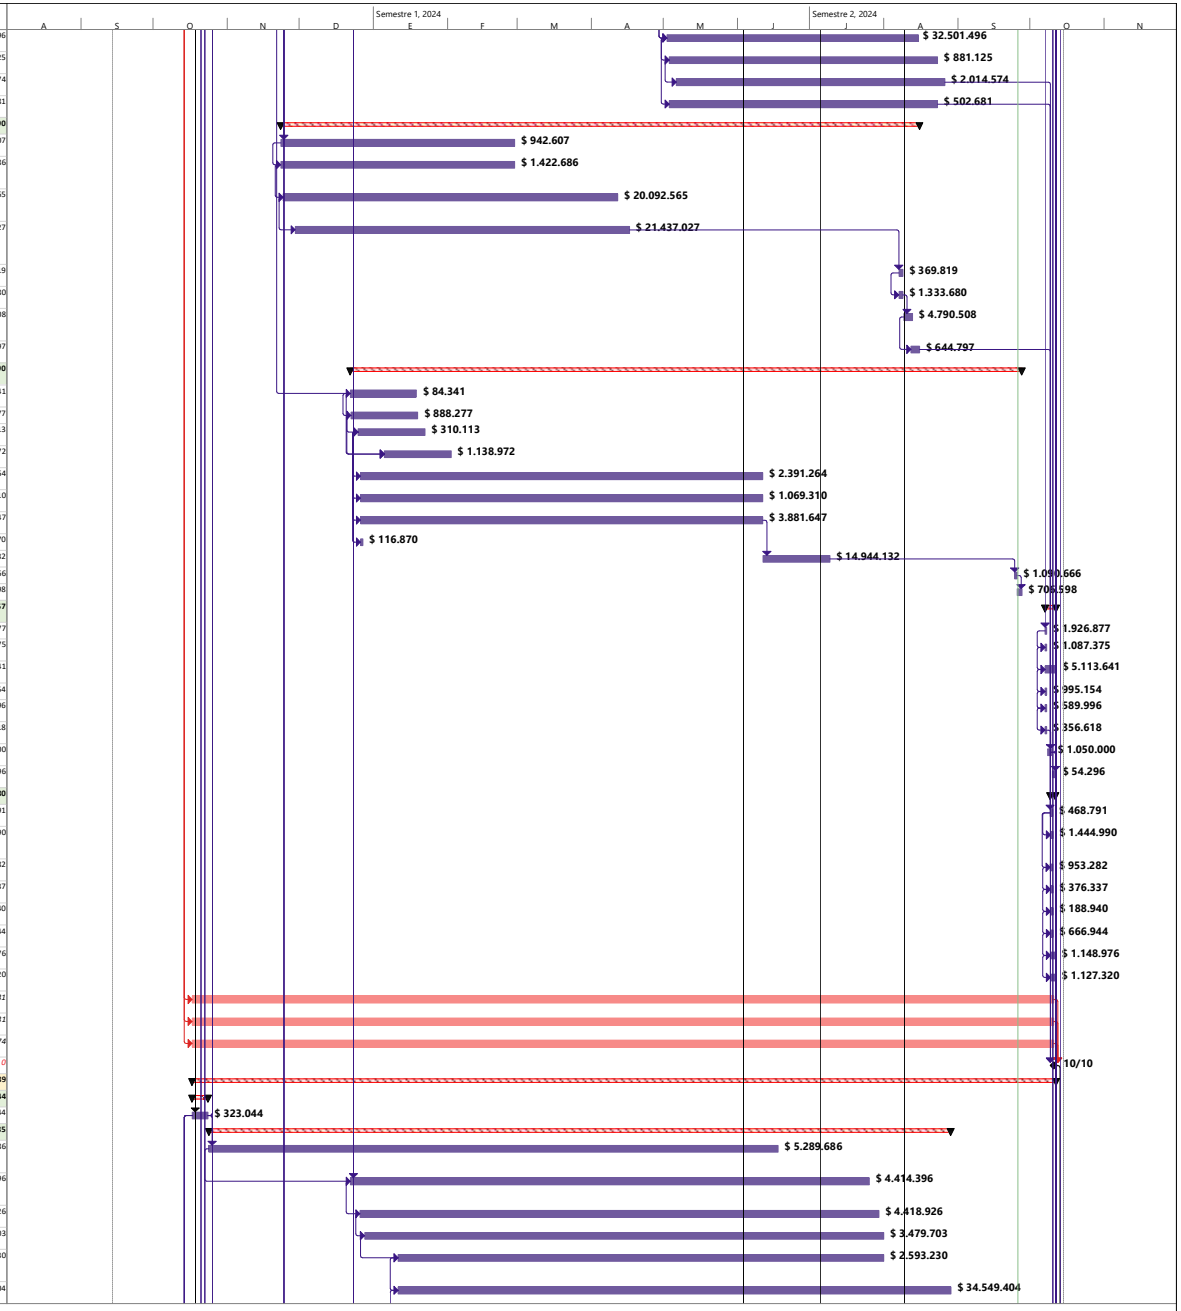

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
295		1.4.8.2.8	6047- Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	165 días	jue 11/01/24	mié 28/08/24	294CC	321FC+28 días	$ 19.218.539
296		**1.4.8.3**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**197,4 días**	**mar 24/10/23**	**jue 25/07/24**			**$ 111.619.061**
297		1.4.8.3.2	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	117 días	mar 24/10/23	mié 3/04/24	287	298CC+4 días;299CC+19 días;87CC+21	$ 1.889.626
298		1.4.8.3.3	3017 - Transporte y Disposicion Final	113 días	lun 30/10/23	mié 3/04/24	297CC+4 días	299CC	$ 17.421.986
299		1.4.8.3.4	4161 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	103 días	lun 20/11/23	mié 10/04/24	297CC+19 días;298CC	300CC+1 día	$ 28.321.089
300		1.4.8.3.5	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	104 días	mar 21/11/23	vie 12/04/24	299CC+1 día	301CC+8 días	$ 4.559.159
301		1.4.8.3.6	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	92 días	vie 1/12/23	lun 8/04/24	300CC+8 días	302CC+1 día	$ 2.871.236
302		1.4.8.3.7	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calzada	92 días	lun 4/12/23	mar 9/04/24	301CC+1 día	305CC+3,6 mss;303CC+18 días	$ 6.738.570
303		1.4.8.3.15	4054 - Instalacion de Sardinel A10	121 días	jue 28/12/23	jue 13/06/24	302CC+18 días	304CC	$ 3.592.892
304		1.4.8.3.8	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa A85	121 días	jue 28/12/23	jue 13/06/24	303CC	307CC	$ 863.680
305		1.4.8.3.9	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	75 días	mar 2/04/24	mar 16/07/24	302CC+3,6 mss	306CC;307CC	$ 6.181.785
306		1.4.8.3.10	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	75 días	mar 2/04/24	mar 16/07/24	305CC	307CC	$ 9.010.265
307		1.4.8.3.11	APU NP - Construccion de losas en concreto MR43	75 días	mar 2/04/24	mar 16/07/24	305CC;306CC;304CC	308CC+1 día;310CC+1 día	$ 27.436.064
308		1.4.8.3.12	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	80 días	mié 3/04/24	mié 24/07/24	307CC+1 día	309CC+1 día	$ 694.305
309		1.4.8.3.13	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	80 días	jue 4/04/24	jue 25/07/24	308CC+1 día	340	$ 1.587.437
310		1.4.8.3.14	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	80 días	mié 3/04/24	mié 24/07/24	307CC+1 día	330FC+55 días	$ 450.967
311		**1.4.8.5**	**ACTIVIDADES DE OBRAS HIDRAULICAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y**	**221,3 días**	**mié 22/11/23**	**jue 26/09/24**			**$ 11.486.497**
312		1.4.8.5.1	4262 - Excavacion Mecanica para redes h (0 a 3.5 metros)	20 días	mié 22/11/23	mar 19/12/23	297CC+21 días	313CC+0,5 días	$ 57.476
313		1.4.8.5.2	3017 - Transporte y Disposicion Final	20 días	mié 22/11/23	mié 20/12/23	312CC+0,5 días	314CC+1 día	$ 529.780
314		1.4.8.5.3	5710 - Instalacion de gravilla 1/2" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	20 días	jue 23/11/23	jue 21/12/23	313CC+1 día	316CC;315CC	$ 305.060
315		1.4.8.5.7	4252 - Instalacion de Placa de Cubierta para pozo D = 1.70 m	20 días	jue 23/11/23	jue 21/12/23	314CC	317CC	$ 1.775.823
316		1.4.8.5.4	4892 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 10" para sumideros	20 días	jue 23/11/23	jue 21/12/23	314CC	317CC	$ 3.437.442
317		1.4.8.5.6	4558 - Construccion de sumidero lateral en via	20 días	jue 23/11/23	jue 21/12/23	316CC;315CC	318FC+8,2 mss	$ 4.981.377
318		1.4.8.5.8	*NP-052 - LAVADO DE REDES CON EQUIPO VAC*	1 día	lun 23/09/24	mar 24/09/24	317FC+8,2 mss	319	$ 242.460
319		1.4.8.5.9	*NP-051 - INSPECCIÓN DE REDES CON EQUIPO C*	2 días	mar 24/09/24	jue 26/09/24	318		$ 157.080
320		**1.4.8.6**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**4 días**	**mar 8/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 13.416.625**
321		1.4.8.6.1	3396 - Instalacion de banca en concreto tipo M	2 días	mar 8/10/24	mié 9/10/24	295FC+28 días	322CC	$ 1.926.877
322		1.4.8.6.2	4290 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	2 días	mar 8/10/24	mié 9/10/24	321CC	323CC	$ 2.174.749
323		1.4.8.6.3	7353 - Construccion de contenedor de raices Tipo B23	2 días	mar 8/10/24	mié 9/10/24	322CC	324CC	$ 6.392.051
324		1.4.8.6.4	3548 - Instalacion de Bolardo en hierro tipo M6	2 días	mar 8/10/24	mié 9/10/24	323CC	325CC	$ 995.154
325		1.4.8.6.5	8094 - Siembra de individuo arboreo tipo Pino Romeron H = 1.50 m	2 días	mar 8/10/24	mié 9/10/24	324CC	326CC	$ 589.996
326		1.4.8.6.6	4884 - Siembra de individuo arboreo tipo Nogal H = 1.50 m	1 día	mar 8/10/24	mar 8/10/24	325CC	327	$ 534.927
327		1.4.8.6.8	*4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm*	1 día	mié 9/10/24	mié 9/10/24	326	213;328	$ 735.000
328		1.4.8.6.9	*NP-048 - ACTUALIZACIÓN SIGAU POR SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS*	2 días	jue 10/10/24	vie 11/10/24	327		$ 67.870
329		**1.4.8.7**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**2,3 días**	**mié 9/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 5.199.795**
330		1.4.8.7.6	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	310FC+55 días	331CC+0,3 días;332CC	$ 478.362
331		1.4.8.7.7	*NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN (ml)*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	330CC+0,3 días		$ 1.474.494
332		1.4.8.7.8	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	330CC	333CC+0,3 días	$ 953.282
333		1.4.8.7.9	*NP-025 - PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	332CC+0,3 días	334CC	$ 376.337
334		1.4.8.7.10	*NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (un)*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	333CC	335	$ 204.685
335		1.4.8.7.12	*NP-030 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	334	336CC	$ 1.148.976
336		1.4.8.7.13	*NP-031 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	335CC		$ 563.660
337		*1.4.8.8*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*287CC*	*340*	*$ 60.907.703*
338		*1.4.8.9*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*287CC*	*340*	*$ 4.845.190*
339		*1.4.8.10*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*258 días*	*mar 17/10/23*	*jue 10/10/24*	*287CC*	*340*	*$ 1.416.990*
340		*1.4.9*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6000478 - Isla del Sol No*	*0 días*	*jue 10/10/24*	*jue 10/10/24*	*309;337;338;339*	*853*	*$ 0*
341		**1.4.10**	**CIV 6000485 - ISLA DEL SOL No. 2**	**259,7 días**	**mar 17/10/23**	**lun 14/10/24**			**$ 289.657.618**
342		**1.4.10.11**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 17/10/23**	**lun 23/10/23**			**$ 259.589**
343		1.4.10.11.2	3007 - Replanteo General	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	6	50;11;402CC;403CC;404C	$ 259.589
344		**1.4.10.12**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**233 días**	**mar 24/10/23**	**jue 12/09/24**			**$ 46.724.637**
345		1.4.10.12.16	5196 - Demolicion de concreto 8cm a 15 cm (Andenes)	22 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	343	51;59CC;146CC;346CC	$ 162.719
346		1.4.10.12.9	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	215 días	mar 24/10/23	lun 19/08/24	345CC	347CC+4 días	$ 4.608.557
347		1.4.10.12.10	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de Andenes	173 días	vie 22/12/23	mar 20/08/24	346CC+4 días;31	348CC+2 días	$ 3.776.111
348		1.4.10.12.11	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	155 días	mar 26/12/23	lun 29/07/24	347CC+2 días	349CC+2 días	$ 3.689.489
349		1.4.10.12.12	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	155 días	jue 28/12/23	mié 31/07/24	348CC+2 días	350CC+10 días	$ 3.028.845
350		1.4.10.12.13	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	140 días	jue 11/01/24	mié 24/07/24	349CC+10 días	351CC	$ 1.504.668
351		1.4.10.12.14	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	145 días	jue 11/01/24	mié 31/07/24	350CC	352CC	$ 19.203.258

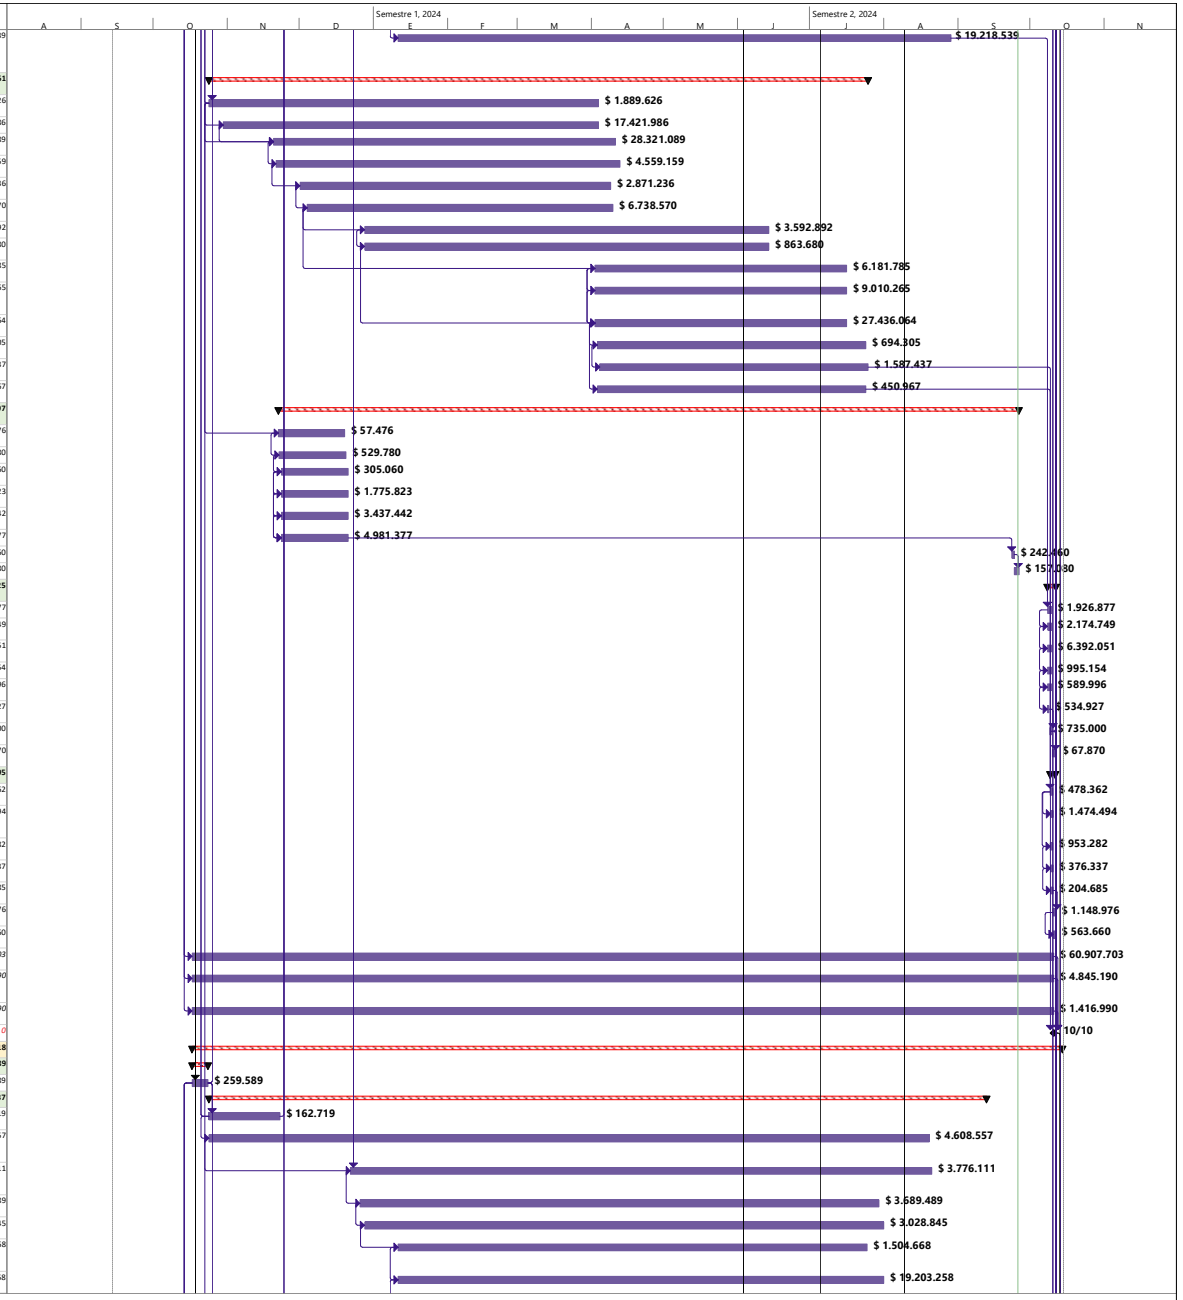

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
352		1.4.10.12.15	6047- Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	165 días	jue 11/01/24	mié 28/08/24	351CC	385FC+26 días;353FC+10 días	$ 10.554.804
353		1.4.10.12.17	4855 - Construccion de franja de ajuste en concreto premezclado 3000 psi	1 día	jue 12/09/24	jue 12/09/24	352FC+10 días		$ 196.186
354		**1.4.10.13**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**241,4 días**	**mar 24/10/23**	**mié 25/09/24**			**$ 112.633.466**
355		1.4.10.13.30	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	22 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	343	60;76;435;516;582;659;71	$ 956.845
356		1.4.10.13.16	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	210 días	mar 24/10/23	lun 12/08/24	343	357CC+4 días;358CC+19 días;87CC+21	$ 1.499.139
357		1.4.10.13.17	3017 - Transporte y Disposicion Final	206 días	lun 30/10/23	lun 12/08/24	356CC+4 días	358CC	$ 13.821.741
358		1.4.10.13.18	4161 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	193 días	lun 20/11/23	mié 14/08/24	356CC+19 días;357CC	359CC+1 día	$ 22.209.173
359		1.4.10.13.19	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	193 días	mar 21/11/23	jue 15/08/24	358CC+1 día	360CC+8 días	$ 3.578.288
360		1.4.10.13.20	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	185 días	vie 1/12/23	jue 15/08/24	359CC+8 días	361CC+1 día	$ 2.568.676
361		1.4.10.13.21	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calza	185 días	lun 4/12/23	vie 16/08/24	360CC+1 día	364CC+3,6 mss;362CC+18	$ 6.951.847
362		1.4.10.13.22	4054 - Instalacion de Sardinel A10	167 días	jue 28/12/23	vie 16/08/24	361CC+18 días	363CC	$ 3.860.324
363		1.4.10.13.23	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa ABS	167 días	jue 28/12/23	vie 16/08/24	362CC	366CC	$ 575.786
364		1.4.10.13.24	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	110 días	mar 2/04/24	mar 3/09/24	361CC+3,6 mss	365CC;366CC	$ 8.705.139
365		1.4.10.13.25	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	110 días	mar 2/04/24	mar 3/09/24	364CC	366CC	$ 7.428.048
366		1.4.10.13.26	APU NP - Construccion de losas en concreto MR	110 días	mar 2/04/24	mar 3/09/24	363CC;364CC;365CC	367CC+1 día;369CC+1 día	$ 31.599.619
367		1.4.10.13.27	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	110 días	mié 3/04/24	mié 4/09/24	366CC+1 día	368CC+1 día	$ 691.704
368		1.4.10.13.28	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	110 días	jue 4/04/24	jue 5/09/24	367CC+1 día	405	$ 1.581.489
369		1.4.10.13.31	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	115 días	mié 3/04/24	mié 11/09/24	366CC+1 día	394FC+21 días;370FC+8 días	$ 394.692
370		1.4.10.13.29	*NP-044 - INSTALACIÓN RIEGO DE LIGA CRR1 (Cobertura Zanja)*	1 día	lun 23/09/24	mar 24/09/24	369FC+8 días	371	$ 152.291
371		1.4.10.13.32	*NP-043 - INSTALACIÓN DE CAPA DE RODADURA EN MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 (Cobertura Zanja)*	1 día	mar 24/09/24	mié 25/09/24	370		$ 6.058.667
372		**1.4.10.14**	**ACTIVIDADES DE OBRAS HIDRAULICAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y**	**222,5 días**	**mié 22/11/23**	**vie 27/09/24**			**$ 47.402.704**
373		1.4.10.14.7	4262 - Excavacion Mecanica para redes h (0 a 3.5 metros)	195 días	mié 22/11/23	mar 20/08/24	356CC+21 días	374CC+0,5 días;380CC	$ 343.356
374		1.4.10.14.8	3017 - Transporte y Disposicion Final	195 días	mié 22/11/23	mié 21/08/24	373CC+0,5 días	375CC+1 día	$ 3.165.733
375		1.4.10.14.9	5710 - Instalacion de gravilla 1/2" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	195 días	jue 23/11/23	jue 22/08/24	374CC+1 día	378CC;376CC+1 día;377CC+1 día	$ 1.471.615
376		1.4.10.14.12	4892 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 10" para sumideros	60 días	vie 24/11/23	vie 16/02/24	375CC+1 día		$ 4.692.856
377		1.4.10.14.13	4896 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 12" para red Pluvial	199 días	vie 24/11/23	jue 29/08/24	375CC+1 día	382FC+18 días	$ 21.611.264
378		1.4.10.14.10	4252 - Instalacion de Placa de Cubierta para pozo D = 1.70 m	202 días	jue 23/11/23	lun 2/09/24	375CC	379CC	$ 3.551.645
379		1.4.10.14.11	4558 - Construccion de sumidero lateral en via	60 días	jue 23/11/23	jue 15/02/24	378CC	381CC	$ 9.962.755
380		1.4.10.14.14	3779 - Construccion de caja de inspeccion 60x6	220 días	mié 22/11/23	mar 19/12/23	373CC	381CC	$ 761.292
381		1.4.10.14.15	8227 - Cañuela especial	9 días	jue 23/11/23	mié 6/12/23	379CC;380CC		$ 343.914
382		1.4.10.14.16	*NP-052 - LAVADO DE REDES CON EQUIPO VAC*	1 día	mar 24/09/24	mié 25/09/24	377FC+18 días	383	$ 909.225
383		1.4.10.14.17	*NP-051 - INSPECCIÓN DE REDES CON EQUIPO C*	2 días	mié 25/09/24	vie 27/09/24	382		$ 589.050
384		**1.4.10.15**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**6 días**	**vie 4/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 9.395.059**
385		1.4.10.15.8	3396 - Instalacion de banca en concreto tipo M	3 días	vie 4/10/24	mar 8/10/24	352FC+26 días	386CC	$ 1.284.585
386		1.4.10.15.9	4290 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	3 días	vie 4/10/24	mar 8/10/24	385CC	387CC	$ 1.631.062
387		1.4.10.15.10	7353 - Construccion de contenedor de raices Tipo B23	5 días	vie 4/10/24	jue 10/10/24	386CC	388CC+1 día	$ 3.835.231
388		1.4.10.15.11	3548 - Instalacion de Bolardo en hierro tipo M6	2 días	lun 7/10/24	mar 8/10/24	387CC+1 día	389CC	$ 995.154
389		1.4.10.15.12	8094 - Siembra de individuo arboreo tipo Pino Romeron H = 1.50 m	2 días	lun 7/10/24	mar 8/10/24	388CC	390CC	$ 589.996
390		1.4.10.15.13	4884 - Siembra de individuo arboreo tipo Nogal H = 1.50 m	2 días	lun 7/10/24	mar 8/10/24	389CC	391	$ 178.309
391		1.4.10.15.15	*4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm*	1 día	mié 9/10/24	mié 9/10/24	390	213;392	$ 840.000
392		1.4.10.15.16	*NP-048 - ACTUALIZACIÓN SIGAU POR SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS*	2 días	jue 10/10/24	vie 11/10/24	391		$ 40.722
393		**1.4.10.16**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**2,3 días**	**jue 10/10/24**	**lun 14/10/24**			**$ 6.590.453**
394		1.4.10.16.11	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	369FC+21 días	395CC+0,3 días;396CC	$ 459.433
395		1.4.10.16.12	*NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN (ml)*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	394CC+0,3 días		$ 1.416.146
396		1.4.10.16.13	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	394CC	397CC+0,3 días	$ 727.491
397		1.4.10.16.14	*NP-025 - PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	396CC+0,3 días	398CC	$ 981.164
398		1.4.10.16.15	*NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (un)*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	397CC	400;399CC	$ 62.980
399		1.4.10.16.18	*NP-032 - INSTALACIÓN DE BANDA SONORA EN ESTOPERCLES*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	398CC		$ 666.944
400		1.4.10.16.16	*NP-030 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO*	1 día	vie 11/10/24	lun 14/10/24	398	401CC	$ 1.148.976
401		1.4.10.16.17	*NP-031 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO.*	1 día	vie 11/10/24	lun 14/10/24	400CC		$ 1.127.320
402		*1.4.10.17*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*259 días*	*mar 17/10/23*	*vie 11/10/24*	*343CC*	*405*	*$ 60.437.838*
403		*1.4.10.18*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*259 días*	*mar 17/10/23*	*vie 11/10/24*	*343CC*	*405*	*$ 4.807.814*
404		*1.4.10.19*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*259 días*	*mar 17/10/23*	*vie 11/10/24*	*343CC*	*405*	*$ 1.406.059*
405		*1.4.11*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6000485 - Isla del Sol N*	*0 días*	*vie 11/10/24*	*vie 11/10/24*	*368;402;403;404*	*853*	*$ 0*
406		**1.4.12**	**CIV 6000501 - ISLA DEL SOL No. 1**	**282 días**	**jue 14/09/23**	**vie 11/10/24**			**$ 549.587.201**
407		**1.4.12.13**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 17/10/23**	**lun 23/10/23**			**$ 576.612**
408		1.4.12.13.2	3007 - Replanteo General	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	6	410FC+8,5 mss;425;422FC	$ 576.612
409		**1.4.12.14**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE RED MENOR DE ACUEDUCTO**	**237 días**	**jue 14/09/23**	**vie 9/08/24**			**$ 8.367.937**
410		1.4.12.14.23	4390 - Excavacion Manual en Material Comun	3 días	lun 5/08/24	mié 7/08/24	408FC+8,5 mss	411;465CC	$ 523.345
411		1.4.12.14.24	3024 - Relleno para redes en Arena de Peña	1 día	jue 8/08/24	jue 8/08/24	410	412	$ 636.309
412		1.4.12.14.25	3234 - Instalacion de tuberia PVC D = 4"	1 día	vie 9/08/24	vie 9/08/24	411		$ 2.659.339

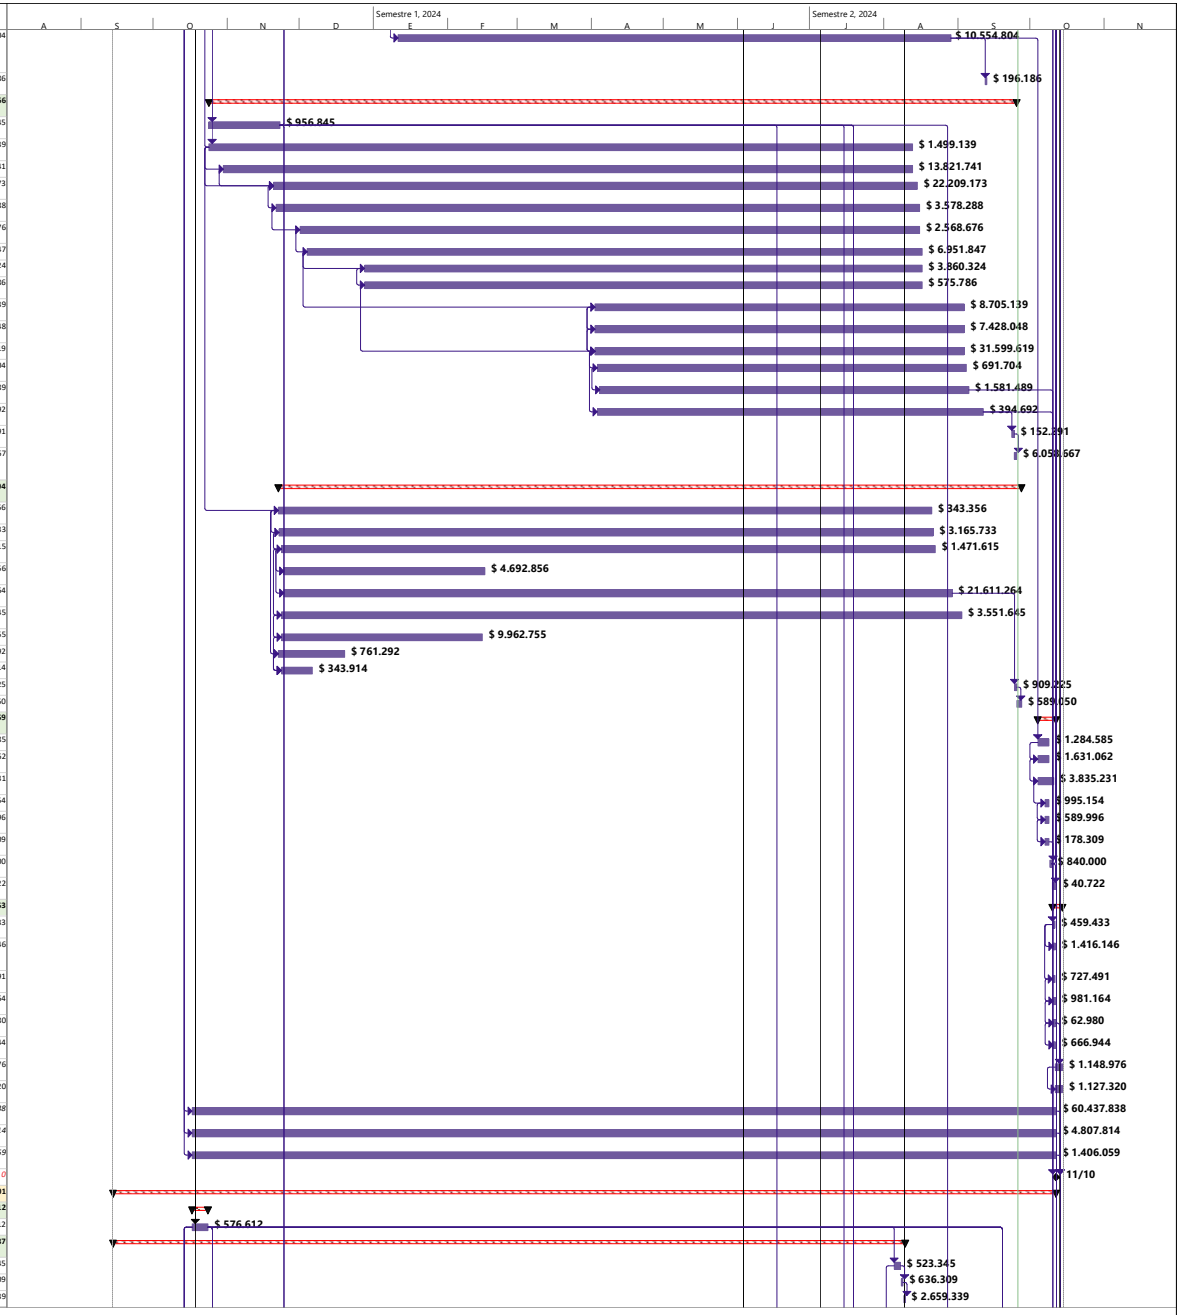

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
413		1.4.12.14.31	3293 - Instalacion de Codo HD 90° Extremo Liso D = 4"	1 día	jue 14/09/23	jue 14/09/23		414CC	$ 219.338
414		1.4.12.14.32	3602 - Instalacion de Union PVC Tipo UM 4"	1 día	jue 14/09/23	jue 14/09/23	413CC	415CC	$ 162.702
415		1.4.12.14.33	4982 - Acometida Domiciliaria de 1/2" incluye tuberia PF D = 1/2", registros y accesorios	1 día	jue 14/09/23	jue 14/09/23	414CC	416CC	$ 604.983
416		1.4.12.14.34	4984 - Relocalizacion de medidor de acueducto D = 1/2"	1 día	jue 14/09/23	jue 14/09/23	415CC	417CC	$ 1.062.503
417		1.4.12.14.35	5172 - Incorporacion de acometida domiciliaria 4" a 1/2"	1 día	jue 14/09/23	jue 14/09/23	416CC	419CC;418CC	$ 1.480.744
418		1.4.12.14.45	N.P. - Empate para red de acueducto de 4" incluye anclaje en seco	1 día	jue 14/09/23	jue 14/09/23	417CC		$ 913.549
419		1.4.12.14.36	3202 - Concreto 3000 psi para redes hecho en obra	1 día	jue 14/09/23	jue 14/09/23	417CC		$ 105.126
420		**1.4.12.15**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES SECA**	**4 días**	**jue 19/09/24**	**mié 25/09/24**			**$ 13.212.497**
421		1.4.12.15.29	NP - Traslado de Poste y red de alumbrado publico CIV 6000501 - Margen Derecho	4 días	jue 19/09/24	mié 25/09/24	408FC+9,89 mss	497	$ 12.301.540
422		1.4.12.15.28	3203 - Concreto 3000 psi hecho en obra	4 días	jue 19/09/24	mié 25/09/24	408FC+9,89 mss	497	$ 910.958
423		**1.4.12.16**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**225 días**	**mar 24/10/23**	**lun 2/09/24**			**$ 75.487.196**
424		1.4.12.16.18	5196 - Demolición de concreto espesor 8 a 15 cm para espacio publico	150 días	mar 24/10/23	lun 20/05/24	408	426	$ 894.954
425		1.4.12.16.10	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	150 días	mar 24/10/23	lun 20/05/24	408	426	$ 12.876.621
426		1.4.12.16.11	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de Andenes	52 días	mar 21/05/24	mié 31/07/24	425;424	427CC+2 días	$ 3.654.301
427		1.4.12.16.12	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	65 días	jue 23/05/24	mié 21/08/24	426CC+2 días	428CC+2 días	$ 2.572.467
428		1.4.12.16.13	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	60 días	lun 27/05/24	vie 16/08/24	427CC+2 días	429CC+10 días	$ 4.392.981
429		1.4.12.16.14	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	60 días	lun 10/06/24	vie 30/08/24	428CC+10 días	430CC	$ 3.877.308
430		1.4.12.16.15	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	60 días	lun 10/06/24	vie 30/08/24	429CC	431CC	$ 31.090.989
431		1.4.12.16.16	6047 - Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	60 días	lun 10/06/24	vie 30/08/24	430CC	432;479FC+25 días	$ 15.539.017
432		1.4.12.16.17	4855 - Construccion de franja de ajuste en concreto premezclado 3000 psi	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24	431		$ 588.558
433		**1.4.12.17**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**212,08 días**	**mar 24/10/23**	**jue 15/08/24**			**$ 170.225.471**
434		1.4.12.17.16	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	22 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	408	435;451	$ 1.043.830
435		1.4.12.17.17	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	117 días	jue 23/11/23	vie 3/05/24	434;355	436CC+4 días;437CC+19 días;459CC+21 días	$ 2.471.823
436		1.4.12.17.18	3017 - Transporte y Disposicion Final	113 días	mié 29/11/23	vie 3/05/24	435CC+4 días	437CC	$ 22.789.824
437		1.4.12.17.19	4161 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	103 días	mié 20/12/23	vie 10/05/24	435CC+19 días;436CC	438CC+1 día	$ 24.089.924
438		1.4.12.17.20	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	104 días	jue 21/12/23	mar 14/05/24	437CC+1 día	439FC+15 días	$ 3.878.022
439		1.4.12.17.21	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	34,19 días	mié 5/06/24	mar 23/07/24	438FC+15 días	440CC+1 día	$ 3.260.378
440		1.4.12.17.22	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calza	30 días	jue 6/06/24	mié 17/07/24	439CC+1 día	441CC+18 días;443CC+4 d	$ 9.153.655
441		1.4.12.17.23	4054 - Instalacion de Sardinel A10	20 días	mar 2/07/24	lun 29/07/24	440CC+18 días	442CC+8 días	$ 4.902.728
442		1.4.12.17.24	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa A85	15 días	vie 12/07/24	jue 1/08/24	441CC+8 días		$ 990.353
443		1.4.12.17.25	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	35 días	mié 12/06/24	mar 30/07/24	440CC+4 días	444CC;446CC	$ 27.305.161
444		1.4.12.17.26	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	46,08 días	mié 12/06/24	jue 15/08/24	443CC	446CC;445CC	$ 10.508.836
445		1.4.12.17.31	*NP-045 - ANCLAJE EPOXICO CON VARILLA DE 1/2 " (ZANJAS DE TUBERÍAS) REPOSICIÓN MR*	46,08 días	mié 12/06/24	jue 15/08/24	444CC		$ 3.504.375
446		1.4.12.17.27	APU NP - Construccion de losas en concreto MR43	35 días	mié 12/06/24	mar 30/07/24	443CC;444CC	447CC+1 día;449CC+1 día	$ 52.213.963
447		1.4.12.17.28	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	35 días	jue 13/06/24	mié 31/07/24	446CC+1 día	448	$ 1.064.160
448		1.4.12.17.29	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	2 días	jue 1/08/24	vie 2/08/24	447	497	$ 2.433.060
449		1.4.12.17.30	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	40 días	jue 13/06/24	mié 7/08/24	446CC+1 día	486FC+43 días	$ 615.380
450		**1.4.12.18**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR**	**210 días**	**jue 23/11/23**	**mié 11/09/24**			**$ 82.260.536**
451		1.4.12.18.11	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Muro de Contencion	25 días	jue 23/11/23	mié 27/12/23	434	452CC+1 día	$ 558.515
452		1.4.12.18.12	3017 - Transporte y Disposicion Final	25 días	vie 24/11/23	jue 28/12/23	451CC+1 día	453CC+5 días	$ 5.149.419
453		1.4.12.18.14	9109 - Instalacion de concreto de limpieza o solado, para construccion de zapata y dentellon muro de contencion	70 días	vie 1/12/23	jue 7/03/24	452CC+5 días	454CC+1 día	$ 4.384.937
454		1.4.12.18.15	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para zapata, dentellon y vastago muro de contencion	100 días	lun 4/12/23	vie 19/04/24	453CC+1 día	455CC+3 días	$ 27.510.885
455		1.4.12.18.16	5421 - Construccion de muro en concreto estructural de 4000 psi, incluye formaleteado, alineado, plomado, y fundida	100 días	jue 7/12/23	mié 24/04/24	454CC+3 días	456FC+96 días	$ 38.425.264
456		1.4.12.18.18	4905 - Instalacion de geodren vial de 100 mm x 1 m para filtro frances	2 días	vie 6/09/24	lun 9/09/24	455FC+96 días	457CC+1 día	$ 4.610.363
457		1.4.12.18.20	8655 - Instalacion de gravilla de 3/4" para filtro frances	3 días	lun 9/09/24	mié 11/09/24	456CC+1 día	497	$ 1.621.153
458		**1.4.12.19**	**ACTIVIDADES DE OBRAS HIDRAULICAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y**	**200,16 días**	**vie 22/12/23**	**vie 27/09/24**			**$ 56.449.614**
459		1.4.12.19.18	4262 - Excavacion Mecanica para redes h (0 a 3.5 metros)	41,72 días	vie 22/12/23	lun 19/02/24	435CC+21 días	460CC+0,5 días;462CC;461CC+10	$ 759.445
460		1.4.12.19.19	3017 - Transporte y Disposicion Final	40 días	vie 22/12/23	vie 16/02/24	459CC+0,5 días	462CC+10 días	$ 7.001.325
461		1.4.12.19.22	5710 - Instalacion de gravilla 1/2" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	40 días	vie 5/01/24	jue 29/02/24	459CC+10 días	464CC+2 días	$ 1.518.353
462		1.4.12.19.23	3473 - Instalacion de Placa de Fondo para pozo D = 1.70 m	40 días	vie 5/01/24	vie 1/03/24	459CC;460CC+10 días	463CC+4 días	$ 1.708.458
463		1.4.12.19.24	3471 - Cilindro Pozo de inspeccion en mamposteria	40 días	jue 11/01/24	jue 7/03/24	462CC+4 días	472;474	$ 2.210.196
464		1.4.12.19.27	3043 - Instalacion de tuberia Novafort 8"	40 días	mar 9/01/24	lun 4/03/24	461CC+2 días;468CC+2 dí	472	$ 4.743.533
465		1.4.12.19.29	5015 - Construccion de caja de inspeccion 60x6	10 días	lun 5/08/24	vie 16/08/24	410CC	474	$ 1.522.584
466		1.4.12.19.30	3042 - Instalacion de tuberia Novafort 6" Conexiones Domiciliarias	10 días	mié 28/02/24	mar 12/03/24	459CC+2 mss	467CC	$ 1.264.985
467		1.4.12.19.31	4879 - Conexión Silla Yee de 6" a 8"	60 días	mié 28/02/24	mar 21/05/24	466CC	472	$ 840.172
468		1.4.12.19.38	8655 - Instalacion de gravilla 3/4" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	60 días	vie 5/01/24	jue 28/03/24	459CC+10 días	464CC+2 días;469CC+40 días	$ 125.784
469		1.4.12.19.36	4892 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 10" para sumideros	69,6 días	vie 1/03/24	jue 6/06/24	468CC+40 días	471CC;473;470CC	$ 1.733.666

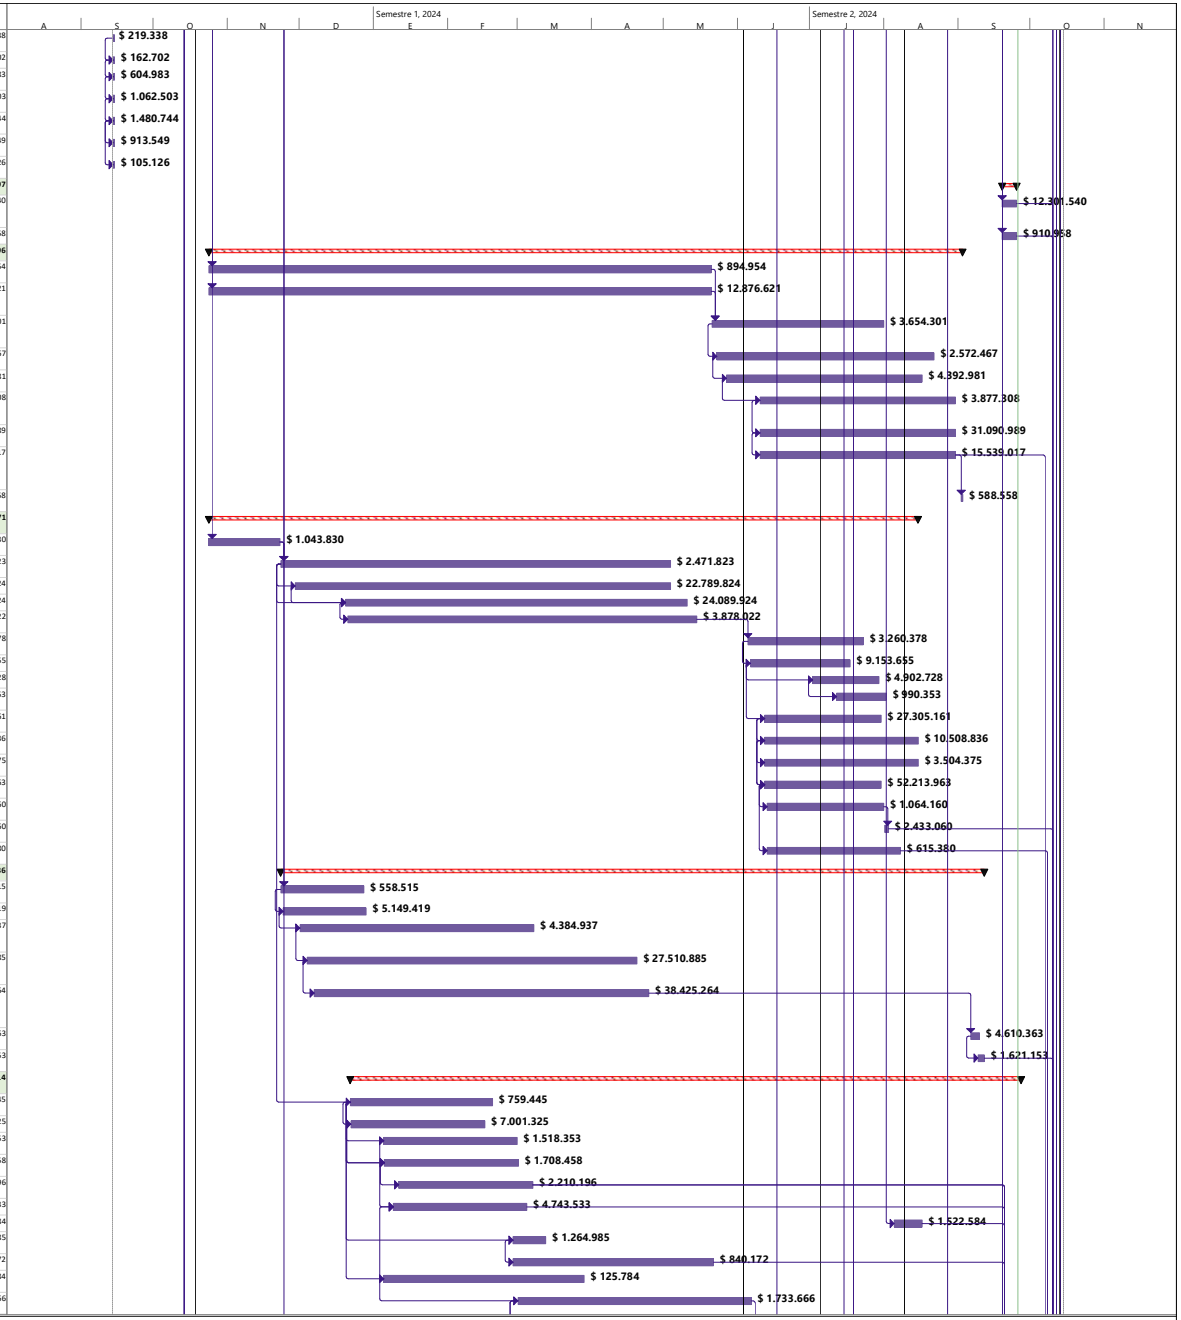

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
470		1.4.12.19.39	4896 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 12" para red Pluvial	60 días	vie 1/03/24	jue 23/05/24	469CC	471CC	$ 9.799.590
471		1.4.12.19.37	3443 - Lleno de cajas de tuberia en B200	60 días	vie 1/03/24	jue 23/05/24	469CC;470CC		$ 7.204.904
472		1.4.12.19.32	4252 - Instalacion de placa superior en concreto D = 1.70 m	2 días	vie 20/09/24	mar 24/09/24	463;464;467;611	497	$ 7.103.291
473		1.4.12.19.33	4558 - Construccion de sumidero lateral en via	30 días	jue 6/06/24	jue 18/07/24	469	474	$ 4.981.377
474		1.4.12.19.34	8227 - Cañuela especial	1 día	vie 20/09/24	lun 23/09/24	463;465;473;611	497;475CC	$ 286.595
475		1.4.12.19.40	NP-046 - INSTALACIÓN DE PASOS PARA ESCALERA DE GATO PP	1 día	vie 20/09/24	lun 23/09/24	474CC	476CC+3 días	$ 1.081.640
476		1.4.12.19.41	NP-052 - LAVADO DE REDES CON EQUIPO VAC	1 día	mié 25/09/24	jue 26/09/24	475CC+3 días	477	$ 1.555.785
477		1.4.12.19.42	NP-051 - INSPECCIÓN DE REDES CON EQUIPO C	1 día	jue 26/09/24	vie 27/09/24	476		$ 1.007.930
478		**1.4.12.20**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**5 días**	**lun 7/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 7.585.274**
479		1.4.12.20.9	4290 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	1 día	lun 7/10/24	lun 7/10/24	431FC+25 días	480CC	$ 4.349.498
480		1.4.12.20.10	7353 - Construccion de contenedor de raices Tipo B23	2 días	lun 7/10/24	mar 8/10/24	479CC	481CC+1 día	$ 2.556.821
481		1.4.12.20.12	8094 - Siembra de individuo arboreo tipo Pino Romeron H = 1.50 m	1 día	mar 8/10/24	mar 8/10/24	480CC+1 día	482CC	$ 294.998
482		1.4.12.20.13	4884 - Siembra de individuo arboreo tipo Nogal H = 1.50 m	1 día	mar 8/10/24	mar 8/10/24	481CC	483	$ 178.309
483		1.4.12.20.14	4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm	2 días	mié 9/10/24	jue 10/10/24	482	497;484	$ 178.500
484		1.4.12.20.15	NP-048 - ACTUALIZACIÓN SIGAU POR SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	vie 11/10/24	vie 11/10/24	483		$ 27.148
485		**1.4.12.25**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**3,3 días**	**mar 8/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 6.599.790**
486		1.4.12.25.17	NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. [ml]	1 día	mar 8/10/24	mar 8/10/24	449FC+43 días	487CC+0,3 días;488CC	$ 195.020
487		1.4.12.25.18	NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN [ml]	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	486CC+0,3 días		$ 601.124
488		1.4.12.25.19	NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. [ml]	1 día	mar 8/10/24	mar 8/10/24	486CC	489CC+0,3 días	$ 239.626
489		1.4.12.25.20	NP-025 - PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	488CC+0,3 días	490CC	$ 978.924
490		1.4.12.25.21	NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (un)	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	489CC	492;491CC	$ 204.685
491		1.4.12.25.22	NP-032 - INSTALACIÓN DE BANDA SONORA EN ESTOPEROLES	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	490CC		$ 2.667.776
492		1.4.12.25.23	NP-030 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	490	493CC	$ 1.148.976
493		1.4.12.25.24	NP-031 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	492CC		$ 563.660
494		*1.4.12.22*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*259 días*	*mar 17/10/23*	*vie 11/10/24*	*408CC*	*497*	*$ 116.812.301*
495		*1.4.12.23*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*259 días*	*mar 17/10/23*	*vie 11/10/24*	*408CC*	*497*	*$ 9.292.388*
496		*1.4.12.24*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*259 días*	*mar 17/10/23*	*vie 11/10/24*	*408CC*	*497*	*$ 2.717.585*
497		*1.4.13*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6000501 - Isla del Sol No*	*0 días*	*vie 11/10/24*	*vie 11/10/24*	*422;448;457;472;474;483;853*		*$ 0*
498		**1.4.14**	**CIV 6000505 - ISLA DEL SOL No. 1**	**259 días**	**mar 17/10/23**	**vie 11/10/24**			**$ 377.918.690**
499		**1.4.14.26**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 17/10/23**	**lun 23/10/23**			**$ 414.621**
500		1.4.14.26.3	3007 - Replanteo General	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	6	515;560CC;561CC;562CC;	$ 414.621
501		**1.4.14.28**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES SECA**	**4 días**	**jue 19/09/24**	**mié 25/09/24**			**$ 6.606.249**
502		1.4.14.28.30	NP - Traslado de Poste y red de alumbrado publico CIV 6000505 - Margen Derecho	4 días	jue 19/09/24	mié 25/09/24	408FC+9,89 mss	563	$ 6.150.770
503		1.4.14.28.29	3203 - Concreto 3000 psi hecho en obra	4 días	jue 19/09/24	mié 25/09/24	408FC+9,89 mss	563	$ 455.479
504		**1.4.14.29**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**42 días**	**jue 18/07/24**	**vie 13/09/24**			**$ 67.714.492**
505		1.4.14.29.26	5196 - Demolicion de concreto 8cm a 15 cm (Andenes)	15 días	jue 18/07/24	mié 7/08/24	500FC+8 mss	506CC	$ 488.157
506		1.4.14.29.18	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	15 días	jue 18/07/24	mié 7/08/24	505CC	507CC+1 día	$ 4.061.779
507		1.4.14.29.19	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de Andenes	20 días	vie 19/07/24	jue 15/08/24	506CC+1 día	508CC+2 días	$ 3.654.301
508		1.4.14.29.20	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	20 días	mar 23/07/24	lun 19/08/24	507CC+2 días	509CC+2 días	$ 2.858.297
509		1.4.14.29.21	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	20 días	jue 25/07/24	mié 21/08/24	508CC+2 días	510CC+2 días	$ 5.202.214
510		1.4.14.29.22	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	26 días	lun 29/07/24	lun 2/09/24	509CC+2 días	511CC	$ 4.274.781
511		1.4.14.29.23	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	26 días	lun 29/07/24	lun 2/09/24	510CC	512CC	$ 32.005.430
512		1.4.14.29.24	6047 - Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	26 días	lun 29/07/24	lun 2/09/24	511CC	513FC+2 días;551FC+26 días	$ 14.659.450
513		1.4.14.29.25	4855 - Construccion de franja de ajuste en concreto premezclado 3000 psi	7 días	jue 5/09/24	vie 13/09/24	512FC+2 días		$ 510.084
514		**1.4.14.30**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**254 días**	**mar 24/10/23**	**vie 11/10/24**			**$ 137.050.845**
515		1.4.14.30.31	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	22 días	mar 24/10/23	mié 22/11/23	500	516	$ 2.174.647
516		1.4.14.30.32	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	190 días	jue 23/11/23	mié 14/08/24	515;355	517CC+4 días;518CC+19 días;539FC-8	$ 1.527.642
517		1.4.14.30.33	3017 - Transporte y Disposicion Final	186 días	mié 29/11/23	mié 14/08/24	516CC+4 días	518CC	$ 14.084.640
518		1.4.14.30.34	4161 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	171 días	mié 20/12/23	mié 14/08/24	516CC+19 días;517CC	519CC+1 día	$ 18.565.873
519		1.4.14.30.35	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	170 días	jue 21/12/23	mié 14/08/24	518CC+1 día	520CC+5 mss	$ 2.946.825
520		1.4.14.30.36	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	10 días	jue 6/06/24	mié 19/06/24	519CC+5 mss	521CC+1 día	$ 2.827.321
521		1.4.14.30.37	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calzad	50 días	vie 7/06/24	jue 15/08/24	520CC+1 día	522CC+1 día;524CC+4 día	$ 7.211.971
522		1.4.14.30.38	4054 - Instalacion de Sardinel A10	20 días	lun 10/06/24	vie 5/07/24	521CC+1 día	523CC+8 días	$ 3.778.932
523		1.4.14.30.39	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa A85	40 días	jue 20/06/24	mié 14/08/24	522CC+8 días		$ 863.680
524		1.4.14.30.40	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	77 días	jue 13/06/24	vie 27/09/24	521CC+4 días	525CC;527CC	$ 17.572.226
525		1.4.14.30.41	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	77 días	jue 13/06/24	vie 27/09/24	524CC	527CC;526CC	$ 6.919.116
526		1.4.14.30.46	NP-045 - ANCLAJE EPOXICO CON VARILLA DE 1/2 " (ZANJAS DE TUBERÍAS) REPOSICIÓN MR	62 días	jue 13/06/24	vie 6/09/24	525CC		$ 2.382.975
527		1.4.14.30.42	APU NP - Construccion de losas en concreto MR	62 días	jue 13/06/24	vie 6/09/24	524CC;525CC	528CC+1 día;530CC+1 día	$ 51.874.911
528		1.4.14.30.43	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	81 días	vie 14/06/24	vie 4/10/24	527CC+1 día	529	$ 1.093.720

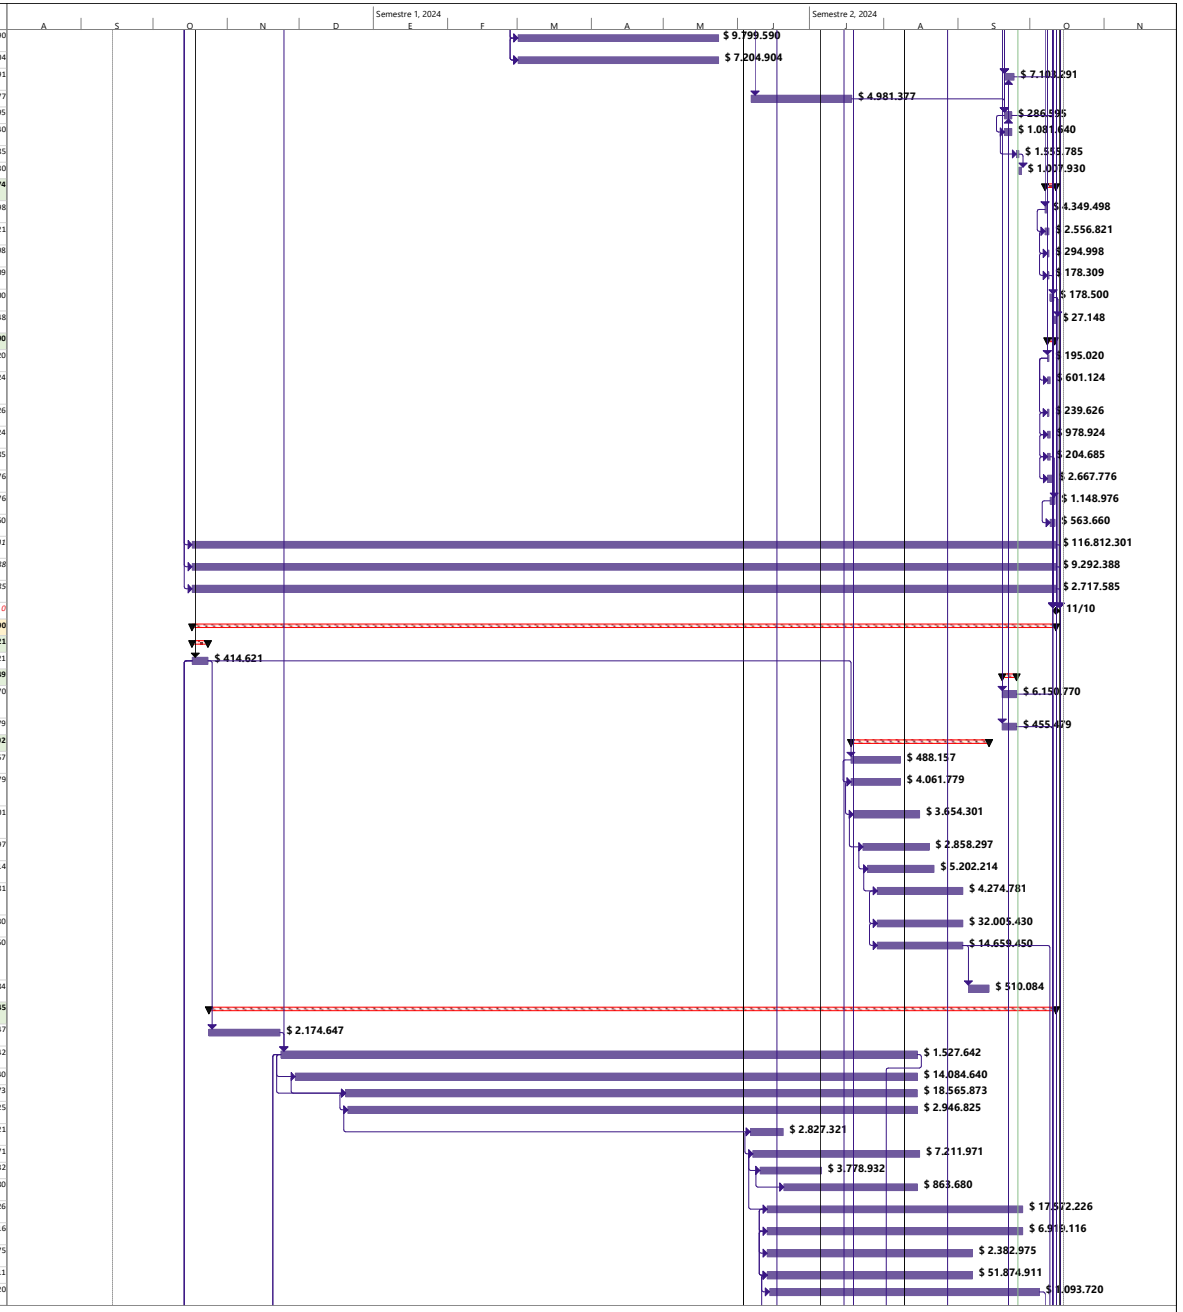

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
529		1.4.14.30.44	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	5 días	lun 7/10/24	vie 11/10/24	528	563	$ 2.500.645
530		1.4.14.30.45	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	61 días	vie 14/06/24	vie 6/09/24	527CC+1 día	554FC+22 días	$ 725.724
531		**1.4.14.31**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR**	**220 días**	**jue 23/11/23**	**mié 25/09/24**			**$ 55.230.360**
532		1.4.14.31.28	3776 - Entibado discontinuo para proteccion de talud	70 días	jue 23/11/23	mié 28/02/24	516CC	534CC+1 día	$ 2.279.876
533		1.4.14.31.23	9109 - Instalacion de concreto de limpieza o solado, para construccion de zapata y dentellon muro de contencion	70 días	jue 23/11/23	mié 28/02/24	516CC	534CC+1 día	$ 2.893.736
534		1.4.14.31.24	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para zapata, dentellon y vastago muro de contencion	100 días	vie 24/11/23	jue 11/04/24	533CC+1 día;532CC+1 día	535CC+3 días	$ 18.908.574
535		1.4.14.31.25	5421 - Construccion de muro en concreto estructural de 4000 psi, incluye formaleteado, alineado, plomado, y fundida	100 días	mié 29/11/23	mar 16/04/24	534CC+3 días	536FC+110 días	$ 26.592.768
536		1.4.14.31.26	4905 - Instalacion de geodren vial de 100 mm x 1 m para filtro frances	2 días	mié 18/09/24	jue 19/09/24	535FC+110 días	537	$ 3.334.199
537		1.4.14.31.27	8655 - Instalacion de gravilla de 3/4" para filtro frances	4 días	vie 20/09/24	mié 25/09/24	536	563	$ 1.221.207
538		**1.4.14.32**	**ACTIVIDADES DE OBRAS HIDRAULICAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y**	**38,86 días**	**lun 5/08/24**	**jue 26/09/24**			**$ 22.823.475**
539		1.4.14.32.40	4262 - Excavacion Mecanica para redes h (0 a 3.5 metros)	5 días	lun 5/08/24	vie 9/08/24	516FC-8 días	540CC+0,5 días	$ 119.632
540		1.4.14.32.41	3017 - Transporte y Disposicion Final	5 días	lun 5/08/24	lun 12/08/24	539CC+0,5 días	541CC	$ 1.103.044
541		1.4.14.32.42	5710 - Instalacion de gravilla 1/2" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	5 días	lun 5/08/24	lun 12/08/24	540CC	542CC	$ 480.012
542		1.4.14.32.49	8655 - Instalacion de gravilla 3/4" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	5 días	lun 5/08/24	lun 12/08/24	541CC	543CC+2 días	$ 61.060
543		1.4.14.32.50	4892 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 10" para sumideros	2 días	mié 7/08/24	vie 9/08/24	542CC+2 días	544CC	$ 2.989.080
544		1.4.14.32.51	4896 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 12" para red Pluvial	2 días	lun 9/09/24	mié 11/09/24	543CC;677CC	545FC+2 días	$ 10.433.024
545		1.4.14.32.53	4252 - Instalacion de placa superior en concreto D = 1.70 m	1 día	vie 13/09/24	lun 16/09/24	544FC+2 días	563;546CC	$ 1.775.823
546		1.4.14.32.54	4558 - Construccion de sumidero lateral en via	3 días	vie 13/09/24	mié 18/09/24	545CC	547	$ 4.981.377
547		1.4.14.32.55	8227 - Cañuela especial	1 día	mié 18/09/24	jue 19/09/24	546	563;548FC+3 días	$ 114.638
548		1.4.14.32.56	*NP-052 - LAVADO DE REDES CON EQUIPO VAC*	1 día	mar 24/09/24	mié 25/09/24	547FC+3 días	549	$ 464.715
549		1.4.14.32.57	*NP-051 - INSPECCIÓN DE REDES CON EQUIPO C*	1 día	mié 25/09/24	jue 26/09/24	548		$ 301.070
550		**1.4.14.33**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**3 días**	**mié 9/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 4.454.498**
551		1.4.14.33.15	4290 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	2 días	mié 9/10/24	jue 10/10/24	512FC+26 días	563;552	$ 4.349.498
552		1.4.14.33.20	*4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm*	1 día	vie 11/10/24	vie 11/10/24	551	213	$ 105.000
553		**1.4.14.34**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**2,3 días**	**mié 9/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 3.598.434**
554		1.4.14.34.23	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	mié 9/10/24	mié 9/10/24	530FC+22 días	555CC+0,3 días;556CC	$ 97.766
555		1.4.14.34.24	*NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN (ml)*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	554CC+0,3 días		$ 301.353
556		1.4.14.34.25	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	mié 9/10/24	mié 9/10/24	554CC	557CC+0,3 días	$ 207.780
557		1.4.14.34.26	*NP-025 - PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	556CC+0,3 días	558CC	$ 848.998
558		1.4.14.34.27	*NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (un)*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	557CC	559CC	$ 141.705
559		1.4.14.34.28	*NP-032 - INSTALACIÓN DE BANDA SONORA EN ESTOPEROLES*	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	558CC		$ 2.000.832
560		*1.4.14.35*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*259 días*	*mar 17/10/23*	*vie 11/10/24*	*500CC*	563	*$ 72.564.998*
561		*1.4.14.36*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*259 días*	*mar 17/10/23*	*vie 11/10/24*	*500CC*	563	*$ 5.772.527*
562		*1.4.14.37*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*259 días*	*mar 17/10/23*	*vie 11/10/24*	*500CC*	563	*$ 1.688.192*
563		*1.4.15*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6000505 - Isla del Sol No*	*0 días*	*vie 11/10/24*	*vie 11/10/24*	*503;529;537;545;547;560;853*		*$ 0*
564		**1.4.16**	**CIV 6000530 - ISLA DEL SOL No. 1 (Adicional)**	**95,14 días**	**lun 3/06/24**	**lun 14/10/24**			**$ 318.830.142**
565		**1.4.16.38**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 3/06/24**	**lun 10/06/24**			**$ 205.796**
566		1.4.16.38.4	3007 - Replanteo General	5 días	lun 3/06/24	lun 10/06/24	6FC+6,84 mss	581;637CC;638CC;639CC;	$ 205.796
567		**1.4.16.39**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES SECA**	**3 días**	**mar 24/09/24**	**vie 27/09/24**			**$ 6.606.249**
568		1.4.16.39.31	3203 - Concreto 3000 psi hecho en obra	3 días	mar 24/09/24	vie 27/09/24	566FC+3,2 mss	640	$ 455.479
569		1.4.16.39.30	NP - Traslado de Poste y red de alumbrado publico CIV 6000530 - Margen Derecho	3 días	mar 24/09/24	vie 27/09/24	566FC+3,2 mss	640	$ 6.150.770
570		**1.4.16.40**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**30 días**	**lun 19/08/24**	**lun 30/09/24**			**$ 53.653.963**
571		1.4.16.40.27	5196 - Demolicion de concreto 8cm a 15 cm (Andenes)	5 días	lun 19/08/24	lun 26/08/24	566CC+55 días	572CC	$ 569.516
572		1.4.16.40.28	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	10 días	lun 19/08/24	lun 2/09/24	571CC	573CC+1 día	$ 2.343.334
573		1.4.16.40.29	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de	10 días	mar 20/08/24	mar 3/09/24	572CC+1 día	574CC+10 días	$ 2.606.735
574		1.4.16.40.30	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	18 días	mar 3/09/24	vie 27/09/24	573CC+10 días	575CC+8 días	$ 4.287.445
575		1.4.16.40.31	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	10 días	vie 13/09/24	vie 27/09/24	574CC+8 días	576CC+2 días	$ 3.299.360
576		1.4.16.40.32	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (incluye suministro, fijacion en instalacion)	8 días	mar 17/09/24	vie 27/09/24	575CC+2 días	577CC+1 día	$ 3.082.775
577		1.4.16.40.33	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	7 días	mié 18/09/24	vie 27/09/24	576CC+1 día	578CC	$ 19.834.222
578		1.4.16.40.34	6047- Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	7 días	mié 18/09/24	vie 27/09/24	577CC	579;621FC+7 días	$ 17.591.340
579		1.4.16.40.35	4855 - Construccion de franja de ajuste en concreto premezclado 3000 psi	1 día	vie 27/09/24	lun 30/09/24	578		$ 39.237
580		**1.4.16.41**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**81,84 días**	**lun 10/06/24**	**mar 1/10/24**			**$ 88.151.673**
581		1.4.16.41.46	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	5 días	lun 10/06/24	lun 17/06/24	566	582	$ 260.958
582		1.4.16.41.47	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	16,51 días	lun 17/06/24	mar 9/07/24	581;355	583CC+4 días	$ 1.638.147
583		1.4.16.41.48	3017 - Transporte y Disposicion Final	16,84 días	vie 21/06/24	lun 15/07/24	582CC+4 días	584FC+2 días	$ 15.259.715
584		1.4.16.41.49	4161 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	9,37 días	mié 17/07/24	mié 31/07/24	583FC+2 días	585CC+1 día	$ 6.823.212
585		1.4.16.41.50	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	4 días	jue 18/07/24	mié 24/07/24	584CC+1 día	586FC+1 día	$ 1.098.745

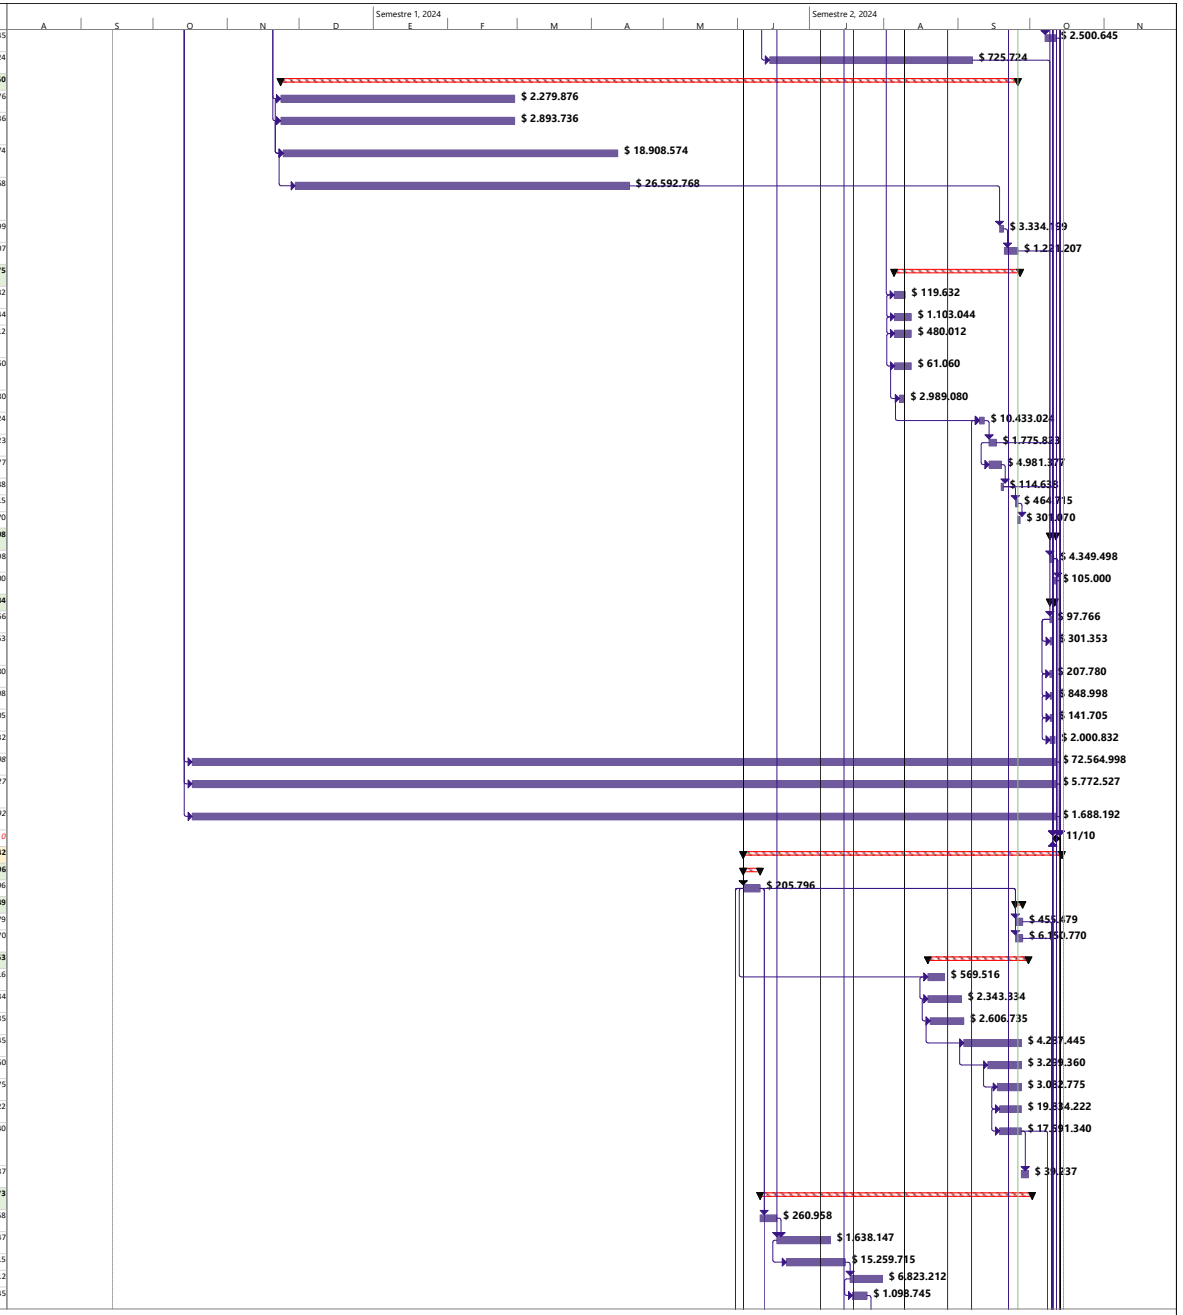

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
586		1.4.16.41.51	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	2 días	jue 25/07/24	lun 29/07/24	585FC+1 día	587CC+1 día	$ 2.092.952
587		1.4.16.41.52	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calzac	35 días	vie 26/07/24	vie 13/09/24	586CC+1 día	588CC+2 días	$ 8.169.868
588		1.4.16.41.53	4054 - Instalacion de Sardinel A10	42 días	mar 30/07/24	jue 26/09/24	587CC+2 días	589CC	$ 3.488.245
589		1.4.16.41.54	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa A85	42 días	mar 30/07/24	jue 26/09/24	588CC	590CC+27 días	$ 575.786
590		1.4.16.41.55	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	17 días	jue 5/09/24	lun 30/09/24	589CC+27 días	591CC	$ 9.042.805
591		1.4.16.41.56	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	17 días	jue 5/09/24	lun 30/09/24	590CC	593CC+5 días;592CC	$ 13.564.208
592		1.4.16.41.61	NP-045 - ANCLAJE EPOXICO CON VARILLA DE 1/2 " (ZANJAS DE TUBERÍAS) REPOSICIÓN MR	17 días	jue 5/09/24	lun 30/09/24	591CC		$ 1.682.100
593		1.4.16.41.57	APU NP - Construccion de losas en concreto MR	12 días	jue 12/09/24	lun 30/09/24	591CC+5 días	594CC+1 día;596CC+1 día	$ 22.377.413
594		1.4.16.41.58	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	11 días	vie 13/09/24	lun 30/09/24	593CC+1 día	595CC	$ 532.080
595		1.4.16.41.59	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	11 días	vie 13/09/24	lun 30/09/24	594CC	640	$ 1.216.530
596		1.4.16.41.60	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	12 días	vie 13/09/24	mar 1/10/24	593CC+1 día	630FC+4 días	$ 328.910
597		**1.4.16.49**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR**	**77 días**	**lun 10/06/24**	**mié 25/09/24**			**$ 57.541.889**
598		1.4.16.49.21	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Muro de Contencion	10 días	lun 10/06/24	lun 24/06/24	566	599CC+1 día;600CC+1 día	$ 280.825
599		1.4.16.49.22	3017 - Transporte y Disposicion Final	10 días	mar 11/06/24	mar 25/06/24	598CC+1 día	601CC+20 días	$ 2.589.149
600		1.4.16.49.29	3776 - Instalación de entibado para proteccion de talud	10 días	mar 11/06/24	mar 25/06/24	598CC+1 día	601CC+20 días	$ 1.709.731
601		1.4.16.49.23	9109 - Instalacion de concreto de limpieza o solado, para construccion de zapata y dentellon muro de contencion	15 días	mar 9/07/24	mar 30/07/24	599CC+20 días;600CC+20 días	602CC+1 día	$ 1.608.079
602		1.4.16.49.24	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para zapata, dentellon y vastago muro de contencion	15 días	mié 10/07/24	mié 31/07/24	601CC+1 día	603CC+3 días	$ 15.272.887
603		1.4.16.49.25	5421 - Construccion de muro en concreto estructural de 4000 psi, incluye formaleteado, alineado, plomado, y fundida	15 días	lun 15/07/24	lun 5/08/24	602CC+3 días	605FC+35 días;604FC+35 días	$ 31.277.208
604		1.4.16.49.28	4009 - Instalacion de geotextil NT3000 para conformacion de filtro frances	1 día	lun 23/09/24	mar 24/09/24	603FC+35 días	606	$ 544.823
605		1.4.16.49.26	4905 - Instalacion de geodren vial de 100 mm x 1 m para filtro frances	1 día	lun 23/09/24	mar 24/09/24	603FC+35 días	606	$ 2.500.649
606		1.4.16.49.27	8655 - Instalacion de gravilla de 3/4" para filtro frances	1 día	mar 24/09/24	mié 25/09/24	605;604	640	$ 1.758.538
607		**1.4.16.51**	**ACTIVIDADES DE OBRAS HIDRAULICAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y**	**14,5 días**	**vie 6/09/24**	**jue 26/09/24**			**$ 24.530.461**
608		1.4.16.51.56	4262 - Excavacion Mecanica para redes h (0 a 3.5 metros)	5 días	vie 6/09/24	vie 13/09/24	715FC+35 días	609CC+0,5 días;610	$ 90.847
609		1.4.16.51.57	3017 - Transporte y Disposicion Final	5 días	vie 6/09/24	vie 13/09/24	608CC+0,5 días	612CC	$ 837.490
610		1.4.16.51.65	3473 - Instalacion de Placa de Fondo para pozo D = 1.70 m	1 día	vie 13/09/24	lun 16/09/24	608	611CC+4 días	$ 569.486
611		1.4.16.51.66	3471 - Cilindro Pozo de inspeccion en mamposteria	1 día	jue 19/09/24	vie 20/09/24	610CC+4 días	472;474	$ 552.549
612		1.4.16.51.58	5710 - Instalacion de gravilla 1/2" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	5 días	vie 6/09/24	vie 13/09/24	609CC	613CC;617;616	$ 304.429
613		1.4.16.51.61	4896 - Instalacion de tubería concreto Alta resistencia CEF 12" para red Pluvial	10 días	vie 6/09/24	vie 20/09/24	612CC	614FC+2 días;615	$ 8.964.949
614		1.4.16.51.62	4252 - Instalacion de placa superior en concreto D = 1.70 m	1 día	mar 24/09/24	mié 25/09/24	613FC+2 días	563	$ 1.775.823
615		1.4.16.51.64	8227 - Cañuela especial	1 día	vie 20/09/24	lun 23/09/24	613	563	$ 57.319
616		1.4.16.51.70	NP-049 - CONSTRUCCIÓN DE SUBDREN LATERAL MARGEN IZQUIERDO ESPACIO	6 días	vie 13/09/24	lun 23/09/24	612	618CC+6 días	$ 10.139.580
617		1.4.16.51.67	NP-046 - INSTALACIÓN DE PASOS PARA ESCALERA DE GATO PP	6 días	vie 13/09/24	lun 23/09/24	612	618CC+6 días	$ 405.615
618		1.4.16.51.68	NP-052 - LAVADO DE REDES CON EQUIPO VAC	1 día	lun 23/09/24	mar 24/09/24	617CC+6 días;616CC+6 días	619	$ 505.125
619		1.4.16.51.69	NP-051 - INSPECCIÓN DE REDES CON EQUIPO C	2 días	mar 24/09/24	jue 26/09/24	618		$ 327.250
620		**1.4.16.50**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**3 días**	**mar 8/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 7.383.724**
621		1.4.16.50.15	3396 - Instalacion de banca en concreto tipo M	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	578FC+7 días	622CC	$ 1.284.585
622		1.4.16.50.16	4290 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	621CC	623CC	$ 1.631.062
623		1.4.16.50.17	7353 - Construccion de contenedor de raices Tipo B23	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	622CC	624CC	$ 1.278.410
624		1.4.16.50.18	3548 - Instalacion de Bolardo en hierro tipo M6	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	623CC	625CC;626CC	$ 1.824.449
625		1.4.16.50.19	8094 - Siembra de individuo arboreo tipo Pino Romeron H = 1.50 m	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	624CC	640	$ 294.998
626		1.4.16.50.22	4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	624CC	213;628;627	$ 630.000
627		1.4.16.50.24	NP-048 - ACTUALIZACIÓN SIGAU POR SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	626		$ 13.574
628		1.4.16.50.23	NP-047 - TALA DE ARBOLES CLASE I (PALMAS DE YUCA) - NO REQUIERE PERMISO FORESTAL	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	626;686;737;788		$ 426.646
629		**1.4.16.45**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**4,3 días**	**lun 7/10/24**	**lun 14/10/24**			**$ 4.277.457**
630		1.4.16.45.28	NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)	1 día	lun 7/10/24	mar 8/10/24	596FC+4 días	631CC+0,3 días;632CC	$ 78.623
631		1.4.16.45.29	NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN (ml)	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	630CC+0,3 días		$ 242.346
632		1.4.16.45.30	NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)	1 día	lun 7/10/24	mar 8/10/24	630CC	633CC+0,3 días	$ 152.442
633		1.4.16.45.31	NP-025 - PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	632CC+0,3 días	634CC	$ 622.748
634		1.4.16.45.32	NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (un)	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	633CC	635CC	$ 31.490
635		1.4.16.45.33	NP-032 - INSTALACIÓN DE BANDA SONORA EN ESTOPEROLES	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	634CC	636	$ 2.000.832
636		1.4.16.45.34	NP-030 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO	2 días	jue 10/10/24	lun 14/10/24	635		$ 1.148.976
637		*1.4.16.46*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*94 días*	*lun 3/06/24*	*vie 11/10/24*	*566CC*	*640*	*$ 69.348.875*
638		*1.4.16.47*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*94 días*	*lun 3/06/24*	*vie 11/10/24*	*566CC*	*640*	*$ 5.516.685*
639		*1.4.16.48*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*94 días*	*lun 3/06/24*	*vie 11/10/24*	*566CC*	*640*	*$ 1.613.370*
640		*1.4.17*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6000530 - Isla del Sol No. 1 (Adicional)*	*0 días*	*vie 11/10/24*	*vie 11/10/24*	*569;595;637;638;639;625;853*		*$ 0*
641		**1.4.18**	**CIV 6000560 - ISLA DEL SOL No. 1 (Adicional)**	**94,3 días**	**lun 3/06/24**	**vie 11/10/24**			**$ 320.346.744**
642		**1.4.18.51**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 3/06/24**	**lun 10/06/24**			**$ 256.921**
643		1.4.18.51.5	3007 - Replanteo General	5 días	lun 3/06/24	lun 10/06/24	6FC+6,84 mss	658CC+25 días;697CC;698	$ 256.921
644		**1.4.18.52**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES SECA**	**4 días**	**vie 20/09/24**	**jue 26/09/24**			**$ 6.606.249**

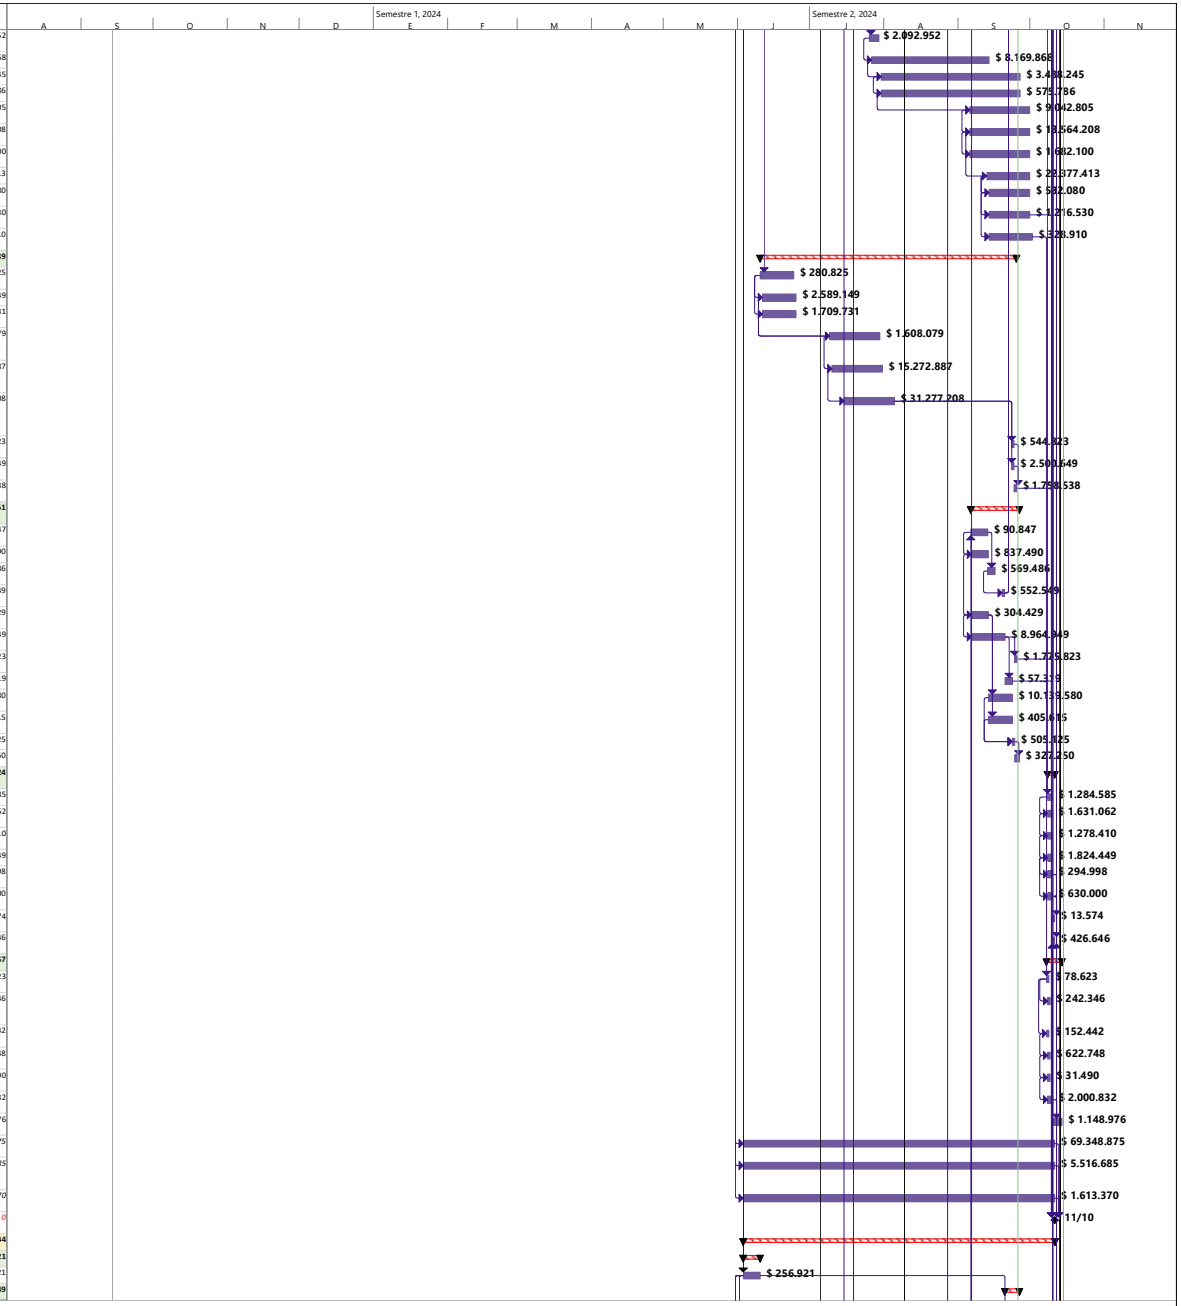

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
645		1.4.18.52.32	NP - Traslado de Poste y red de alumbrado publico CIV 6000560 - Margen Derecho	4 días	vie 20/09/24	jue 26/09/24	643FC+3,1 mss	700;646CC	$ 6.150.770
646		1.4.18.52.31	3203 - Concreto 3000 psi hecho en obra	4 días	vie 20/09/24	jue 26/09/24	645CC	700	$ 455.479
647		**1.4.18.53**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**30 días**	**lun 19/08/24**	**lun 30/09/24**			**$ 75.236.012**
648		1.4.18.53.36	5196 - Demolicion de concreto 8cm a 15 cm (Andenes)	5 días	lun 19/08/24	lun 26/08/24	643CC+55 días	649CC	$ 162.719
649		1.4.18.53.37	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	10 días	lun 19/08/24	lun 2/09/24	648CC	650CC+10 días	$ 7.850.170
650		1.4.18.53.38	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de Andenes	17 días	lun 2/09/24	mié 25/09/24	649CC+10 días	651CC+2 días	$ 2.607.953
651		1.4.18.53.39	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	16 días	mié 4/09/24	jue 26/09/24	650CC+2 días	652CC+2 días	$ 4.573.274
652		1.4.18.53.40	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	14 días	vie 6/09/24	jue 26/09/24	651CC+2 días	653CC+2 días	$ 2.167.589
653		1.4.18.53.41	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	12 días	mar 10/09/24	jue 26/09/24	652CC+2 días	654CC	$ 5.501.040
654		1.4.18.53.42	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	13 días	mar 10/09/24	vie 27/09/24	653CC	655CC	$ 24.324.127
655		1.4.18.53.43	6047- Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	13 días	mar 10/09/24	vie 27/09/24	654CC	656;681CC+15 días	$ 27.852.955
656		1.4.18.53.44	4855 - Construccion de franja de ajuste en concreto premezclado 3000 psi	1 día	vie 27/09/24	lun 30/09/24	655		$ 196.186
657		**1.4.18.54**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**60,5 días**	**lun 8/07/24**	**lun 30/09/24**			**$ 127.877.588**
658		1.4.18.54.61	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	5 días	lun 8/07/24	lun 15/07/24	643CC+25 días	659	$ 1.739.717
659		1.4.18.54.62	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	15 días	lun 15/07/24	lun 5/08/24	658;355	660CC+4 días;674FC+25 días	$ 1.687.994
660		1.4.18.54.63	3017 - Transporte y Disposicion Final	15 días	vie 19/07/24	vie 9/08/24	659CC+4 días	661FC+2 días	$ 15.563.110
661		1.4.18.54.64	4161 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	4 días	mar 13/08/24	lun 19/08/24	660FC+2 días	662CC+1 día	$ 13.392.240
662		1.4.18.54.65	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	2 días	mié 14/08/24	vie 16/08/24	661CC+1 día	663FC+1 día	$ 2.155.392
663		1.4.18.54.66	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	2 días	lun 19/08/24	mié 21/08/24	662FC+1 día	664CC+1 día	$ 2.819.977
664		1.4.18.54.67	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calza	24 días	mar 20/08/24	lun 23/09/24	663CC+1 día	665CC+2 días	$ 7.982.480
665		1.4.18.54.68	4054 - Instalacion de Sardinel A10	24 días	jue 22/08/24	mié 25/09/24	664CC+2 días	666CC	$ 4.534.718
666		1.4.18.54.69	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa A85	24 días	jue 22/08/24	mié 25/09/24	665CC	667	$ 1.439.466
667		1.4.18.54.70	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	1 día	mié 25/09/24	jue 26/09/24	666	668CC;669CC	$ 17.126.525
668		1.4.18.54.71	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	1 día	mié 25/09/24	jue 26/09/24	667CC	669CC	$ 4.158.320
669		1.4.18.54.72	APU NP - Construccion de losas en concreto MR	2 días	mié 25/09/24	vie 27/09/24	667CC;668CC	670;672CC+1 día	$ 47.053.596
670		1.4.18.54.73	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	0,5 días	vie 27/09/24	vie 27/09/24	669	671	$ 2.335.240
671		1.4.18.54.74	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	1 día	vie 27/09/24	lun 30/09/24	670	700	$ 5.339.215
672		1.4.18.54.75	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	2 días	jue 26/09/24	lun 30/09/24	669CC+1 día	689FC+6 días	$ 549.598
673		**1.4.18.61**	**ACTIVIDADES DE OBRAS HIDRAULICAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y**	**5,5 días**	**lun 9/09/24**	**lun 16/09/24**			**$ 8.802.312**
674		1.4.18.61.67	4262 - Excavacion Mecanica para redes h (0 a 3.5 metros)	5 días	lun 9/09/24	lun 16/09/24	659FC+25 días	675CC+0,5 días	$ 32.950
675		1.4.18.61.68	3017 - Transporte y Disposicion Final	5 días	lun 9/09/24	lun 16/09/24	674CC+0,5 días	676CC	$ 303.727
676		1.4.18.61.71	5710 - Instalacion de gravilla 1/2" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	5 días	lun 9/09/24	lun 16/09/24	675CC	677CC+0,2 días	$ 138.951
677		1.4.18.61.75	4892 - Instalacion de tuberia concreto Alta resistencia CEF 10" para sumideros	2 días	lun 9/09/24	mié 11/09/24	676CC+0,2 días	544CC;678CC	$ 3.287.988
678		1.4.18.61.76	4558 - Construccion de sumidero lateral en via	3 días	lun 9/09/24	jue 12/09/24	677CC	679	$ 4.981.377
679		1.4.18.61.74	8227 - Cañuela especial	1 día	jue 12/09/24	vie 13/09/24	678	700	$ 57.319
680		**1.4.18.56**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**8 días**	**mar 1/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 12.167.933**
681		1.4.18.56.23	4290 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	5 días	mar 1/10/24	mar 8/10/24	655CC+15 días	682CC	$ 1.631.062
682		1.4.18.56.24	7353 - Construccion de contenedor de raices Tipo B23	8 días	mar 1/10/24	vie 11/10/24	681CC	683CC+1 día	$ 6.392.051
683		1.4.18.56.25	3548 - Instalacion de Bolardo en hierro tipo M63	1 día	mié 2/10/24	jue 3/10/24	682CC+1 día	684CC	$ 2.322.026
684		1.4.18.56.26	8094 - Siembra de individuo arboreo tipo Pino Romeron H = 1.50 m	1 día	mié 2/10/24	jue 3/10/24	683CC	700;685CC	$ 589.996
685		1.4.18.56.27	4884 - Siembra de individuo arboreo tipo Nogal H = 1.50 m	1 día	mié 2/10/24	jue 3/10/24	684CC	686	$ 534.927
686		1.4.18.56.29	*4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm*	2 días	jue 3/10/24	lun 7/10/24	685	213;628;687	$ 630.000
687		1.4.18.56.30	*NP-048 - ACTUALIZACIÓN SIGAU POR SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS*	1 día	lun 7/10/24	mar 8/10/24	686		$ 67.870
688		**1.4.18.57**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**3,3 días**	**mar 8/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 22.213.247**
689		1.4.18.57.34	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	672FC+6 días	690CC+0,3 días;691CC	$ 81.358
690		1.4.18.57.35	*NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN [ml]*	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	689CC+0,3 días		$ 250.776
691		1.4.18.57.36	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	689CC	692CC+0,3 días;696CC	$ 93.188
692		1.4.18.57.37	*NP-025 - PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES*	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	691CC+0,3 días	693CC	$ 380.817
693		1.4.18.57.38	*NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL [un]*	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	692CC	694CC	$ 31.490
694		1.4.18.57.39	*NP-032 - INSTALACIÓN DE BANDA SONORA EN ESTOPEROLES*	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	693CC	695	$ 2.000.832
695		1.4.18.57.40	*NP-030 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	694		$ 1.148.976
696		1.4.18.57.41	*NP-050 - CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS EN AGREGADO*	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	691CC		$ 18.225.810
697		*1.4.18.58*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*94 días*	*lun 3/06/24*	*vie 11/10/24*	*643CC*	*700*	*$ 60.922.745*
698		*1.4.18.59*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*94 días*	*lun 3/06/24*	*vie 11/10/24*	*643CC*	*700*	*$ 4.846.396*
699		*1.4.18.60*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*94 días*	*lun 3/06/24*	*vie 11/10/24*	*643CC*	*700*	*$ 1.417.342*
700		*1.4.19*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6000560 - Isla del Sol No. 1 (Adicional)*	*0 días*	*vie 11/10/24*	*vie 11/10/24*	*646;671;684;697;698;699;853*		*$ 0*
701		**1.4.20**	**CIV 6000603 - ISLA DEL SOL No. 1 (Adicional)**	**70,3 días**	**vie 5/07/24**	**vie 11/10/24**			**$ 457.590.110**

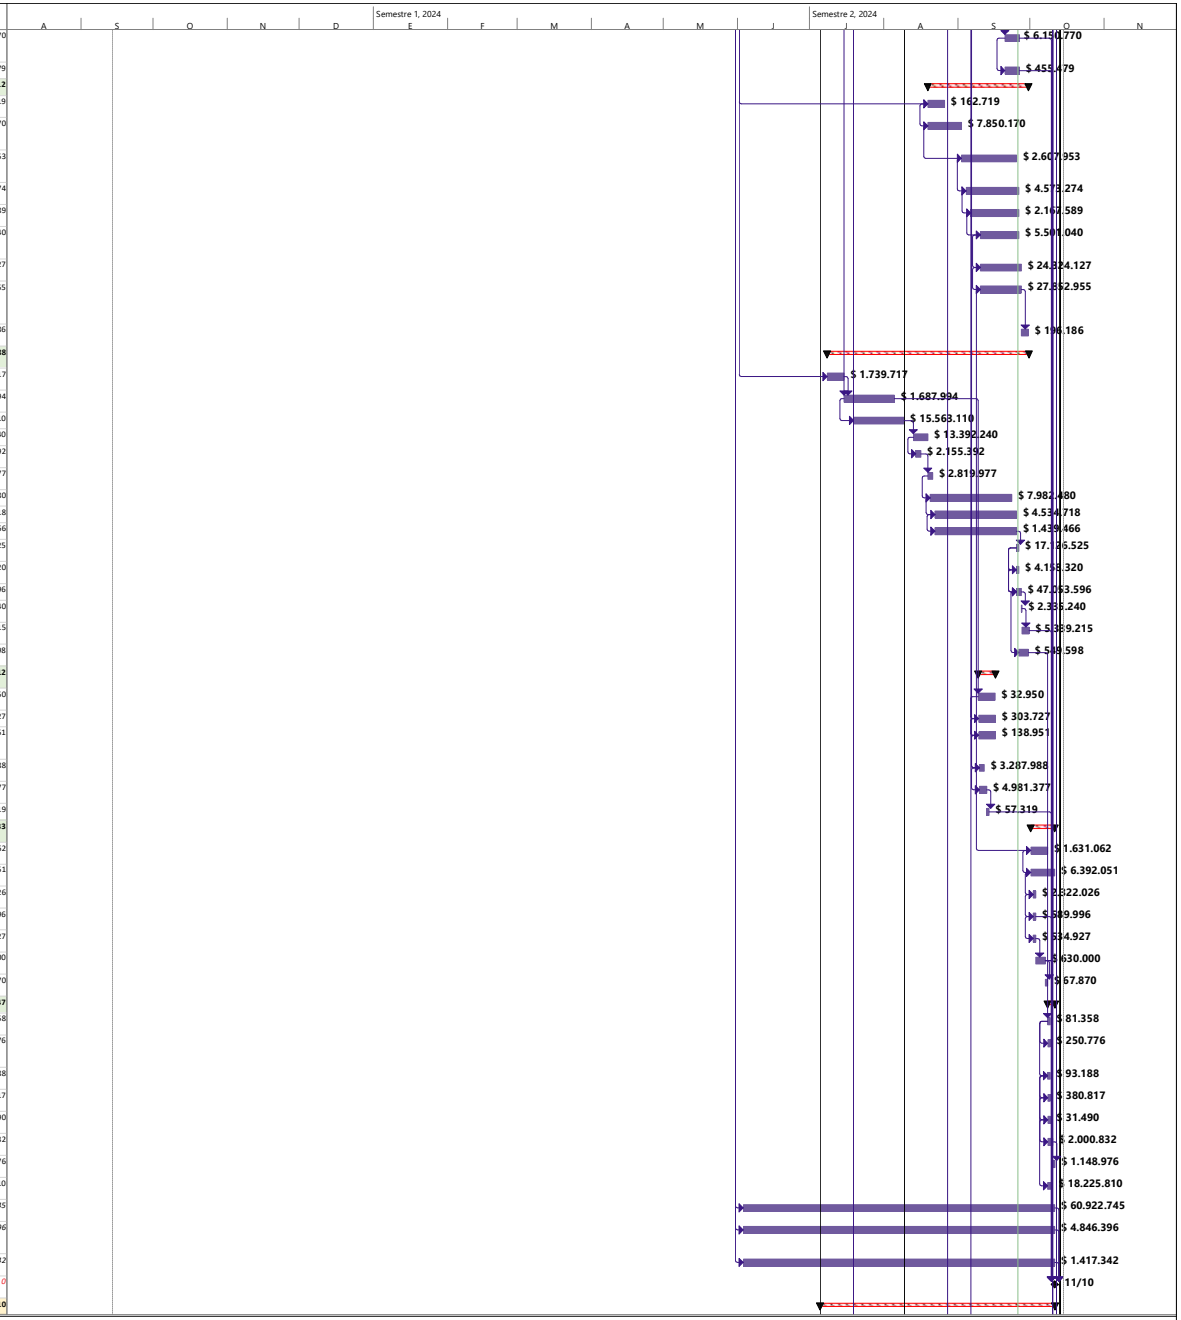

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
702		**1.4.20.61**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	**vie 5/07/24**	**vie 12/07/24**			**$ 584.075**
703		1.4.20.61.6	3007 - Replanteo General	5 días	vie 5/07/24	vie 12/07/24	6FC+7,84 mss	715;747CC;748CC;749CC;	$ 584.075
704		**1.4.20.63**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**19,2 días**	**mar 3/09/24**	**lun 30/09/24**			**$ 146.136.472**
705		1.4.20.63.45	5196 - Demolicion de concreto 8cm a 15 cm (Andenes)	2 días	mar 3/09/24	jue 5/09/24	703CC+42 días	706CC	$ 325.438
706		1.4.20.63.46	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	6 días	mar 3/09/24	mié 11/09/24	705CC	707CC	$ 16.012.784
707		1.4.20.63.47	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de	14 días	mar 3/09/24	lun 23/09/24	706CC	708CC+1 día	$ 7.308.602
708		1.4.20.63.48	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	14 días	mié 4/09/24	mar 24/09/24	707CC+1 día	709CC+2 días	$ 5.716.593
709		1.4.20.63.49	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	14 días	vie 6/09/24	jue 26/09/24	708CC+2 días	710	$ 6.936.286
710		1.4.20.63.50	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	1 día	jue 26/09/24	vie 27/09/24	709	711CC	$ 8.220.732
711		1.4.20.63.51	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	2 días	jue 26/09/24	lun 30/09/24	710CC	712CC	$ 65.291.077
712		1.4.20.63.52	6047 - Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	2 días	jue 26/09/24	lun 30/09/24	711CC	713CC+2 días	$ 36.109.157
713		1.4.20.63.53	4855 - Construccion de franja de ajuste en concreto premezclado 3000 psi	0,2 días	lun 30/09/24	lun 30/09/24	712CC+2 días	731	$ 215.805
714		**1.4.20.64**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**61 días**	**vie 12/07/24**	**lun 7/10/24**			**$ 177.327.891**
715		1.4.20.64.76	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	5 días	vie 12/07/24	vie 19/07/24	703	716;608FC+35 días	$ 869.859
716		1.4.20.64.77	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	15 días	vie 19/07/24	vie 9/08/24	715;355	717CC+1 día	$ 2.085.127
717		1.4.20.64.78	3017 - Transporte y Disposicion Final	15 días	lun 22/07/24	lun 12/08/24	716CC+1 día	718FC+1 día	$ 19.224.433
718		1.4.20.64.79	4161 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	4 días	mar 13/08/24	lun 19/08/24	717FC+1 día	719CC+1 día	$ 25.418.374
719		1.4.20.64.80	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	3 días	mié 14/08/24	lun 19/08/24	718CC+1 día	720FC+1 día	$ 4.091.877
720		1.4.20.64.81	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	1 día	mar 20/08/24	mié 21/08/24	719FC+1 día	721CC+1 día	$ 5.874.952
721		1.4.20.64.82	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calzada	10 días	mié 21/08/24	mié 4/09/24	720CC+1 día	722CC+2 días	$ 15.286.912
722		1.4.20.64.83	4054 - Instalacion de Sardinel A10	20 días	vie 23/08/24	vie 20/09/24	721CC+2 días	723CC	$ 9.185.711
723		1.4.20.64.84	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa ABS	20 días	vie 23/08/24	vie 20/09/24	722CC	724CC+2 días	$ 345.472
724		1.4.20.64.85	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	20 días	mar 27/08/24	mar 24/09/24	723CC+2 días	725CC;726CC	$ 7.152.037
725		1.4.20.64.86	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	20 días	mar 27/08/24	mar 24/09/24	724CC	726CC	$ 9.645.659
726		1.4.20.64.87	APU NP - Construccion de losas en concreto MR43	22 días	mar 27/08/24	jue 26/09/24	724CC;725CC	727;729CC+1 día	$ 72.455.349
727		1.4.20.64.88	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	1 día	jue 26/09/24	vie 27/09/24	726	728	$ 1.418.880
728		1.4.20.64.89	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	1 día	vie 27/09/24	lun 30/09/24	727	750	$ 3.244.080
729		1.4.20.64.90	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	28 días	mié 28/08/24	lun 7/10/24	726CC+1 día	740FC+2 días	$ 1.029.170
730		**1.4.20.65**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**2 días**	**lun 30/09/24**	**mié 2/10/24**			**$ 18.701.871**
731		1.4.20.65.35	3396 - Instalacion de banca en concreto tipo M3	1 día	lun 30/09/24	mar 1/10/24	713	732CC	$ 1.284.585
732		1.4.20.65.29	4290 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	1 día	lun 30/09/24	mar 1/10/24	731CC	733CC	$ 2.174.749
733		1.4.20.65.30	7353 - Construccion de contenedor de raices Tipo B23	1 día	lun 30/09/24	mar 1/10/24	732CC	734CC	$ 10.227.282
734		1.4.20.65.31	3548 - Instalacion de Bolardo en hierro tipo M6	1 día	lun 30/09/24	mar 1/10/24	733CC	735CC	$ 1.492.731
735		1.4.20.65.32	8094 - Siembra de individuo arboreo tipo Pino Romeron H = 1.50 m	1 día	lun 30/09/24	mar 1/10/24	734CC	750;736CC;737CC	$ 1.179.992
736		1.4.20.65.33	4884 - Siembra de individuo arboreo tipo Nogal H = 1.50 m	1 día	lun 30/09/24	mar 1/10/24	735CC	750	$ 713.236
737		1.4.20.65.36	***4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm***	1 día	lun 30/09/24	mar 1/10/24	735CC	213;628;738	$ 1.575.000
738		1.4.20.65.37	***NP-048 - ACTUALIZACIÓN SIGAU POR SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS***	1 día	mar 1/10/24	mié 2/10/24	737		$ 54.296
739		**1.4.20.66**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**2,3 días**	**mié 9/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 10.587.560**
740		1.4.20.66.40	***NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)***	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	729FC+2 días	741CC+0,3 días;742CC	$ 492.079
741		1.4.20.66.41	***NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN (ml)***	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	740CC+0,3 días		$ 1.516.772
742		1.4.20.66.42	***NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)***	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	740CC	743CC+0,3 días	$ 560.170
743		1.4.20.66.43	***NP-025 - PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES***	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	742CC+0,3 días	744CC	$ 2.289.382
744		1.4.20.66.44	***NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (un)***	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	743CC	745CC	$ 188.940
745		1.4.20.66.45	***NP-032 - INSTALACIÓN DE BANDA SONORA EN ESTOPEROLES***	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	744CC	746CC	$ 2.667.776
746		1.4.20.66.46	***NP-030 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO***	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	745CC		$ 2.872.440
747		*1.4.20.67*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*70 días*	*vie 5/07/24*	*vie 11/10/24*	*703CC*	*750*	*$ 94.532.700*
748		*1.4.20.68*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*70 días*	*vie 5/07/24*	*vie 11/10/24*	*703CC*	*750*	*$ 7.520.050*
749		*1.4.20.69*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*70 días*	*vie 5/07/24*	*vie 11/10/24*	*703CC*	*750*	*$ 2.199.491*
750		*1.4.21*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6000603 - Isla del Sol No. 1 (Adicional)*	*0 días*	*vie 11/10/24*	*vie 11/10/24*	*728;735;747;748;749;736;853*		*$ 0*
751		**1.4.22**	**CIV 6000620 - ISLA DEL SOL No. 1 (Adicional)**	**70,3 días**	**vie 5/07/24**	**vie 11/10/24**			**$ 291.794.208**
752		**1.4.22.70**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**5 días**	**vie 5/07/24**	**vie 12/07/24**			**$ 252.378**
753		1.4.22.70.7	3007 - Replanteo General	5 días	vie 5/07/24	vie 12/07/24	6FC+7,84 mss	767;798CC;799CC;800CC;	$ 252.378
754		**1.4.22.78**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES SECA**	**4 días**	**vie 20/09/24**	**jue 26/09/24**			**$ 6.150.770**
755		1.4.22.78.32	NP - Traslado de Poste y red de alumbrado publico CIV 6000620 - Margen Derecho	4 días	vie 20/09/24	jue 26/09/24	753FC+2,1 mss	801	$ 6.150.770
756		**1.4.22.71**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**27 días**	**vie 23/08/24**	**mar 1/10/24**			**$ 76.570.423**
757		1.4.22.71.54	5196 - Demolicion de concreto 8cm a 15 cm (Andenes)	3 días	vie 23/08/24	mié 28/08/24	753CC+35 días	758CC	$ 162.719
758		1.4.22.71.55	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	8 días	vie 23/08/24	mié 4/09/24	757CC	759CC+10 días	$ 5.936.447
759		1.4.22.71.56	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de	13 días	vie 6/09/24	mié 25/09/24	758CC+10 días	760CC	$ 4.385.161
760		1.4.22.71.57	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	13 días	vie 6/09/24	mié 25/09/24	759CC	761CC+2 días	$ 9.146.549

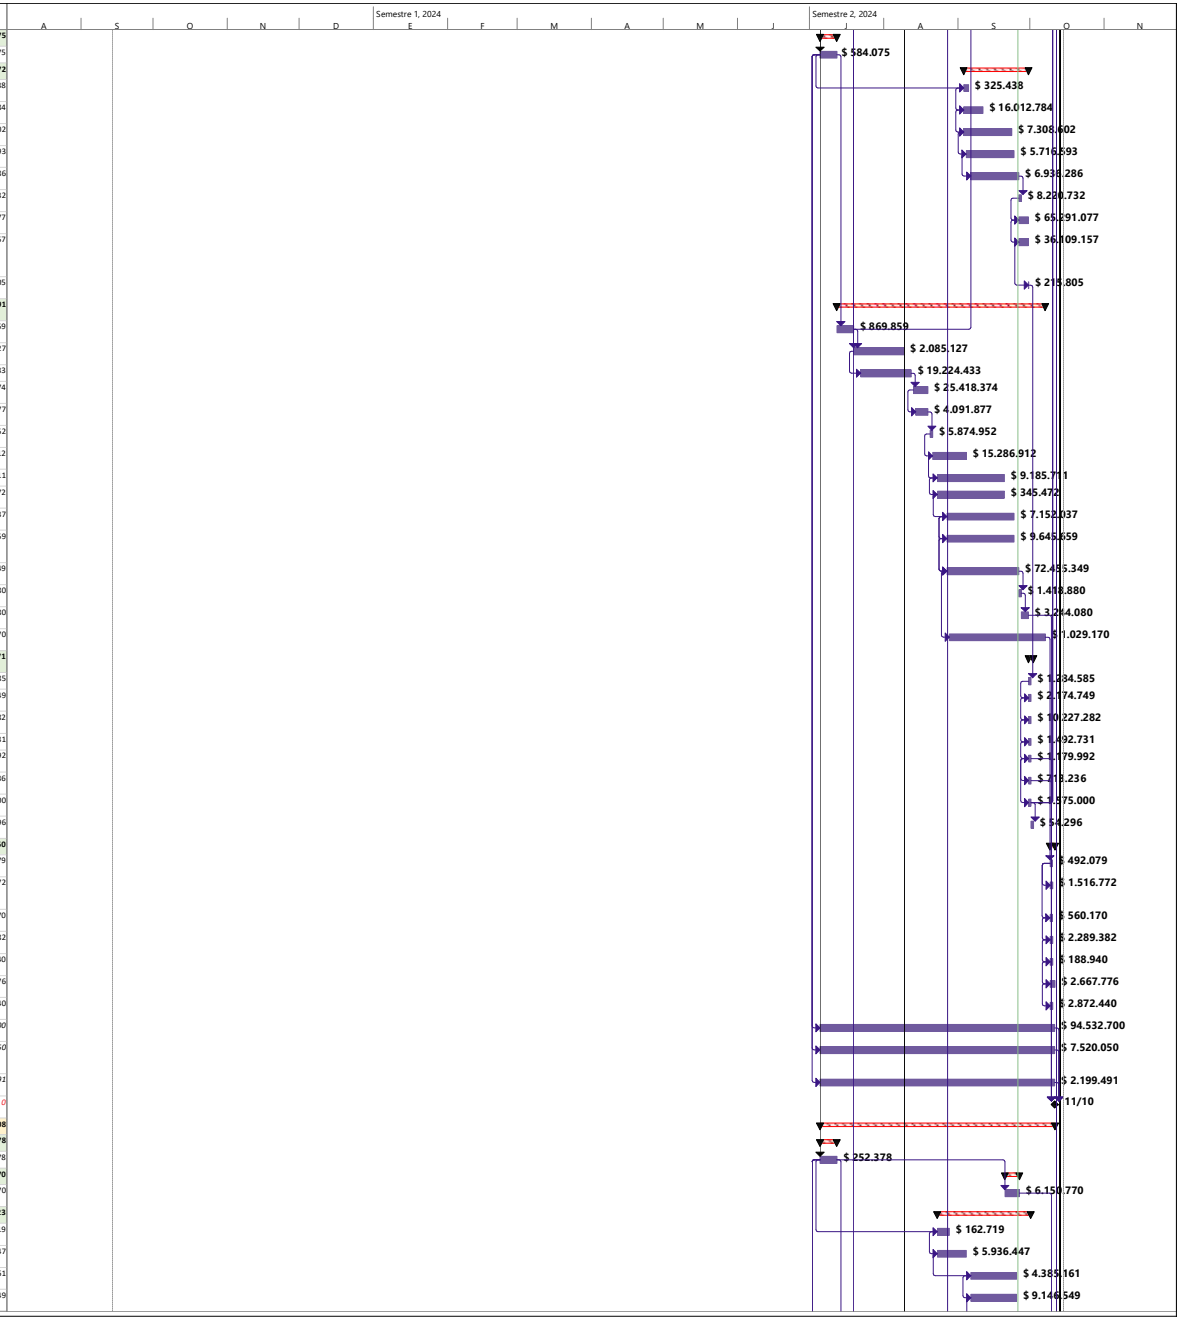

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
761		1.4.22.71.58	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	13 días	mar 10/09/24	vie 27/09/24	760CC+2 días	762	$ 2.861.218
762		1.4.22.71.59	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	1 día	vie 27/09/24	lun 30/09/24	761	763CC	$ 2.260.701
763		1.4.22.71.60	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	2 días	vie 27/09/24	mar 1/10/24	762CC	764CC	$ 23.592.574
764		1.4.22.71.61	6047- Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	1 día	vie 27/09/24	lun 30/09/24	763CC	765CC	$ 28.028.868
765		1.4.22.71.62	4855 - Construccion de franja de ajuste en concreto premezclado 3000 psi	1 día	vie 27/09/24	lun 30/09/24	764CC	783FC+7 días	$ 196.186
766		**1.4.22.72**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**51,5 días**	**vie 12/07/24**	**lun 23/09/24**			**$ 102.370.304**
767		1.4.22.72.91	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	5 días	vie 12/07/24	vie 19/07/24	753	768	$ 543.662
768		1.4.22.72.92	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	5 días	vie 19/07/24	vie 26/07/24	767;355	769CC+1 día	$ 1.659.209
769		1.4.22.72.93	3017 - Transporte y Disposicion Final	5 días	lun 22/07/24	lun 29/07/24	768CC+1 día	770FC+1 día	$ 15.297.556
770		1.4.22.72.94	4161 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	2 días	mar 30/07/24	jue 1/08/24	769FC+1 día	771CC+1 día	$ 23.744.736
771		1.4.22.72.95	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	2 días	mié 31/07/24	vie 2/08/24	770CC+1 día	772FC+1 día	$ 3.704.580
772		1.4.22.72.96	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	1 día	lun 5/08/24	mar 6/08/24	771FC+1 día	773CC+1 día	$ 1.505.457
773		1.4.22.72.97	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calzada	10 días	mar 6/08/24	mar 20/08/24	772CC+1 día	774	$ 5.712.867
774		1.4.22.72.98	4054 - Instalacion de Sardinel A10	20 días	mar 20/08/24	mar 17/09/24	773	775CC	$ 4.011.481
775		1.4.22.72.99	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa A85	20 días	mar 20/08/24	mar 17/09/24	774CC	776CC+8 días	$ 460.629
776		1.4.22.72.100	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	15 días	vie 30/08/24	vie 20/09/24	775CC+8 días	777CC;778CC	$ 4.452.897
777		1.4.22.72.101	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	15 días	vie 30/08/24	vie 20/09/24	776CC	778CC	$ 4.663.895
778		1.4.22.72.102	APU NP - Construccion de losas en concreto MR43	15 días	vie 30/08/24	vie 20/09/24	776CC;777CC	779;781CC+1 día	$ 33.735.645
779		1.4.22.72.103	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	1 día	vie 20/09/24	lun 23/09/24	778	780	$ 762.648
780		1.4.22.72.104	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	0,5 días	lun 23/09/24	lun 23/09/24	779	801	$ 1.743.693
781		1.4.22.72.105	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	15 días	lun 2/09/24	lun 23/09/24	778CC+1 día	791FC+11 días	$ 371.350
782		**1.4.22.73**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA URBANISMO Y PAISAJISMO**	**2 días**	**mié 9/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 11.784.472**
783		1.4.22.73.36	3396 - Instalacion de banca en concreto tipo M3	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	765FC+7 días	784CC	$ 1.926.877
784		1.4.22.73.37	4290 - Instalacion de Caneca doble tipo Barcelona M121	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	783CC	785CC	$ 1.631.062
785		1.4.22.73.38	7353 - Construccion de contenedor de raices Tipo B23	0,5 días	mié 9/10/24	mié 9/10/24	784CC	786CC	$ 6.392.051
786		1.4.22.73.40	8094 - Siembra de individuo arboreo tipo Pino Romeron H = 1.50 m	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	785CC	801;787CC;788CC	$ 884.994
787		1.4.22.73.41	4884 - Siembra de individuo arboreo tipo Nogal H = 1.50 m	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	786CC	801	$ 356.618
788		1.4.22.73.43	*4883 - Siembra de pasto kykuyo para zonas verdes, incluye tierra negra h = 10 cm*	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	786CC	213;628;789	$ 525.000
789		1.4.22.73.44	*NP-048 - ACTUALIZACIÓN SIGAU POR SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	788		$ 67.870
790		**1.4.22.74**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**3,3 días**	**mar 8/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 4.509.071**
791		1.4.22.74.47	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	781FC+11 días	792CC+0,3 días;793CC	$ 84.221
792		1.4.22.74.48	*NP-024 - PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN (ml)*	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	791CC+0,3 días		$ 259.600
793		1.4.22.74.49	*NP-026 - PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. (ml)*	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	791CC	794CC+0,3 días	$ 174.890
794		1.4.22.74.50	*NP-025 - PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES*	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	793CC+0,3 días	795CC	$ 714.592
795		1.4.22.74.51	*NP-028 - INSTALACIÓN DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (un)*	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	794CC	796CC	$ 125.960
796		1.4.22.74.52	*NP-032 - INSTALACIÓN DE BANDA SONORA EN ESTOPEROLES*	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	795CC	797	$ 2.000.832
797		1.4.22.74.53	*NP-030 - INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO*	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	796		$ 1.148.976
798		*1.4.22.75*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*70 días*	*vie 5/07/24*	*vie 11/10/24*	*753CC*	801	*$ 84.548.433*
799		*1.4.22.76*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*70 días*	*vie 5/07/24*	*vie 11/10/24*	*753CC*	801	*$ 4.339.313*
800		*1.4.22.77*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*70 días*	*vie 5/07/24*	*vie 11/10/24*	*753CC*	801	*$ 1.269.044*
801		*1.4.23*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6000620 - Isla del Sol No. 1 (Adicional)*	*0 días*	*vie 11/10/24*	*vie 11/10/24*	*780;786;787;798;799;800;853*		*$ 0*
802		**1.4.24**	**CIV 6002157 - SAN BENITO (Adicional)**	**45 días**	**vie 9/08/24**	**vie 11/10/24**			**$ 146.943.410**
803		**1.4.24.79**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**vie 9/08/24**	**mar 13/08/24**			**$ 115.373**
804		1.4.24.79.8	3007 - Replanteo General	2 días	vie 9/08/24	mar 13/08/24	6FC+8,9 mss	829FC+8 días;849CC;850C	$ 115.373
805		**1.4.24.81**	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESPACIO PU**	**21 días**	**vie 30/08/24**	**lun 30/09/24**			**$ 36.376.506**
806		1.4.24.81.63	5196 - Demolicion de concreto 8cm a 15 cm (Andenes)	5 días	vie 30/08/24	vie 6/09/24	804CC+15 días	807CC	$ 976.314
807		1.4.24.81.64	4390 - Excavacion manual en material comun para conformacion de espacio publico	10 días	vie 30/08/24	vie 13/09/24	806CC	808CC+1 día	$ 7.967.336
808		1.4.24.81.65	4159 - Instalacion de capa de Sub Base granular Clase C para conformacion de	15 días	lun 2/09/24	lun 23/09/24	807CC+1 día	809CC+2 días	$ 2.436.201
809		1.4.24.81.66	6475 - Instalacion de Bordillo A80 para conformacion de paños Espacio publico	15 días	mié 4/09/24	mié 25/09/24	808CC+2 días	810CC+2 días	$ 1.143.319
810		1.4.24.81.67	4907 - Instalacion de capa de SBG PEA para conformacion de espacio publico	14 días	vie 6/09/24	jue 26/09/24	809CC+2 días	811CC+2 días	$ 1.387.257
811		1.4.24.81.68	4232 - Malla electrosoldada 15x15,6mm (Incluye suministro, fijacion en instalacion)	12 días	mar 10/09/24	jue 26/09/24	810CC+2 días	812CC	$ 1.644.146
812		1.4.24.81.69	6137 - Instalacion de concreto MR41 color gris - Concreto Estampado	13 días	mar 10/09/24	vie 27/09/24	811CC	813CC	$ 11.156.178
813		1.4.24.81.70	6047- Instalacion de concreto MR41 color ocre y/o rojo - Concreto Estampado para rampas vehiculares, vados peatonales y loseta guia+podotactil	13 días	mar 10/09/24	vie 27/09/24	812CC	814	$ 9.587.280
814		1.4.24.81.71	4855 - Construccion de franja de ajuste en concreto premezclado 3000 psi	1 día	vie 27/09/24	lun 30/09/24	813		$ 78.474
815		**1.4.24.88**	**ACTIVIDADES DE OBRAS HIDRAULICAS PARA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y**	**6,5 días**	**mar 3/09/24**	**jue 12/09/24**			**$ 9.879.496**
816		1.4.24.88.56	4262 - Excavacion Mecanica para redes h (0 a 3.5 metros)	2 días	mar 3/09/24	jue 5/09/24	804FC+15 días	817CC+0,5 días	$ 88.928
817		1.4.24.88.57	3017 - Transporte y Disposicion Final	2 días	mié 4/09/24	vie 6/09/24	816CC+0,5 días	818CC+1 día	$ 819.897

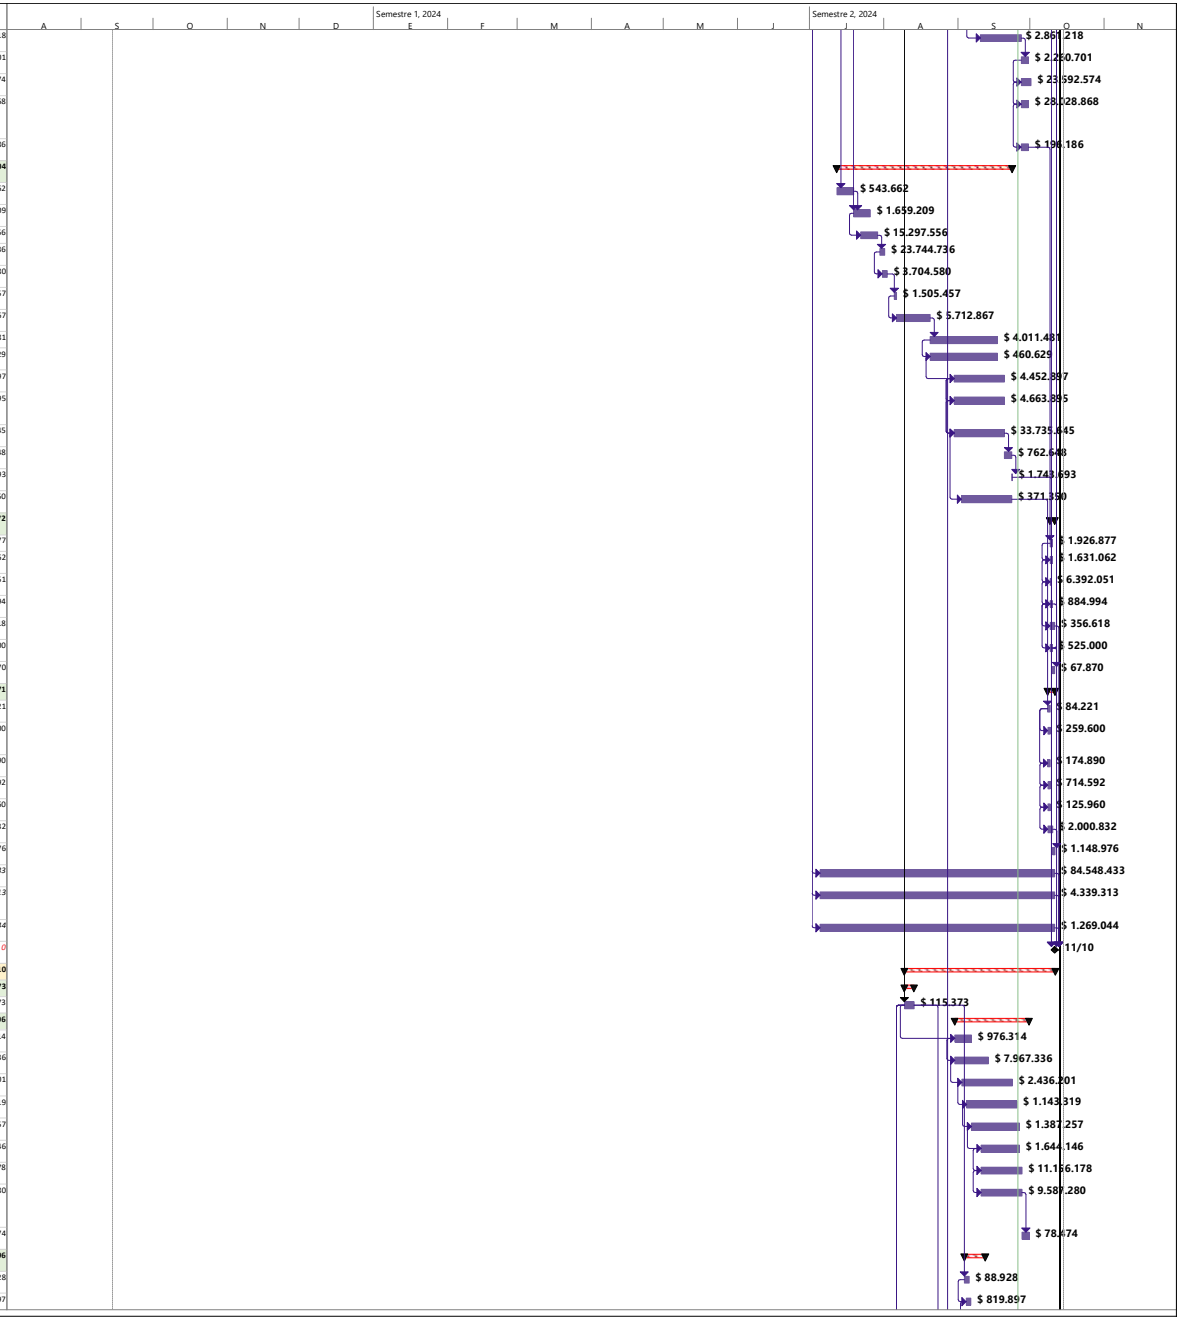

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
818		1.4.24.88.58	5710 - Instalacion de gravilla 1/2" para camas y atraques de tuberia de alcantarillado	2 días	jue 5/09/24	lun 9/09/24	817CC+1 día	822CC+1 día;820CC+1 día;821CC+1 día;819CC+1	$ 189.478
819		1.4.24.88.69	4850 - Demolición de pozos, cajas y camaras ESP	2 días	vie 6/09/24	mar 10/09/24	818CC+1 día	825CC;824CC;823CC	$ 512.954
820		1.4.24.88.67	3779 - Construcción de caja de inspección de 60x60	2 días	vie 6/09/24	mar 10/09/24	818CC+1 día	825CC;824CC;823CC	$ 761.292
821		1.4.24.88.68	5015 - Construcción de caja de inspección de 80x80	2 días	vie 6/09/24	mar 10/09/24	818CC+1 día	825CC;824CC;823CC	$ 1.139.944
822		1.4.24.88.59	4848 - Demolición de tuberías de acueducto y alcantarillado	2 días	vie 6/09/24	mar 10/09/24	818CC+1 día	825CC;824CC;823CC	$ 135.870
823		1.4.24.88.66	3042 - Instalación de tubería Novafort 6" Alcantarillado Sanitario	2 días	vie 6/09/24	mar 10/09/24	822CC;820CC;821CC;819C	826;827	$ 624.684
824		1.4.24.88.65	4879 - Instalación de Silla Yee 6 a 8" Alcantarillado Sanitario	2 días	vie 6/09/24	mar 10/09/24	822CC;820CC;821CC;819C	852	$ 840.172
825		1.4.24.88.60	3043 - Instalación de tubería Novafort 8" Alcantarillado Sanitario	2 días	vie 6/09/24	mar 10/09/24	822CC;820CC;821CC;819C	852	$ 1.157.312
826		1.4.24.88.62	4252 - Instalacion de placa superior en concreto D = 1.70 m	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24	823	852	$ 3.551.645
827		1.4.24.88.64	8227 - Cañuela especial	1 día	mar 10/09/24	mié 11/09/24	823	852	$ 57.319
828		**1.4.24.82**	**ACTIVIDADES DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CALZADA**	**31 días**	**vie 23/08/24**	**lun 7/10/24**			**$ 42.212.826**
829		1.4.24.82.106	5197 - Demolicion de concreto 16 a 25 cm (Calzada)	2 días	vie 23/08/24	mar 27/08/24	804FC+8 días	830	$ 543.662
830		1.4.24.82.107	3710 - Excavacion Mecanica en Material Comun para Calzada	2 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	829;355	831CC+1 día	$ 458.681
831		1.4.24.82.108	3017 - Transporte y Disposicion Final	3 días	mié 28/08/24	lun 2/09/24	830CC+1 día	832FC+1 día	$ 4.228.944
832		1.4.24.82.109	4161 - Estabilizacion de la Subrasante con rajon	2 días	mar 3/09/24	jue 5/09/24	831FC+1 día	833CC+1 día	$ 5.962.335
833		1.4.24.82.110	4792 - Instalacion de capa de sello en recebo comun	2 días	mié 4/09/24	vie 6/09/24	832CC+1 día	834FC+1 día	$ 808.272
834		1.4.24.82.111	4671 - Instalacion de geotextil NT2500 para separacion de capas de sello y SBG	1 día	lun 9/09/24	mar 10/09/24	833FC+1 día	835CC+1 día	$ 1.285.146
835		1.4.24.82.112	4161 - Instalacion de capa de SBG-A para calzad	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24	834CC+1 día	836CC+2 días	$ 3.052.451
836		1.4.24.82.113	4054 - Instalacion de Sardinel A10	9 días	jue 12/09/24	mié 25/09/24	835CC+2 días	837CC	$ 1.395.298
837		1.4.24.82.114	4088 - Instalacion de Sardinel Bajo Rampa A85	9 días	jue 12/09/24	mié 25/09/24	836CC	838	$ 368.503
838		1.4.24.82.115	APU NP - Armado y figurado de Acero de refuerzo para losas especiales	2 días	mié 25/09/24	vie 27/09/24	837	839CC;840CC	$ 3.792.498
839		1.4.24.82.116	APU NP - Instalacion de canastilla pasajuntas, incluido Acero listo de transferencia	2 días	mié 25/09/24	vie 27/09/24	838CC	840CC	$ 1.929.132
840		1.4.24.82.117	APU NP - Construccion de losas en concreto MR	1 día	mié 25/09/24	jue 26/09/24	838CC;839CC	841;843CC+1 día	$ 17.142.454
841		1.4.24.82.118	4239 - Corte y ampliacion de juntas en pavimento de concreto hidraulico	1 día	jue 26/09/24	vie 27/09/24	840	842	$ 319.248
842		1.4.24.82.119	3837 - Sellado de juntas en pavimento de concreto hidraulico	1 día	vie 27/09/24	lun 30/09/24	841	852	$ 729.918
843		1.4.24.82.120	3806 - Curado de Losas en concreto (Suministro y aplicación)	7 días	jue 26/09/24	lun 7/10/24	840CC+1 día	845FC+1 día	$ 196.285
844		**1.4.24.84**	**ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION**	**3 días**	**mar 8/10/24**	**vie 11/10/24**			**$ 3.710.691**
845		1.4.24.84.47	4240 - Demarcacion linea continua de bordes, A = 12 cm con pintura termoplastica ml	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	843FC+1 día	846CC	$ 414.677
846		1.4.24.84.49	4248 - Demarcacion de paso peatonal o Cebra	2 días	mar 8/10/24	jue 10/10/24	845CC	847CC	$ 1.727.695
847		1.4.24.84.50	6594 - Demarcación de pictograma triángulos ceda el paso (un)	3 días	mar 8/10/24	vie 11/10/24	846CC	848CC	$ 36.636
848		1.4.24.84.51	6779 - Demarcación de pictograma triángulos ceda el paso (m2)	3 días	mar 8/10/24	vie 11/10/24	847CC	852	$ 1.531.683
849		*1.4.24.85*	*COBRO DEL AIU ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS*	*45 días*	*vie 9/08/24*	*vie 11/10/24*	*804CC*	852	*$ 44.515.127*
850		*1.4.24.86*	*COBRO DE COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SST, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*45 días*	*vie 9/08/24*	*vie 11/10/24*	*804CC*	852	*$ 9.140.674*
851		*1.4.24.87*	*COBRO DE COMPONENTE PMT, ASOCIADO A LAS OBRAS EJECUTADAS*	*45 días*	*vie 9/08/24*	*vie 11/10/24*	*804CC*	852	*$ 992.718*
852		*1.4.25*	*Fin de Actividades de Obra CIV 6002157- San Benito (Adicional)*	*0 días*	*vie 11/10/24*	*vie 11/10/24*	*842;848;849;850;851;826*	*853*	*$ 0*
853		***1.4.26***	***FIN DE ACTIVIDADES DE OBRA***	***0 días***	***lun 14/10/24***	***lun 14/10/24***	***852;801;750;700;640;563***		***$ 0***

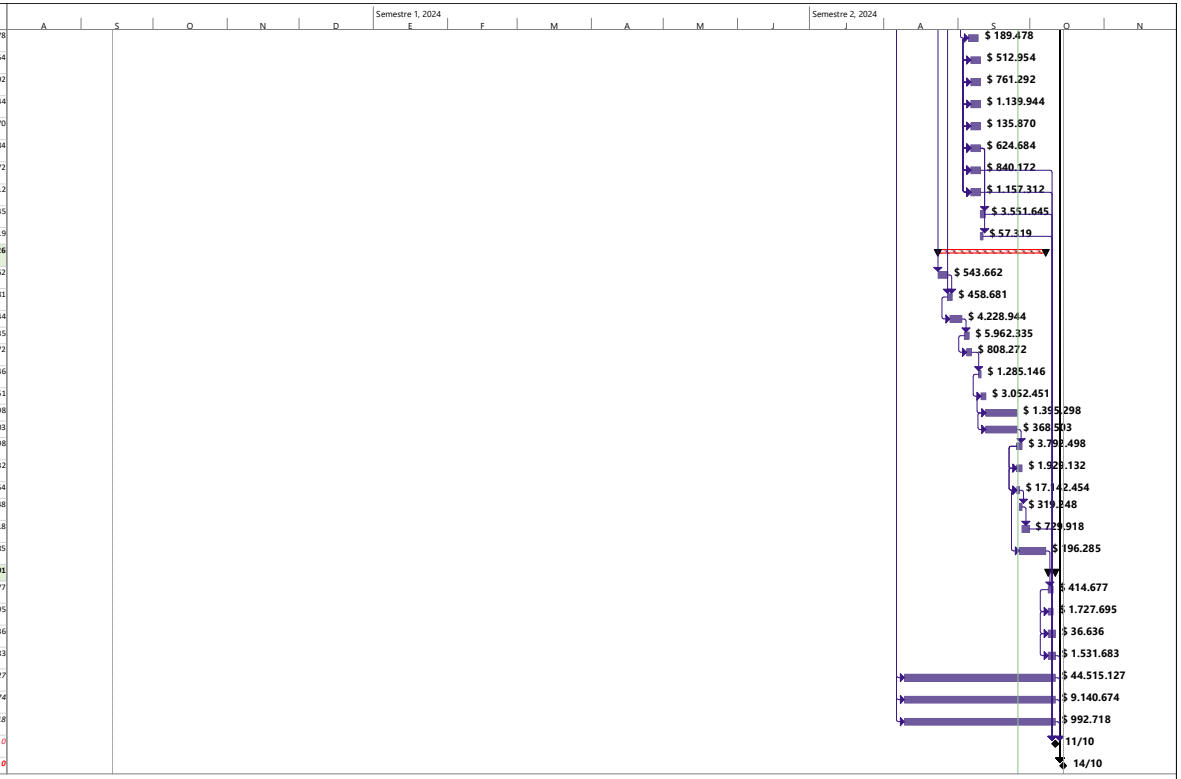

Proyecto: PDT - TUNJUELITO
Fecha: jue 26/09/24

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	
