

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**PRESUPUESTO TEATRO SERVITA - Localidad de Usaquen**	**138,63 días**	**jue 14/09/23**	**mar 13/02/24**		**$ 319.624.052,14**
2		INICIO	0 días	jue 14/09/23	jue 14/09/23		$ 0,00
3		ETAPA DE DIAGNOSTICO	28 días	jue 14/09/23	sáb 14/10/23	2	$ 0,00
4		**PRELIMINARES**	**62 días**	**lun 16/10/23**	**vie 22/12/23**		**$ 9.394.314,69**
5		CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	5 días	lun 16/10/23	vie 20/10/23	3	$ 1.601.100,00
6		DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	8 días	mié 1/11/23	jue 9/11/23	5	$ 550.469,94
7		DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	5 días	mié 1/11/23	lun 6/11/23	5	$ 392.489,02
8		DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	10 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	5	$ 92.035,98
9		DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO: LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	10 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	8CC	$ 239.076,00
10		PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE	14 días	lun 13/11/23	mar 28/11/23	11	$ 1.228.508,66
11		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	11 días	mié 1/11/23	lun 13/11/23	9	$ 459.500,93
12		DESMONTE DE PISO	7 días	jue 14/12/23	vie 22/12/23	76	$ 4.031.690,00
13		DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	6 días	mié 22/11/23	mié 29/11/23	15	$ 799.444,16
14		**MUROS TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	87,13 días	vie 20/10/23	mié 24/01/24		**$ 32.200.768,68**
15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS	30 días	vie 20/10/23	mié 22/11/23	5	$ 27.803.054,76
16		ENCHAPE 25 X 35	21 días	lun 1/01/24	mié 24/01/24	29	$ 4.397.713,92
17		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**25,13 días**	**lun 8/01/24**	**lun 5/02/24**		**$ 9.154.042,00**
18		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EP/ES, ASIENTO	3 días	lun 8/01/24	jue 11/01/24	39	$ 1.931.105,00
19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	3 días	mié 24/01/24	sáb 27/01/24	16	$ 1.329.162,00
20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ACOPLE, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	3 días	mié 24/01/24	sáb 27/01/24	22CC	$ 1.641.234,00
21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y	2 días	lun 8/01/24	mié 10/01/24	39	$ 1.622.152,00
22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO	10 días	mié 24/01/24	lun 5/02/24	16	$ 2.522.400,00
23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	2 días	mar 9/01/24	mié 10/01/24	44CC	$ 107.989,00

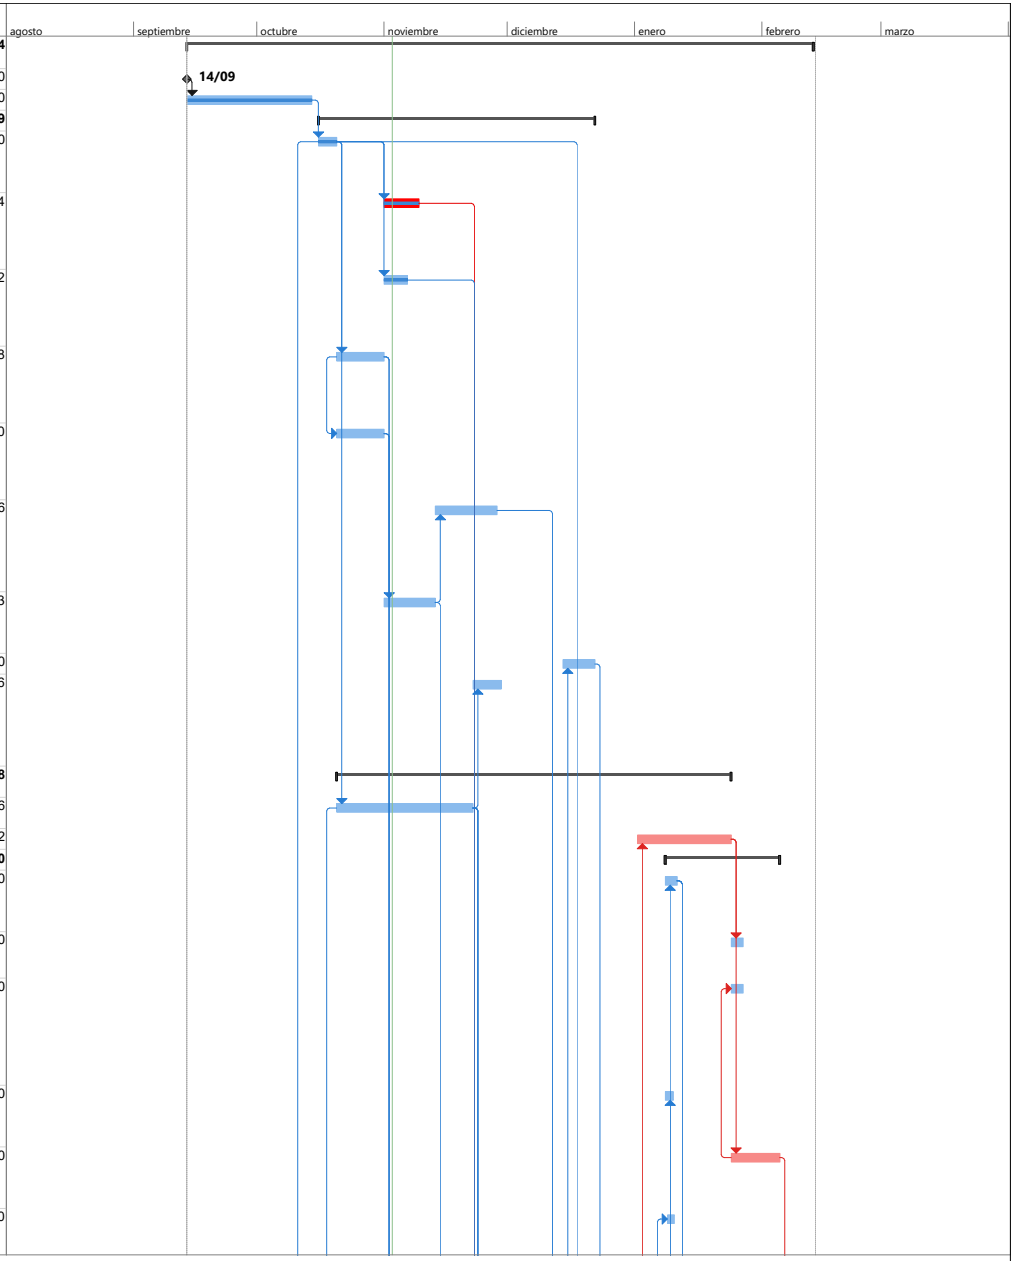

Proyecto: Programación Servita
Fecha: vie 3/11/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
24		**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**35,13 días**	**lun 27/11/23**	**jue 4/01/24**		**$ 3.159.972,00**
25		TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	8 días	lun 27/11/23	mié 6/12/23	67	$ 1.480.800,00
26		REGISTRO CORTINA 3/4"	3 días	lun 1/01/24	jue 4/01/24	29	$ 237.162,00
27		PUNTO SANITARIO 2"	5 días	lun 27/11/23	sáb 2/12/23	25CC	$ 507.190,00
28		TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS	10 días	mar 12/12/23	vie 22/12/23	10	$ 503.855,00
29		punto hidraulico de agua Fria de 1/2"	9 días	vie 22/12/23	lun 1/01/24	28	$ 430.965,00
30		**INSTALACIONES ELECTRICAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**7 días**	**vie 17/11/23**	**sáb 25/11/23**		**$ 854.900,00**
31		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	7 días	vie 17/11/23	sáb 25/11/23	55	$ 854.900,00
32		**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**10 días**	**jue 23/11/23**	**lun 4/12/23**		**$ 22.136.328,83**
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA	10 días	jue 23/11/23	lun 4/12/23	7	$ 8.857.602,83
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	10 días	jue 23/11/23	lun 4/12/23	6	$ 13.278.726,00
35		**PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**25,38 días**	**mié 22/11/23**	**mié 20/12/23**		**$ 15.445.760,40**
36		PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS	3 días	lun 18/12/23	mié 20/12/23	5	$ 2.129.011,92
37		VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	25 días	mié 22/11/23	mié 20/12/23	15	$ 13.316.748,48
38		**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**52 días**	**sáb 16/12/23**	**lun 12/02/24**		**$ 5.704.314,44**
39		PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	20 días	sáb 16/12/23	lun 8/01/24	82	$ 2.948.594,44
40		INSTALACIÓN DE PISO MACHIMBRE	28 días	vie 12/01/24	lun 12/02/24	41CC	$ 1.186.440,00
41		REINSTALACIÓN DE PISO MADERA	28 días	vie 12/01/24	lun 12/02/24	53	$ 1.569.280,00
42		**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**6 días**	**lun 8/01/24**	**lun 15/01/24**		**$ 12.061.266,09**
43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, ANTIÁCIDO,	6 días	lun 8/01/24	lun 15/01/24	39	$ 10.964.428,09
44		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30,	5 días	mar 9/01/24	sáb 13/01/24	29	$ 1.096.838,00
45		**MESONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**5 días**	**lun 27/11/23**	**sáb 2/12/23**		**$ 3.142.953,20**
46		MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	5 días	lun 27/11/23	sáb 2/12/23	67	$ 3.142.953,20
47		**SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA**	**4 días**	**mié 27/12/23**	**lun 1/01/24**		**$ 3.217.240,00**

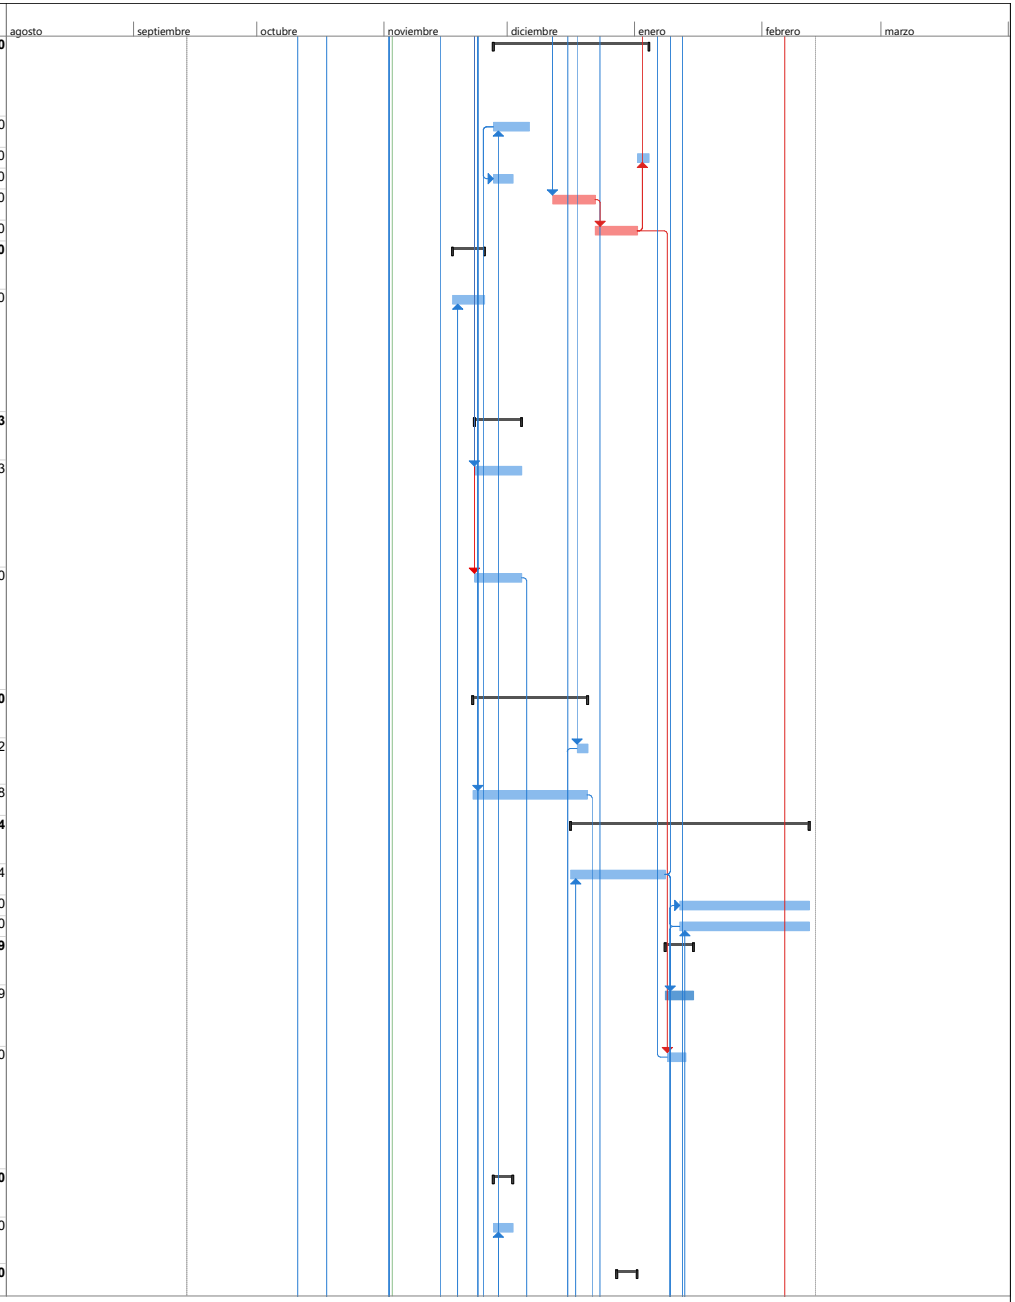

Proyecto: Programación Servita
Fecha: vie 3/11/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
48		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20	4 días	mié 27/12/23	lun 1/01/24	68	$ 3.217.240,00
49		**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**40 días**	**mié 22/11/23**	**vie 5/01/24**		**$ 77.951.159,59**
50		CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO Y	40 días	mié 22/11/23	vie 5/01/24	76CC	$ 77.951.159,59
51		**NO PREVISTOS**	**111,63 días**	**vie 13/10/23**	**mar 13/02/24**		**$ 125.201.032,22**
52		PAÑETES LISO MUROS 1:3 (e=0,03m)	12 días	lun 27/11/23	sáb 9/12/23	67	$ 2.776.589,90
53		DILATACIÓN PLASTICA EN Z	10 días	lun 1/01/24	jue 11/01/24	48	$ 271.418,40
54		MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, APLICACIÓN DE HIDROFUGO 10 AÑOS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y	15 días	lun 18/12/23	mar 2/01/24	36CC	$ 16.110.850,52
55		DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS (CABLES, TOMAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS).	5 días	lun 13/11/23	vie 17/11/23	11	$ 40.480,00
56		DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARA CUALQUIER TAMAÑO, (INCLUYE LIMPIEZA Y AJUSTE SI SE	4 días	mié 20/12/23	lun 25/12/23	37	$ 1.208.324,00
57		PUNTO SANITARIO PVC (4")	8 días	lun 27/11/23	mié 6/12/23	25CC	$ 578.510,00
58		DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDOS EXISTENTES A DOBLE ALTURA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	40 días	mar 24/10/23	jue 7/12/23	71	$ 1.116.226,00
59		DESMONTE, INSTALADA, PULIDA, LACADA Y SELLADO DE GUARDA	10 días	vie 12/01/24	mar 23/01/24	41CC	$ 251.258,00
60		BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	4 días	jue 11/01/24	lun 15/01/24	18	$ 1.106.628,00
61		BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	2 días	jue 11/01/24	vie 12/01/24	18	$ 539.335,00
62		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE FACHADA.	4 días	lun 4/12/23	vie 8/12/23	34	$ 2.630.436,00
63		COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.12x0.15 M.	10 días	mié 27/12/23	lun 8/01/24	68	$ 767.823,70
64		DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE REINTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE GRIFERIA)	8 días	lun 5/02/24	mar 13/02/24	22	$ 460.480,00
65		DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	6 días	mié 1/11/23	mar 7/11/23	9	$ 366.579,72
66		DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	12 días	mié 1/11/23	mar 14/11/23	8	$ 171.735,72
67		MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M	12 días	mar 14/11/23	lun 27/11/23	66	$ 759.041,16
68		LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN ZONA INFERIOR INTERNA DE TARIMA DE TEATRO (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL).	5 días	vie 22/12/23	mié 27/12/23	12	$ 957.060,00
69		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA, PISO CERAMICA (SEGUN PISO INSTALADO)	8 días	lun 8/01/24	mar 16/01/24	39	$ 254.467,50
70		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PVC COLOR	7 días	mié 22/11/23	jue 30/11/23	15	$ 898.767,19
71		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTON CORRUGADO	10 días	vie 13/10/23	mar 24/10/23	5CC	$ 859.440,00
72		MEDIA CAÑA FUNDIDO EN SITIO Y PULIDO (GRANITO PULIDO a= 0,1 m)	6 días	lun 8/01/24	lun 15/01/24	39	$ 1.805.913,60
73		SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC-S	6 días	lun 27/11/23	lun 4/12/23	57CC	$ 285.402,00
74		EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO	8 días	mar 7/11/23	jue 16/11/23	65	$ 263.419,20
75		GRANITO ANCHO MAX 0.15(INCLUYE PULIDA)	5 días	sáb 16/12/23	vie 22/12/23	82	$ 214.062,75
76		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODO CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS	20 días	mié 22/11/23	jue 14/12/23	15	$ 67.118.041,82
77		SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO+CABLE+CAJA)	10 días	lun 27/11/23	jue 7/12/23	67	$ 264.630,00
78		ESTRUCTURA METALICA PARA RECUBRIMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS.	30 días	vie 20/10/23	mié 22/11/23	15CC	$ 16.806.243,06
79		SALIDA CON LUMINARIA PANEL LED RD 24 W	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	55	$ 676.305,00
80		DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO	5 días	mié 1/11/23	lun 6/11/23	8	$ 25.167,22

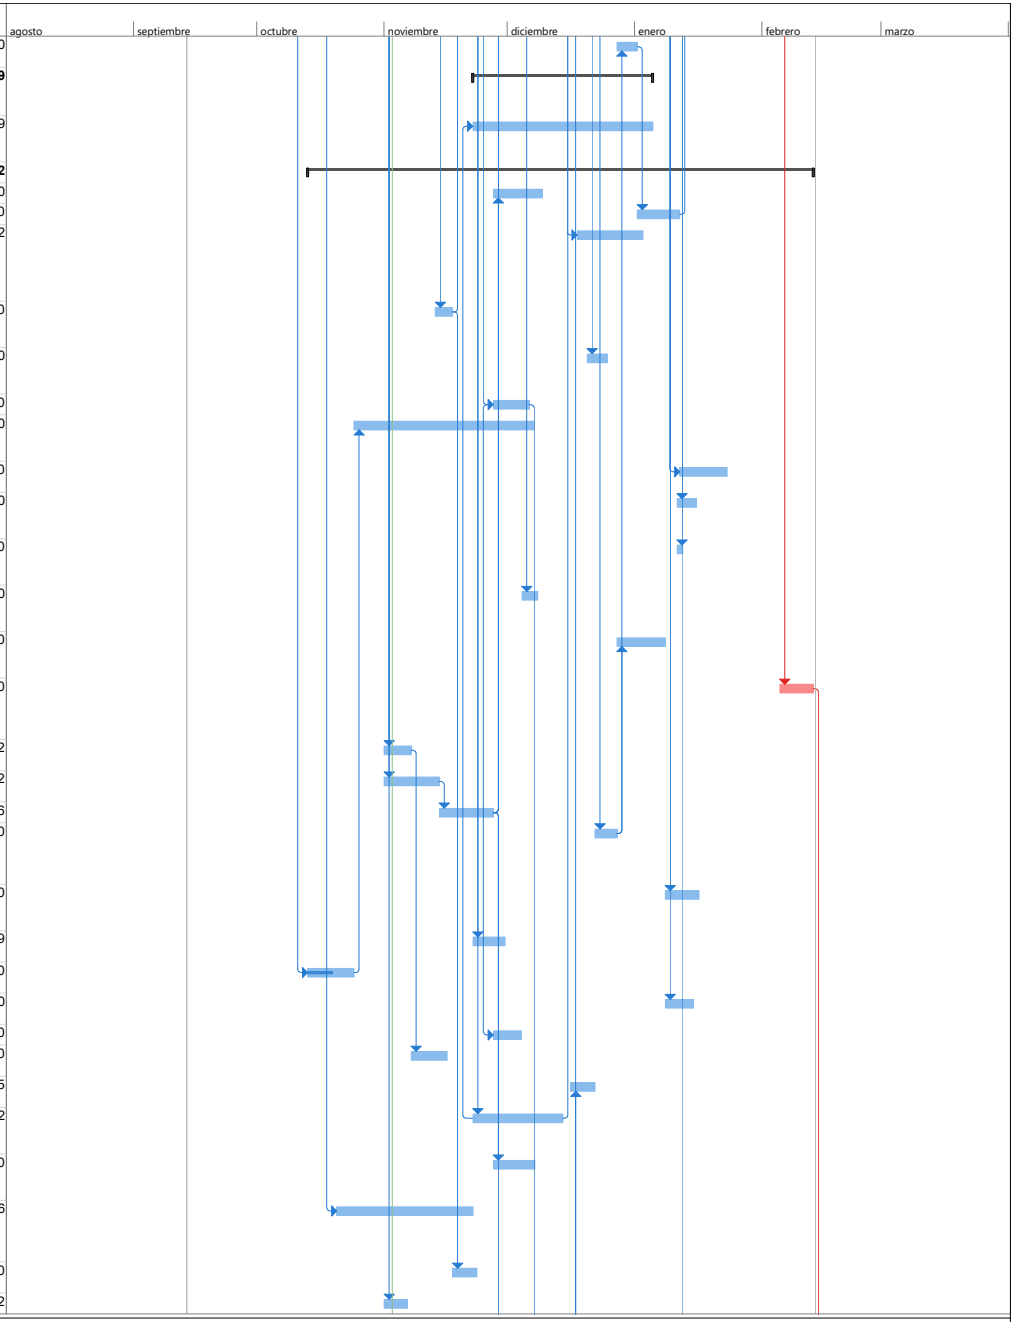

Proyecto: Programación Servita
Fecha: vie 3/11/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
81		ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E	5 días	jue 11/01/24	mar 16/01/24	18	$ 852.543,51
82		ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h	10 días	mié 6/12/23	sáb 16/12/23	57	$ 481.542,75
83		BASE PLACA CONCRETO POBRE 1500 PSI, ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE	8 días	lun 27/11/23	mié 6/12/23	67	$ 4.282.310,50
84		FIN	0 días	mar 13/02/24	mar 13/02/24	64	$ 0,00



Proyecto: Programación Servita
Fecha: vie 3/11/23

Tarea
Resumen del proyecto
Tarea manual
solo el comienzo
Fecha límite
Hito de línea base
División
Tarea inactiva
solo duración
solo fin
Tareas críticas
Resumen de línea base
Hito
Hito inactivo
Informe de resumen manual
Tareas externas
División crítica
Progreso
Resumen
Resumen inactivo
Resumen manual
Hito externo
Línea base
Progreso manual
