20246000015092
Rad: 20246000015092
Fecha: 04-SEP-2024 09:53
Asunto: KAREEN VANESSA PINZON RAMIREZ CUENT
Usua: ASANCHEZG Dest: Dep 600 No.Folios: 47
Rem: KAREEN VANESSA PINZO

Bogotá D.C., 03 de Septiembre de 2024

Cuenta de Cobro Nº 004

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P
DISPAC S.A. E.S.P
NIT 818.001.629-4

DEBE A:

KAREEN VANESSA PINZON RAMIREZ
C.C. 1.023.942.176 de Bogotá (Cund).

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES DE PESOS M/c ($7.000.000)

Por concepto de:

- Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Agosto de 2024.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 200-763874-61

Cordialmente,



Kareen Vanessa Pinzón Ramírez
C.C. 1.023.942.176

Registro Presupuestal: 5100003039

CERTIFICADO - RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTAS DE TRABAJO

Bogotá D.C.

Señores:
DISPAC S.A. E.S.P
Bogotá D.C

Yo, Kareen Vanessa Pinzón Ramírez, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.023.942.176 expedida en Bogotá D.C, para efectos de disminuir la base de retención en la fuente por rentas de trabajo, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que la información señalada en este documento corresponde a la factura y/o documento equivalente aportado a la empresa DISPAC SA ESP.

		SI	NO
1.	Soy residente en Colombia	X	___
2.	Se tomará los costos y deducciones asociadas a dichas rentas	___	X

3. Ingresos No Constitutivos de Renta:

3.1. Valores aportados en la planilla de seguridad social atribuibles a la factura objeto de pago

Aportes obligatorios a salud	$ 352.500
Aportes obligatorios a pensión	$ 451.200
Aportes a ARL	$ 14.800

3.2. Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS $0.

Se adjunta:

☐ Planilla de seguridad social pagada

4. Deducciones:

3.1. Declaración de Dependientes

Certifico bajo la gravedad de juramento que la(s) siguiente(s) persona(s) depende(n) económicamente de mí, y que cumplen con los términos y requisitos establecidos en el artículo 387 del Estatuto Tributario y no han sido incluidas por otras personas para usar la deducción por dependientes que establece el mencionado artículo:

Nombre	Identificación	Parentesco	Edad
N/A	N/A	N/A	N/A

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito que me sean aplicadas las deducciones por dependientes que se marcan a continuación como “Deducción a solicitar”, y adjunto los respectivos documentos soporte exigidos:

- ☐ Registro civil de nacimiento.
- ☐ Certificación de las instituciones de educación superior certificadas por el ICFES o autoridad oficial correspondiente.
- ☐ Certificación expedida por la entidad promotora de salud EPS o, por medicina legal.
- ☐ Certificación firmada por contador público de ausencia de ingresos.

3.2. Intereses de vivienda

El valor de los intereses pagados por concepto de vivienda deducibles de la base de retención en la fuente es de: $0. Este valor no ha sido ni será incluido por otras personas, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificación expedida por la entidad financiera de los intereses pagados durante el periodo 2024.

3.1. Pagos por salud

El valor de los pagos por salud (medicina prepagada y/o seguros) deducibles de la base de retención en la fuente es de: $0, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificación de los pagos realizados en el año 2024 expedido por las empresas de medicina prepagada o compañías de seguros.

4. Rentas exentas

4.1. El valor de los aportes AFC susceptibles de ser considerados como renta exenta para efectos de la retención en la fuente es de $0, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificado expedido por la entidad financiera correspondiente.

4.2. El valor de los aportes a fondos de pensiones voluntarios y/o seguros privados de pensiones susceptibles de ser considerados como renta exenta para efectos de la retención en la fuente es de $ 0, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificado expedido por el Fondo de Pensiones.

Con el presente documento certifico que, en el momento de tener algún cambio en mi calidad tributaria, esta será informada oportunamente.

La presente certificación se expide a los 03 días del mes de Septiembre del año 2024, dirigida a DISPAC S.A. E.S.P quien la utilizará únicamente para los fines descritos al inicio de esta.

NOMBRE **KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ**

FIRMA 

IDENTIFICACIÓN **1.023.942176**

	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	Código	F40-41-12
dispac La energía del Chocó		Versión	01
		Fecha	4/9/2020

CIUDAD			
FECHA DE OPERACIÓN	Día	Mes	Año

N°: DSB -

Autorizado del prefijo DSB 2001 al 3000, Vigencia 12 meses según Res. DIAN 18764017774450 del 08/09/2021

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
NIT: 818.001.629 - 4
Carrera 7 N° 24-76 Quibdó - Chocó
AV. Calle 26 N° 69D 91 Torre 1 of. 804 Bogotá D.C.
Teléfonos: (4) 6726172 - (1) 4672205

NOMBRE DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO: **KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ**

NIT/CC: **1023942176** **E-MAIL:** vanessapinzonr@gmail.com

DIRECCIÓN: **Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial Arrecife T. Peatonal, Of. 804**

TELÉFONO: **467 2203 - 467 2204 - 467 2205** **CELULAR:** **3204180576**

DOCUMENTO SOPORTE PARA LA PROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLE en Compras de Bienes o Servicios a **Persona Natural,** no comerciantes o no responsables de IVA. según resolucion DIAN 0042 de 2020, artículo 771-2 del Estatuto Tributario, y los artículos 1.6.1.4.12. y 1.6.1.4.13. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Contrato DG-070-2024, relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY." por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Agosto de 2024.	$ 7.000.000	$ 7.000.000
VALOR EN LETRAS:	**SIETE MILLONES DE PESOS MCTE**		

KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL VENDEDOR

ELABORADO POR

Declaro bajo la gravedad del juramento que no estoy obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente y no soy responsable de IVA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023942176		PINZON RAMIREZ KAREEN VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 27 # 49 - 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	828190811	9470734423	I	2024/09/18	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	$818,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1023942176	PINZON KAREEN	25-14	30	$2,820,000	$451,200	EPS005	30	$2,820,000	$352,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,820,000	$14,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,820,000**	**$451,200**			**$2,820,000**	**$352,500**			**$0**	**$0**			**$2,820,000**	**$14,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$451,200	$0	$0	$451,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$451,200	$0	$0	$451,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,800	$0	$0	$14,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,800	$0	$0	$14,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,500	$0	$0	$352,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$352,500	$0	$0	$352,500
TOTAL				1	$818,500	$0	$0	$818,500

2024/08/25 07:46 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141038157856

(415)7707212489984(8020) 000014103815785 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 3 9 4 2 1 7 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 3 9 4 2 1 7 6	2 0 1 3 0 5 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PINZON	RAMIREZ	KAREEN	VANESSA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 27 49 07 AP 401

42. Correo electrónico: Vanessapinzonr@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 0 7 5 6 8	3 2 0 4 1 8 0 5 7 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 7 0 4 2 8	4 3 9 0	2 0 1 7 0 4 2 8			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 03 / 11 : 53: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PINZON RAMIREZ KAREEN VANESSA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 818.001.629-4

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5100003039

DATOS GENERALES

Fecha del documento:	14.05.2024		
Fecha de contabilización:	14.05.2024		
Creado por:	MAGUIRRE	Modificado por:	TBENITEZ
Creado el	14.05.2024	Ultima modificación:	15.05.2024

DATOS ADICIONALES

Objeto:	AMP.SERV.ASES.TECN.ADMIN.INFORM.PROY,SGR,GESPROY	Total :	49.000.000

POSICIÓN DE DOCUMENTO 001

Objeto:	VANESSA.PINZON.PREST.SERV.ASES.TEC.ADM.SGR.GESPROY		
Acreedor:	1023942176 - KAREEN VANESSA PINZO	Fecha de vencimiento:	31.12.2024
CDP No.:	3100002239 / 001		
Pos. presup.:	B05010100100701 -	Centro gestor:	CG10 - GER.GENERAL DISPAC
Fondos:	2024 - FONDO GENERAL	Prog. presupuestal:	C1000 - Gastos FUN, OC ,DEU
Importe:	49.000.000 pesos	Area funcional:	

Se expide a los 14 días del mes de mayo del año 2024.

Contabilizado presupuesto: TANIA AMARUC BENITEZ RODRÍGUEZ

Bogotá DC, septiembre 3 de 2024

Doctor
JORGE JULIAN QUINTERO POLO
Representante Legal Suplente
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO – DISPAC S. A. E.S.P
Ciudad**.**

Respetado Doctor:

En mi calidad de SUPERVISORA del contrato DG-070-2024 relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY, que se ha suscrito con KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ, me permito certificar que el desarrollo de actividades ha venido siendo atendido de conformidad, por lo tanto, emito mi visto bueno, para el trámite correspondiente al pago pactado.

Agradezco su atención,

MELISSA RODRIGUEZ
Supervisor contrato DG-070-2024

Proyectó	Elaboró	Revisó	No. de folios	Anexos
* MRODRIGUEZ *	*MRODRIGUEZ*	MRODRIGUEZ	1	1

ING. VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

Bogotá D.C, 03 de Septiembre de 2024

Señores
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICIO S.A. E.S.P.- DISPAC
Atn. **ING. MELISSA MARIA RODRIGUEZ**
Av. Calle 26 No 69 D- 91, Torre 1 Oficina 804, Centro Empresarial Arrecife
Tel: (571) 4672203
Bogotá D.C

Asunto: Informe número 004 de actividades correspondientes al contrato DG-070-2024.

Estimada ingeniera.

En el siguiente informe se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2024, en el marco del contrato DG-070-2024 relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY.

1. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. **Realizar el registro y actualización de la información en la plataforma GESPROY relacionada con los proyectos y los contratos derivados de este, en cumplimiento con el sistema de seguimiento, monitoreo y ejecución de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   Se realiza el cargue de información de los proyectos a cargo de DISPAC en la plataforma GESPROY, y se notifica vía correo electrónico a los supervisores y coordinadora de los proyectos para aprobación y posterior aprobación y envío en la plataforma, tal como se evidencia en el Anexo 1 del presente informe de actividades.

2. **Realizar la programación de los hitos de la contratación derivada de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   No se ejecuta la actividad por la etapa en la que se encuentran los proyectos.

3. **Realizar el registro de la información de la supervisión de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   Se verifica la información de los supervisores de los contratos a fin de garantizar que esta esté completa y conforme a la realidad de cada proyecto.

4. **Proyectar los informes de ejecución y cargue de GESPROY, de acuerdo con la información suministrada por el responsable de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   Se realizan los informes de ejecución y cargue del proyecto, los cuales son enviados a los supervisores y a la coordinadora de proyectos vía correo electrónico – Ver Anexo 1.

5. **Atender las consultas que se desprendan de los reportes, las alertas y novedades de la plataforma GESPROY:**

   Se atienden y contestan las inquietudes que surgen a raíz de los reportes previa aprobación y envío de la información en la plataforma.

6. **Verificar o registrar la marcación de los indicadores de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.**

   No se ejecuta la actividad por la etapa en la que se encuentran los proyectos, sin embargo se registra el avance en los indicadores y metas de productos de los proyectos que están en ejecución.

7. **Realizar la creación, modificación y eliminación de rubros, CDP, procesos precontractuales, contratos, registros presupuestales, pagos, e incorporación del presupuesto en el aplicativo GESPROY de los proyectos que se requieran:**

   Se realiza la revisión y actualización de los contratos que se encuentran en ejecución, suspendidos y terminados, así mismo, se registran las modificaciones (Otrosí, suspensiones o reinicios) de los contratos asociados a los proyectos.

8. **Realizar los ajustes a los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías dentro de las oportunidades establecidas:**

   Para este mes no se realiza ningún ajuste relevante en los proyectos.

9. **Realizar el cargue mensual de la ejecución de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías y reporte de la contratación:**

   Como se evidencia en los puntos anteriores, se realiza el cargue para el mes de Junio de la información de ejecución de los proyectos. Ver Anexo 1.

10. **Verificar la creación y vinculación de terceros, tales como los contratistas y supervisores, en la plataforma GESPROY.**

    Se verifica la información en la plataforma y se corrobora que está completa.


11. **Realizar el reporte de ejecución de bienes y servicios de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

    Se carga el reporte de ejecución de bienes y servicios de acuerdo con lo reportado en el mes por los supervisores de los proyectos, para los proyectos en los cuales aplica el reporte.

12. **Revisar y actualizar la información reportada para garantizar que se obtenga el adecuado desempeño en la medición del IGPR de la empresa:**

    Se reporta el avance de ejecución mensual conforme lo indicado y aprobado por los supervisores de los contratos en la reunión mensual para revisión y cargue de información de GESPROY.


    Se muestran los resultados de la medición del IGPR para el segundo trimestre del 2024, en donde, DISPAC S.A. E.S.P, alcanza una medición del 90,2 sobre 100 puntos posibles.

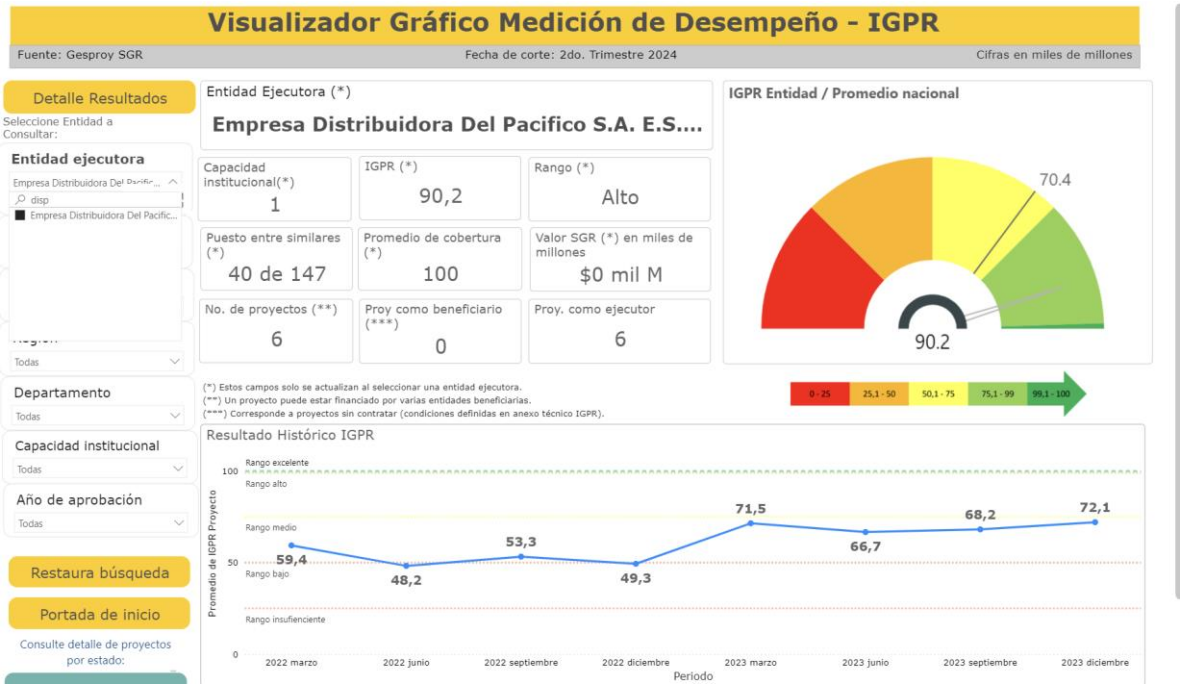


13. Realizar en términos generales los reportes y seguimiento en las diferentes plataformas del Sistema General de Regalías del proyecto y de los contratos derivados del mismo:

Como se evidencia en los puntos anteriores, se realiza el cargue para el mes de Junio de la información de ejecución de los proyectos, así mismo, se realiza el aprueba y envía de los proyectos de la siguiente manera:


- **PROYECTO BPIN 2021002440035 - GUAJIRA FASE 2**

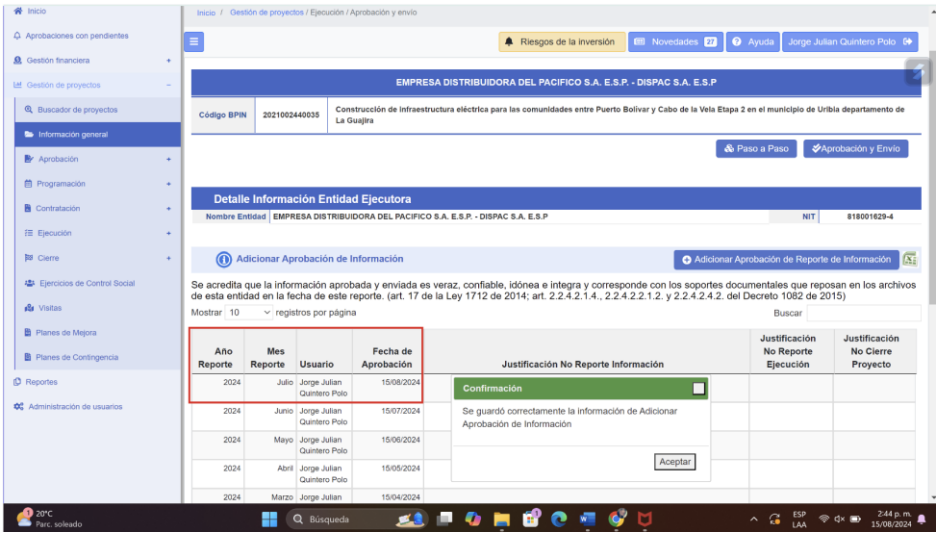

- **PROYECTO BPIN 2021005940004 – BARRANCOMINAS**

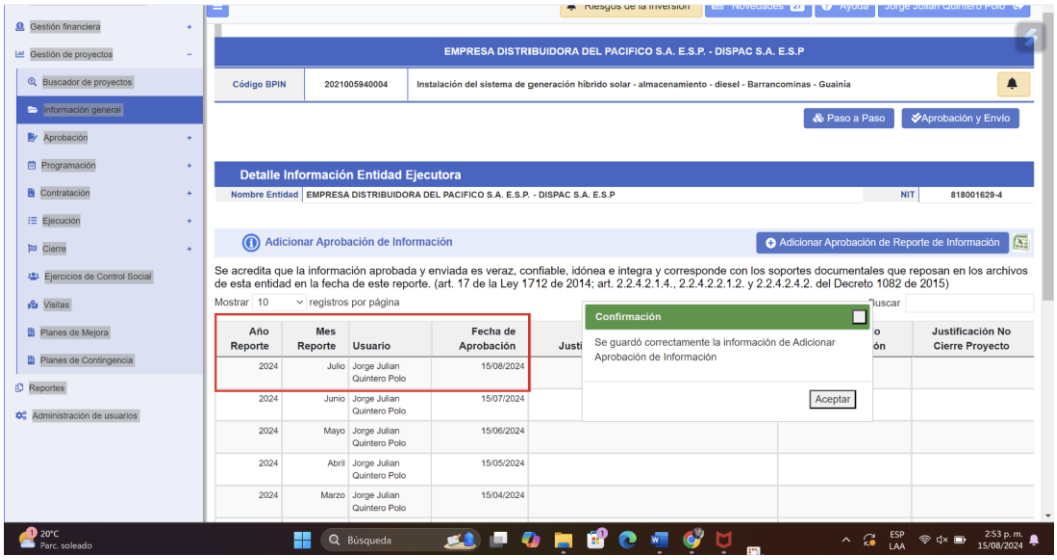

- **PROYECTO BPIN 20201301010353 – CAUCA NARIÑO**

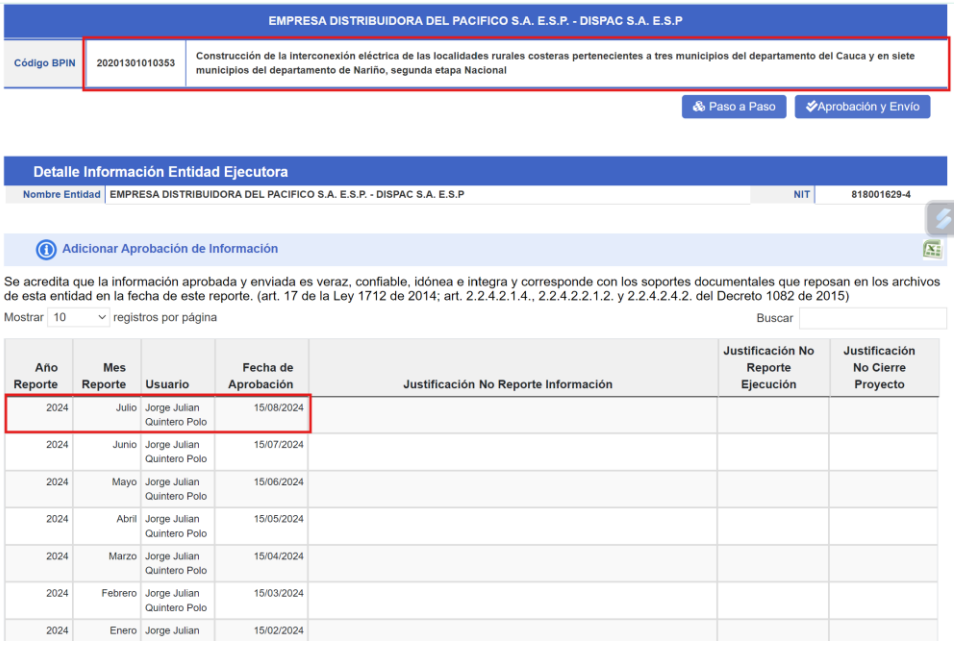

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301010353	Construcción de la interconexión eléctrica de las localidades rurales costeras pertenecientes a tres municipios del departamento del Cauca y en siete municipios del departamento de Nariño, segunda etapa Nacional

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P | NIT: 818001629-4


Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Julio	Jorge Julian Quintero Polo	15/08/2024			
2024	Junio	Jorge Julian Quintero Polo	15/07/2024			
2024	Mayo	Jorge Julian Quintero Polo	15/06/2024			
2024	Abril	Jorge Julian Quintero Polo	15/05/2024			
2024	Marzo	Jorge Julian Quintero Polo	15/04/2024			
2024	Febrero	Jorge Julian Quintero Polo	15/03/2024			
2024	Enero	Jorge Julian	15/02/2024			

- **PROYECTO BPIN 20201301010463 – SIMITI**
-

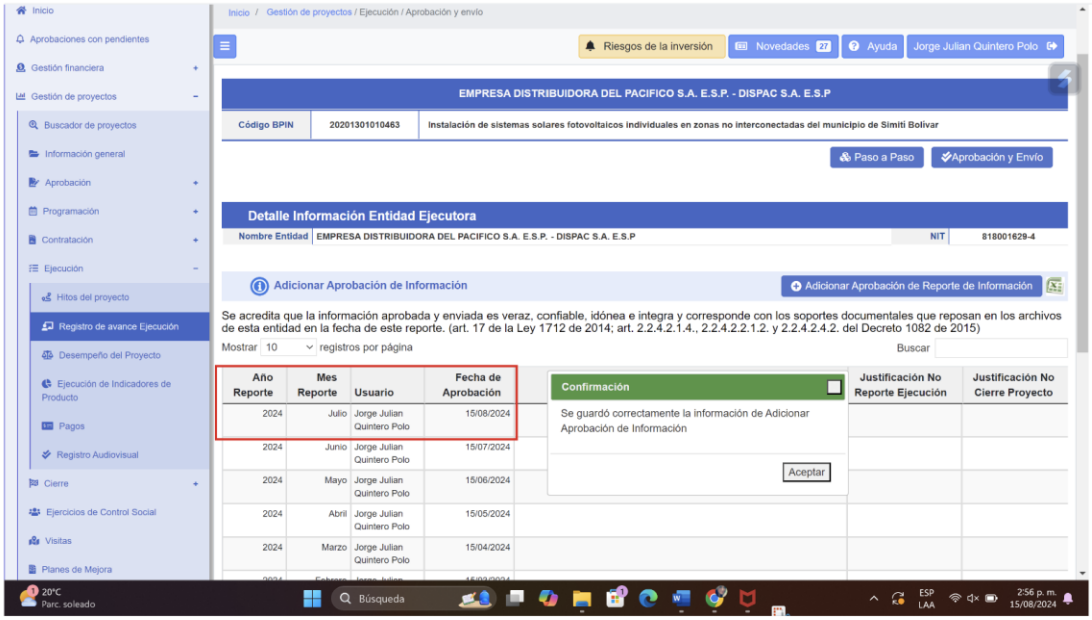

Inicio / Gestión de proyectos / Ejecución / Aprobación y envío

Riesgos de la inversión | Novedades 27 | Ayuda | Jorge Julian Quintero Polo

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301010463	Instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas no interconectadas del municipio de Simiti Bolivar

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P | NIT: 818001629-4

Adicionar Aprobación de Información | Adicionar Aprobación de Reporte de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página — Buscar


Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Julio	Jorge Julian Quintero Polo	15/08/2024		
2024	Junio	Jorge Julian Quintero Polo	15/07/2024		
2024	Mayo	Jorge Julian Quintero Polo	15/06/2024		
2024	Abril	Jorge Julian Quintero Polo	15/05/2024		
2024	Marzo	Jorge Julian Quintero Polo	15/04/2024		

Confirmación


Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información

Aceptar


- **PROYECTO BPIN 20201301010558 - CARMEN DE BOLIVAR**

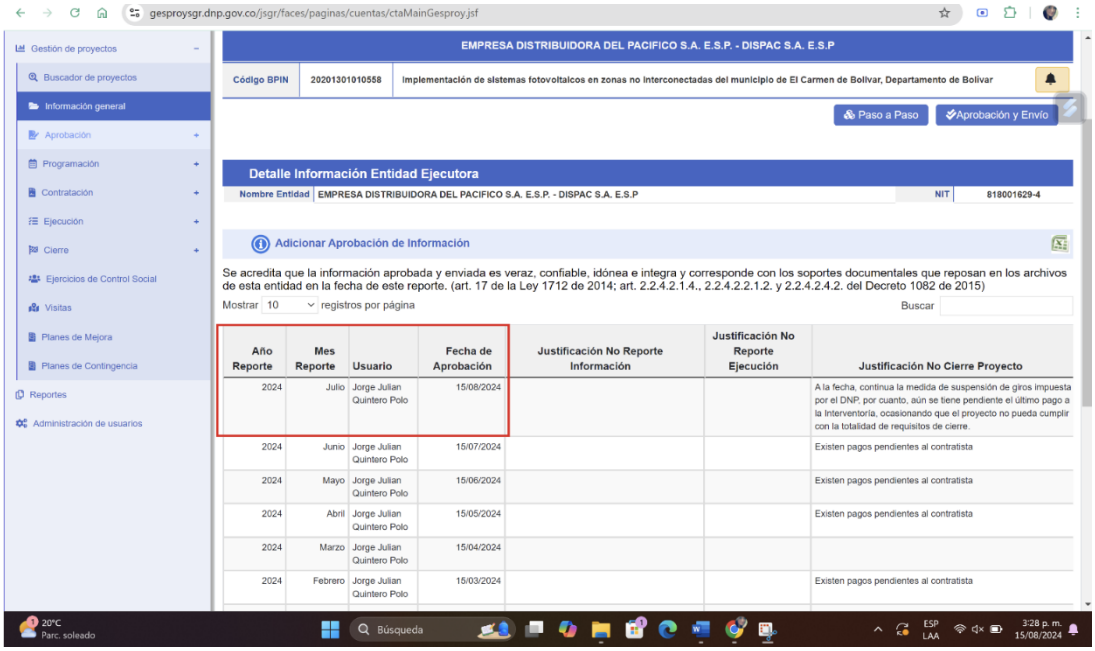


- **PROYECTO BPIN 20201301010861 - PUEBLO BELLO**

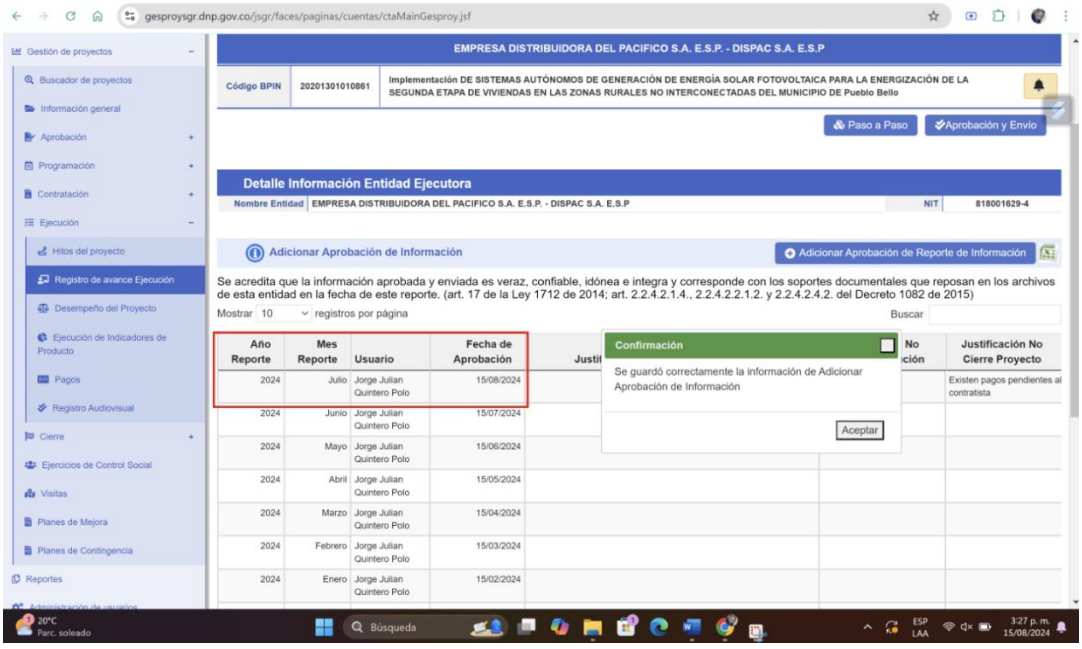


- **PROYECTO BPIN 20201301011070 – NOVITA**

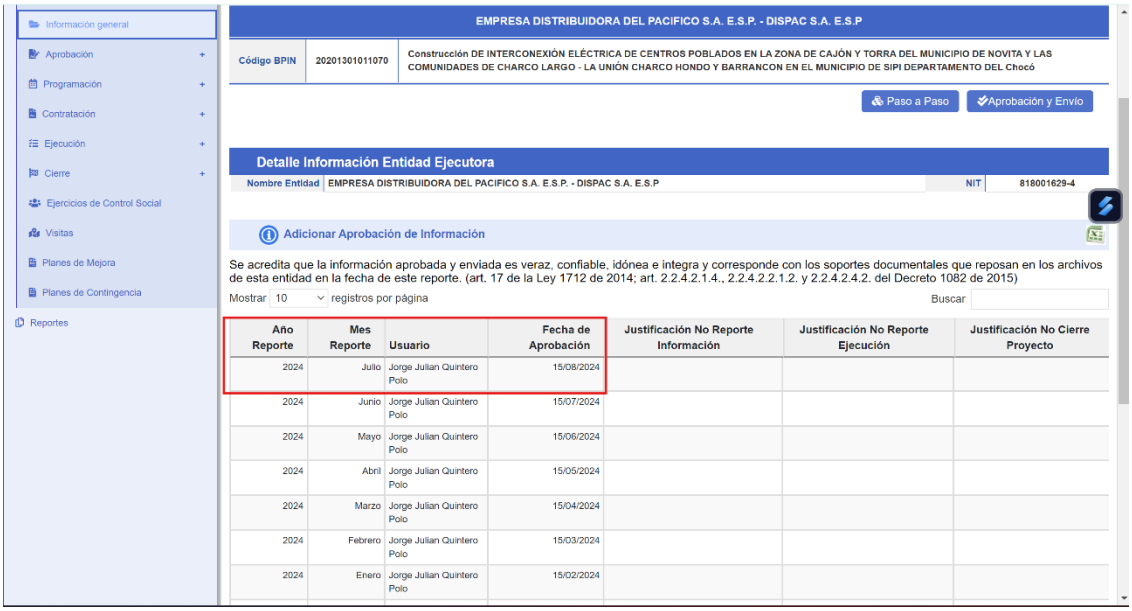

- **PROYECTO BPIN 20201301011744 – CIÉNAGA**

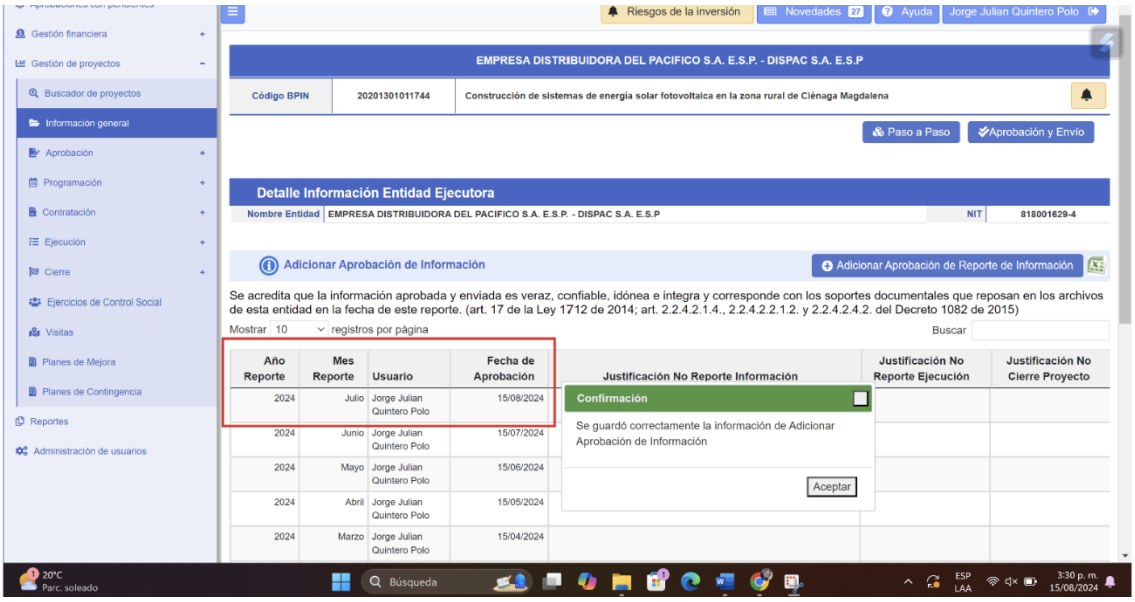

- **PROYECTO BPIN 20201301011863 – CIÉNAGA**

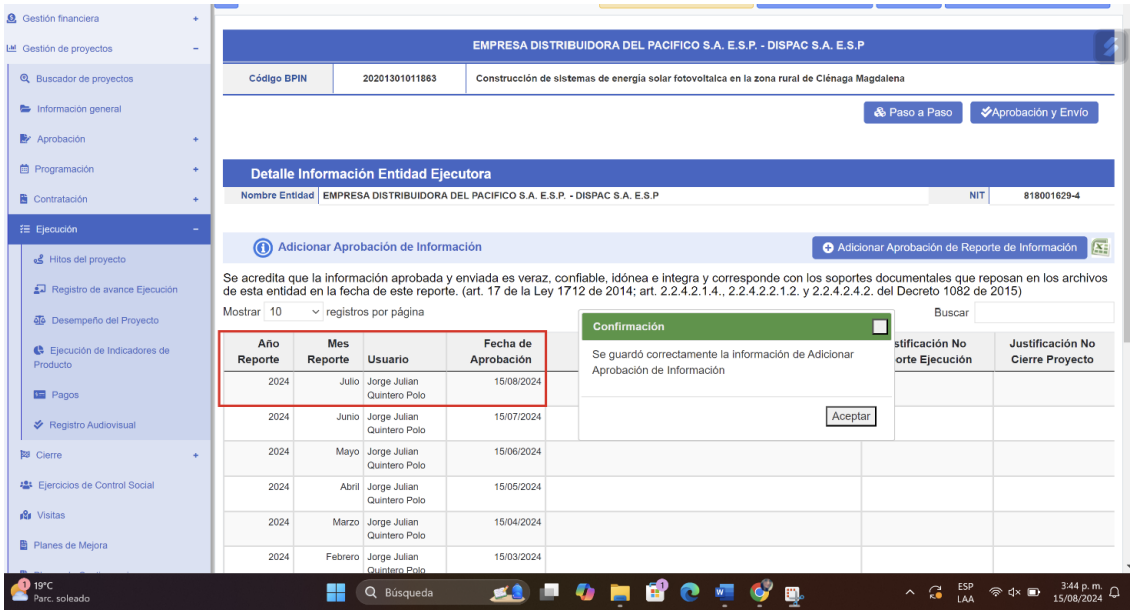

14. **Participar en las reuniones con el DNP, OCAD PAZ, y aquellas entidades en donde se requiera para tratar los asuntos relacionados con el manejo de la plataforma por parte de la empresa.**

    Se asiste reuniones programadas con respecto a la ejecución de los proyectos de regalías.

Cordialmente,

ING. KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ
Ing. Civil
Magister en Gerencia de Proyectos

K V
A R

ING. VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

ANEXO 1 –

INFORMES DE CARGUE DE EJECUCIÓN

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

CARGUE GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010353 CAUCA NARIÑO - JULIO 2024

2 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 12:16
Para: Ulpiano Plaza Pastrana <ingulplapa@yahoo.com.ar>, Andres Felipe Horta Rojas <ahorta@dispac.com.co>
Cc: Jorge Julian Quintero Polo <jquintero@dispac.com.co>

Buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 20201301010353 - Cauca Nariño en la plataforma GESPROY.


Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Julio de 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Julio de 2024** se carga la siguiente información de ejecución, así:

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se carga el replanteo al 89%, de acuerdo con lo informado por la interventoría.




Se cargan las siguientes observaciones a la ejecución:



A hoy el proyecto se encuentra contratado y ejecución, con **0 alertas** para DISPAC.


En su ejecución física se tiene un 1,41% y ejecución financiera un 1,55%.



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EFICIENCIA - CURVA S:

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S



Periodos

Línea	1 oct-21	2 nov-21	3 dic-21	4 ene-22	5 feb-22	6 mar-22	7 abr-22	8 may-22	9 jun-22	10 jul-22	11 ago-22	12 sep-22	13 oct-22	14 nov-22	15 dic-22	16 ene-23	17 feb-23	18 mar-23	19 abr-23	20 may-23	21 jun-23	22 jul-23	23 ago-23	24 sep-23	25 oct-23	26 nov-23	27 dic-23	28 ene-24	29 feb-24	30 mar-24	31 abr-24	32 may-24	33 jun-24	34 jul-24	35 ago-24	36 sep-24
* Valor Planeado (PV)	0,80000899	51	132	260	410	713	1016	1333	1617	2062	2694	3781	6685	16827	26890	38446	57394	81117	105865	131565	157795	181668	196942	203724	212158	222532	235986	255780	272811	286430	299540	309850	317083	317366	317467	317840
* Valor Ganado (EV)	0,800001	51	132	260	410	706	936	1034	1161	1267	1367	1604	1755	1882	2685	2679	2718	2764	2815	2867	3009	3067	3159	3211	3268	3859	3956	3971	4485							
* Costo Actual (AC)	0,79999999	51	132	260	410	610	689	785	912	1018	1118	1604	1846	1972	2755	2768	2807	2853	2905	2956	3098	3157	3248	3300	3358	3949	4045	4060	4574							
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	0,99	0,92	0,78	0,72	0,61	0,51	0,42	0,26	0,11	0,10	0,07	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02							
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	1	1	1	1,16	1,36	1,32	1,27	1,24	1,22	1	0,95	0,95	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98							
Retraso SV(t) Meses		0,10	0,07	0,10	0,10	0	0,33	1	1,63	2,30	3	3,20	3,80	4,57	4,20	5,20		7,07	8,03	9	9,90	10,83	11,80	12,77	13,73		15,20	16,23	17,07							

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--
--
Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Andres Felipe Horta Rojas <ahorta@dispac.com.co> 15 de agosto de 2024, 17:25
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Ulpiano Plaza Pastrana <ingulplapa@yahoo.com.ar>, Jorge Julian Quintero Polo <jquintero@dispac.com.co>

Cordial saludo.

En atención a su solicitud, y conversado con el ing. Quintero en su calidad de supervisor del proyecto, este último autoriza el reporte de la información al aplicativo.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
[El texto citado está oculto]
--

Cordialmente,

ANDRÉS HORTA ROJAS
Secretario General
ahorta@dispac.com.co
6014672203 - 6044672204
Av. calle 26 No. 69 d 91 Oficina 804 Torre 1
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301011070 - NOVITA - JULIO 2024

2 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 15 de agosto de 2024, 11:44
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>, Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenos días.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301011070** - **Novita**, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día 8 de agosto.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Julio 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se carga avance así:



Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR APOYOS BT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	1.4.1 Suministro de poste de fibra de vidrio de 8MX510 kgf	und	22	100	No	Inicial																															
						Prog	87	507.611,23	44.162.177															43	44													
						Eje	87	507.611,23	44.162.177															43	44													
2	1.4.2 Transporte de poste de fibra de vidrio de 8MX510 kgf	und	22	25	No	Inicial																															
						Prog	87	507.611,23	44.162.177																							17	18	18	17	17		
						Eje	21,75	507.611,23	11.040.544,25																							4,35	4,35	4,35	4,35	4,35		
3	1.4.3 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 8MX510 kgf	und	23	11,49	No	Inicial																															
						Prog	87	522.993,39	45.500.425																												29	29
						Eje	20	522.993,4	10.459.868																												10	10
4	1.4.4 Suministro de poste de fibra de vidrio de 8MX750 kgf	und	08	100	No	Inicial																															
						Prog	25	635.357,68	15.883.942															12	13													
						Eje	25	635.357,68	15.883.942															12	13													
5	1.4.5 Transporte de poste de fibra de vidrio de 8MX750 kgf	und	08	21,4	No	Inicial																															
						Prog	25	635.357,68	15.883.942																							5	5	5	5	5		
						Eje	5,35	635.357,94	3.399.165																							1,07	1,07	1,07	1,07	1,07		
6	1.4.6 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 8MX750 kgf	und	08	8	No	Inicial																															
						Prog	25	654.610,92	16.365.273																												8	8
						Eje	4	654.611	2.618.444																												2	2
7	1.4.7 Construcción civil para Cimentación para poste de 8 m	und	36	0	No	Inicial																															
						Prog	112	637.957,38	71.451.227																												56	56
						Eje		0	0																													

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA A TIERRA BT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	1.6.1 Suministro de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010)	und	04	100	No	Inicial																															
						Prog	55	161.707,45	8.893.910															27	28													
						Eje	55	161.707,45	8.893.910															27	28													
2	1.6.2 Transporte de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010)	und	04	20	No	Inicial																															
						Prog	55	161.707,45	8.893.910																							11	11	11	11	11		
						Eje	11	161.707,27	1.778.780																							2,2	2,2	2,2	2,2	2,2		
3	1.6.3 Instalación de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010)	und	05	18,18	No	Inicial																															
						Prog	55	166.607,67	9.163.422																												14	14	14
						Eje	20	166.607,7	3.332.154																												10	10	10

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	1.6.1 Suministro de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010)	und	04	100	No	Inicial																															
						Prog	55	161.707,45	8.893.910															27	28													
						Eje	55	161.707,45	8.893.910															27	28													
2	1.6.2 Transporte de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010)	und	04	20	No	Inicial																															
						Prog	55	161.707,45	8.893.910																							11	11	11	11	11		
						Eje	11	161.707,27	1.778.780																							2,2	2,2	2,2	2,2	2,2		
3	1.6.3 Instalación de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010)	und	05	18,18	No	Inicial																															
						Prog	55	166.607,67	9.163.422																												14	14	14
						Eje	20	166.607,7	3.332.154																												10	10	10

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	1.7.1 Suministro de Transformador Monofásico autoprotegido de 10 KVA	und	.01	100	No		Inicial																														
							Prog	1	1.809.611	1.809.611																		0,25	0,25	0,25	0,25							
							Eje	1	1.809.612	1.809.612																		0,25	0,25	0,25	0,25							
2	1.7.2 Transporte de Transformador Monofásico autoprotegido de 10 KVA	und	.01	30	No		Inicial																														
							Prog	1	1.809.611	1.809.611																									0,5	0,5			
							Eje	0,3	1.809.613,33	542.884																									0,15	0,15			
3	1.7.3 Instalación de Transformador Monofásico autoprotegido de 10 KVA	und	.01	10	No		Inicial																														
							Prog	1	1.864.448	1.864.448																												0,33	0,33
							Eje	0,2	1.864.450	372.890																												0,1	0,1
4	1.7.4 Suministro de Transformador Monofásico autoprotegido de 25 KVA	und	.05	100	No		Inicial																														
							Prog	4	2.564.897,75	10.259.591																		1	1	1	1							
							Eje	4	2.564.898	10.259.592																		1	1	1	1							
5	1.7.5 Transporte de Transformador Monofásico autoprotegido de 25 KVA	und	.05	30	No		Inicial																														
							Prog	4	2.564.897,75	10.259.591																										2	2		
							Eje	1,2	2.564.898,33	3.077.878																										0,6	0,6		
6	1.7.6 Instalación de Transformador Monofásico autoprotegido de 25 KVA	und	.05	0	No		Inicial																														
							Prog	4	2.642.621,75	10.570.487																												1	2
							Eje		0	0																											
7	1.7.7 Suministro de Transformador Monofásico Autoprotegido de 37,5 KVA	und	.03	100	No		Inicial																														
							Prog	2	2.999.273	5.998.546																		0,5	0,5	0,5	0,5							
							Eje	2	2.999.272,5	5.998.545																		0,5	0,5	0,5	0,5							
8	1.7.8 Transporte de Transformador Monofásico Autoprotegido de 37,5 KVA	und	.03	30	No		Inicial																														
							Prog	2	2.999.273	5.998.546																										1	1		
							Eje	0,6	2.999.273,33	1.799.564																										0,3	0,3		
9	1.7.9 Instalación de Transformador Monofásico Autoprotegido de 37,5 KVA	und	.03	10	No		Inicial																														
							Prog	2	3.090.160	6.180.320																												0,66	0,67
							Eje	0,4	3.090.160	1.236.064																												0,2	0,2
	1.7.10 Suministro de																																				

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR TENDIDO RED BT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	1.3.1 Suministro de Cable triplex 2x2 1x2 AWG ACSR	m	.02	100	No		Inicial																														
							Prog	371	8.149,36	3.023.414														185	186													
							Eje	371	8.149,36	3.023.414														185	186													
2	1.3.2 Transporte de Cable triplex 2x2 1x2 AWG ACSR	m	.02	20.22	No		Inicial																														
							Prog	371	8.149,36	3.023.414																						74	74	74	74	75		
							Eje	75	8.149,35	611.201																						15	15	15	15	15		
3	1.3.3 Tendido y tensionado de Cable triplex 2x2 1x2 AWG ACSR	m	.02	0	No		Inicial																														
							Prog	371	8.396,31	3.115.032																												123	124
							Eje		0	0																											
4	1.3.4 Suministro de Cable triplex 2x10 1x10 AWG ACSR	m	.01	100	No		Inicial																														
							Prog	185	10.140,52	1.875.996														92	93													
							Eje	185	10.140,52	1.875.996														92	93													
5	1.3.5 Transporte de Cable triplex 2x10 1x10 AWG ACSR	m	.01	18.92	No		Inicial																														
							Prog	185	10.140,52	1.875.996																						37	37	37	37	37		
							Eje	35	10.140,57	354.929																						7	7	7	7	7		
6	1.3.6 Tendido y tensionado de Cable triplex 2x10 1x10 AWG ACSR	m	.01	32.97	No		Inicial																														
							Prog	185	10.447,81	1.932.844																												61	62
							Eje	122	10.447,8	1.274.632																												61	61
7	1.3.7 Suministro de Cable triplex 2x20 1x20 AWG ACSR	m	.06	100	No		Inicial																														
							Prog	906	12.498,14	11.323.311														453	453													
							Eje	906	12.498,14	11.323.311														453	453													
8	1.3.8 Transporte de Cable triplex 2x20 1x20 AWG ACSR	m	.06	19.87	No		Inicial																														
							Prog	906	12.498,14	11.323.311																						181	181	181	181	182		
							Eje	180	12.498,14	2.249.665																						36	36	36	36	36		
9	1.3.9 Tendido y tensionado de Cable triplex 2x20 1x20 AWG ACSR	m	.06	16.56	No		Inicial																														
							Prog	906	12.876,87	11.666.443																												382	382
							Eje	300	12.876,87	3.863.060																												150	150
10	1.3.10 Suministro de Cable cuadruplex 3xN 2 AWGXLPE 1xN 2 ACSR90600V	m	.06	100	No		Inicial																														
							Prog	1.186	10.142,68	12.029.214														593	593													
							Eje	1.186	10.142,68	12.029.214														593	593													
11	1.3.11 Transporte de Cable cuadruplex 3xN 2 AWGXLPE 1xN 2 ACSR90600V	m	.06	19.81	No		Inicial																														
							Prog	1.186	10.142,68	12.029.214																						237	237	237	237	238		
							Eje	235	10.142,68	2.383.530																						47	47	47	47	47		
12	1.3.12 Tendido y tensionado de Cable cuadruplex 3xN 2 AWGXLPE 1xN 2 ACSR90600V	m	.06	12.65	No		Inicial																														
							Prog	1.186	10.450,83	12.393.737																												395	395
							Eje	300	10.450,83	3.135.010																												150	150
13	1.3.13 Suministro de Cable cuadruplex 3xN 10 AWGXLPE 1xN 10 ACSR90600V	m	.09	100	No		Inicial																														
							Prog	1.403	13.288,9	18.644.328														701	702													
							Eje	1.403	13.288,9	18.644.328														701	702													
14	1.3.14 Transporte de Cable cuadruplex 3xN 10 AWGXLPE 1xN 10 ACSR90600V	m	.09	19.96	No		Inicial																														
							Prog	1.403	13.288,9	18.644.328																						281	281	281	280	280		
							Eje	280	13.288,89	3.728.890																						56	56	56	56	56		
15	1.3.15 Tendido y tensionado de Cable cuadruplex 3xN 10 AWGXLPE 1xN 10 ACSR90600V	m	.1	14.26	No		Inicial																														
							Prog	1.403	13.691,59	19.209.387																												468	468
							Eje	400	13.691,6	5.476.638																												280	280
16	1.3.16 Suministro de Cable cuadruplex 3xN 20 AWGXLPE 1xN 20 ACSR90600V	m	.03	100	No		Inicial																														
							Prog	385	14.374,48	5.534.173														192	193													
							Eje	385	14.374,48	5.534.173														192	193													
17	1.3.17 Transporte de Cable cuadruplex 3xN 20 AWGXLPE 1xN 20 ACSR90600V	m	.03	19.48	No		Inicial																														
							Prog	385	14.374,48	5.534.173																						77	77	77	77	77		
							Eje	75	14.374,47	1.078.085																						15	15	15	15	15		
18	1.3.18 Tendido y tensionado de Cable cuadruplex 3xN 20 AWGXLPE 1xN 20 ACSR90600V	m	.03	18.18	No		Inicial																														
							Prog	385	14.810,06	5.701.875																												128	128
							Eje	140	14.810,87	2.073.410																												78	70

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR APOYOS MT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10	2024 11	2024 12
1	2.3.1 Suministro de poste de fibra de vidrio de 14MX750 kgf	und	3.74	100	No	Inicial																																						
						Prog	472	1.578.877,38	741.454.123															118	118	118	118																	
						Eje	472	1.578.877,38	741.454.123,2															118	118	118	118																	
2	2.3.2 Transporte de poste de fibra de vidrio de 14MX750 kgf	und	3.74	45.55	No	Inicial																																						
						Prog	472	1.578.877,38	741.454.123																			52	52	52	52	53	53	53	53									
						Eje	236	1.578.877,37	370.727.060																			22	22	22	22	21	21	21	21	21								
3	2.3.3 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 14MX750 kgf	und	3.85	11.65	No	Inicial																																						
						Prog	472	1.618.479,72	763.922.430																									67	67	67	67	67	70					
						Eje	66	1.618.479,73	106.819.662																									11	11	11	11	11						
4	2.3.4 Suministro de poste de fibra de vidrio de 14MX1050 kgf	und	3.74	100	No	Inicial																																						
						Prog	78	1.892.859,24	147.643.021															19	19	20	20																	
						Eje	78	1.892.859,24	147.643.021															19	19	20	20																	
5	2.3.5 Transporte de poste de fibra de vidrio de 14MX1050 kgf	und	3.74	32.05	No	Inicial																																						
						Prog	78	1.892.859,24	147.643.021																			8	8	8	9	9	9	9	9									
						Eje	27	1.892.859,19	51.107.198																			3	3	3	3	3	2	2	2	2	2					
6	2.3.6 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 14MX1050 kgf	und	7.7	16.67	No	Inicial																																						
						Prog	78	1.958.218,62	152.117.952																									11	11	11	11	11	12					
						Eje	15	1.958.218,6	29.253.279																									3	3	3	2	2						
7	2.3.7 Suministro de poste de fibra de vidrio de 20MX1050 kgf	und	2.2	100	No	Inicial																																						
						Prog	12	3.643.117,68	43.717.405															3	3	3	3																	
						Eje	12	3.643.117,68	43.717.405															3	3	3	3																	
8	2.3.8 Transporte de poste de fibra de vidrio de 20MX1050 kgf	und	2.2	58.33	No	Inicial																																						
						Prog	12	3.643.117,17	43.717.406																			1	2	2	2	1	1	1	1									
						Eje	7	3.643.117	25.501.819																			1		1		1	1	1	1									
9	2.3.9 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 20MX1050 kgf	und	2.3	16.67	No	Inicial																																						
						Prog	12	3.753.514,67	45.042.176																									1	2	2	2	2	1					
						Eje	2	3.753.915	7.507.830																									1		1								
10	2.3.10 Suministro de torre de 26 m	und	7.2	100	No	Inicial																																						
						Prog	4	35.755.967,75	143.023.871															1	1	1	1																	
						Eje	4	35.755.967,75	143.023.871															1	1	1	1																	
11	2.3.11 Transporte de torre de 26 m	und	7.2	0	No	Inicial																																						
						Prog	4	35.755.968	143.023.872																			0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45									
						Eje		0	0																																			
12	2.3.12 Ahoyada e hincada de torre de 26 m	und	7.4	0	No	Inicial																																						
						Prog	4	36.839.482,25	147.357.929																									0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5				
						Eje		0	0																																			
13	2.3.13 Construcción civil de cimentacion para poste de 14 mts	und	5.17	15.27	No	Inicial																																						
						Prog	550	1.864.840,45	1.025.662.249																									91	92	92	92	92	91					
						Eje	84	1.864.840,48	156.646.600																									21	21	21	21							
14	2.3.14 Construcción civil de cimentacion para poste de 20 mts	und	1.2	16.67	No	Inicial																																						
						Prog	12	1.921.412,75	23.056.953																									2	2	2	2	2	2					
						Eje	2	1.921.413	3.842.826																									1		1								
15	2.3.15 Construcción civil de cimentacion cimentacion 1 punto de apoyo torre de 26 m	und	1.4	33	No	Inicial																																						
						Prog	4	6.819.980	27.276.320																									0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66					
						Eje	1,32	6.819.080,3	9.001.186																									0,66	0,66									

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA A TIERRA MT


No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	2.2.1 Suministro de Puesta a Tierra Cable de Guarda MT	und	12	100	No	Inicial																																	
						Prog	102	225.476,22	22.998.574															25	26	26	25											
						Eje	102	225.476,22	22.998.574															25	26	26	25											
2	2.2.2 Transporte de Puesta a Tierra Cable de Guarda MT	und	12	32.35	No	Inicial																																	
						Prog	102	225.476,22	22.998.574																					11	12	12	11	11	11	11	11			
						Eje	36	225.476,31	8.117.147																					4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2.2.3 Instalación de Puesta a Tierra Cable de Guarda MT	und	12	4.9	No	Inicial																																	
						Prog	102	232.308,83	23.695.501																											14	14	14	15	15	15
						Eje	10	232.308,8	2.323.088																														5	5

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEMPLETES MT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	2.6.1 Suministro, transporte e instalación de Viento Convencional para 13.2 kV (Estructura RAM001)	und	1.65	65.26	No	Inicial																																	
						Prog	665	493.249,42	328.010.862															41	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42
						Eje	465	493.249,42	229.360.980															31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
2	2.6.2 Suministro transporte y mano de obra cimentacion para referida	und	3	65.26	No	Inicial																																	
						Prog	665	893.324,76	594.060.965															41	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42
						Eje	465	893.324,77	415.396.020															31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR TENDIDO RED MT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	2.1.1 Suministro de red trifásica en Cable Ecologico 15 kV ACSR No. 20 (3 fases)	m	3.49	100	No	Inicial																																	
						Prog	31.489	21.961,41	691.542.889																																
						Eje	31.489	21.961,41	691.542.889															7.872	7.872	7.872	7.873														
2	2.1.2 Transporte de red trifásica en Cable Ecologico 15 kV ACSR No. 20 (3 fases)	m	3.49	28.64	No	Inicial																																	
						Prog	31.489	21.961,41	691.542.889																									5.248	5.248	5.248	5.248	5.248	5.249				
						Eje	10.020	21.961,41	220.053.340																									1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
3	2.1.3 Tendido y tensionado de red trifásica en Cable Ecologico 15 kV ACSR No. 20 (3 fases)	m	3.59	15.92	No	Inicial																																	
						Prog	31.489	22.626,91	712.498.734																										5.248	5.248	5.248	5.248	5.248	5.249			
						Eje	5.728	22.626,91	129.606.936																										716	716	716	716	716	716	716	716	716
4	2.1.4 Suministro de red trifásica en Cable Ecologico 15 kv ACSR No. 40 (3 fases)	m	3.47	100	No	Inicial																																	
						Prog	2.311,29	297.474,04	687.548.778																																
						Eje	2.311,29	297.474,04	687.548.777,9															578	578	578	577,29														
5	2.1.5 Transporte de red trifásica en Cable Ecologico 15 kv ACSR No. 40 (3 fases)	m	3.47	35.82	No	Inicial																																	
						Prog	2.311,29	297.474,04	687.548.778																									385	385	385	385	385	386,29				
						Eje	920	297.474,04	273.676.120																									92	92	92	92	92	92	92	92	92	
6	2.1.6 Tendido y tensionado de red trifásica en Cable Ecologico 15 kv ACSR No. 40 (3 fases)	m	3.57	21.81	No	Inicial																																	
						Prog	2.311,29	306.488,41	708.383.590																										385	385	385	385	385	386,29			
						Eje	576	306.488,4	176.537.320																										72	72	72	72	72	72	72	72	
7	2.1.7 Suministro de Cable de acero extramesistente super GX de 14	m	53	100	No	Inicial																																	
						Prog	54.602,7	1.939,36	105.894.212																																
						Eje	54.602,7	1.939,36	105.894.211,99															13.650	13.650	13.650	13.652,7														
8	2.1.8 Transporte de Cable de acero extramesistente super GX de 14	m	53	49.99	No	Inicial																																	
						Prog	54.602,7	1.939,36	105.894.212																									9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.102,7			
						Eje	30.028	1.939,36	58.235.058																									3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	2.730	2.730
9	2.1.9 Tendido y tensionado de Cable de acero extramesistente super GX de 14	m	55	30	No	Inicial																																	
						Prog	54.602,7	1.968,13	109.103.127																										9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.102,7			
						Eje	17.472	1.968,13	34.911.278																										2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	1.092	1.092	

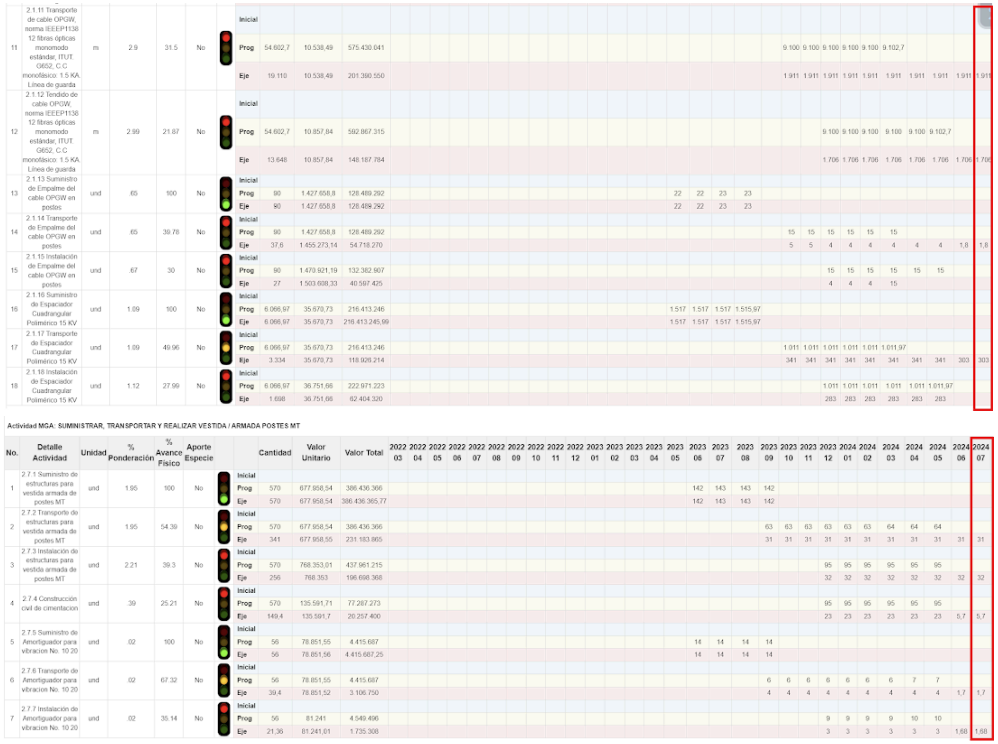


Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR VESTIDA / ARMADA POSTES MT

A hoy el proyecto se encuentra contratado y en ejecución, con **0 alertas.**




En su ejecución física se tiene un 48,64 % y ejecución financiera 50,73% (Pendiente actualización a Julio 2024)



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EFICIENCIA - CURVA S (Pendiente actualización a Julio 2024)

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S



Línea	Periodos																														
	1 mar-22	2 abr-22	3 may-22	4 jun-22	5 jul-22	6 ago-22	7 sep-22	8 oct-22	9 nov-22	10 dic-22	11 ene-23	12 feb-23	13 mar-23	14 abr-23	15 may-23	16 jun-23	17 jul-23	18 ago-23	19 sep-23	20 oct-23	21 nov-23	22 dic-23	23 ene-24	24 feb-24	25 mar-24	26 abr-24	27 may-24	28 jun-24	29 jul-24	30 ago-24	31 sep-24	3 oc 2
* Valor Planeado (PV)	3	6	9	12	54	104	154	204	254	304	354	405	455	506	1573	2744	3848	4947	5530	6420	7311	8679	10017	11691	13375	15054	16746	17743	18770	19359	19575	1
* Valor Ganado (EV)	3	6	9	12	54	104	154	204	254	304	354	405	455	506	1560	2716	3806	4891	5365	5832	6303	6850	7282	7783	8294	8784	9266	9644				
* Costo Actual (AC)	3	6	9	12	54	104	154	204	254	305	355	405	455	506	1560	2717	3806	4892	5365	5832	6303	6851	7283	7784	8296	8786	9268	9646				
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,99	0,99	0,99	0,99	0,97	0,91	0,86	0,79	0,73	0,67	0,62	0,58	0,55	0,54				
Cumplimiento del costo (CPI)	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Retraso SV(t) Meses					0,07		0,10	0,07	0,10	0,07	0,10	0,10	0	0,10	0,07	0,10	0,10	0,13	0,37	0,70	1,20	1,60	2,13	2,77	3,37	4,03	4,67	5,43				

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,

Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 16 de agosto de 2024, 12:19
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 08 de agosto.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301011744 - CIENAGA - JULIO 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 13 de agosto de 2024, 17:57
Para: jose leon <dispac.joseleon@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Jose, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301011744** - **Ciénaga**, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado el día de hoy.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Julio/2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Julio/2024**, se carga la siguiente información de ejecución, de acuerdo a lo conversado el día de hoy.

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se cambia la ejecución cargada para modificar lo cargado en la actividad de proceso de liquidación de obra e interventoría, por lo anterior, la ejecución de esta actividad queda al 84%, así:

Actividad MGA: Realizar la interventoría.

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	3.2.1 Interventoria general del proyecto	und	3.34	100	No		Inicial							0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12																
							Prog	1	176.957.272	176.957.272				0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12																
							Eje	1	176.957.272	176.957.272				0,011	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,099															
2	3.2.2 Etapa de liquidación	und	.59	84	No		Inicial															0,33	0,33	0,34														
							Prog	1	31.227.754	31.227.754												0,33	0,33	0,34														
							Eje	0,9	31.227.750	28.104.975														0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

De igual forma, se reporta en las observaciones a la ejecución, la siguiente información:

- Por parte del contratista de obra, se avanza en el cumplimiento de requisitos para la liquidación del proyecto.	JOSE HERNANDO LEÓN GÓMEZ	13/08/2024	

A hoy el proyecto se encuentra contratado en ejecución, con **0 alertas.**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301011744	Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en la zona rural de Ciénaga Magdalena

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance


Construcción, suministro e instalación de 172 sistemas de energía solar fotovoltaica en 11 veredas de la zona rural de Cienaga, Magdalena.

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
20/09/2021	22/05/2023	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 5.303.286.143	$ 3.450.586.837	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados


En su ejecución física se tiene un 99,91% y ejecución financiera 93,96%.

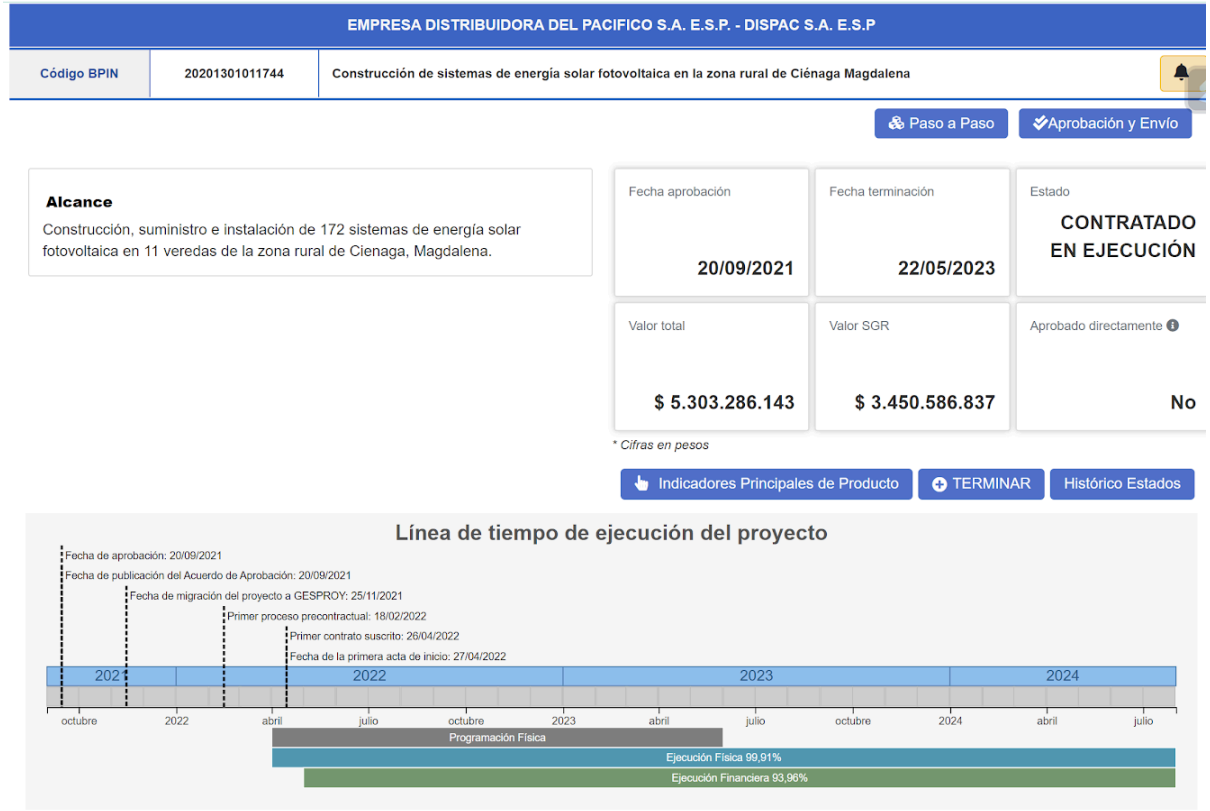

Desempeño del proyecto - Curva S.

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S



Línea	Periodos																									
	1 abr-22	2 may-22	3 jun-22	4 jul-22	5 ago-22	6 sep-22	7 oct-22	8 nov-22	9 dic-22	10 ene-23	11 feb-23	12 mar-23	13 abr-23	14 may-23	15 jun-23	16 jul-23	17 ago-23	18 sep-23	19 oct-23	20 nov-23	21 dic-23	22 ene-24	23 feb-24	24 mar-24	25 abr-24	26 may-24	27 jun-24
* Valor Planeado (PV)	20	40	59	84	122	296	655	1114	1682	2288	2873	3409	4870	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303
* Valor Ganado (EV)	20	40	59	66	90	137	161	218	342	528	1286	2489	4850	5274	5276	5278	5280	5281	5283	5285	5287	5289	5291	5293	5295	5296	5298
* Costo Actual (AC)	17	38	58	65	90	137	161	217	342	524	1279	2478	4835	5260	5262	5264	5265	5267	5269	5271	5273	5275	5277	5279	5280	5282	5284
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	0,79	0,74	0,46	0,25	0,20	0,20	0,23	0,45	0,73	1	0,99	0,99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cumplimiento del costo (CPI)	1,15	1,05	1,02	1,01	1,01	1	1	1	1	1,01	1,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Retraso SV(t) Meses		0,07	0,10	0,77	0,90	1	1,87	2,57	2,97	3,47	2,80	1,67	0,10	0,13	1,13	2,13	3,17	4,20	5,20	6,23	7,23	8,23	9,27	10,23	11,27	12,27	13,30

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

---

jose leon <dispac.joseleon@gmail.com> 13 de agosto de 2024, 21:48
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Buena noche, de mi parte la información es válida por lo que puedes proceder con el cargue de la info.

Att;

JLEON

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 14 de agosto de 2024, 17:11
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Aprobado

[El texto citado está oculto]

--

Cordialmente,

MELISSA RODRÍGUEZ CHADID
CONTRATISTA PROYECTOS
mrodriguez@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010463 - SIMITI - JULIO 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 13 de agosto de 2024, 15:53
Para: jose leon <dispac.joseleon@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Jose, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301010463- Simití**, en la plataforma GESPROY.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Julio 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Julio 2024**, se carga la siguiente información de ejecución, así:

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: No se genera cargue de ejecución teniendo en cuenta la suspensión, sin embargo, **se cargan las siguientes observaciones al avance de ejecución.**

* Persiste la medida de suspensión de giros del proyecto, impuesta por el DNP * Continua la suspensión N° 3 del contrato de obra, DG-098-2022. * Se inicia proceso sancionatorio al contratista de Interventoría HCR INGENIEROS SAS.	JOSE HERNANDO LEÓN GÓMEZ	13/08/2024	

De antemano agradecemos su colaboración y quedamos atentos a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--
--
Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

---

jose leon <dispac.joseleon@gmail.com> 13 de agosto de 2024, 21:51
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Buena noche Vanessa, de mi parte valido la información suministrada por favor proceder con el proceso de cargue.

mil gracias, feliz noche.

Att;
JLEON
[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 14 de agosto de 2024, 17:11
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Aprobado

[El texto citado está oculto]

--

Cordialmente,

MELISSA RODRÍGUEZ CHADID
CONTRATISTA PROYECTOS
mrodriguez@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

MIGRACIÓN INFORMACIÓN GESPROY PROYECTO BPIN 20201301011863 - CIENAGA - JULIO 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 13 de agosto de 2024, 15:41
Para: Juan Diego Castaño <jcastano.dispac@gmail.com>, Ricardo Arturo Ribero Rojas <rribero@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Ricardo, Juan, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301011863 - Ciénaga**, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día de hoy.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Julio/2023 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Julio de 2023**, se carga la siguiente información de ejecución, así:

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se genera el archivo de cargue ejecución del mes de Abril para las siguientes actividades:

- **Interventoría:** Para la actividad de interventoría se carga lo equivalente a la ejecución de 1 mes, así:

Actividad MGA: Realizar la interventoría.

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	1.6.1 Interventoria	und	5.17	93.2	No		Inicial																											
							Prog	1	884.349.452	884.349.452	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07									
							Eje	0,972	884.349.451,92	859.587.667,27	0,034	0,04	0,04	0,04	0,018	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

- **Proceso de liquidación de obra e interventoría:** Se cargan un avance del 3,5%, alcanzando un avance acumulado para esta actividad del 92,5%

Actividad MGA: Realizar el apoyo a la supervisión

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07
1	1.7.1 Apoyo a la supervision	und	.31	100	No		Inicial																											
							Prog	1	52.500.000	52.500.000	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,1									
							Eje	1	64.676.670	64.676.670			0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,1	0,06	0,06						
2	1.7.2 Proceso de liquidación obra e interventoria	und	.06	89	No		Inicial																											
							Prog	1	10.500.000	10.500.000																0,33	0,33	0,34							
							Eje	0,925	10.500.000	9.712.500																			0,33	0,14	0,14	0,14	0,14	0,035

De igual forma, se reporta en las observaciones a la ejecución, la siguiente información:

	* Se realiza acta de imprevistos del proyecto, continuando así con el trámite de liquidación del contrato de obra del proyecto; una vez se concluya este proceso se iniciará con la liquidación de la Interventoría.	RICARDO ARTURO RIBERO ROJAS	13/08/2024	

A hoy el proyecto se encuentra contratado en ejecución, con **0 alertas.**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P		
Código BPIN	20201301011863	Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en la zona rural de Ciénaga Magdalena

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance


CONSTRUCCIÓN DE 854 SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN 35 VEREDAS DE LA ZONA RURAL DE CIÉNAGA, MAGDALENA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
20/09/2021	05/12/2023	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 17.092.291.380	$ 17.057.122.806	No

** Cifras en pesos*


En su ejecución física se tiene un 99,64% y ejecución financiera 92,79%. **(Pendiente actualización con información a Julio 2023)**

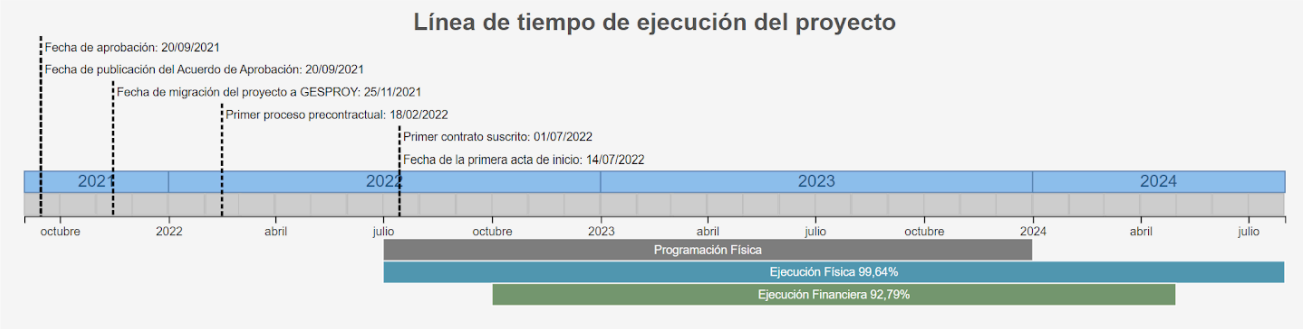

Desempeño del proyecto - Curva S. (Pendiente actualización con información a Julio 2023)

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S



Línea	Periodos																							
	1 jul-22	2 ago-22	3 sep-22	4 oct-22	5 nov-22	6 dic-22	7 ene-23	8 feb-23	9 mar-23	10 abr-23	11 may-23	12 jun-23	13 jul-23	14 ago-23	15 sep-23	16 oct-23	17 nov-23	18 dic-23	19 ene-24	20 feb-24	21 mar-24	22 abr-24	23 may-24	24 jun-24
* Valor Planeado (PV)	56	112	169	235	433	1344	2812	5484	9195	12174	14558	16020	16645	16994	17077	17085	17089	17092	17092	17092	17092	17092	17092	17092
* Valor Ganado (EV)	30	65	104	142	169	229	302	348	411	476	586	791	866	2124	3495	6571	9538	13882	16845	16884	16920	16957	16994	17031
* Costo Actual (AC)	30	65	105	145	174	235	308	357	421	489	601	808	886	2145	3519	6590	9554	13895	16857	16896	16933	16969	17006	17043
Cumplimiento en la programación (SPI)	0,53	0,58	0,62	0,61	0,39	0,17	0,11	0,06	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,13	0,20	0,38	0,56	0,81	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	0,99	0,98	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Retraso SV(t) Meses		0,93	1,27	1,53		2,17	2,77	3,57	4,20	5,03	5,90	6,73	7,63	7,63	7,90	7,83	8,10	7,47	5,60	6,53	7,40	8,33		9,77

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,

Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Diego Castaño <jcastano.dispac@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 12:25
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Ricardo Arturo Ribero Rojas <rribero@dispac.com.co>, Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Hola,

Aprobado.

[El texto citado está oculto]

--

Juan Diego Castaño Orozco
Ingeniero Civil
DISPAC S.A. E.S.P.

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 14 de agosto de 2024, 17:11
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Aprobado

[El texto citado está oculto]

--

Cordialmente,

MELISSA RODRÍGUEZ CHADID
CONTRATISTA PROYECTOS
mrodriguez@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

MIGRACIÓN INFORMACIÓN GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010861 - PUEBLO BELLO

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 13 de agosto de 2024, 11:44
Para: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>, Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenos días.

De acuerdo con lo informado en correo precedente, se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301010861 - Pueblo Bello.**

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Julio 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**


De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

---------- Forwarded message ---------
De: **GESPROY DISPAC** <gesproy.dispac@gmail.com>
Date: lun, 22 jul 2024 a las 9:40
Subject: TERMINACIÓN Y CIERRE PROYECTO BPIN 20201301010861 - PUEBLO BELLO
To: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>, Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenos días.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301010861 - Pueblo Bello.**

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se carga la ejecución al 100% de acuerdo con los valores liquidados para el contrato de obra e interventoría, así:

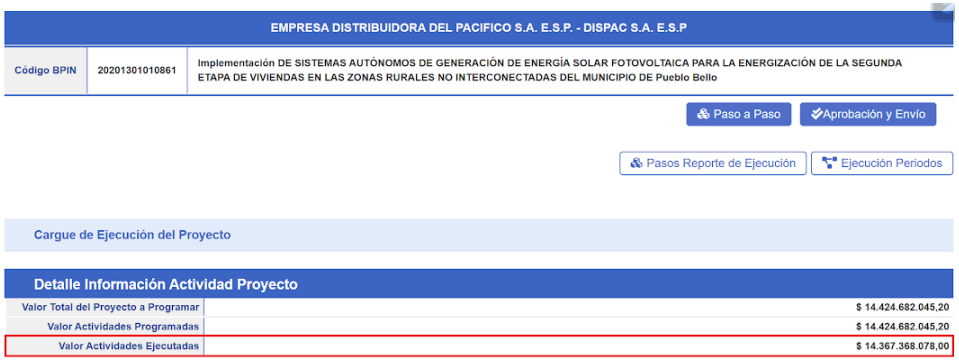

2. CARGUE DE INDICADORES Y METAS DE PRODUCTOS:

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301010861	Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Pueblo Bello

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Metas de Productos

Mostrar 10 registros por página — Buscar


	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
1	Aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica en la zona rural.	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	Número de unidades	721	2023	Diciembre	721	100
2	Aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica en la zona rural.	Redes internas de energía eléctrica instaladas	Número de viviendas	721	2023	Diciembre	721	100

Indicadores de Producto

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Nombre Indicador	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
	Aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica en la zona rural.	Redes internas de energía eléctrica instaladas	Número de viviendas	721	Viviendas con red interna de energía eléctrica instalada	2020	2020	721,00	2023	Diciembre	721	100
	Aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica en la zona rural.	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	Número de unidades	721	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	2020	2020	721,00	2023	Diciembre	721	100

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente



3. CARGUE DE BENEFICIARIOS Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Se carga la información de beneficiarios del proyecto de acuerdo a lo establecido en la MGA del proyecto, es decir 3.440 beneficiarios, lo que es equivalente a 4,7 usuarios por cada una de las 721 soluciones instaladas.


EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301010861	Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Pueblo Bello

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Población Beneficiada

No Beneficiarios Reales	Fuente Beneficiarios Reales	Otra Fuente Beneficiarios	¿La población objetivo se está beneficiando tal como se esperaba?	Concepto por el cual la población objetivo no se beneficia de acuerdo a lo esperado
3440	Acta de recibo comunidad		Si	



De igual forma, se carga la información de sostenibilidad y concepto de entidad designada para la supervisión, así:

Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Terminado

¿Los productos generados por el proyecto son agotables?
Si

Concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría

¿Las obras fueron recibidas a satisfacción?	¿Las pruebas técnicas y ensayos de calidad cumplen con la reglamentación sectorial vigente?	¿El proyecto cumplió con las especificaciones técnicas?	¿El proyecto es funcional?	¿El proyecto es sostenible?	¿El proyecto esta operando?	Concepto
Si	Si	Si	Si	Si	Si	• El contratista CONSORCIO SOLAR PUEBLO BELLO 2022, ejecutó todas las actividades del proyecto la cuales fueron verificadas y validadas por la interventoría en campo, conforme a las cantidades presentadas en la oferta económica presentada por el contratista de obra y aprobada por DISPAC S.A. E.S.P. las cuales se presentan a continuación. • El ejecutor, el contratista, la interventoría y la alcaldía han realizado las verificaciones directas para establecer que los Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales – SSFVI y demás componentes de la infraestructura construida, cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto y con las normas técnicas de calidad para este tipo de proyectos por cada uno de los 721 usuarios beneficiados. • El ejecutor, el contratista, la interventoría y la alcaldía entrega a HELIOS y esta recibe la totalidad de la infraestructura construida, las acta de recibo a satisfacción de los respectivos usuarios, los certificados de garantía y calidad de los materiales y equipos instalados, entre los que se encuentran: Paneles, inversor, controlados, baterías, cable solar, sistema "puesta a tierra", DPS, gabinete y protecciones, entre otros.

4. ALCANCE FINAL: Se carga el siguiente alcance final del proyecto.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301010861	Implementación DE SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE Pueblo Bello

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance inicial

IMPLEMENTACIÓN DE 721 SISTEMAS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VIVIENDAS EN LAS ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

Alcance final

Instalación de setecientas veintiún (721) soluciones solares fotovoltaicas individuales – SSFVI conformadas cada una de la siguiente manera: Dos (2) módulos solares de 370Wp, una (1) batería de litio con capacidad de 120 Ah y 24V, un (1) inversor de onda senoidal pura de 1000W, un (1) regulador solar 40A del tipo MPPT y un (1) medidor de energía, en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Pueblo Bello.

5. REQUISITOS DE CIERRE: Con el cargue de la información anterior, se actualizan los requisitos de cierre quedando pendiente el último pago de los contratos, para poder liquidarlos en el aplicativo y cumplir con el 100% de los requisitos.

Requisitos Para Cierre del Proyecto		
Requisito	**Cumplido**	**Descripción**
Proyecto terminado	✓	Proyecto en estado TERMINADO con avance del 100% en la ejecución de la programación de actividades con registro generado por la entidad ejecutora en el que se indica que la ejecución física del proyecto está concluida y se asignó el estado TERMINADO al proyecto. El proyecto debe tener registro audiovisual.
Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto.	✓	El porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto está al 100% o existe justificación de la no ejecución del 100%.
Pólizas de estabilidad para contratos de obra	NA	Se verifica si existe al menos un contrato de Obra en el proyecto, si no, NA (No aplica). Si los hay, todos deben tener póliza de estabilidad registrada: Tipo póliza = Cumplimiento, Cubrimiento = Estabilidad de la obra. Si el cubrimiento de la póliza tiene una duración menor a 60 meses debe tener diligenciado el campo Observación.
Contratos liquidados	✗	El dato se obtiene de la pestaña 'Detalle Contratos'. Se valida que el contrato tenga 'Acta de Liquidación' para los contratos de Obra. Para los contratos diferentes a Obra, se valida que tenga 'Acta de Liquidación' o 'Acta liquidación - no requiere'
Contratos pagados	✗	Se verifica que la sumatoria de los pagos asociados al contrato(s) del proyecto menos la sumatoria del concepto de Ingreso "Reintegro recursos no ejecutados en contratos" registrado en Cuentas SGR para el proyecto y contrato, coincida con el Valor del "Acta de Liquidación" o con el "Valor final Ejecutado" del tipo de documento "Acta de Liquidación No Requiere", según corresponda a contratos de obra o diferentes de estos. Así mismo, que la distribución de las fuentes de financiación definidos en estos documentos sea consistente con las asignadas al contrato.
Recursos reintegrados	NA	Se verifica que el monto de los recursos registrados para el proyecto en el aplicativo Cuentas SGR en el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados", o el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados" más el valor de las fuentes de financiación en la liquidación del contrato de Interventoría cuyo beneficiario es la entidad designada para contratar la interventoría y las fuentes corresponden a Asignaciones Directas, FCR 40%, Incentivo a la producción; es equivalente a la diferencia entre el valor girado o transferido por fuente de financiación y la sumatoria de los pagos SGR asociados al proyecto por cada una de las fuentes de financiación.
Ejercicios de control social	NA	Si el proyecto cuenta con ejercicios de control social, todos los compromisos establecidos para el proyecto deben tener estado Cumplido o Insubsanable
El Proyecto no tiene Alertas sin Subsanar	✓	Se verifica que el proyecto no tiene alertas en estado Sin Subsanar para el último trimestre generado de alertas masivas SMSCE, si no las tiene cumple con el requisito.
Planes de Mejora	NA	Se verifica si el proyecto tiene planes de mejora y que estos no se encuentren vigentes (Abiertos).

Con este cargue de información el proyecto pasa a estado TERMINADO, y estaríamos en espera de cumplir los requisitos de cierre para que el estado cambie a CERRADO.



--

Cordialmente,

Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 13 de agosto de 2024, 11:58
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 08 de agosto.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 14 de agosto de 2024, 17:12
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Aprobado
[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

MIGRACIÓN INFORMACIÓN GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010558 - CARMEN DE BOLIVAR - JULIO2024

3 mensajes


GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 20201301010558 - Carmen de Bolívar en la plataforma GESPROY.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Julio 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Julio 2024**, se carga la siguiente información como observaciones a la ejecución:



A hoy, el proyecto se encuentra terminado, con **1 alerta asociada al cierre del proyecto.**



De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--
--
Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 13 de agosto de 2024, 11:34
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día de ayer 08 de agosto.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 14 de agosto de 2024, 17:12
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Aprobado
[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 2021002440035 - GUAJIRA FASE 2 - JULIO 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 13 de agosto de 2024, 10:22
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenos días.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **2021002440035** - Guajira Fase 2, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día 08 de Agosto de 2024.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Julio de 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**


Para los meses de **Julio de 2024**, se carga la siguiente información de ejecución, así:

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: No se carga avance en la ejecución del proyecto, sin embargo, se reportó la siguiente información como observaciones a la ejecución:


	• De conformidad con la finalización del 100% de la obra, así como, de la expedición del certificado de conformidad RETIE de la infraestructura eléctrica construida, del día 8 al 12 de Julio se llevó a cabo la visita de ejecución de obra en la cual se verificó la infraestructura por parte del IPSE, contratista de obra, interventoría y DISPAC. • Posteriormente se suscribió el acta de recibo y entrega de infraestructura entre interventoría, DISPAC e IPSE en la cual se recibe por parte del instituto de planificación la infraestructura a cargo del IPSE, debido a aporte de recursos de $1.417.838.571. En lo que respecta a la infraestructura eléctrica con aportes del SGR a través de la gobernación de la Guajira, esta se encuentra en trámite toda vez loa tiempos de proyección del documento, revisión y firma. Ahora bien es importante mencionar que toda obra de infraestructura debe contar con una empresa que se encargue de su sostenibilidad, en virtud de lo anterior y considerando que esta obra es la Fase II del proyecto de interconexión cuyo operador de red es la empresa HELIOS S.A. E.S.P. esta última, al termino del presente informe no ha recibido la infraestructura eléctrica manifestando desequilibrio económico en la prestación del servicio para la fase I. Situación que se dio a conocer al director del IPSE y su equipo de trabajo y cuyo compromiso se estableció en hacer las gestiones necesarias para que en virtud del contrato de mandato que responsabiliza a HELIOS como prestador de servicio de la fase I, así mismo, se haga para la fase II. Se espera para el mes de Agosto tener reporte por parte del IPSE de la reunión que se realice con el operador de red.	JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ	08/08/2024

A hoy, el proyecto se encuentra contratado en ejecución, con **0 alertas.**

En su ejecución física se tiene un 82,95% y ejecución financiera 76,31%

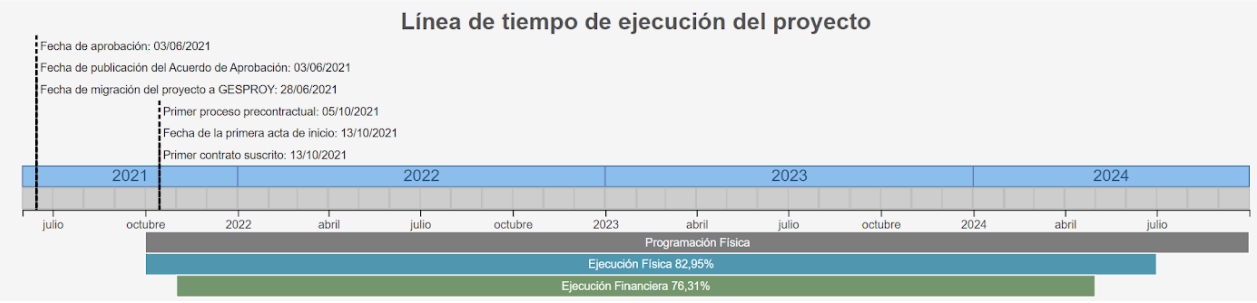

Indicadores de desempeño de la eficiencia - curva S



Linea	Periodos																																
	1 oct-21	2 nov-21	3 dic-21	4 ene-22	5 feb-22	6 mar-22	7 abr-22	8 may-22	9 jun-22	10 jul-22	11 ago-22	12 sep-22	13 oct-22	14 nov-22	15 dic-22	16 ene-23	17 feb-23	18 mar-23	19 abr-23	20 may-23	21 jun-23	22 jul-23	23 ago-23	24 sep-23	25 oct-23	26 nov-23	27 dic-23	28 ene-24	29 feb-24	30 mar-24	31 abr-24	32 may-24	33 jun-24	34 jul-24
* Valor Planeado (PV)	9	17	26	35	41	48	55	61	68	74	81	87	94	100	122	161	201	236	268	294	319	349	480	642	896	2787	3454	4225	5586	7148	8412	8653	8740	8769
* Valor Ganado (EV)	9	17	26	35	41	48	55	61	68	74	81	87	94	100	122	161	201	236	268	294	319	349	480	642	896	2787	3454	4225	5586	7148	8412	8653	8740	
* Costo Actual (AC)	1	28	65	78	92	122	135	149	156	166	175	186	198	209	237	274	311	343	373	396	418	441	565	721	969	2853	3514	4278	5631	7192	8449	8684	8765	
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Cumplimiento del costo (CPI)	5,86	0,62	0,40	0,45	0,45	0,40	0,41	0,41	0,43	0,45	0,46	0,47	0,47	0,48	0,51	0,59	0,65	0,69	0,72	0,74	0,76	0,79	0,85	0,89	0,92	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	1	1	1	
Retraso SV(t) Meses		0,10	0,07	0,10	0,10	0	0,10	0,07	0,10	0,07	0,10	0,10	0,07	0,10	0,07																			

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,

Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 13 de agosto de 2024, 10:53
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día de ayer 08 de agosto.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 14 de agosto de 2024, 17:13
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Aprobado

[El texto citado está oculto]

--

[El texto citado está oculto]

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 2021005940004 - BARRANCOMINAS - JULIO 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenos días.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 2021005940004 - Barrancominas, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día 08 de Agosto.


Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Julio de 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Debido a la suspensión del contrato, no se carga avance de ejecución, sin embargo, se carga la siguiente información como observación al avance de ejecución, así:


		• Al termino del presente informe se suscribió el acta de reinicio del contrato interadministrativo 132 en virtud del cumplimiento del plazo de suspensión solicitado, conforme a lo anterior se reanudaron el contrato de obra DG-126-2022 y de interventoria DG-058-2022 el día 28 de julio. • Según los tiempos de vigencia de estos contratos (3 días de ejecución) y adicionalmente los tiempos necesarios para la actividad de pruebas, puesta en funcionamiento y energización de la planta de generación se prorrogó el plazo de estos contratos hasta el 30 de Agosto fecha final en la cual se espera sea energizada la infraestructura construida.	JUAN GOMEZ

A hoy el proyecto se encuentra contratado y en ejecución, con **0 alertas.**

En su ejecución física se tiene un 95,73% y ejecución financiera de 87,84%



Indicadores de desempeño de la eficiencia - curva S

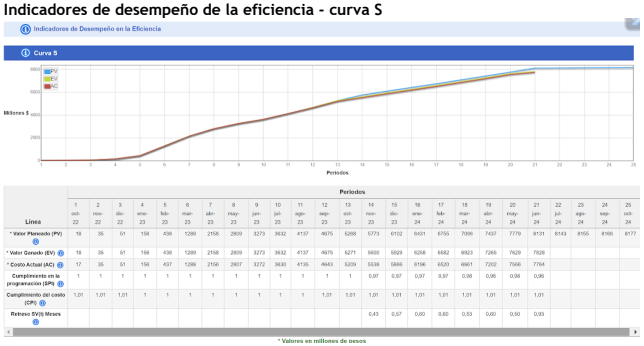

Línea	1 oct-22	2 nov-22	3 dic-22	4 ene-23	5 feb-23	6 mar-23	7 abr-23	8 may-23	9 jun-23	10 jul-23	11 ago-23	12 sep-23	13 oct-23	14 nov-23	15 dic-23	16 ene-24	17 feb-24	18 mar-24	19 abr-24	20 may-24	21 jun-24	22 jul-24	23 ago-24	24 sep-24	25 oct-24
* Valor Planeado (PV)	18	36	61	156	436	1289	2156	2809	3273	3632	4137	4675	5268	5773	6102	6431	6755	7066	7437	7779	8131	8143	8166	8166	8177
* Valor Ganado (EV)	18	36	61	156	436	1289	2156	2809	3273	3632	4137	4675	5271	5600	6029	6268	6582	6923	7266	7629	7828				
* Costo Actual (AC)	17	35	61	156	437	1288	2156	2807	3272	3630	4135	4643	5259	5538	5866	6196	6520	6861	7202	7566	7764				
Cumplimiento en la programacion (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,96				
Cumplimiento del costo (CPI)	1,01	1,01	1,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01				
Retraso SV(t) Meses														0,43	0,57	0,60	0,60	0,53	0,60	0,50	0,93				

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco tu colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 13 de agosto de 2024, 10:52
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día de ayer 08 de agosto.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 14 de agosto de 2024, 17:13
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Aprobado
[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]
