*20246000019442*
Rad: 20246000019442
Fecha: 05-NOV-2024 02:06
Asunto: KAREEN VANESSA PINZON RAMIREZ CUENT
Usua: ASANCHEZG Dest: Dep 600 No.Folios: 38
Rem: KAREEN VANESSA PINZO
www.dispac.com.co
info@dispaciaesp.com

Bogotá D.C., 05 de Noviembre de 2024

**Cuenta de Cobro Nº 006**

**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P**
**DISPAC S.A. E.S.P**
**NIT 818.001.629-4**

**DEBE A:**

KAREEN VANESSA PINZON RAMIREZ
C.C. 1.023.942.176 de Bogotá (Cund).

**LA SUMA DE:**

**SIETE MILLONES DE PESOS M/c ($7.000.000)**

**Por concepto de:**

- Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Octubre de 2024.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 200-763874-61

**Cordialmente,**

Kareen Vanessa Pinzón Ramírez
C.C. 1.023.942.176

**Registro Presupuestal:** 5100003039

**CERTIFICADO - RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTAS DE TRABAJO**

Bogotá D.C.

Señores:
**DISPAC S.A. E.S.P**
Bogotá D.C

Yo, Kareen Vanessa Pinzón Ramírez, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.023.942.176 expedida en Bogotá D.C, para efectos de disminuir la base de retención en la fuente por rentas de trabajo, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que la información señalada en este documento corresponde a la factura y/o documento equivalente aportado a la empresa DISPAC SA ESP.

| | | SI | NO |
|---|---|---|---|
| **1.** | Soy residente en Colombia | X | ___ |
| **2.** | Se tomará los costos y deducciones asociadas a dichas rentas | ___ | X |

**3. Ingresos No Constitutivos de Renta:**

**3.1.** Valores aportados en la planilla de seguridad social atribuibles a la factura objeto de pago

| | |
|---|---|
| Aportes obligatorios a salud | $ 352.500 |
| Aportes obligatorios a pensión | $ 451.200 |
| Aportes a ARL | $ 14.800 |

**3.2.** Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS $0.

Se adjunta:

☐ Planilla de seguridad social pagada

**4. Deducciones:**

**3.1. Declaración de Dependientes**

Certifico bajo la gravedad de juramento que la(s) siguiente(s) persona(s) depende(n) económicamente de mí, y que cumplen con los términos y requisitos establecidos en el artículo 387 del Estatuto Tributario y no han sido incluidas por otras personas para usar la deducción por dependientes que establece el mencionado artículo:

| Nombre | Identificación | Parentesco | Edad |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito que me sean aplicadas las deducciones por dependientes que se marcan a continuación como “Deducción a solicitar”, y adjunto los respectivos documentos soporte exigidos:

- ☐ Registro civil de nacimiento.
- ☐ Certificación de las instituciones de educación superior certificadas por el ICFES o autoridad oficial correspondiente.
- ☐ Certificación expedida por la entidad promotora de salud EPS o, por medicina legal.
- ☐ Certificación firmada por contador público de ausencia de ingresos.

**3.2. Intereses de vivienda**

El valor de los intereses pagados por concepto de vivienda deducibles de la base de retención en la fuente es de: $0. Este valor no ha sido ni será incluido por otras personas, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificación expedida por la entidad financiera de los intereses pagados durante el periodo 2024.

**3.1. Pagos por salud**

El valor de los pagos por salud (medicina prepagada y/o seguros) deducibles de la base de retención en la fuente es de: $0, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificación de los pagos realizados en el año 2024 expedido por las empresas de medicina prepagada o compañías de seguros.

**4. Rentas exentas**

**4.1.** El valor de los aportes AFC susceptibles de ser considerados como renta exenta para efectos de la retención en la fuente es de $0, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificado expedido por la entidad financiera correspondiente.

**4.2.** El valor de los aportes a fondos de pensiones voluntarios y/o seguros privados de pensiones susceptibles de ser considerados como renta exenta para efectos de la retención en la fuente es de $ 0, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificado expedido por el Fondo de Pensiones.

Con el presente documento certifico que, en el momento de tener algún cambio en mi calidad tributaria, esta será informada oportunamente.

La presente certificación se expide a los 05 días de Noviembre del año 2024, dirigida a DISPAC S.A. E.S.P quien la utilizará únicamente para los fines descritos al inicio de esta.

**NOMBRE** **KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ**

**FIRMA** 

**IDENTIFICACIÓN** **1.023.942176**

| | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR | Código | F40-41-12 |
|---|---|---|---|
| dispac La energía del Chocó | | Versión | 01 |
| | | Fecha | 4/9/2020 |

| CIUDAD | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE OPERACIÓN | Día | Mes | Año |
| | | | |

**N°: DSB -**

Autorizado del prefijo DSB 2001 al 3000, Vigencia 12 meses según Res. DIAN 18764017774450 del 08/09/2021

**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.**
**NIT: 818.001.629 - 4**
Carrera 7 N° 24-76 Quibdó - Chocó
AV. Calle 26 N° 69D 91 Torre 1 of. 804 Bogotá D.C.
Teléfonos: (4) 6726172 - (1) 4672205

**NOMBRE DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO:** **KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ**

**NIT/CC:** **1023942176** **E-MAIL:** vanessapinzonr@gmail.com

**DIRECCIÓN:** **Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial Arrecife T. Peatonal, Of. 804**

**TELÉFONO:** **467 2203 - 467 2204 - 467 2205** **CELULAR:** **3204180576**

**DOCUMENTO SOPORTE PARA LA PROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLE** en Compras de Bienes o Servicios a **Persona Natural,** no comerciantes o no responsables de IVA. según resolucion DIAN 0042 de 2020, artículo 771-2 del Estatuto Tributario, y los artículos 1.6.1.4.12. y 1.6.1.4.13. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Contrato DG-070-2024, relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY." por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Octubre de 2024. | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **VALOR EN LETRAS:** | **SIETE MILLONES DE PESOS MCTE** | | |

***KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ***

**FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL VENDEDOR**

**ELABORADO POR**

Declaro bajo la gravedad del juramento que no estoy obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente y no soy responsable de IVA

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1023942176 | | PINZON RAMIREZ KAREEN VANESSA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cr 27 # 49 - 07 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7777777 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-10 | 960051327 | 9474530874 | I | 2024/11/21 | 2024/10/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $818,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1023942176 | PINZON KAREEN | 25-14 | 30 | $2,820,000 | $451,200 | EPS005 | 30 | $2,820,000 | $352,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,820,000 | $14,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $2,820,000 | $451,200 | | | $2,820,000 | $352,500 | | | $0 | $0 | | | $2,820,000 | $14,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $451,200 | $0 | $0 | $451,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $451,200 | $0 | $0 | $451,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,800 | $0 | $0 | $14,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $14,800 | $0 | $0 | $14,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $352,500 | $0 | $0 | $352,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $352,500 | $0 | $0 | $352,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $818,500 | $0 | $0 | $818,500 |



2024/10/31 09:28 AM

**DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.**
NIT. 818.001.629-4

# CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5100003039

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha del documento: | 14.05.2024 | | |
| Fecha de contabilización: | 14.05.2024 | | |
| Creado por: | MAGUIRRE | Modificado por: | TBENITEZ |
| Creado el | 14.05.2024 | Ultima modificación: | 15.05.2024 |

## DATOS ADICIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto: | AMP.SERV.ASES.TECN.ADMIN.INFORM.PROY,SGR,GESPROY | Total : | 49.000.000 |

## POSICIÓN DE DOCUMENTO 001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto: | VANESSA.PINZON.PREST.SERV.ASES.TEC.ADM.SGR.GESPROY | | |
| Acreedor: | 1023942176 - KAREEN VANESSA PINZO | Fecha de vencimiento: | 31.12.2024 |
| CDP No.: | 3100002239 / 001 | | |
| Pos. presup.: | B05010100100701 - | Centro gestor: | CG10 - GER.GENERAL DISPAC |
| Fondos: | 2024 - FONDO GENERAL | Prog. presupuestal: | C1000 - Gastos FUN, OC ,DEU |
| Importe: | 49.000.000 pesos | Area funcional: | |

Se expide a los 14 días del mes de mayo del año 2024.

Contabilizado presupuesto: TANIA AMARUC BENITEZ RODRÍGUEZ

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14886479644

(415)7707212489984(8020) 000001488647964 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 2 3 9 4 2 1 7 6 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 2 3 9 4 2 1 7 6 | 2 0 1 3 0 5 1 5 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PINZON | RAMIREZ | KAREEN | VANESSA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 27 49 07 AP 401

42. Correo electrónico: Vanessapinzonr@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 0 7 5 6 8 | 3 2 0 4 1 8 0 5 7 6 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 7 0 4 2 8 | 4 3 9 0 | 2 0 1 7 0 4 2 8 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 05 / 00 : 34: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PINZON RAMIREZ KAREEN VANESSA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ING. VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

Bogotá D.C, 05 de Noviembre de 2024

Señores
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICIO S.A. E.S.P.- DISPAC
Atn. **ING. MELISSA MARIA RODRIGUEZ**
Av. Calle 26 No 69 D- 91, Torre 1 Oficina 804, Centro Empresarial Arrecife
Tel: (571) 4672203
Bogotá D.C

**Asunto:** Informe número 006 de actividades correspondientes al contrato DG-070-2024.

Estimada ingeniera.

En el siguiente informe se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 30 de Octubre de 2024, en el marco del contrato DG-070-2024 relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY.

1. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. **Realizar el registro y actualización de la información en la plataforma GESPROY relacionada con los proyectos y los contratos derivados de este, en cumplimiento con el sistema de seguimiento, monitoreo y ejecución de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   Se realiza el cargue de información de los proyectos a cargo de DISPAC en la plataforma GESPROY, y se notifica vía correo electrónico a los supervisores y coordinadora de los proyectos para aprobación y posterior aprobación y envío en la plataforma, tal como se evidencia en el Anexo 1 del presente informe de actividades.

2. **Realizar la programación de los hitos de la contratación derivada de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   No se ejecuta la actividad por la etapa en la que se encuentran los proyectos.

3. Realizar el registro de la información de la supervisión de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.

4. **Proyectar los informes de ejecución y cargue de GESPROY, de acuerdo con la información suministrada por el responsable de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   Se realizan los informes de ejecución y cargue del proyecto, los cuales son enviados a los supervisores y a la coordinadora de proyectos vía correo electrónico – Ver Anexo 1.

5. **Atender las consultas que se desprendan de los reportes, las alertas y novedades de la plataforma GESPROY:**

   Se atienden y contestan las inquietudes que surgen a raíz de los reportes previa aprobación y envío de la información en la plataforma.

6. **Verificar o registrar la marcación de los indicadores de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.**

   No se ejecuta la actividad por la etapa en la que se encuentran los proyectos, sin embargo, se registra el avance en los indicadores y metas de productos de los proyectos que están en ejecución.

7. **Realizar la creación, modificación y eliminación de rubros, CDP, procesos precontractuales, contratos, registros presupuestales, pagos, e incorporación del presupuesto en el aplicativo GESPROY de los proyectos que se requieran:**

   Se realiza la revisión y actualización de los contratos que se encuentran en ejecución, suspendidos y terminados, así mismo, se registran las modificaciones (Otrosí, suspensiones o reinicios) de los contratos asociados a los proyectos.

8. **Realizar los ajustes a los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías dentro de las oportunidades establecidas:**

   Para este mes no se realiza ningún ajuste relevante en los proyectos.

9. **Realizar el cargue mensual de la ejecución de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías y reporte de la contratación:**

   Como se evidencia en los puntos anteriores, se realiza el cargue para el mes de Septiembre de la información de ejecución de los proyectos. Ver Anexo 1.

10. **Verificar la creación y vinculación de terceros, tales como los contratistas y supervisores, en la plataforma GESPROY.**

    Se verifica la información en la plataforma y se corrobora que está completa.

11. **Realizar el reporte de ejecución de bienes y servicios de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

    Se carga el reporte de ejecución de bienes y servicios de acuerdo con lo reportado en el mes por los supervisores de los proyectos, para los proyectos en los cuales aplica el reporte.


12. **Revisar y actualizar la información reportada para garantizar que se obtenga el adecuado desempeño en la medición del IGPR de la empresa:**

    Se reporta el avance de ejecución mensual conforme lo indicado y aprobado por los supervisores de los contratos en la reunión mensual para revisión y cargue de información de GESPROY.


13. **Realizar en términos generales los reportes y seguimiento en las diferentes plataformas del Sistema General de Regalías del proyecto y de los contratos derivados del mismo:**

    Como se evidencia en los puntos anteriores, se realiza el cargue para el mes de Junio de la información de ejecución de los proyectos, así mismo, se realiza el aprueba y envía de los proyectos de la siguiente manera:


    - **PROYECTO BPIN 2021002440035 - GUAJIRA FASE 2**

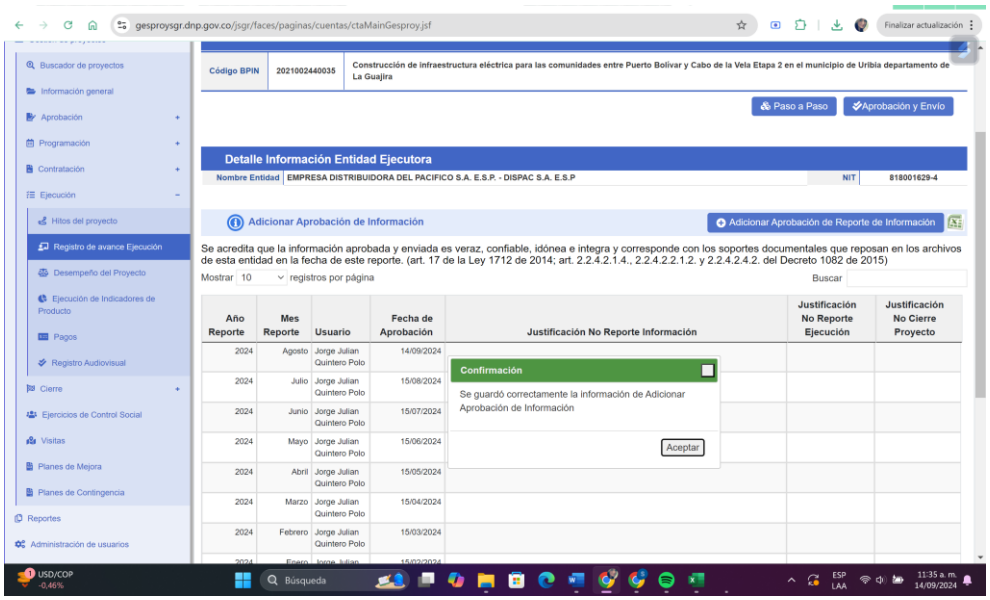


- **PROYECTO BPIN 2021005940004 – BARRANCOMINAS**

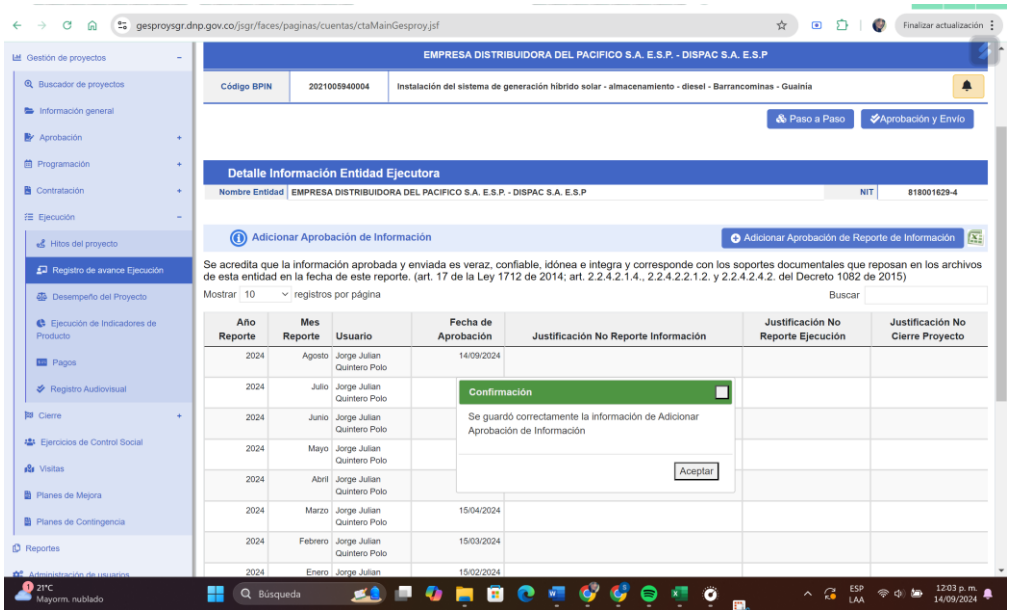



- **PROYECTO BPIN 20201301010353 – CAUCA NARIÑO**

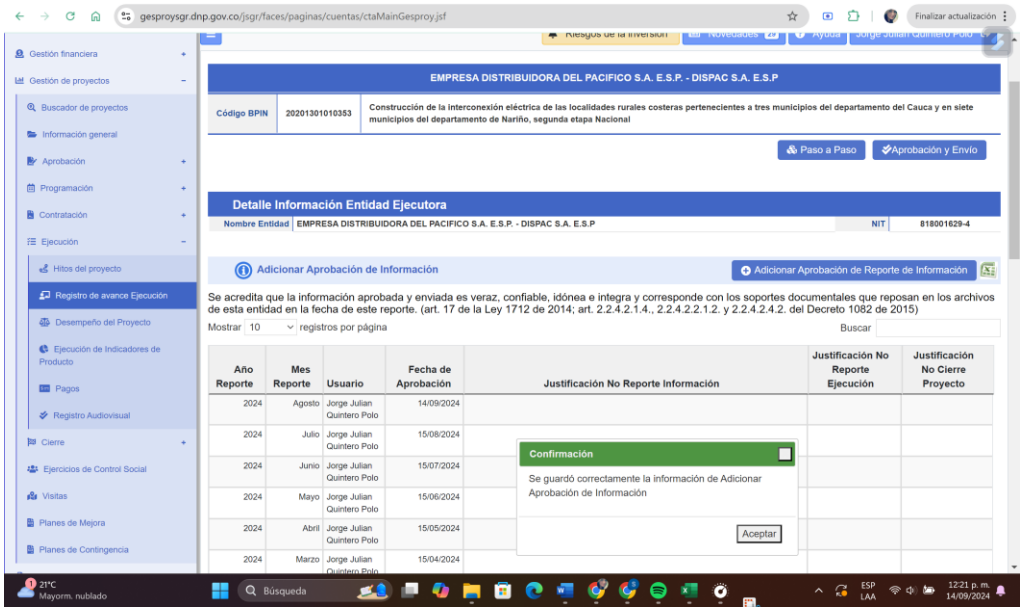


- **PROYECTO BPIN 20201301010463 – SIMITI**

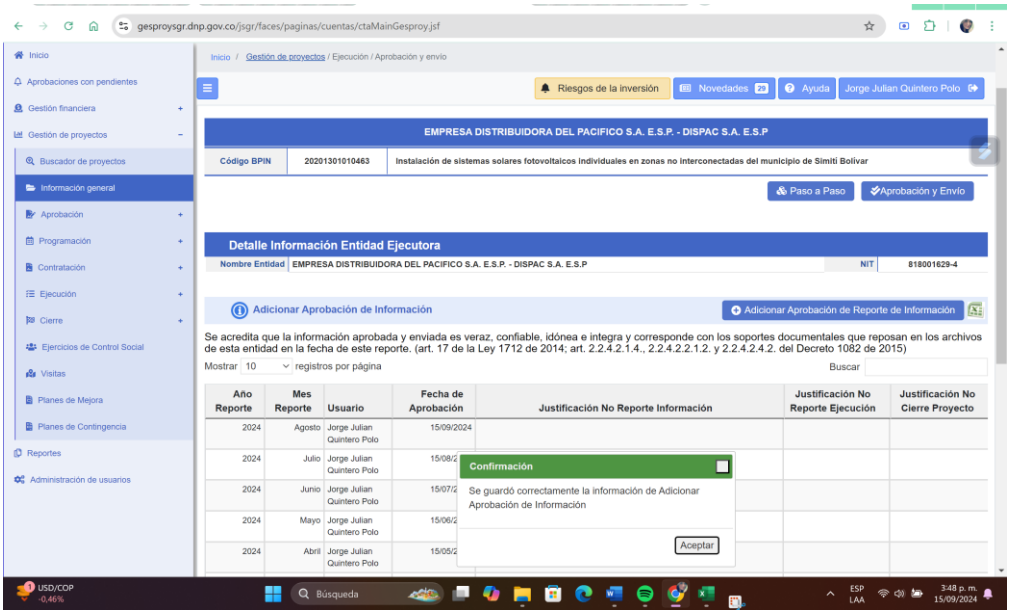



- **PROYECTO BPIN 20201301010558 - CARMEN DE BOLIVAR**

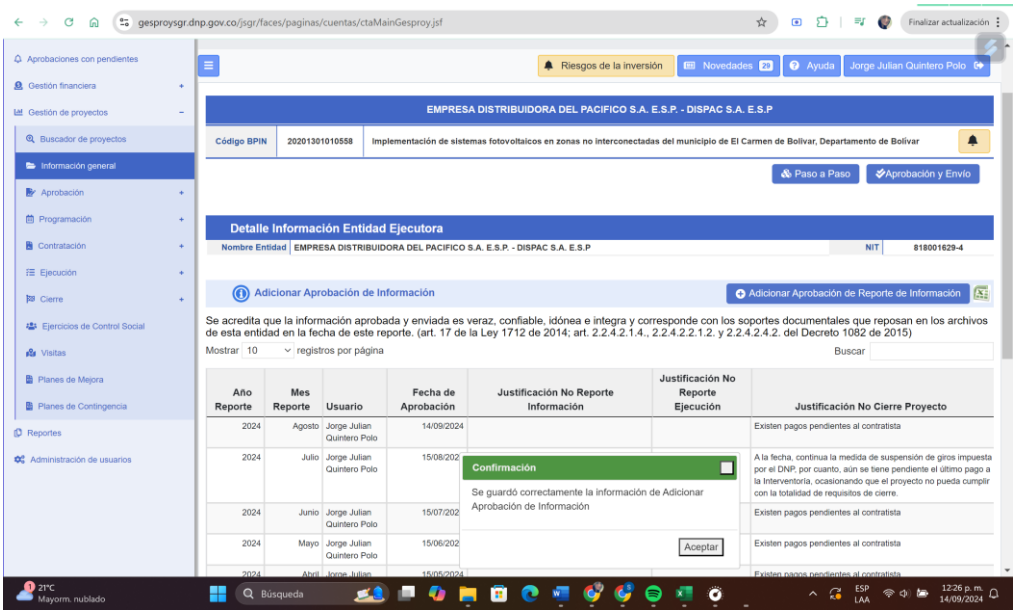


- **PROYECTO BPIN 20201301010861 - PUEBLO BELLO**

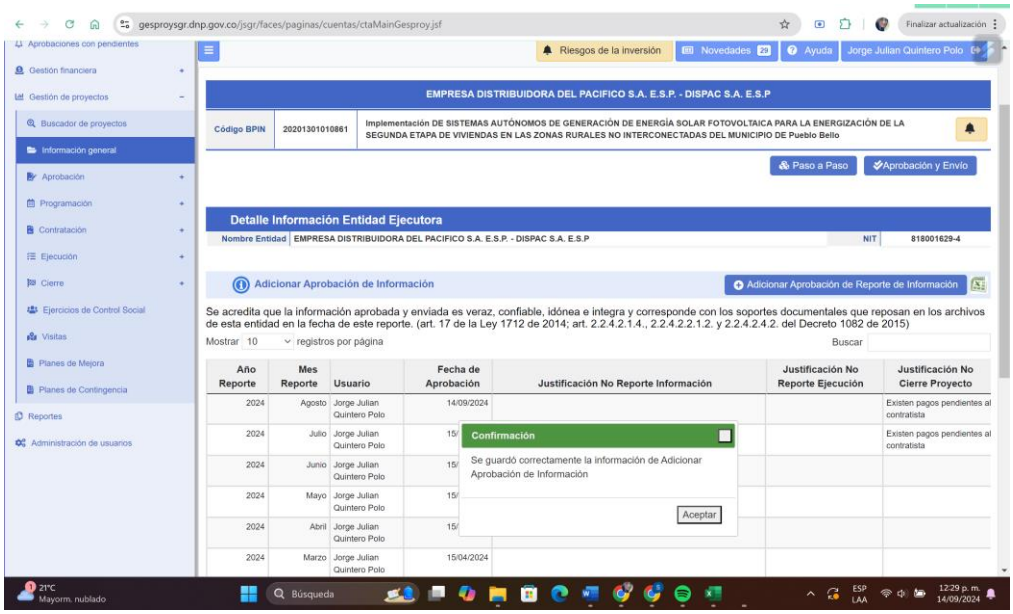



- **PROYECTO BPIN 20201301011070 – NOVITA**

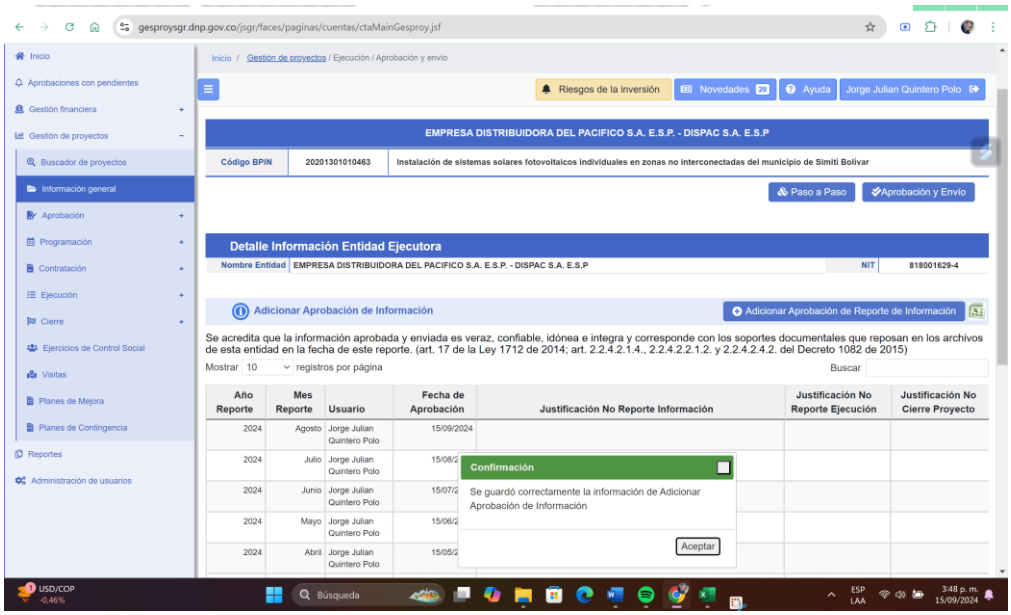

- **PROYECTO BPIN 20201301011744 – CIÉNAGA**

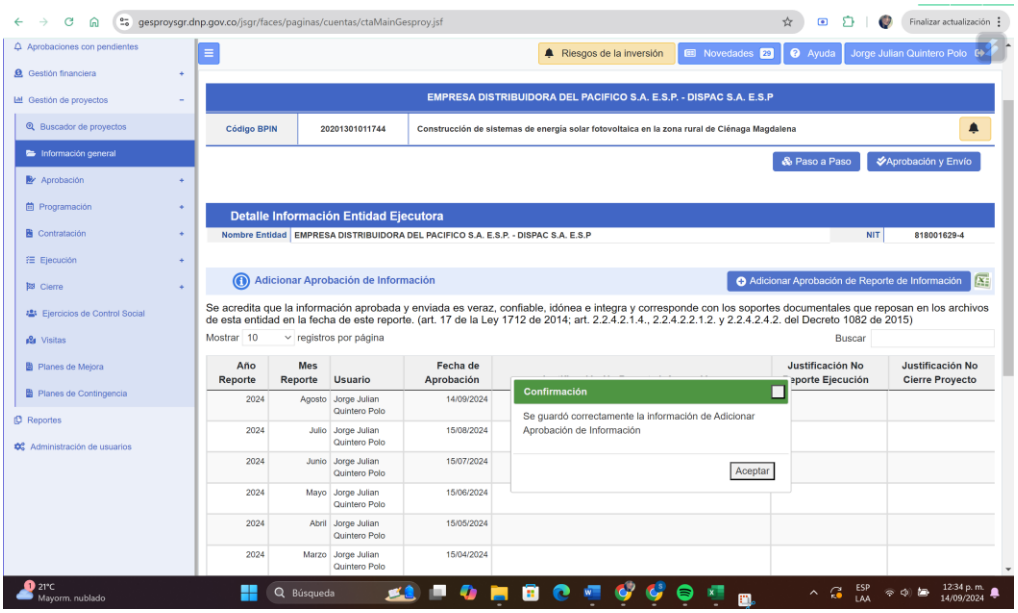


- **PROYECTO BPIN 20201301011863 – CIÉNAGA**

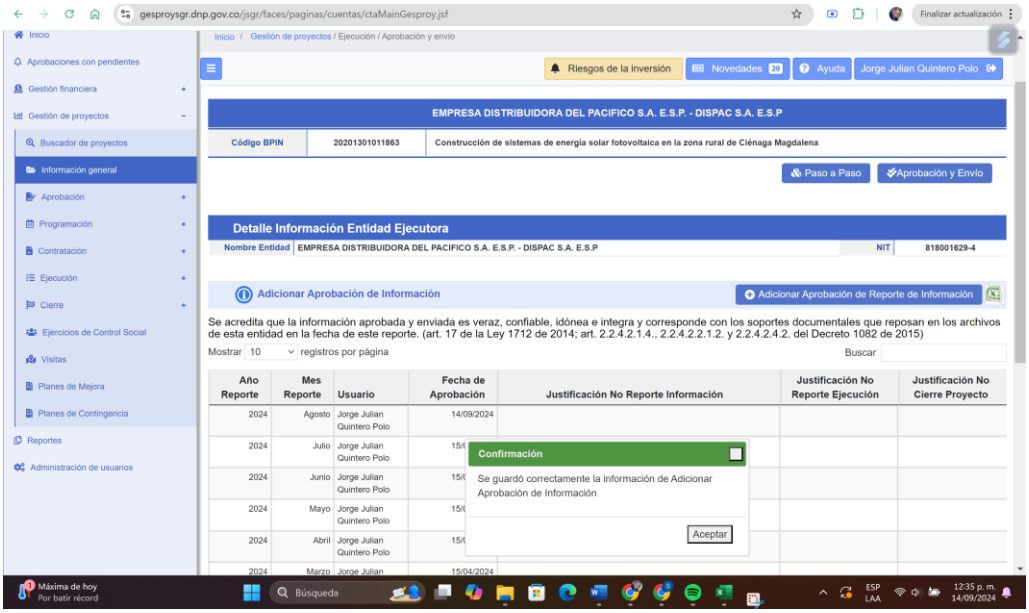

14. **Participar en las reuniones con el DNP, OCAD PAZ, y aquellas entidades en donde se requiera para tratar los asuntos relacionados con el manejo de la plataforma por parte de la empresa.**

    Se asiste reuniones programadas por el DNP y el OCADPAZ con respecto a la ejecución del proyecto BPIN 20201301010353 - Construcción de la interconexión eléctrica de las localidades rurales costeras pertenecientes a tres municipios del departamento del Cauca y en siete municipios del departamento de Nariño, segunda etapa Nacional.

Cordialmente,

**ING. KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ**
Ing. Civil
Magister en Gerencia de Proyectos

K V
A R

ING. VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

# ANEXO 1 –

# INFORMES DE CARGUE DE EJECUCIÓN

# MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301011070 - NOVITA - SEPTIEMBRE 2024

2 mensajes


**GESPROY DISPAC** <gesproy.dispac@gmail.com> 15 de octubre de 2024, 12:35
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>, Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301011070 - Novita**, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día 8 de Octubre.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Septiembre 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

**1. CARGUE DE EJECUCIÓN:** Se carga avance así:

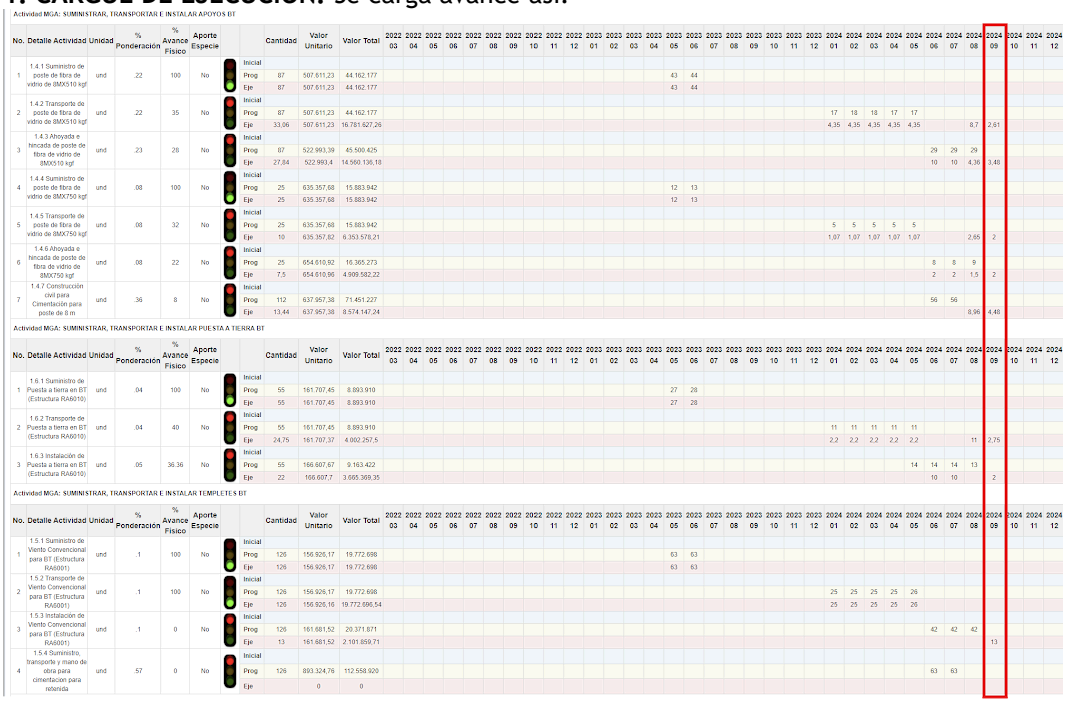

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR APOYOS BT

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4.1 Suministro de poste de fibra de vidrio de 8MX510 kgf | und | ,22 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 87 | 507.611,23 | 44.162.177 | | | | | | | | | | | | | | 43 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 87 | 507.611,23 | 44.162.177 | | | | | | | | | | | | | | 43 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.4.2 Transporte de poste de fibra de vidrio de 8MX510 kgf | und | ,22 | 35 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 87 | 507.611,23 | 44.162.177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 33,06 | 507.611,23 | 16.781.627,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | | | 8,7 | 2,61 | | | | |
| 3 | 1.4.3 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 8MX510 kgf | und | ,23 | 28 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 87 | 522.993,39 | 45.500.425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 29 | 29 | | | | | |
| | | | | | | Eje | 27,84 | 522.993,4 | 14.560.136,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 4,36 | 3,48 | | | | |
| 4 | 1.4.4 Suministro de poste de fibra de vidrio de 8MX750 kgf | und | ,08 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 25 | 635.357,68 | 15.883.942 | | | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 25 | 635.357,68 | 15.883.942 | | | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.4.5 Transporte de poste de fibra de vidrio de 8MX750 kgf | und | ,08 | 32 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 25 | 635.357,68 | 15.883.942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 10 | 635.357,82 | 6.353.578,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | | | 2,65 | 2 | | | | |
| 6 | 1.4.6 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 8MX750 kgf | und | ,08 | 22 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 25 | 654.610,92 | 16.365.273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 9 | | | | | |
| | | | | | | Eje | 7,5 | 654.610,96 | 4.909.582,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1,5 | 2 | | | | |
| 7 | 1.4.7 Construcción civil para Cimentación para poste de 8 m | und | ,36 | 8 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 112 | 637.957,38 | 71.451.227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 56 | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 13,44 | 637.957,38 | 8.574.147,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,96 | 4,48 | | | | |

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA A TIERRA BT

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6.1 Suministro de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010) | und | ,04 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 55 | 161.707,45 | 8.893.910 | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 55 | 161.707,45 | 8.893.910 | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.6.2 Transporte de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010) | und | ,04 | 40 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 55 | 161.707,45 | 8.893.910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 24,75 | 161.707,37 | 4.002.257,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | | 11 | 2,75 | | | | |
| 3 | 1.6.3 Instalación de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010) | und | ,05 | 36,36 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 55 | 166.607,67 | 9.163.422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 14 | 13 | | | | |
| | | | | | | Eje | 22 | 166.607,7 | 3.665.369,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | | 2 | | | | |

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEMPLETES BT

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5.1 Suministro de Viento Convencional para BT (Estructura RA6001) | und | ,1 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 126 | 156.926,17 | 19.772.698 | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 126 | 156.926,17 | 19.772.698 | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.5.2 Transporte de Viento Convencional para BT (Estructura RA6001) | und | ,1 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 126 | 156.926,17 | 19.772.698 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 126 | 156.926,16 | 19.772.696,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | | | | | | | | |
| 3 | 1.5.3 Instalación de Viento Convencional para BT (Estructura RA6001) | und | ,1 | 0 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 126 | 161.681,52 | 20.371.871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 42 | 42 | | | | | |
| | | | | | | Eje | 13 | 161.681,52 | 2.101.859,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | |
| 4 | 1.5.4 Suministro, transporte y mano de obra para cimentacion para retenida | und | ,57 | 0 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 126 | 893.324,76 | 112.558.920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 63 | | | | | | |
| | | | | | | Eje | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TRANSFORMADORES

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7.1 Suministro de Transformador Monofásico autoprotegido de 10 KVA | und | .01 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 1.809.611 | 1.809.611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1 | 1.809.612 | 1.809.612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.7.2 Transporte de Transformador Monofásico autoprotegido de 10 KVA | und | .01 | 50 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 1.809.611 | 1.809.611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 0,6 | 1.809.612,17 | 1.085.767,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | | | 0,2 | 0,1 | | | |
| 3 | 1.7.3 Instalación de Transformador Monofásico autoprotegido de 10 KVA | und | .01 | 30 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 1.864.448 | 1.864.448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 0,4 | 1.864.449 | 745.779,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| 4 | 1.7.4 Suministro de Transformador Monofásico autoprotegido de 25 KVA | und | .05 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 4 | 2.564.697,75 | 10.259.591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 4 | 2.564.898 | 10.259.592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.7.5 Transporte de Transformador Monofásico autoprotegido de 25 KVA | und | .05 | 50 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 4 | 2.564.697,75 | 10.259.591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 2,4 | 2.564.898,04 | 6.155.755,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,6 | | | 0,8 | 0,4 | | | |
| 6 | 1.7.6 Instalación de Transformador Monofásico autoprotegido de 25 KVA | und | .05 | 20 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 4 | 2.642.621,75 | 10.570.487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1,2 | 2.642.621,75 | 3.171.146,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | 0,4 | | | |
| 7 | 1.7.7 Suministro de Transformador Monofásico Autoprotegido de 37,5 KVA | und | .03 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 2 | 2.999.273 | 5.998.546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 2 | 2.999.272,5 | 5.998.545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.7.8 Transporte de Transformador Monofásico Autoprotegido de 37,5 KVA | und | .03 | 50 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 2 | 2.999.273 | 5.998.546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1,2 | 2.999.273,17 | 3.599.127,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | | | 0,4 | 0,2 | | | |
| 9 | 1.7.9 Instalación de Transformador Monofásico Autoprotegido de 37,5 KVA | und | .03 | 30 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 2 | 3.090.160 | 6.180.320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,66 | 0,67 | 0,67 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 0,8 | 3.090.160 | 2.472.128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | |
| 10 | 1.7.10 Suministro de Transformador Trifasico Autoprotegido 30 KVA 13200 220 V | und | .08 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 5 | 3.298.406,4 | 16.492.032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 5 | 3.298.406,4 | 16.492.032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.7.11 Transporte de Transformador Trifasico Autoprotegido 30 KVA 13200 220 V | und | .08 | 50 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 5 | 3.298.406,4 | 16.492.032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 3 | 3.298.406,53 | 9.895.219,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 | | | 1 | 0,5 | | | |
| 12 | 1.7.12 Instalación de Transformador Trifasico Autoprotegido 30 KVA 13200 220 V | und | .09 | 20 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 5 | 3.398.358,2 | 16.991.791 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1,5 | 3.398.358,2 | 5.097.537,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,5 | | | |
| 13 | 1.7.13 Suministro de Transformador Trifasico autoprotegido 45 KVA 13200 220 V | und | .09 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 5 | 3.753.719,8 | 18.768.599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 5 | 3.753.719 | 18.768.595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.7.14 Transporte de Transformador Trifasico autoprotegido 45 KVA 13200 220 V | und | .09 | 50 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 5 | 3.753.719,8 | 18.768.599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 3 | 3.753.719,9 | 11.261.159,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 0,75 | | | 1 | 0,5 | | | |
| 15 | 1.7.15 Instalación de Transformador Trifasico autoprotegido 45 KVA 13200 220 V | und | .1 | 20 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 5 | 3.867.468,8 | 19.337.344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1,5 | 3.867.468,8 | 5.801.203,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,5 | | | |
| 16 | 1.7.16 Suministro de Transformador Trifasico autoprotegido 75 KVA 13200 220 V | und | .04 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 2 | 4.327.681,5 | 8.655.363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 2 | 4.327.682 | 8.655.364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.7.17 Transporte de Transformador Trifasico autoprotegido 75 KVA 13200 220 V | und | .04 | 50 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 2 | 4.327.681,5 | 8.655.363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1,2 | 6.491.521,5 | 7.789.825,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 | | | 0,4 | 0,2 | | | |
| 18 | 1.7.18 Instalación de Transformador Trifasico autoprotegido 75 KVA 13200 220 V | und | .05 | 30 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 2 | 4.458.823,5 | 8.917.647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,66 | 0,67 | 0,67 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 0,8 | 6.688.236 | 5.350.588,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | |

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR TENDIDO RED BT

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.1 Suministro de Cable triplex 2x2 1x2 AWG ACSR | m | .02 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 371 | 8.149,36 | 3.023.414 | | | | | | | | | | | | | | | 185 | 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 371 | 8.149,36 | 3.023.414 | | | | | | | | | | | | | | | 185 | 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.3.2 Transporte de Cable triplex 2x2 1x2 AWG ACSR | m | .02 | 35 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 371 | 8.149,36 | 3.023.414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 166,85 | 8.149,36 | 1.359.720,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | 54,85 | 37 | | | |
| 3 | 1.3.3 Tendido y tensionado de Cable triplex 2x2 1x2 AWG ACSR | m | .02 | 7 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 371 | 8.396,31 | 3.115.032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123 | 124 | 124 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 55,97 | 8.396,31 | 469.941,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,97 | 30 | | | |
| 4 | 1.3.4 Suministro de Cable triplex 2x10 1x10 AWG ACSR | m | .01 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 185 | 10.140,52 | 1.875.996 | | | | | | | | | | | | | | | 92 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 185 | 10.140,52 | 1.875.996 | | | | | | | | | | | | | | | 92 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.3.5 Transporte de Cable triplex 2x10 1x10 AWG ACSR | m | .01 | 18,92 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 185 | 10.140,52 | 1.875.996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 55,5 | 10.140,55 | 562.800,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 20,5 | | | |
| 6 | 1.3.6 Tendido y tensionado de Cable triplex 2x10 1x10 AWG ACSR | m | .01 | 65,95 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 185 | 10.447,81 | 1.932.844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | 62 | 62 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 122 | 10.447,8 | 1.274.632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | 61 | | | | | |
| 7 | 1.3.7 Suministro de Cable triplex 2x20 1x20 AWG ACSR | m | .06 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 906 | 12.498,14 | 11.323.311 | | | | | | | | | | | | | | | 453 | 453 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 906 | 12.498,14 | 11.323.311 | | | | | | | | | | | | | | | 453 | 453 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.3.8 Transporte de Cable triplex 2x20 1x20 AWG ACSR | m | .06 | 19,87 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 906 | 12.498,14 | 11.323.311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 271,8 | 12.498,14 | 3.396.993,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | 91,8 | | | |
| 9 | 1.3.9 Tendido y tensionado de Cable triplex 2x20 1x20 AWG ACSR | m | .06 | 33,11 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 906 | 12.876,87 | 11.666.443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302 | 302 | 302 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 300 | 12.876,87 | 3.863.060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 150 | | | | | |
| 10 | 1.3.10 Suministro de Cable cuadruplex 3xN 2 AWGXLPE 1xN 2 ACSR90600V | m | .06 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1.186 | 10.142,68 | 12.029.214 | | | | | | | | | | | | | | | 593 | 593 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1.186 | 10.142,68 | 12.029.214 | | | | | | | | | | | | | | | 593 | 593 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.11 Transporte de Cable cuadruplex 3xN 2 AWGXLPE 1xN 2 ACSR90600V | m | .06 | 19,81 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1.186 | 10.142,68 | 12.029.214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 237 | 237 | 237 | 237 | 238 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 355,8 | 10.142,68 | 3.608.765,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | | | | 120,8 | | | |
| 12 | 1.3.12 Tendido y tensionado de Cable cuadruplex 3xN 2 AWGXLPE 1xN 2 ACSR90600V | m | .06 | 25,3 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1.186 | 10.450,03 | 12.393.737 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 395 | 395 | 396 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 300 | 10.450,03 | 3.135.010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 150 | | | | | |
| 13 | 1.3.13 Suministro de Cable cuadruplex 3xN 10 AWGXLPE 1xN 10 ACSR90600V | m | .09 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1.403 | 13.288,9 | 18.644.328 | | | | | | | | | | | | | | | 701 | 702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1.403 | 13.288,9 | 18.644.328 | | | | | | | | | | | | | | | 701 | 702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.3.14 Transporte de Cable cuadruplex 3xN 10 AWGXLPE 1xN 10 ACSR90600V | m | .09 | 19,96 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1.403 | 13.288,9 | 18.644.328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 281 | 281 | 281 | 280 | 280 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 421 | 13.288,9 | 5.594.625,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | | | | 141 | | | |
| 15 | 1.3.15 Tendido y tensionado de Cable cuadruplex 3xN 10 AWGXLPE 1xN 10 ACSR90600V | m | .1 | 28,51 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1.403 | 13.691,59 | 19.209.307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 468 | 468 | 467 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 400 | 13.691,6 | 5.476.638 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | 200 | | | | | |
| 16 | 1.3.16 Suministro de Cable cuadruplex 3xN 20 AWGXLPE 1xN 20 ACSR90600V | m | .03 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 385 | 14.374,48 | 5.534.173 | | | | | | | | | | | | | | | 192 | 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 385 | 14.374,48 | 5.534.173 | | | | | | | | | | | | | | | 192 | 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.3.17 Transporte de Cable cuadruplex 3xN 20 AWGXLPE 1xN 20 ACSR90600V | m | .03 | 19,48 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 385 | 14.374,48 | 5.534.173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 115 | 14.374,47 | 1.653.064,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | 40 | | | |
| 18 | 1.3.18 Tendido y tensionado de Cable cuadruplex 3xN 20 AWGXLPE 1xN 20 ACSR90600V | m | .03 | 36,36 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 385 | 14.810,06 | 5.701.875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 | 128 | 129 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 140 | 14.810,07 | 2.073.410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 70 | | | | | |

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR VESTIDA / ARMADA POSTES BT

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2.1 Suministro de estructura para postes | und | .04 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 171 | 46.805,79 | 8.003.790 | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 171 | 46.805,79 | 8.003.790,01 | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.2.2 Transporte de estructura para postes | und | .04 | 45 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 171 | 46.805,79 | 8.003.790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 43 | 43 | 43 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 85,5 | 46.805,77 | 4.001.893,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | | | 42,9 | 8,55 | | | |
| 3 | 1.2.3 Instalación, vestida y armada de estructura para postes | und | .05 | 35 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 171 | 53.046,56 | 9.070.962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 57 | 57 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 68,4 | 53.046,56 | 3.628.384,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 9,85 | 8,55 | | | |
| 4 | 1.2.4 Construcción civil para cimentación | und | .01 | 0 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 171 | 9.361,16 | 1.600.758 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 57 | 57 | | | | |
| | | | | | | | Eje | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR APOYOS MT

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3.1 Suministro de poste de fibra de vidrio de 14MX750 kgf | und | 3.74 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 472 | 1.570.877,38 | 741.454.123 | | | | | | | | | | | | | | | 118 | 118 | 118 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 472 | 1.570.877,38 | 741.454.123,2 | | | | | | | | | | | | | | | 118 | 118 | 118 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.3.2 Transporte de poste de fibra de vidrio de 14MX750 kgf | und | 3.74 | 50 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 472 | 1.570.877,38 | 741.454.123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 283 | 1.570.877,37 | 444.558.296,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | 47 | | | | | |
| 3 | 2.3.3 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 14MX750 kgf | und | 3.85 | 30 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 472 | 1.618.479,72 | 763.922.430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 79 | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 188,6 | 1.618.479,73 | 305.245.276,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 75,6 | 47 | | | | | | |
| 4 | 2.3.4 Suministro de poste de fibra de vidrio de 14MX1050 kgf | und | .74 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 78 | 1.892.859,24 | 147.643.021 | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 78 | 1.892.859,24 | 147.643.021 | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 19 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.3.5 Transporte de poste de fibra de vidrio de 14MX1050 kgf | und | .74 | 50 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 78 | 1.892.859,24 | 147.643.021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 47 | 1.892.859,21 | 88.964.382,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | | | | | |
| 6 | 2.3.6 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 14MX1050 kgf | und | .77 | 25 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 78 | 1.950.218,62 | 152.117.052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 27,5 | 1.950.218,61 | 53.631.011,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4,5 | 8 | | | | | | |
| 7 | 2.3.7 Suministro de poste de fibra de vidrio de 20MX1050 kgf | und | .22 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 12 | 3.643.117,08 | 43.717.405 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 12 | 3.643.117,08 | 43.717.405 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2.3.8 Transporte de poste de fibra de vidrio de 20MX1050 kgf | und | .22 | 58,33 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 12 | 3.643.117,17 | 43.717.406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 7,8 | 3.643.117,02 | 28.416.312,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0,8 | | | | | |
| 9 | 2.3.9 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 20MX1050 kgf | und | .23 | 30 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 12 | 3.753.514,67 | 45.042.576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 4,8 | 3.753.514,8 | 18.016.871,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1,6 | 1,2 | | | | | | |
| 10 | 2.3.10 Suministro de torre de 26 m | und | .72 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 4 | 35.755.967,75 | 143.023.871 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 4 | 35.755.967,75 | 143.023.871 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.3.11 Transporte de torre de 26 m | und | .72 | 0 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 4 | 35.755.968 | 143.023.872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 0,6 | 35.755.968 | 21.453.580,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | |
| 12 | 2.3.12 Ahoyada e hincada de torre de 26 m | und | .74 | 0 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 4 | 36.839.482,25 | 147.357.929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | | | | | | |
| | | | | | | Eje | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2.3.13 Construcción civil de cimentacion para poste de 14 mts | und | 5.17 | 25 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 550 | 1.864.840,45 | 1.025.662.249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 192,5 | 1.864.840,46 | 358.981.789,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 21 | 21 | 21 | | | 53,5 | 55 | | | | | |
| 14 | 2.3.14 Construcción civil de cimentacion para poste de 20 mts | und | .12 | 20 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 12 | 1.921.412,75 | 23.056.953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 3,6 | 1.921.412,89 | 6.917.086,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 0,4 | 1,2 | | | | | | |
| 15 | 2.3.15 Construcción civil de cimentacion cimentacion 1 punto de apoyo torre de 26 m | und | .14 | 33 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 4 | 6.819.080 | 27.276.320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1,4 | 6.819.080,29 | 9.546.712,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,66 | 0,66 | | | | | | 0,08 | | | | | |

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA A TIERRA MT

Actividad MGA: REALIZAR COMPENSACIÓN AMBIENTAL

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.10.1 Compensación ambiental | und | 5.18 | 60 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 1.026.176.820 | 1.026.176.820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 0,65 | 1.026.176.820 | 667.014.933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,05 | | | | |

Actividad MGA: REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL


| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5.1 Interventoria | mes | 5.1 | 88.46 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 26 | 38.908.421,19 | 1.011.618.951 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | | Eje | 24 | 38.908.421,16 | 933.802.107,65 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | 2.5.2 Gestión documental liquidación de obra | mes | 1.57 | 0 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 4 | 77.816.842,25 | 311.267.369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | Eje | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA A TIERRA MT

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2.1 Suministro de Puesta a Tierra Cable de Guarda MT | und | .12 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 102 | 225.476,22 | 22.998.574 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26 | 26 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 102 | 225.476,22 | 22.998.574 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 26 | 26 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.2.2 Transporte de Puesta a Tierra Cable de Guarda MT | und | .12 | 35.29 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 102 | 225.476,22 | 22.998.574 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 45,9 | 225.476,29 | 10.349.361,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 9,9 | | | | | |
| 3 | 2.2.3 Instalación de Puesta a Tierra Cable de Guarda MT | und | .12 | 9.8 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 102 | 232.308,83 | 23.695.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 20,4 | 232.308,82 | 4.739.099,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | 10,4 | | | | | |

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEMPLETES MT


| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6.1 Suministro, transporte e instalación de Viento Convencional para 13.2 kV (Estructura RA6001) | und | 1.65 | 75 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 665 | 493.249,42 | 328.010.862 | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 532 | 493.249,42 | 262.408.690,91 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33,75 | 33,25 | | | | | |
| 2 | 2.6.2 Suministro transporte y mano de obra cimentacion para relenida | und | 3 | 69.92 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 665 | 893.324,76 | 594.060.965 | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 498,75 | 893.324,77 | 445.545.730,63 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33,75 | | | | | | |

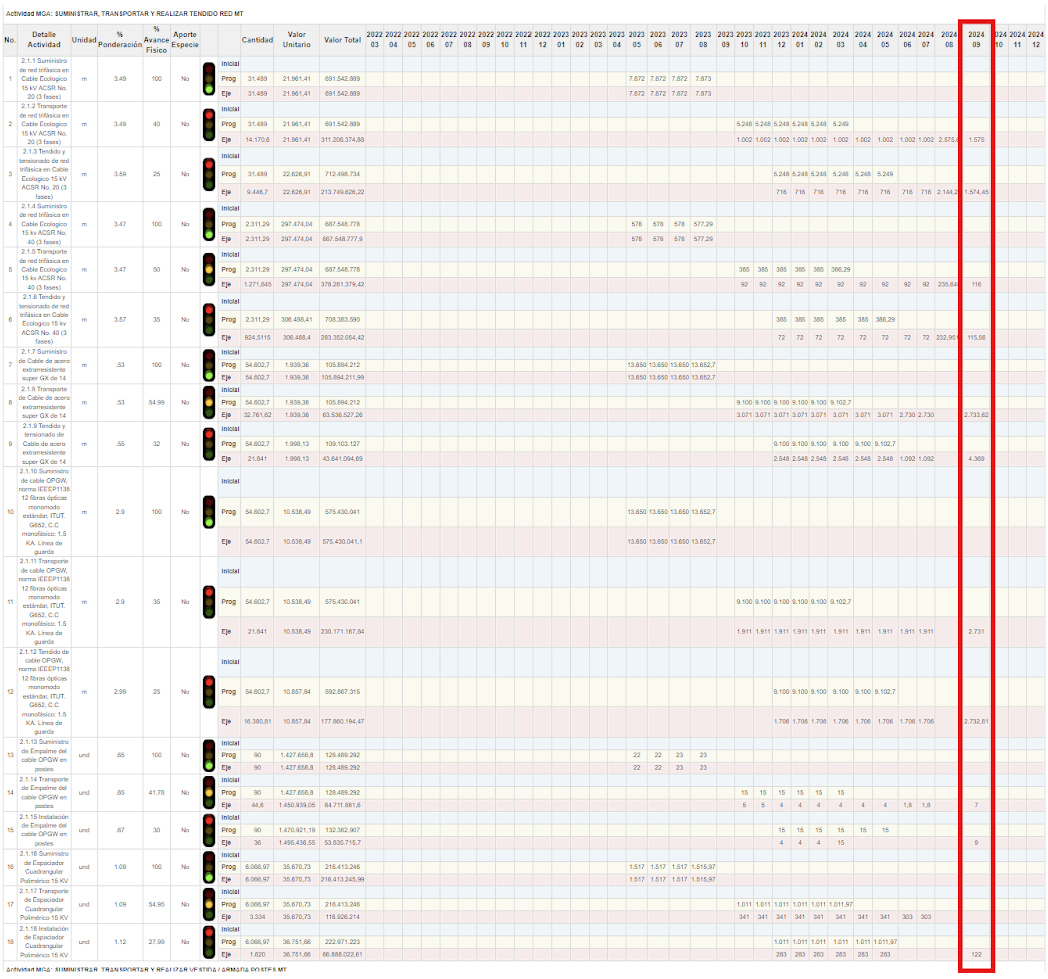

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR TENDIDO RED MT

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1.1 Suministro de red trifásica en Cable Ecológico 15 kV ACSR No. 20 (3 fases) | m | 3.49 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 31.489 | 21.961,41 | 691.542.889 | | | | | | | | | | | | | | 7.872 | 7.872 | 7.872 | 7.873 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 31.489 | 21.961,41 | 691.542.889 | | | | | | | | | | | | | | 7.872 | 7.872 | 7.872 | 7.873 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.1.2 Transporte de red trifásica en Cable Ecológico 15 kV ACSR No. 20 (3 fases) | m | 3.49 | 40 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 31.489 | 21.961,41 | 691.542.889 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.248 | 5.248 | 5.248 | 5.248 | 5.248 | 5.249 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 14.170,6 | 21.961,41 | 311.206.374,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 2.575,6 | 1.575 | | | | | | |
| 3 | 2.1.3 Tendido y tensionado de red trifásica en Cable Ecológico 15 kV ACSR No. 20 (3 fases) | m | 3.59 | 25 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 31.489 | 22.626,91 | 712.498.734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.248 | 5.248 | 5.248 | 5.248 | 5.248 | 5.249 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 9.446,7 | 22.626,91 | 213.749.626,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 2.144,2 | 1.574,45 | | | | | |
| 4 | 2.1.4 Suministro de red trifásica en Cable Ecológico 15 kv ACSR No. 40 (3 fases) | m | 3.47 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 2.311,29 | 297.474,04 | 687.548.778 | | | | | | | | | | | | | | 578 | 578 | 578 | 577,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 2.311,29 | 297.474,04 | 687.548.777,9 | | | | | | | | | | | | | | 578 | 578 | 578 | 577,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.1.5 Transporte de red trifásica en Cable Ecológico 15 kv ACSR No. 40 (3 fases) | m | 3.47 | 50 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 2.311,29 | 297.474,04 | 687.548.778 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 386,29 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1.271,645 | 297.474,04 | 378.261.379,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 235,64 | 116 | | | | | |
| 6 | 2.1.6 Tendido y tensionado de red trifásica en Cable Ecológico 15 kv ACSR No. 40 (3 fases) | m | 3.57 | 35 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 2.311,29 | 306.488,41 | 708.383.590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 386,29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 924,5115 | 306.488,4 | 283.352.054,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 232,903 | 115,56 | | | | | |
| 7 | 2.1.7 Suministro de Cable de acero extramresistente super GX de 14 | m | .53 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 54.602,7 | 1.939,36 | 105.894.212 | | | | | | | | | | | | | | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.652,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 54.602,7 | 1.939,36 | 105.894.211,99 | | | | | | | | | | | | | | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.652,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2.1.8 Transporte de Cable de acero extramresistente super GX de 14 | m | .53 | 54.99 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 54.602,7 | 1.939,36 | 105.894.212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.102,7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 32.761,62 | 1.939,36 | 63.536.527,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 2.730 | 2.730 | | 2.733,62 | | | | | |
| 9 | 2.1.9 Tendido y tensionado de Cable de acero extramresistente super GX de 14 | m | .55 | 32 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 54.602,7 | 1.998,13 | 109.103.127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.102,7 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 21.941 | 1.998,13 | 43.841.054,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.548 | 2.548 | 2.548 | 2.548 | 2.548 | 2.548 | 1.092 | 1.092 | | 4.369 | | | |
| 10 | 2.1.10 Suministro de cable OPGW, norma IEEEP1138 12 fibras ópticas monomodo estándar, ITUT. G652, C.C monofásico: 1.5 KA. Linea de guarda | m | 2.9 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 54.602,7 | 10.538,49 | 575.430.041 | | | | | | | | | | | | | | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.652,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 54.602,7 | 10.538,49 | 575.430.041,1 | | | | | | | | | | | | | | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.652,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.1.11 Transporte de cable OPGW, norma IEEEP1138 12 fibras ópticas monomodo estándar, ITUT. G652, C.C monofásico: 1.5 KA. Linea de guarda | m | 2.9 | 35 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 54.602,7 | 10.538,49 | 575.430.041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.102,7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 21.941 | 10.538,49 | 230.171.167,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | | 2.731 | | | | | | |
| 12 | 2.1.12 Tendido de cable OPGW, norma IEEEP1138 12 fibras ópticas monomodo estándar, ITUT. G652, C.C monofásico: 1.5 KA. Linea de guarda | m | 2.99 | 25 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 54.602,7 | 10.857,84 | 592.867.315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.102,7 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 16.380,81 | 10.857,84 | 177.860.194,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | | 2.732,81 | | | |
| 13 | 2.1.13 Suministro de Empalme del cable OPGW en postes | und | .65 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 90 | 1.427.656,8 | 128.489.292 | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 90 | 1.427.656,8 | 128.489.292 | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2.1.14 Transporte de Empalme del cable OPGW en postes | und | .65 | 41.78 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 90 | 1.427.656,8 | 128.489.292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 44,6 | 1.450.939,05 | 64.711.881,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,8 | 1,8 | | 7 | | | | | |
| 15 | 2.1.15 Instalación de Empalme del cable OPGW en postes | und | .67 | 30 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 90 | 1.470.921,19 | 132.382.907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 36 | 1.495.436,55 | 53.835.715,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 15 | | | | | | 9 | | | |
| 16 | 2.1.16 Suministro de Espaciador Cuadrangular Polimérico 15 KV | und | 1.09 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 6.066,97 | 35.670,73 | 216.413.246 | | | | | | | | | | | | | | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.515,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 6.066,97 | 35.670,73 | 216.413.245,99 | | | | | | | | | | | | | | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.515,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2.1.17 Transporte de Espaciador Cuadrangular Polimérico 15 KV | und | 1.09 | 54.95 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 6.066,97 | 35.670,73 | 216.413.246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011,97 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 3.334 | 35.670,73 | 118.926.214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 303 | 303 | | | | | | | |
| 18 | 2.1.18 Instalación de Espaciador Cuadrangular Polimérico 15 KV | und | 1.12 | 27.99 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 6.066,97 | 36.751,66 | 222.971.223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011,97 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1.620 | 36.751,66 | 66.888.022,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | | | | 122 | | | |

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR VESTIDA / ARMADA POSTES MT

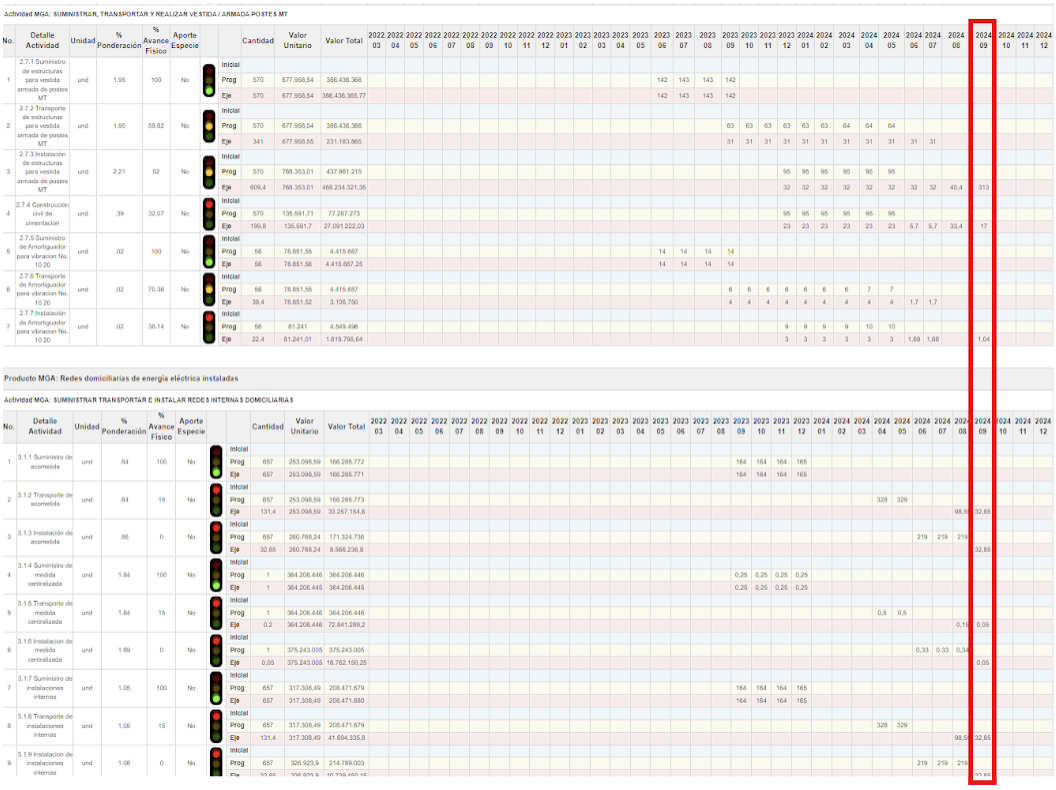

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR VESTIDA / ARMADA POSTES MT

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7.1 Suministro de estructuras para vestida armada de postes MT | und | 1.96 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 570 | 677.958,54 | 386.436.366 | | | | | | | | | | | | | | | 142 | 143 | 143 | 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 570 | 677.958,54 | 386.436.365,77 | | | | | | | | | | | | | | | 142 | 143 | 143 | 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.7.2 Transporte de estructuras para vestida armada de postes MT | und | 1.95 | 59.82 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 570 | 677.958,54 | 386.436.366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 341 | 677.958,55 | 231.183.865 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | | | |
| 3 | 2.7.3 Instalación de estructuras para vestida armada de postes MT | und | 2.21 | 52 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 570 | 768.353,01 | 437.961.215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 609,4 | 768.353,01 | 468.234.321,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40,4 | | 313 | | | |
| 4 | 2.7.4 Construcción civil de cimentacion | und | .39 | 32.07 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 570 | 135.591,71 | 77.267.273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 199,8 | 135.591,7 | 27.091.222,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5,7 | 5,7 | 33,4 | 17 | | | | |
| 5 | 2.7.5 Suministro de Amortiguador para vibracion No. 10 20 | und | .02 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 56 | 78.851,56 | 4.415.687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 56 | 78.851,56 | 4.415.687,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2.7.6 Transporte de Amortiguador para vibracion No. 10 20 | und | .02 | 70.36 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 56 | 78.851,56 | 4.415.687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 39,4 | 78.851,52 | 3.106.750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,7 | 1,7 | | | | | | | |
| 7 | 2.7.7 Instalación de Amortiguador para vibracion No. 10 20 | und | .02 | 38.14 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 56 | 81.241 | 4.549.496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 22,4 | 81.241,01 | 1.819.798,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,68 | 1,68 | | 1,04 | | | |

Producto MGA: Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas

Actividad MGA: SUMINISTRAR TRANSPORTAR E INSTALAR REDES INTERNAS DOMICILIARIAS

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1.1 Suministro de acometida | und | .84 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 657 | 253.098,59 | 166.285.772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164 | 164 | 164 | 165 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 657 | 253.098,59 | 166.285.771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164 | 164 | 164 | 165 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.1.2 Transporte de acometida | und | .84 | 15 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 657 | 253.098,59 | 166.285.773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 328 | 329 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 131,4 | 253.098,59 | 33.257.154,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,56 | 32,85 | | | | | |
| 3 | 3.1.3 Instalación de acometida | und | .66 | 0 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 657 | 260.768,24 | 171.324.736 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 | 219 | 219 | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 32,85 | 260.768,24 | 8.568.236,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,85 | | | | |
| 4 | 3.1.4 Suministro de medida centralizada | und | 1.84 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 364.206.446 | 364.206.446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1 | 364.206.445 | 364.206.445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.1.5 Transporte de medida centralizada | und | 1.84 | 15 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 364.206.446 | 364.206.446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 0,2 | 364.206.446 | 72.841.289,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,05 | | | |
| 6 | 3.1.6 Instalacion de medida centralizada | und | 1.89 | 0 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 375.243.005 | 375.243.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | |
| | | | | | | | Eje | 0,05 | 375.243.005 | 18.762.150,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | |
| 7 | 3.1.7 Suministro de instalaciones internas | und | 1.05 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 657 | 317.308,49 | 208.471.679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164 | 164 | 164 | 165 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 657 | 317.308,49 | 208.471.680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164 | 164 | 164 | 165 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.1.8 Transporte de instalaciones internas | und | 1.05 | 15 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 657 | 317.308,49 | 208.471.679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 328 | 329 | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 131,4 | 317.308,49 | 41.694.335,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,56 | 32,85 | | | | |
| 9 | 3.1.9 Instalacion de instalaciones internas | und | 1.06 | 0 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 657 | 326.923,9 | 214.789.003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 | 219 | 219 | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 32,85 | 326.923,9 | 10.739.450,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32,85 | | | | |

A hoy el proyecto se encuentra contratado y en ejecución, con **0 alertas.**

**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P**

| Código BPIN | 20201301011070 | Construcción DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE CENTROS POBLADOS EN LA ZONA DE CAJÓN Y TORRA DEL MUNICIPIO DE NOVITA Y LAS COMUNIDADES DE CHARCO LARGO - LA UNIÓN CHARCO HONDO Y BARRANCON EN EL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL Chocó |
|---|---|---|

Paso a Paso | Aprobación y Envío

**Alcance**

CONSTRUCCIÓN DE 54.6 km DE REDES DE MT Y 4.44 km DE REDES DE BT EN LOS CENTROS POBLADOS EN LA ZONA CAJÓN Y TORRA, DEL MUNICIPIO DE NOVITA Y LAS COMUNIDADES DE CHARCO LARGO - LA UNIÓN, CHARCO HONDO Y BARRANCON EN EL MUNICIPIO DE SIPI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ


| Fecha aprobación | Fecha terminación | Estado |
|---|---|---|
| 25/10/2021 | 31/12/2024 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |

| Valor total | Valor SGR | Aprobado directamente |
|---|---|---|
| $ 19.828.545.200 | $ 19.828.545.200 | No |

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados

En su ejecución física se tiene un 56,92 % y ejecución financiera 64,72% (Pendiente actualización a Septiembre 2024)

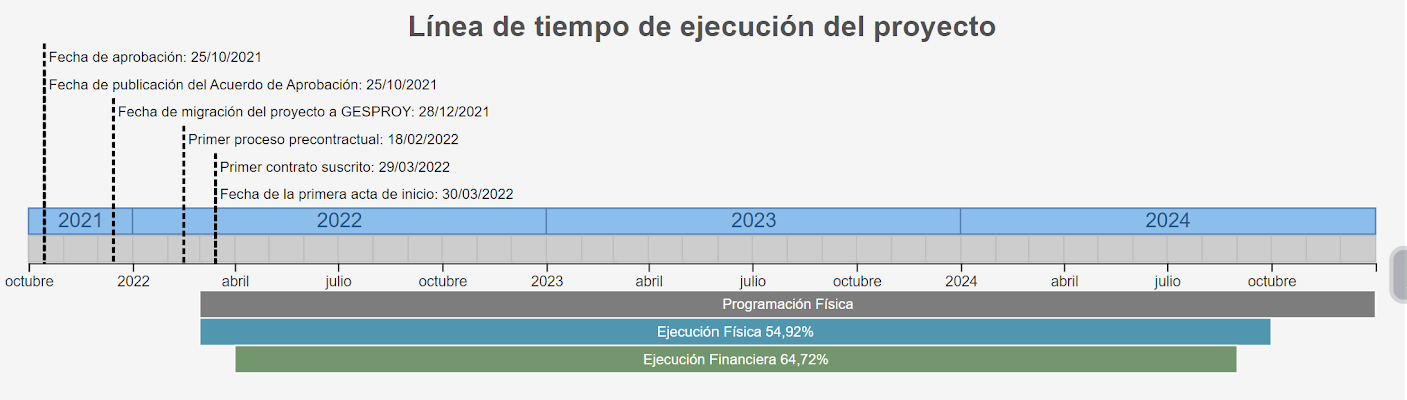


**INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EFICIENCIA - CURVA S** (Pendiente actualización a Septiembre 2024)


**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P**

| Código BPIN | 20201301011070 | Construcción DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE CENTROS POBLADOS EN LA ZONA DE CAJÓN Y TORRA DEL MUNICIPIO DE NOVITA Y LAS COMUNIDADES DE CHARCO LARGO - LA UNIÓN CHARCO HONDO Y BARRANCON EN EL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL Chocó |
|---|---|---|

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

**Curva S**




| Línea | Periodos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 mar-22 | 2 abr-22 | 3 may-22 | 4 jun-22 | 5 jul-22 | 6 ago-22 | 7 sep-22 | 8 oct-22 | 9 nov-22 | 10 dic-22 | 11 ene-23 | 12 feb-23 | 13 mar-23 | 14 abr-23 | 15 may-23 | 16 jun-23 | 17 jul-23 | 18 ago-23 | 19 sep-23 | 20 oct-23 | 21 nov-23 | 22 dic-23 | 23 ene-24 | 24 feb-24 | 25 mar-24 | 26 abr-24 | 27 may-24 | 28 jun-24 | 29 jul-24 | 30 ago-24 | 31 sep-24 | 32 oct-24 | 33 nov-24 | 34 dic-24 |
| * Valor Planeado (PV) | 3 | 6 | 9 | 12 | 54 | 104 | 154 | 204 | 254 | 304 | 354 | 405 | 455 | 506 | 1573 | 2744 | 3848 | 4947 | 5530 | 6420 | 7311 | 8679 | 10017 | 11691 | 13375 | 15054 | 16746 | 17743 | 18770 | 19359 | 19575 | 19660 | 19744 | 19829 |
| * Valor Ganado (EV) | 3 | 6 | 9 | 12 | 54 | 104 | 154 | 204 | 254 | 304 | 354 | 405 | 455 | 506 | 1560 | 2716 | 3806 | 4891 | 5365 | 5832 | 6303 | 6850 | 7282 | 7783 | 8294 | 8784 | 9266 | 9644 | 10022 | 10889 | | | | |
| * Costo Actual (AC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 54 | 104 | 154 | 204 | 254 | 305 | 355 | 405 | 455 | 506 | 1560 | 2717 | 3806 | 4892 | 5365 | 5832 | 6303 | 6851 | 7283 | 7784 | 8296 | 8786 | 9268 | 9646 | 10024 | 10894 | | | | |
| Cumplimiento en la programación (SPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,91 | 0,86 | 0,79 | 0,73 | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,56 | | | | |
| Cumplimiento del costo (CPI) | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Retraso SV(t) | | | | | 0,07 | | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,37 | 0,70 | 1,20 | 1,60 | 2,13 | 2,77 | 3,37 | 4,03 | 4,67 | 5,43 | | 6,63 | | | | |

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

--

Cordialmente,

**Ing. Vanessa Pinzón Ramírez**
**Contratista Apoyo aplicativos SGR**
**Magister en Gerencia de Proyectos**
**(+57) 320 418 0576**
**Bogotá, Colombia.**

---

**Juan Camilo Gómez Sánchez** <jgomez@dispac.com.co> 15 de octubre de 2024, 13:15
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 09 de octubre de los corrientes.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

# MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 2021005940004 - BARRANCOMINAS - SEPTIEMBRE 2024

2 mensajes

**GESPROY DISPAC** <gesproy.dispac@gmail.com> 15 de octubre de 2024, 8:52
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenos días.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 2021005940004 - Barrancominas, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día 08 de Octubre de 2024.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Septiembre de 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

**1. CARGUE DE EJECUCIÓN:** Se carga la información y se lleva el proyecto al 100% de ejecución, así:

Actividad MGA: EXTENDER LINEAS ELECTRICAS

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6.1 Construcción de redes de distribución | und | 1.05 | 95 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 85.804.407 | 85.804.407 | | | | | | | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 85.804.407 | 85.804.407 | | | | | | | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | | | 0,04 | 0,05 | |


Actividad MGA: INSTALAR SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 | 2024 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5.1 TABLERO SINCRONISMO 2 GENERADORES Compra de equipos y materiales importados | und | 2.01 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 164.221.102 | 164.221.102 | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 164.221.102 | 164.221.102 | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.5.2 TABLERO SINCRONISMO 2 GENERADORES Nacionalización de equipos y materiales importados | und | .5 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 41.055.276 | 41.055.276 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 41.055.276 | 41.055.276 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.5.3 TABLERO SINCRONISMO 2 GENERADORES Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución | und | .5 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 41.055.276 | 41.055.276 | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 41.055.276 | 41.055.276 | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.5.4 TABLERO SINCRONISMO 2 GENERADORES Instalación de equipos, materiales y mantenimientos | und | 2.01 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 164.221.102 | 164.221.102 | | | | | | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 164.221.101,82 | 164.221.101,82 | | | | | | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | | | 0,03 | |
| 5 | 1.5.5 TABLERO SINCRONISMO 1 GENERADOR Compra de equipos y materiales importados | und | 2.01 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 164.708.892 | 164.708.892 | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 164.708.892 | 164.708.892 | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.5.6 TABLERO SINCRONISMO 1 GENERADOR Nacionalización de equipos y materiales importados | und | .5 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 41.177.224 | 41.177.224 | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 41.177.224 | 41.177.224 | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.5.7 TABLERO SINCRONISMO 1 GENERADOR Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución | und | .5 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 41.177.224 | 41.177.224 | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 41.177.224 | 41.177.224 | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.5.8 TABLERO SINCRONISMO 1 GENERADOR Instalación de equipos, materiales y mantenimientos | und | 2.01 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 164.708.892 | 164.708.892 | | | | | | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 164.664.990,72 | 164.664.990,72 | | | | | | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | | | 0,03 | |
| 9 | 1.5.9 MAIN CONTROL (UNIDAD DE AUTOMATISMO Y CONTROL) Compra de equipos y materiales importados | und | 5.1 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 417.368.751 | 417.368.751 | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 417.368.751 | 417.368.751 | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.5.10 MAIN CONTROL (UNIDAD DE AUTOMATISMO Y CONTROL) Nacionalización de equipos y materiales importados | und | 1.28 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 104.342.187 | 104.342.187 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 44.609.613 | 44.609.613 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.5.11 MAIN CONTROL (UNIDAD DE AUTOMATISMO Y CONTROL) Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución | und | 1.28 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 104.342.187 | 104.342.187 | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 104.342.187 | 104.342.187 | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.5.12 MAIN CONTROL (UNIDAD DE AUTOMATISMO Y CONTROL) Instalación de equipos, materiales y mantenimientos | und | 5.1 | 97 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 417.368.751 | 417.368.751 | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 417.368.750,9 | 417.368.750,9 | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | | | 0,02 | 0,03 |

Actividad MGA: REALIZAR LA CAPACITACION


| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7.1 Pruebas, puesta en Servicio y capacitación | und | .17 | 97 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 14.171.136 | 14.171.136 | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 14.171.136,2 | 14.171.136,2 | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | | | 0,02 | 0,03 |

De igual forma, se registra la contrapartida, así :

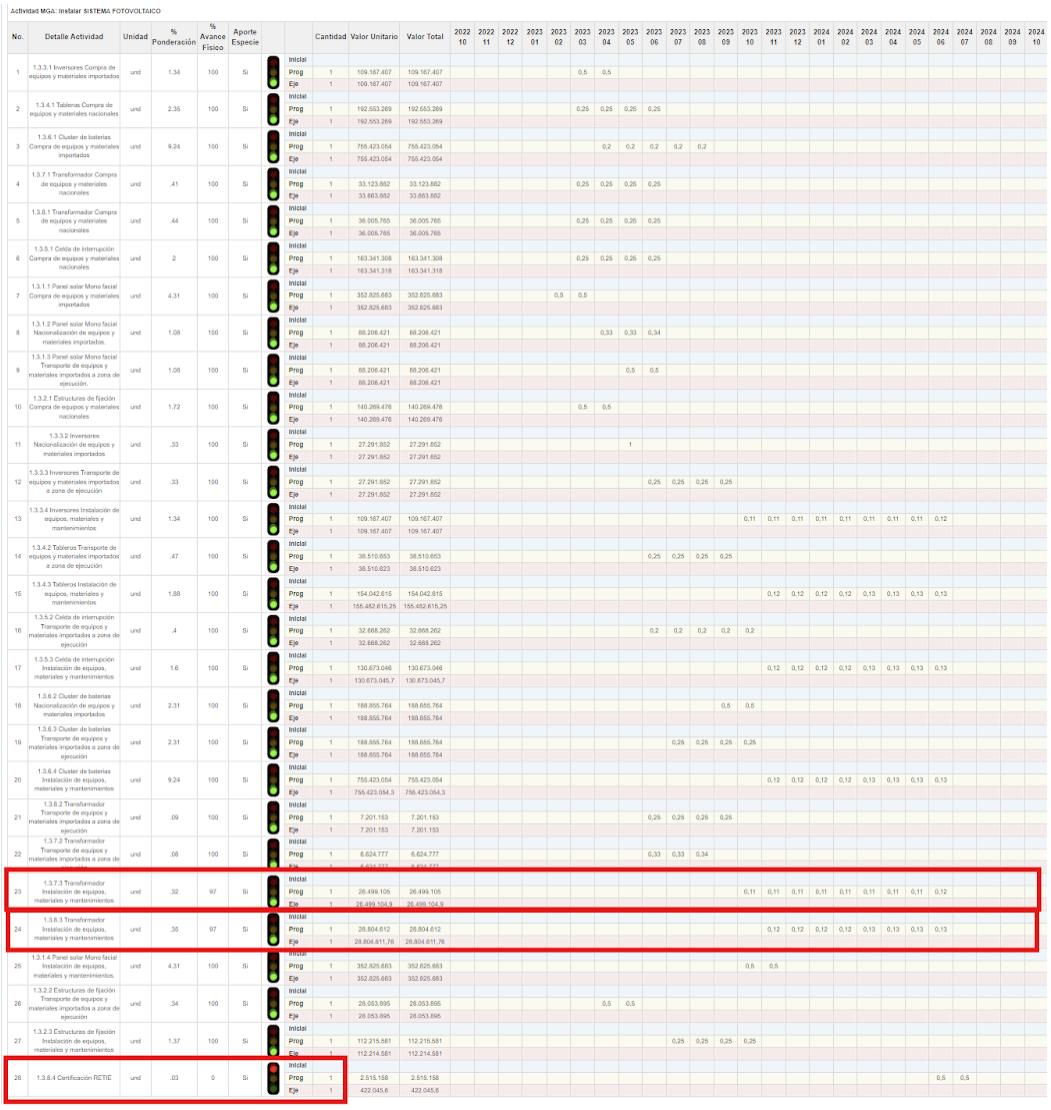



Se carga la siguiente información como observación al avance de ejecución, así:


A hoy el proyecto se encuentra contratado y en ejecución, con **1 alerta, asociada a la suspensión de los contratos de obra e interventoría.**

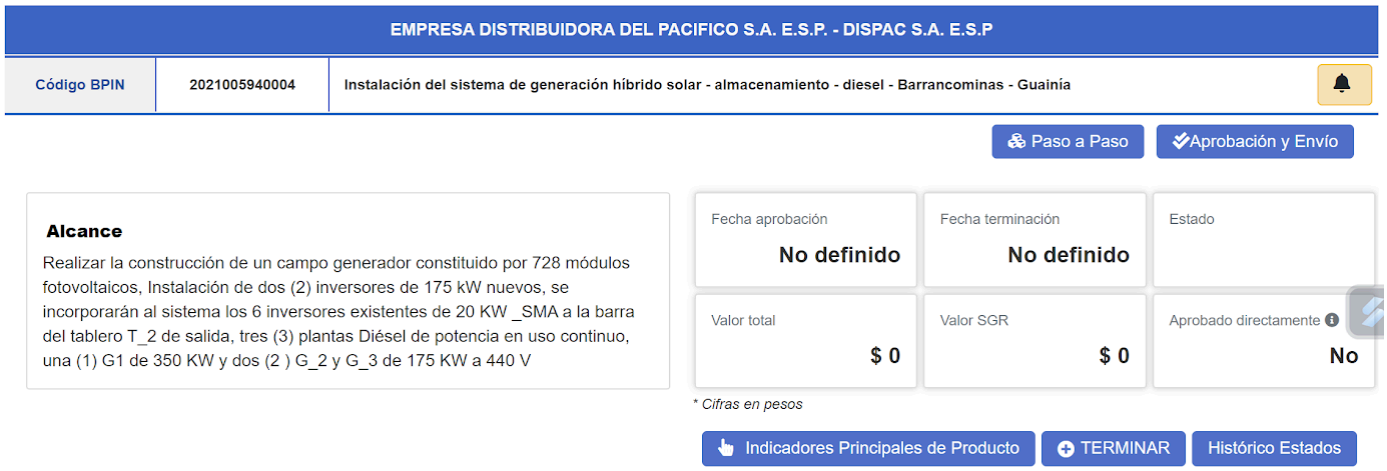


En su ejecución física se tiene un 99,19% y ejecución financiera de 90,72% (Pendiente sincronización a mes de Septiembre 2024)

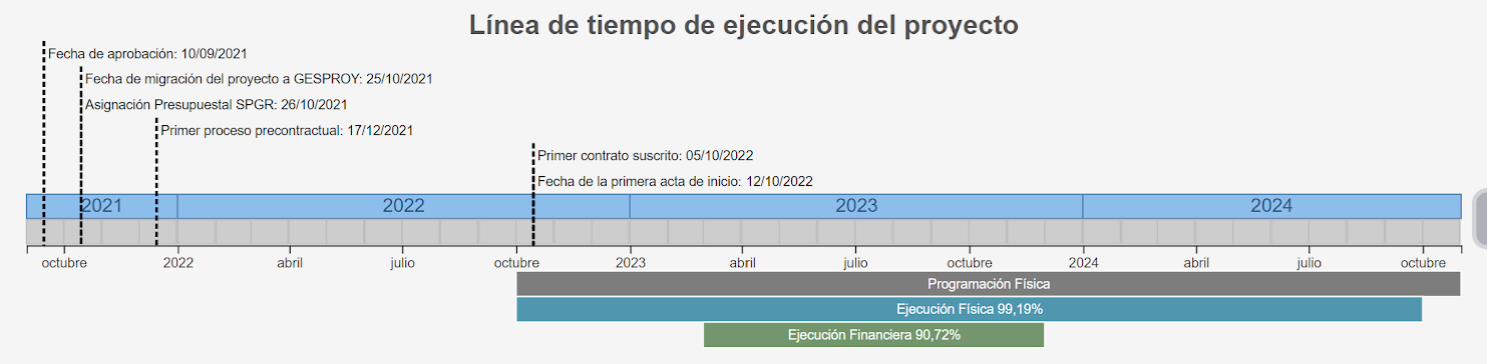


**Indicadores de desempeño de la eficiencia - curva S** (Pendiente sincronización a mes de Septiembre 2024)

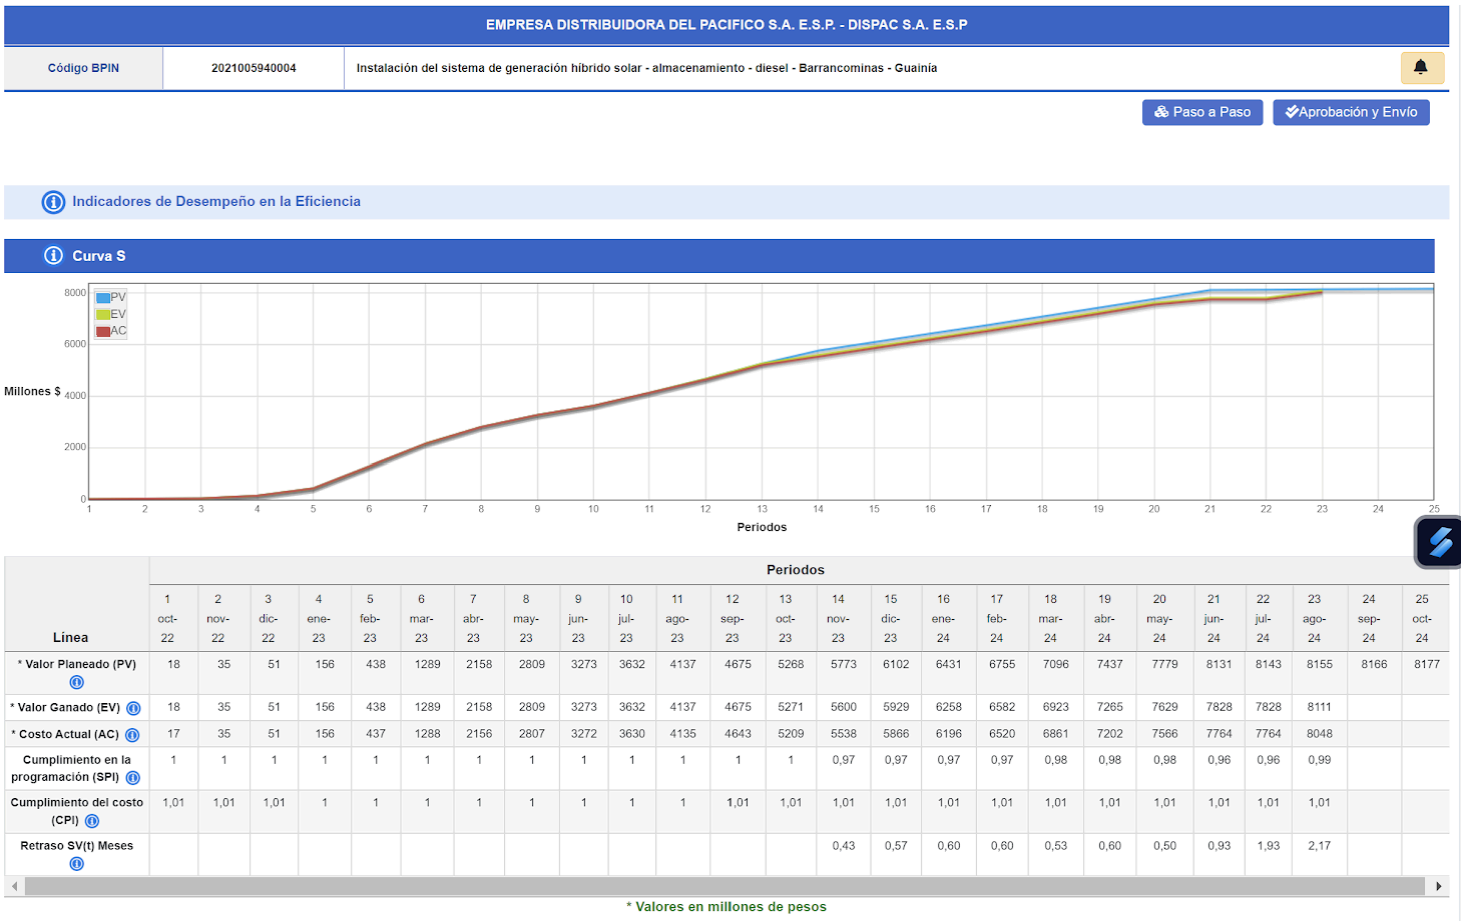


| Linea | Periodos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 oct-22 | 2 nov-22 | 3 dic-22 | 4 ene-23 | 5 feb-23 | 6 mar-23 | 7 abr-23 | 8 may-23 | 9 jun-23 | 10 jul-23 | 11 ago-23 | 12 sep-23 | 13 oct-23 | 14 nov-23 | 15 dic-23 | 16 ene-24 | 17 feb-24 | 18 mar-24 | 19 abr-24 | 20 may-24 | 21 jun-24 | 22 jul-24 | 23 ago-24 | 24 sep-24 | 25 oct-24 |
| * Valor Planeado (PV) | 18 | 35 | 51 | 156 | 438 | 1289 | 2158 | 2809 | 3273 | 3632 | 4137 | 4675 | 5268 | 5773 | 6102 | 6431 | 6755 | 7096 | 7437 | 7779 | 8131 | 8143 | 8155 | 8166 | 8177 |
| * Valor Ganado (EV) | 18 | 35 | 51 | 156 | 438 | 1289 | 2158 | 2809 | 3273 | 3632 | 4137 | 4675 | 5271 | 5600 | 5929 | 6258 | 6582 | 6923 | 7265 | 7629 | 7828 | 7828 | 8111 | | |
| * Costo Actual (AC) | 17 | 35 | 51 | 156 | 437 | 1288 | 2156 | 2807 | 3272 | 3630 | 4135 | 4643 | 5209 | 5538 | 5866 | 6196 | 6520 | 6861 | 7202 | 7566 | 7764 | 7764 | 8048 | | |
| Cumplimiento en la programación (SPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | | |
| Cumplimiento del costo (CPI) | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | | |
| Retraso SV(t) Meses | | | | | | | | | | | | | | 0,43 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,53 | 0,60 | 0,50 | 0,93 | 1,93 | 2,17 | | |

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco tu colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

--

Cordialmente,

**Ing. Vanessa Pinzón Ramírez**
**Contratista Apoyo aplicativos SGR**
**Magister en Gerencia de Proyectos**
**(+57) 320 418 0576**
**Bogotá, Colombia.**

---

**Juan Camilo Gómez Sánchez** <jgomez@dispac.com.co> 15 de octubre de 2024, 13:00
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 09 de octubre de los corrientes.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac®

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

# MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 2021002440035 - GUAJIRA FASE 2 - SEPTIEMBRE 2024

2 mensajes

**GESPROY DISPAC** <gesproy.dispac@gmail.com> 15 de octubre de 2024, 7:34
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>


Melissa, Juan, buenos días.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **2021002440035** - Guajira Fase 2, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día 08 de Octubre de 2024.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Septiembre de 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para los meses de **Septiembre de 2024**, se carga la siguiente información de ejecución, así:

**1. CARGUE DE EJECUCIÓN:** Se carga el valor correspondiente a los procesos de liquidación de obra e interventoría,llevando ambos procesos a un 60% de ejecución, así:

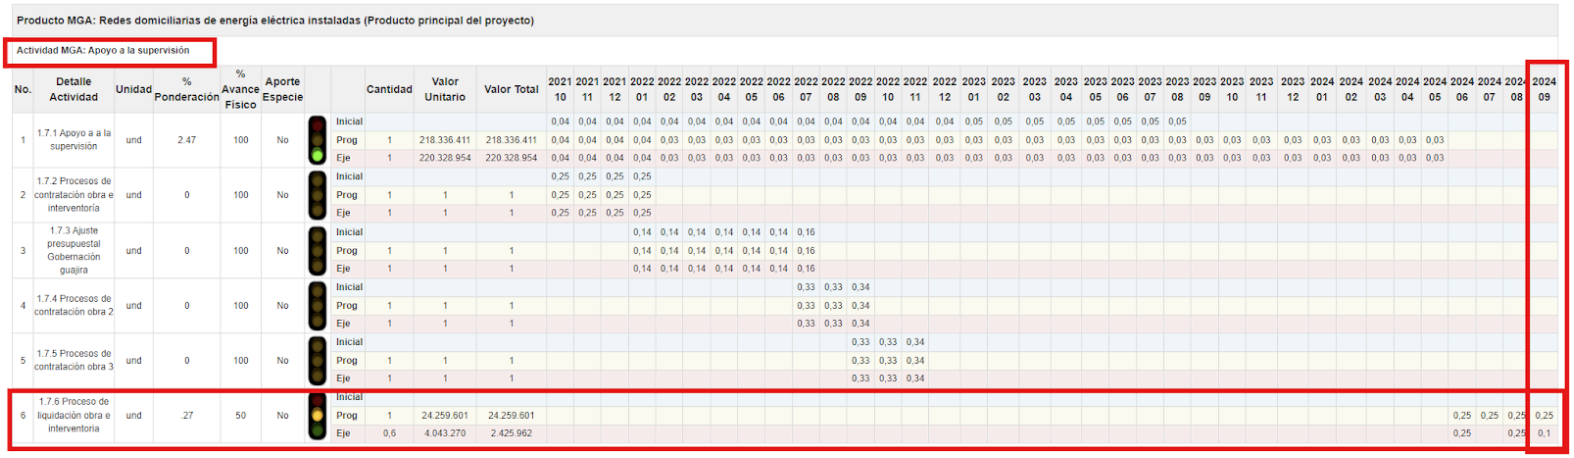

Producto MGA: Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas (Producto principal del proyecto)

Actividad MGA: Apoyo a la supervisión

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 10 | 2021 11 | 2021 12 | 2022 01 | 2022 02 | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7.1 Apoyo a a la supervisión | und | 2.47 | 100 | No | Inicial | | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 218.336.411 | 218.336.411 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 220.328.954 | 220.328.954 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | |
| 2 | 1.7.2 Procesos de contratación obra e interventoría | und | 0 | 100 | No | Inicial | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.7.3 Ajuste presupuestal Gobernación guajira | und | 0 | 100 | No | Inicial | | | | | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 1 | 1 | | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 1 | 1 | | | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.7.4 Procesos de contratación obra 2 | und | 0 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.7.5 Procesos de contratación obra 3 | und | 0 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.7.6 Proceso de liquidación obra e interventoria | und | .27 | 50 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 24.259.601 | 24.259.601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | Eje | 0,6 | 4.043.270 | 2.425.962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | 0,25 | 0,1 |

Actividad MGA: Interventoría integral


| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2021 10 | 2021 11 | 2021 12 | 2022 01 | 2022 02 | 2022 03 | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5.1 Interventoría Integral | und | 4.16 | 100 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 367.310.229 | 367.310.229 | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | | | |
| | | | | | | Eje | 1 | 392.792.381 | 392.792.381 | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | | | |
| 2 | 1.5.2 Proceso de liquidación | und | 1.04 | 50 | No | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog | 1 | 91.827.557 | 91.827.557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| | | | | | | Eje | 0,6 | 91.827.556,67 | 55.096.534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | 0,25 | 0,1 |

No se reporta información como observaciones a la ejecución.


A hoy, el proyecto se encuentra contratado en ejecución, con **0 alertas.**




En su ejecución física se tiene un 99,34% y ejecución financiera 76,31% **(Pendiente actualización con corte a Sep-24)**

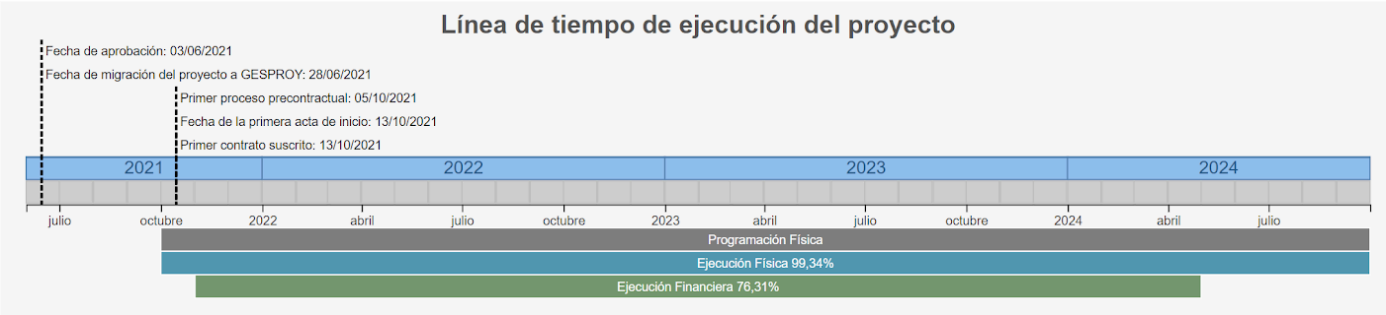


**Indicadores de desempeño de la eficiencia - curva S (Pendiente actualización con corte a Sep-24)**

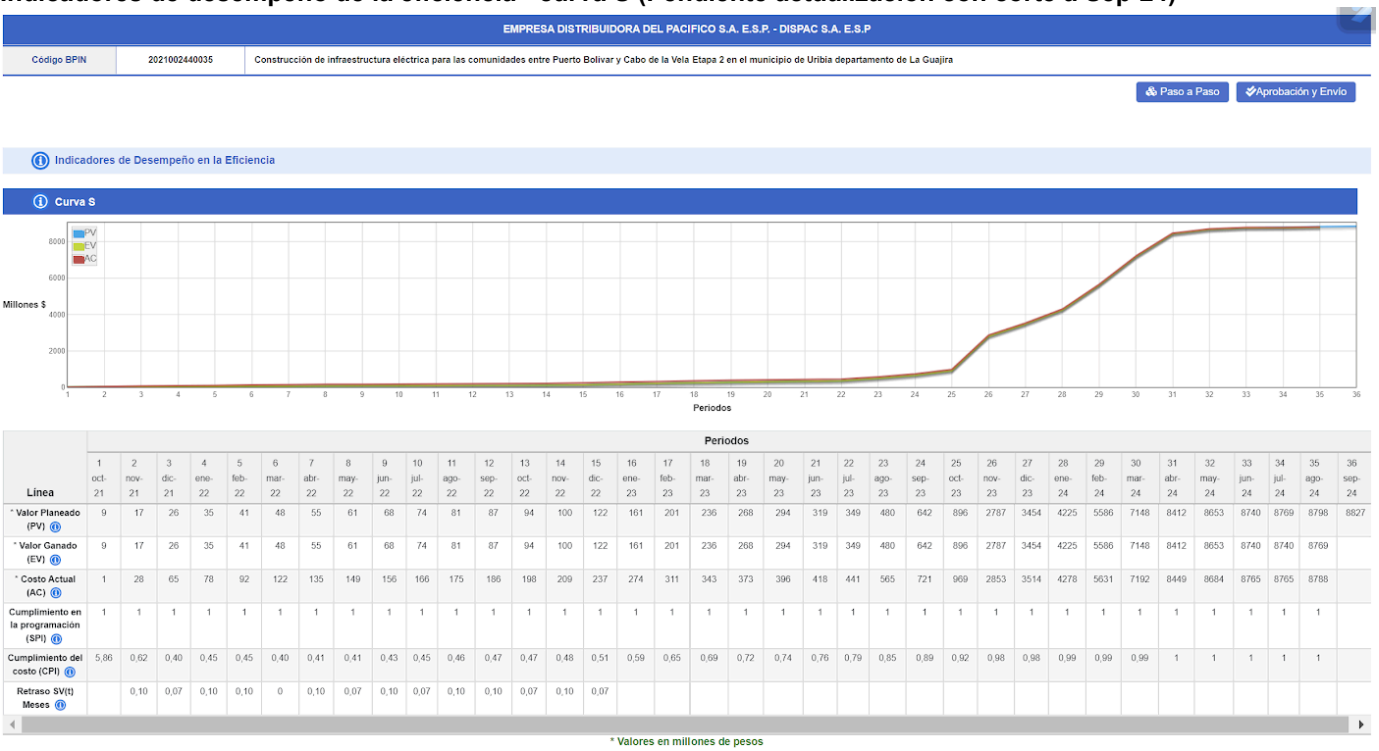


| Línea | Periodos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 oct-21 | 2 nov-21 | 3 dic-21 | 4 ene-22 | 5 feb-22 | 6 mar-22 | 7 abr-22 | 8 may-22 | 9 jun-22 | 10 jul-22 | 11 ago-22 | 12 sep-22 | 13 oct-22 | 14 nov-22 | 15 dic-22 | 16 ene-23 | 17 feb-23 | 18 mar-23 | 19 abr-23 | 20 may-23 | 21 jun-23 | 22 jul-23 | 23 ago-23 | 24 sep-23 | 25 oct-23 | 26 nov-23 | 27 dic-23 | 28 ene-24 | 29 feb-24 | 30 mar-24 | 31 abr-24 | 32 may-24 | 33 jun-24 | 34 jul-24 | 35 ago-24 | 36 sep-24 |
| * Valor Planeado (PV) | 9 | 17 | 26 | 35 | 41 | 48 | 55 | 61 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 | 122 | 161 | 201 | 236 | 268 | 294 | 319 | 349 | 480 | 642 | 896 | 2787 | 3454 | 4225 | 5586 | 7148 | 8412 | 8653 | 8740 | 8769 | 8798 | 8827 |
| * Valor Ganado (EV) | 9 | 17 | 26 | 35 | 41 | 48 | 55 | 61 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 | 122 | 161 | 201 | 236 | 268 | 294 | 319 | 349 | 480 | 642 | 896 | 2787 | 3454 | 4225 | 5586 | 7148 | 8412 | 8653 | 8740 | 8740 | 8769 | |
| * Costo Actual (AC) | 1 | 28 | 65 | 78 | 92 | 122 | 135 | 149 | 156 | 166 | 175 | 186 | 198 | 209 | 237 | 274 | 311 | 343 | 373 | 396 | 418 | 441 | 565 | 721 | 969 | 2853 | 3514 | 4278 | 5631 | 7192 | 8449 | 8684 | 8765 | 8765 | 8788 | |
| Cumplimiento en la programación (SPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cumplimiento del costo (CPI) | 5,86 | 0,62 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,51 | 0,59 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Retraso SV(t) Meses | | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,
**Ing. Vanessa Pinzón Ramírez**
**Contratista Apoyo aplicativos SGR**
**Magister en Gerencia de Proyectos**
**(+57) 320 418 0576**
**Bogotá, Colombia.**

---

**Juan Camilo Gómez Sánchez** <jgomez@dispac.com.co> 15 de octubre de 2024, 12:49

Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 09 de octubre de los corrientes.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac®

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

# MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010463 - SIMITI - SEPTIEMBRE 2024

1 mensaje

**GESPROY DISPAC** <gesproy.dispac@gmail.com> 14 de octubre de 2024, 15:57
Para: jose leon <dispac.joseleon@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Jose, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301010463- Simití**, en la plataforma GESPROY.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Septiembre 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Septiembre 2024**, se carga la siguiente información de ejecución, así:

**1. CARGUE DE EJECUCIÓN:** No se genera cargue de ejecución teniendo en cuenta la suspensión, sin embargo, **se cargan las siguientes observaciones al avance de ejecución.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | * Persiste la medida de suspensión de giros del proyecto, impuesta por el DNP, nos encontramos a la espera de respuesta por parte del DNP para dar continuidad al proceso.<br>* Se recibe solicitud de prorroga a la suspensión N° 3 del contrato de obra, DG-098-2022, debido a las situaciones presentadas por la interventoría.<br>* Se inicia proceso de liquidación del contratista de Interventoría HCR INGENIEROS SAS. | JOSE HERNANDO LEÓN GÓMEZ | 14/10/2024 | |

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--
Cordialmente,
**Ing. Vanessa Pinzón Ramírez**
**Contratista Apoyo aplicativos SGR**
**Magister en Gerencia de Proyectos**
**(+57) 320 418 0576**
**Bogotá, Colombia.**

# MIGRACIÓN INFORMACIÓN GESPROY PROYECTO BPIN 20201301011863 - CIENAGA - SEPTIEMBRE 2024

2 mensajes

**GESPROY DISPAC** <gesproy.dispac@gmail.com> 14 de octubre de 2024, 15:49
Para: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>, Ricardo Arturo Ribero Rojas <rribero@dispac.com.co>

Melissa, Ricardo, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301011863 - Ciénaga**, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día de ayer.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Septiembre/2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Septiembre de 2024**, se carga la siguiente información de ejecución, así:

**1. CARGUE DE EJECUCIÓN:** Se genera el archivo de cargue ejecución del mes de Agosto para las siguientes actividades:

- **Interventoría:** Para la actividad de interventoría se carga lo equivalente a la ejecución de 1 mes, así:

Actividad MGA: Realizar la interventoría.

| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6.1 Interventoria | und | 5.17 | 98.6 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 884.349.452 | 884.349.452 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 0,996 | 884.349.451,07 | 880.812.053,27 | 0,034 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,018 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |

- **Proceso de liquidación de obra e interventoría:** Se cargan un avance del 1%, alcanzando un avance acumulado para esta actividad del 97%

Actividad MGA: Realizar el apoyo a la supervisión


| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7.1 Apoyo a la supervision | und | .31 | 100 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 52.500.000 | 52.500.000 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1 | 64.676.670 | 64.676.670 | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | |
| 2 | 1.7.2 Proceso de liquidación obra e interventoria | und | .06 | 96 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 10.500.000 | 10.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 0,97 | 10.500.000 | 10.185.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,035 | 0,035 | 0,01 |

De igual forma, se reporta en las observaciones a la ejecución, la siguiente información:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | * Se avanza con la liquidación de la Interventoría. | RICARDO ARTURO RIBERO ROJAS | 14/10/2024 |

A hoy el proyecto se encuentra contratado en ejecución, con **0 alertas.**

En su ejecución física se tiene un 99,93% y ejecución financiera 99,40%. **(Pendiente actualización con información a Septiembre 2024)**

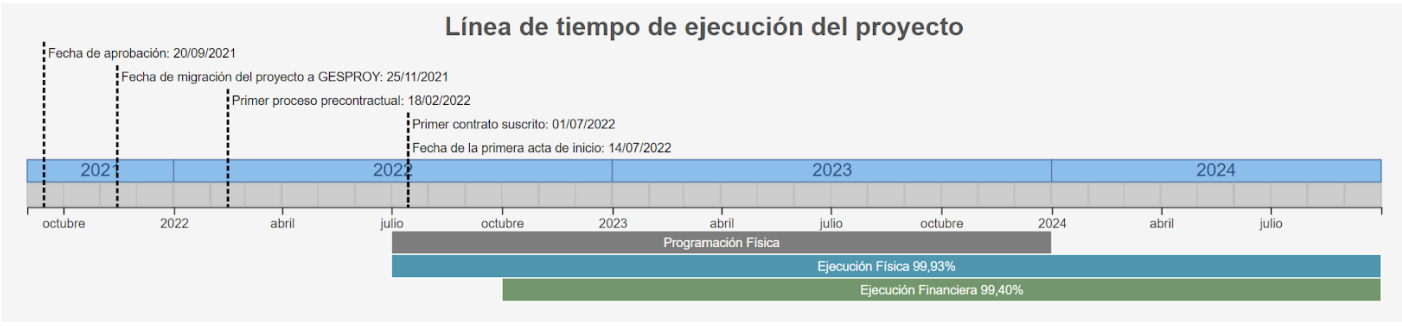


**Desempeño del proyecto - Curva S. (Pendiente actualización con información a Agosto 2023)**


**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P**

| Código BPIN | 20201301011863 | Construcción de sistemas de energia solar fotovoltaica en la zona rural de Ciénaga Magdalena |
|---|---|---|

Paso a Paso | Aprobación y Envío

**Indicadores de Desempeño en la Eficiencia**

**Curva S**




| Línea | Periodos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 jul-22 | 2 ago-22 | 3 sep-22 | 4 oct-22 | 5 nov-22 | 6 dic-22 | 7 ene-23 | 8 feb-23 | 9 mar-23 | 10 abr-23 | 11 may-23 | 12 jun-23 | 13 jul-23 | 14 ago-23 | 15 sep-23 | 16 oct-23 | 17 nov-23 | 18 dic-23 | 19 ene-24 | 20 feb-24 | 21 mar-24 | 22 abr-24 | 23 may-24 | 24 jun-24 | 25 jul-24 | 26 ago-24 |
| * Valor Planeado (PV) | 56 | 112 | 169 | 235 | 433 | 1344 | 2812 | 5484 | 9195 | 12174 | 14558 | 16020 | 16645 | 16994 | 17077 | 17085 | 17089 | 17092 | 17092 | 17092 | 17092 | 17092 | 17092 | 17092 | 17092 | 17092 |
| * Valor Ganado (EV) | 30 | 65 | 104 | 142 | 169 | 229 | 302 | 348 | 411 | 476 | 586 | 791 | 866 | 2124 | 3495 | 6571 | 9538 | 13882 | 16845 | 16884 | 16920 | 16957 | 16994 | 17031 | 17067 | 17079 |
| * Costo Actual (AC) | 30 | 65 | 105 | 145 | 174 | 235 | 308 | 357 | 421 | 489 | 601 | 808 | 886 | 2145 | 3519 | 6590 | 9554 | 13895 | 16857 | 16896 | 16933 | 16969 | 17006 | 17043 | 17079 | 17092 |
| Cumplimiento en la programación (SPI) | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,61 | 0,39 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,81 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
| Cumplimiento del costo (CPI) | 1 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Retraso SV(t) Meses | | 0,93 | 1,27 | 1,53 | | 2,17 | 2,77 | 3,57 | 4,20 | 5,03 | 5,90 | 6,73 | 7,63 | 7,63 | 7,90 | 7,83 | 8,10 | 7,47 | 5,60 | 6,53 | 7,40 | 8,33 | | 9,77 | 10,33 | 10,87 |

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,
**Ing. Vanessa Pinzón Ramírez**
**Contratista Apoyo aplicativos SGR**
**Magister en Gerencia de Proyectos**
**(+57) 320 418 0576**
**Bogotá, Colombia.**

---

**Ricardo Arturo Ribero Rojas** <rribero@dispac.com.co> 15 de octubre de 2024, 7:17
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

De acuerdo Vanessa

Ricardo Arturo Ribero Rojas
Proyectos DISPAC
[El texto citado está oculto]

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

# MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301011744 - CIENAGA - SEPTIEMBRE 2024

1 mensaje

**GESPROY DISPAC** <gesproy.dispac@gmail.com> 10 de octubre de 2024, 17:49
Para: jose leon <dispac.joseleon@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Jose, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301011744 - Ciénaga**, en la plataforma GESPROY.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Septiembre/2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Septiembre/2024**, se carga la siguiente información de ejecución, de acuerdo a lo conversado el día de hoy.

**1. CARGUE DE EJECUCIÓN:** Se continúa el cargue de la actividad "ETAPA DE LIQUIDACIÓN", por lo anterior, la ejecución de esta actividad queda al 97%, así:

Actividad MGA: Realizar la interventoria.


| No. | Detalle Actividad | Unidad | % Ponderación | % Avance Físico | Aporte Especie | | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | 2022 04 | 2022 05 | 2022 06 | 2022 07 | 2022 08 | 2022 09 | 2022 10 | 2022 11 | 2022 12 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04 | 2023 05 | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 | 2024 04 | 2024 05 | 2024 06 | 2024 07 | 2024 08 | 2024 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2.1 Interventoría general del proyecto | und | 3.34 | 100 | No | | Inicial | | | | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 176.957.272 | 176.957.272 | | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 1 | 176.957.272 | 176.957.272 | | | 0,011 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,099 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.2.2 Etapa de liquidación | und | .59 | 96 | No | | Inicial | | | | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prog | 1 | 31.227.754 | 31.227.754 | | | | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eje | 0,97 | 31.227.749,48 | 30.290.917 | | | | | | | | | | | | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |

De igual forma, se reporta en las observaciones a la ejecución, la siguiente información:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Por parte del contratista de obra, se avanza en el cumplimiento de requisitos para la liquidación del proyecto, a la fecha se está revisando el acta de imprevistos del contratista.<br>- El día 19 de Septiembre se recibe visita al proyecto por parte del DNP, estamos a la espera del informe de visita. | JOSE HERNANDO LEÓN GÓMEZ | 10/10/2024 |

A hoy el proyecto se encuentra contratado en ejecución, con **0 alertas.**


**En su ejecución física se tiene un 99,98% y ejecución financiera 93,96%. Pendiente actualización a Septiembre 2024**

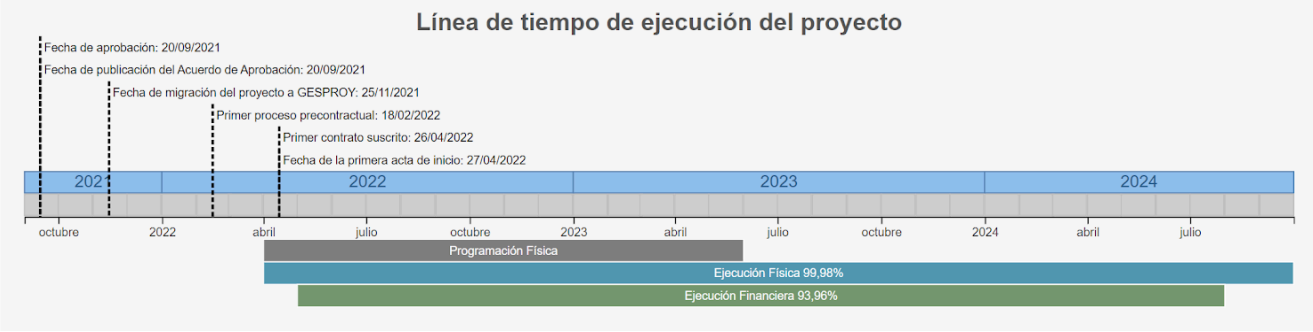


**Desempeño del proyecto - Curva S - Pendiente actualización a Septiembre 2024**

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S




| Línea | Periodos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 abr-22 | 2 may-22 | 3 jun-22 | 4 jul-22 | 5 ago-22 | 6 sep-22 | 7 oct-22 | 8 nov-22 | 9 dic-22 | 10 ene-23 | 11 feb-23 | 12 mar-23 | 13 abr-23 | 14 may-23 | 15 jun-23 | 16 jul-23 | 17 ago-23 | 18 sep-23 | 19 oct-23 | 20 nov-23 | 21 dic-23 | 22 ene-24 | 23 feb-24 | 24 mar-24 | 25 abr-24 | 26 may-24 | 27 jun-24 | 28 jul-24 | 29 ago-24 |
| * Valor Planeado (PV) | 20 | 40 | 59 | 84 | 122 | 296 | 655 | 1114 | 1682 | 2288 | 2873 | 3409 | 4870 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 |
| * Valor Ganado (EV) | 20 | 40 | 59 | 66 | 90 | 137 | 161 | 218 | 342 | 528 | 1286 | 2489 | 4850 | 5274 | 5276 | 5278 | 5280 | 5281 | 5283 | 5285 | 5287 | 5289 | 5291 | 5293 | 5295 | 5296 | 5298 | 5300 | 5302 |
| * Costo Actual (AC) | 17 | 38 | 58 | 65 | 90 | 137 | 161 | 217 | 342 | 524 | 1279 | 2478 | 4835 | 5260 | 5262 | 5264 | 5265 | 5267 | 5269 | 5271 | 5273 | 5275 | 5277 | 5279 | 5280 | 5282 | 5284 | 5286 | 5288 |
| Cumplimiento en la programación (SPI) | 1 | 1 | 1 | 0,79 | 0,74 | 0,46 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,45 | 0,73 | 1 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cumplimiento del costo (CPI) | 1,15 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Retraso SV(t) Meses | | 0,07 | 0,10 | 0,77 | 0,90 | 1 | 1,87 | 2,57 | 2,97 | 3,47 | 2,80 | 1,67 | 0,10 | 0,13 | 1,13 | 2,13 | 3,17 | 4,20 | 5,20 | 6,23 | 7,23 | 8,23 | 9,27 | 10,23 | 11,27 | 12,27 | 13,30 | 14,30 | 15,33 |

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.
--

--
--
Cordialmente,
**Ing. Vanessa Pinzón Ramírez**
**Contratista Apoyo aplicativos SGR**
**Magister en Gerencia de Proyectos**
**(+57) 320 418 0576**
**Bogotá, Colombia.**

# MIGRACIÓN INFORMACIÓN GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010558 - CARMEN DE BOLIVAR - SEPTIEMBRE 2024

1 mensaje

**GESPROY DISPAC** <gesproy.dispac@gmail.com> 10 de octubre de 2024, 17:37
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenas tardes.


De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 20201301010558 - Carmen de Bolívar en la plataforma GESPROY.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Septiembre 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Septiembre 2024**, se carga la siguiente información como observaciones a la ejecución:

| | | | |
|---|---|---|---|
| • A la fecha, continua la medida de suspensión de giros impuesta por el DNP, por cuanto, aún se tiene pendiente el último pago a la Interventoría, ocasionando que el proyecto no pueda cumplir con la totalidad de requisitos de cierre. | JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ | 10/10/2024 | 100,00 |

A hoy, el proyecto se encuentra terminado, con **1 alerta asociada al cierre del proyecto.**



Alertas para el proyecto 20201301010558

| Código | Descripción | Detalles | Valor | Radicado | Fecha Radicado | Plazo para ajuste | Consecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ-1-24 | Proyecto terminado sin cerrar. | Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 346 | $346 | | | 6 meses desde la terminación | Reporte a órganos de control |

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--
Cordialmente,
**Ing. Vanessa Pinzón Ramírez**
**Contratista Apoyo aplicativos SGR**
**Magister en Gerencia de Proyectos**
**(+57) 320 418 0576**
**Bogotá, Colombia.**

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

# CARGUE GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010353 CAUCA NARIÑO - AGOSTO 2024

4 mensajes

**GESPROY DISPAC** <gesproy.dispac@gmail.com> 13 de septiembre de 2024, 17:20
Para: Andres Felipe Horta Rojas <ahorta@dispac.com.co>, Ulpiano Plaza Pastrana <ingulplapa@yahoo.com.ar>, Jorge Julian Quintero Polo <jquintero@dispac.com.co>


Buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 20201301010353 - Cauca Nariño en la plataforma GESPROY.


Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Agosto de 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Agosto de 2024** se carga la siguiente información de ejecución, así:

**1. CARGUE DE EJECUCIÓN:** Se carga el replanteo al 100%, de acuerdo con lo informado por la interventoría.




Se cargan las siguientes observaciones a la ejecución:




| | | | |
|---|---|---|---|
| - Se informa sobre la finalización exitosa de la Etapa de Replanteo de los diez municipios establecidos en el alcance del proyecto, esta actividad, es aprobada en su totalidad por la interventoria, mediante oficio COE-2024-CONS_ADISES-039, del 28 de Agosto de 2024.<br>- Continua la medida de protección impuesta por el DNP. | FREDY HUMBERTO RODRIGUEZ HENAO | 13/09/2024 | |

A hoy el proyecto se encuentra contratado y ejecución, con **0 alertas** para DISPAC.

En su ejecución física se tiene un 1,48% y ejecución financiera un 1,55%.

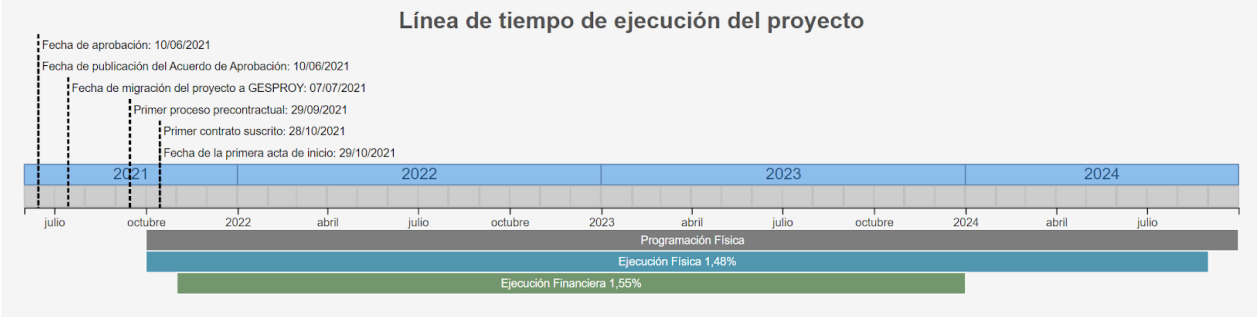


**INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EFICIENCIA - CURVA S:**

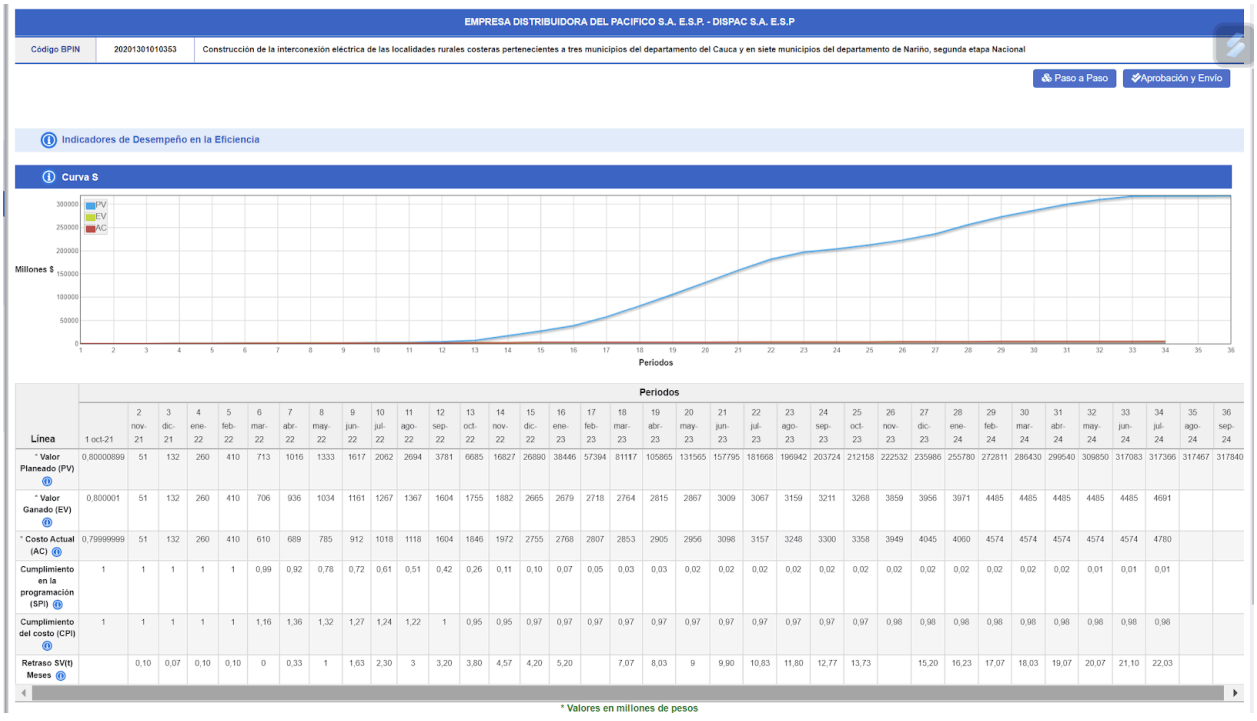

**De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.**

--
--
Cordialmente,
**Ing. Vanessa Pinzón Ramírez**
**Contratista Apoyo aplicativos SGR**
**Magister en Gerencia de Proyectos**
**(+57) 320 418 0576**
**Bogotá, Colombia.**

---

**Andres Felipe Horta Rojas** <ahorta@dispac.com.co> 16 de septiembre de 2024, 12:18
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Ulpiano Plaza Pastrana <ingulplapa@yahoo.com.ar>, Jorge Julian Quintero Polo <jquintero@dispac.com.co>

Ing. Ultpiano,

Cordial saludo.

Atentos a su confirmación para el respectivo cargue.

Gracias.
[El texto citado está oculto]
--

Cordialmente,

ANDRÉS HORTA ROJAS
Secretario General
ahorta@dispac.com.co
6014672203 - 6044672204
Av. calle 26 No. 69 d 91 Oficina 804 Torre 1
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

---

**Ulpiano Plaza Pastrana** <ingulplapa@yahoo.com.ar> 16 de septiembre de 2024, 13:52
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>, Andres Felipe Horta Rojas <ahorta@dispac.com.co>
Cc: Jorge Julian Quintero Polo <jquintero@dispac.com.co>

Buen día, procedamos al cargue.

cordialmente.

Ulpiano Plaza Pastrana

[El texto citado está oculto]

---

**GESPROY DISPAC** <gesproy.dispac@gmail.com> 10 de octubre de 2024, 15:06
Para: PROYECTO CAUCA NARIÑO <dispacproyectocaucanarino@gmail.com>

PSI
[El texto citado está oculto]

Bogotá DC, noviembre 5 de 2024

Doctor
**JORGE JULIAN QUINTERO POLO**
Representante Legal Suplente
**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO – DISPAC S. A. E.S.P**
Ciudad**.**

Respetado Doctor:

En mi calidad de SUPERVISORA del contrato DG-070-2024 relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY, que se ha suscrito con KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ, me permito certificar que el desarrollo de actividades ha venido siendo atendido de conformidad, por lo tanto, emito mi visto bueno, para el trámite correspondiente al pago pactado.

Agradezco su atención,

**MELISSA RODRIGUEZ**
Supervisor contrato DG-070-2024

| Proyectó | Elaboró | Revisó | No. de folios | Anexos |
|---|---|---|---|---|
| * MRODRIGUEZ * | *MRODRIGUEZ* | MRODRIGUEZ | 1 | 1 |
