dispac
www.dispac.com.co
info@dispacsasp.com
20246000010652
Rad: 20246000010652
Fecha: 03-JUL-2024 04:31
Asunto: KAREEN VANESSA PINZON RAMIREZ CUENT
Usua: ASANCHEZG Dest: Dep 600 No.Folios: 15
Rem: KAREEN VANESSA PINZO

Bogotá D.C., 03 de Julio de 2024

Cuenta de Cobro Nº 002

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P
DISPAC S.A. E.S.P
NIT 818.001.629-4

DEBE A:

KAREEN VANESSA PINZON RAMIREZ
C.C. 1.023.942.176 de Bogotá (Cund).

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES DE PESOS M/c ($7.000.000)

Por concepto de:

- Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 200-763874-61

Cordialmente,

Kareen Vanessa Pinzón Ramírez
C.C. 1.023.942.176

Registro Presupuestal: 5100003039

Bogotá, 03 de Julio de 2024

Señores
DISPAC S.A. E.S.P
Bogotá D.C

Asunto: Aplicación retención en la fuente.

Yo, Kareen Vanessa Pinzón Ramírez, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.023.942.176 expedida en Bogotá D.C; declaro bajo la gravedad de juramento:

1. Que para el desarrollo de la actividad contratada he vinculado o contratado a cero (0) empleados.

   Teniendo en cuenta que mi número de empleados es inferior a 2, procedo a certificar la siguiente información:

2. Que los valores correspondientes a los aportes efectuados al sistema de seguridad social en salud y pensión, y los descuentos que aplique por ley son los que detallo a continuación:

I. Periodo de Cotización: Junio de 2024

a) Valor de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud asociados al contrato objeto de cobro $ 352.500.

b) Valor de los Aportes Obligatorios a Fondos de Pensión asociados al contrato objeto de cobro: $ 451.200.

c) Valor de los Aportes Sistema General de Seguridad Social en ARL asociados al contrato objeto de cobro: $14.800

3. Deducción de dependientes Máximo 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT mensuales Valor a deducir por dependientes: $ 0.

4. Deducción de aportes a Fondos de Pensiones voluntarios y/o AFC, Máximo 30% del ingreso neto. (Ingreso bruto menos aportes de salud, pensión y ARL obligatorios) $0.

5. Deducción de aporte medicina prepagada y seguros de salud Monto máximo a deducir 16 UVT mensuales $0.

6. Intereses pagados por préstamos de vivienda y Leasing Habitacional Monto máximo a deducir 100 UVT mensuales Valor a deducir intereses por vivienda $0

El artículo 2º, parágrafo 3º del Decreto 99 de 2013, define la calidad de dependientes para efectos tributarios:

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad y dependan económicamente del contribuyente.

2.Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentra financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificada por el ICFES.

3.Para Hijos mayores de 23 años y/ o cónyuge o compañero (a) permanente, padres y hermanos en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, anexar certificación de Medicina Legal.

7. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 99 de 20131, de manera libre y espontánea bajo la gravedad de juramento, manifiesto que las siguientes personas se encuentran a mi cargo y en consecuencia dependen económicamente de mí:

Nombres	No. Identidad	Fecha de Nacimiento	Calidad de Dependencia

Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes, cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4º del artículo 2º del Decreto 99 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente.

II. La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas tributarias para el mes de (Junio de 2024) y no supera el límite del 10% del ingreso bruto.

III. Esta declaración la hago (03 de Julio de 2024)

Adjunto a la presente los siguientes soportes

1. Copia de la planilla de aportes al sistema general de seguridad social con la constancia de pago.

Cordialmente,



KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ
C.C. N° 1.023.942.176 de Bogotá D.C.

El artículo 2º, parágrafo 3º del Decreto 99 de 2013, define la calidad de dependientes para efectos tributarios:

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad y dependan económicamente del contribuyente.

2.Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentra financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificada por el ICFES.

3.Para Hijos mayores de 23 años y/ o cónyuge o compañero (a) permanente, padres y hermanos en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, anexar certificación de Medicina Legal.

	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	Código	F40-41-12
dispac La energía del Chocó		Versión	01
		Fecha	4/9/2020

CIUDAD			
FECHA DE OPERACIÓN	Día	Mes	Año

N°: DSB -

Autorizado del prefijo DSB 2001 al 3000, Vigencia 12 meses según Res. DIAN 18764017774450 del 08/09/2021

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
NIT: 818.001.629 - 4
Carrera 7 N° 24-76 Quibdó - Chocó
AV. Calle 26 N° 69D 91 Torre 1 of. 804 Bogotá D.C.
Teléfonos: (4) 6726172 - (1) 4672205

NOMBRE DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO: **KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ**

NIT/CC: **1023942176** **E-MAIL:** vanessapinzonr@gmail.com

DIRECCIÓN: **Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial Arrecife T. Peatonal, Of. 804**

TELÉFONO: **467 2203 - 467 2204 - 467 2205** **CELULAR:** **3204180576**

DOCUMENTO SOPORTE PARA LA PROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLE en Compras de Bienes o Servicios a **Persona Natural,** no comerciantes o no responsables de IVA. según resolucion DIAN 0042 de 2020, artículo 771-2 del Estatuto Tributario, y los artículos 1.6.1.4.12. y 1.6.1.4.13. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Contrato DG-070-2024, relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY.” por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024.	$ 7.000.000	$ 7.000.000
VALOR EN LETRAS:	**SIETE MILLONES DE PESOS MCTE**		

KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL VENDEDOR

ELABORADO POR

Declaro bajo la gravedad del juramento que no estoy obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente y no soy responsable de IVA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023942176		PINZON RAMIREZ KAREEN VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 27 # 49 - 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	719101176	9468807674	I	2024/07/18	2024/06/20	NEQUI	0	$458,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1023942176	PINZON KAREEN	25-14	30	$1,580,000	$252,800	EPS005	30	$1,580,000	$197,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,580,000	$8,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,580,000**	**$252,800**			**$1,580,000**	**$197,500**			**$0**	**$0**			**$1,580,000**	**$8,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$252,800	$0	$0	$252,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$252,800	$0	$0	$252,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,300	$0	$0	$8,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,300	$0	$0	$8,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$197,500	$0	$0	$197,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$197,500	$0	$0	$197,500
TOTAL				1	$458,600	$0	$0	$458,600

2024/06/25 10:57 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023942176		PINZON RAMIREZ KAREEN VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 27 # 49 - 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	749321313	9469577479	N	2024/07/18	2024/07/03	BANCOLOMBIA	0	$359,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1023942176	PINZON KAREEN	25-14	30	($1,580,000)	($252,800)	EPS005	30	($1,580,000)	($197,500)		0	$0	$0	14-23	30	($1,580,000)	($8,300)	0	$0	$0
2	CC	1023942176	PINZON KAREEN	25-14	30	$2,820,000	$451,200	EPS005	30	$2,820,000	$352,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,820,000	$14,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,240,000**	**$198,400**			**$1,240,000**	**$155,000**			**$0**	**$0**			**$1,240,000**	**$6,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$198,400	$0	$0	$198,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$198,400	$0	$0	$198,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,500	$0	$0	$6,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,500	$0	$0	$6,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$155,000	$0	$0	$155,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$155,000	$0	$0	$155,000
TOTAL				1	$359,900	$0	$0	$359,900

2024/07/03 11:07 AM

ING. VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

Bogotá D.C, 03 de Julio de 2024

Señores
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICIO S.A. E.S.P.- DISPAC
Atn. **ING. MELISSA MARIA RODRIGUEZ**
Av. Calle 26 No 69 D- 91, Torre 1 Oficina 804, Centro Empresarial Arrecife
Tel: (571) 4672203
Bogotá D.C

Asunto: Informe número 002 de actividades correspondientes al contrato DG-070-2024.

Estimada ingeniera.

En el siguiente informe se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2024, en el marco del contrato DG-070-2024 relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY.

1. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. **Realizar el registro y actualización de la información en la plataforma GESPROY relacionada con los proyectos y los contratos derivados de este, en cumplimiento con el sistema de seguimiento, monitoreo y ejecución de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   Se realiza el cargue de información de los proyectos a cargo de DISPAC en la plataforma GESPROY, y se notifica vía correo electrónico a los supervisores y coordinadora de los proyectos para aprobación y posterior aprobación y envío en la plataforma, tal como se evidencia en el Anexo 1 del presente informe de actividades.

2. **Realizar la programación de los hitos de la contratación derivada de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   No se ejecuta la actividad por la etapa en la que se encuentran los proyectos.

3. **Realizar el registro de la información de la supervisión de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   Se verifica la información de los supervisores de los contratos a fin de garantizar que esta esté completa y conforme a la realidad de cada proyecto.

4. **Proyectar los informes de ejecución y cargue de GESPROY, de acuerdo con la información suministrada por el responsable de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   Se realizan los informes de ejecución y cargue del proyecto, los cuales son enviados a los supervisores y a la coordinadora de proyectos vía correo electrónico – Ver Anexo 1.

5. **Atender las consultas que se desprendan de los reportes, las alertas y novedades de la plataforma GESPROY:**

   Se atienden y contestan las inquietudes que surgen a raíz de los reportes previa aprobación y envío de la información en la plataforma.

6. **Verificar o registrar la marcación de los indicadores de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.**

   No se ejecuta la actividad por la etapa en la que se encuentran los proyectos.

7. **Realizar la creación, modificación y eliminación de rubros, CDP, procesos precontractuales, contratos, registros presupuestales, pagos, e incorporación del presupuesto en el aplicativo GESPROY de los proyectos que se requieran:**

   Se realiza la revisión y actualización de los contratos que se encuentran en ejecución, suspendidos y terminados.

8. **Realizar los ajustes a los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías dentro de las oportunidades establecidas:**

   Se trabaja en la reprogramación del proyecto Guajira Fase II, este cambio se valida con el supervisor del proyecto. Ver Anexo – 2.

9. **Realizar el cargue mensual de la ejecución de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías y reporte de la contratación:**

   Como se evidencia en los puntos anteriores, se realiza el cargue para el mes de Junio de la información de ejecución de los proyectos. Ver Anexo 1.

10. **Verificar la creación y vinculación de terceros, tales como los contratistas y supervisores, en la plataforma GESPROY.**

    Se verifica la información en la plataforma y se corrobora que está completa.

11. **Realizar el reporte de ejecución de bienes y servicios de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

    Se carga el reporte de ejecución de bienes y servicios de acuerdo con lo reportado en el mes por los supervisores de los proyectos.

12. **Revisar y actualizar la información reportada para garantizar que se obtenga el adecuado desempeño en la medición del IGPR de la empresa:**


    Se reporta el avance de ejecución mensual conforme lo indicado y aprobado por los supervisores de los contratos en la reunión mensual para revisión y cargue de información de GESPROY.

    A fin de garantizar el correcto desempeño en la medición del IGPR de DISPAC, se trabaja en la reprogramación del proyecto Guajira Fase II, lo anterior teniendo en cuenta lo estipulado en la Resolución 0226 de 2024.


13. **Realizar en términos generales los reportes y seguimiento en las diferentes plataformas del Sistema General de Regalías del proyecto y de los contratos derivados del mismo:**

    Como se evidencia en los puntos anteriores, se realiza el cargue para el mes de Mayo de la información de ejecución de los proyectos, así mismo, se realiza el aprueba y envía de los proyectos de la siguiente manera:


- **PROYECTO BPIN 2021002440035 - GUAJIRA FASE 2**

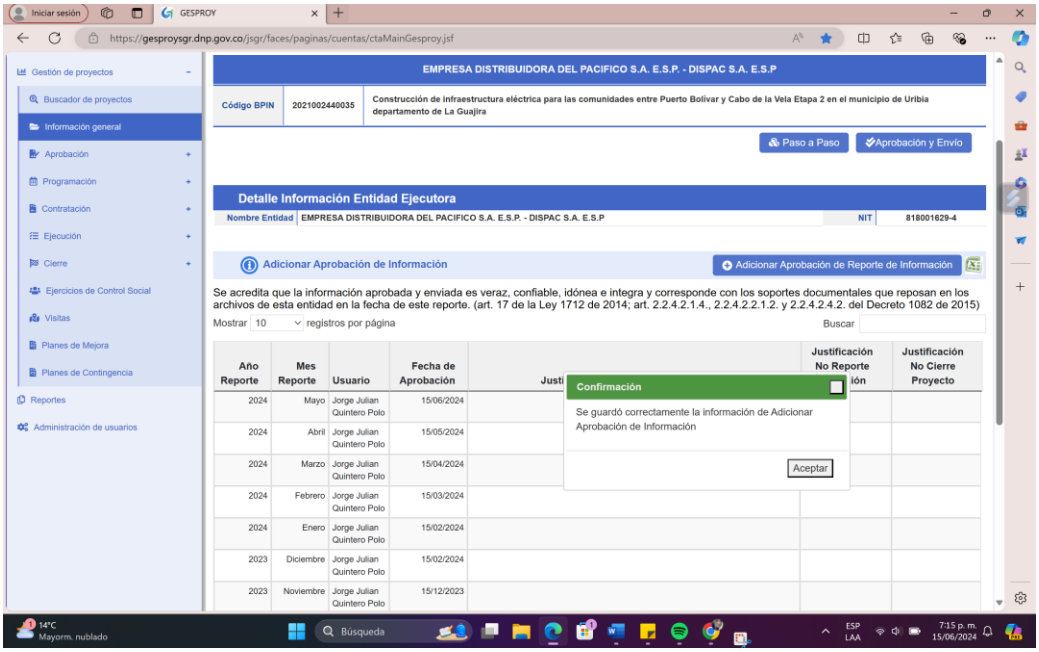


- **PROYECTO BPIN 2021005940004 – BARRANCOMINAS**

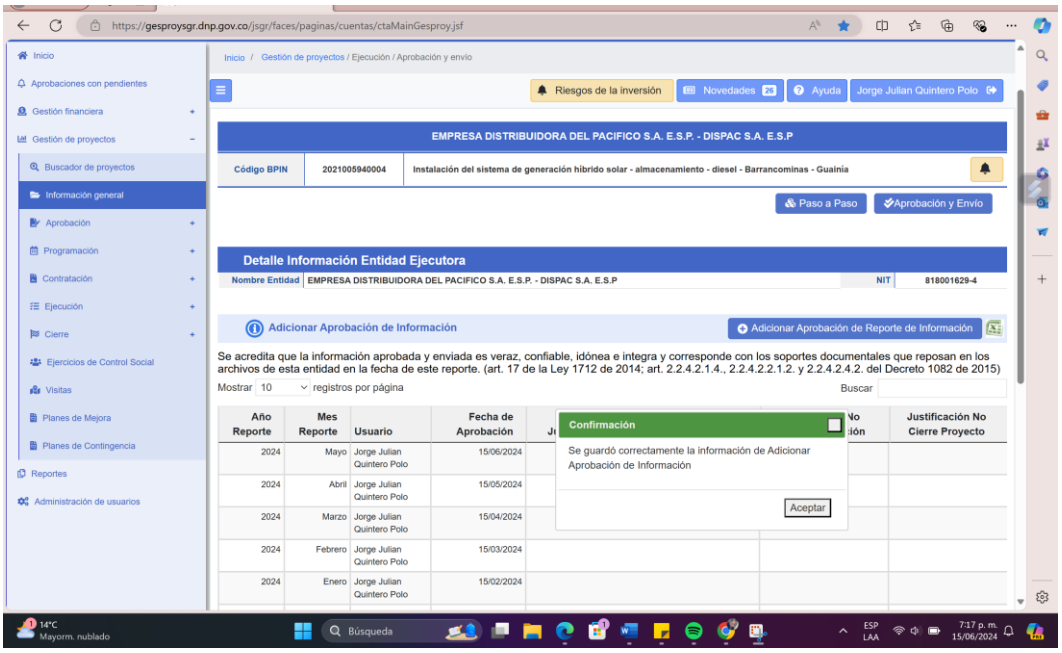


- **PROYECTO BPIN 20201301010353 – CAUCA NARIÑO**

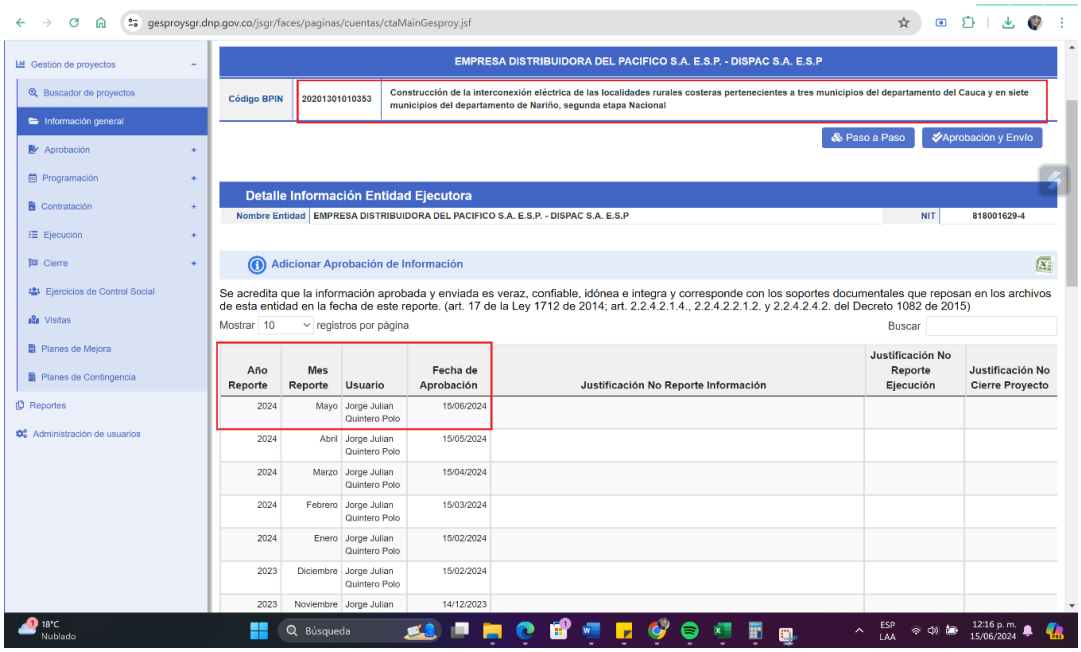


- **PROYECTO BPIN 20201301010463 – SIMITI**

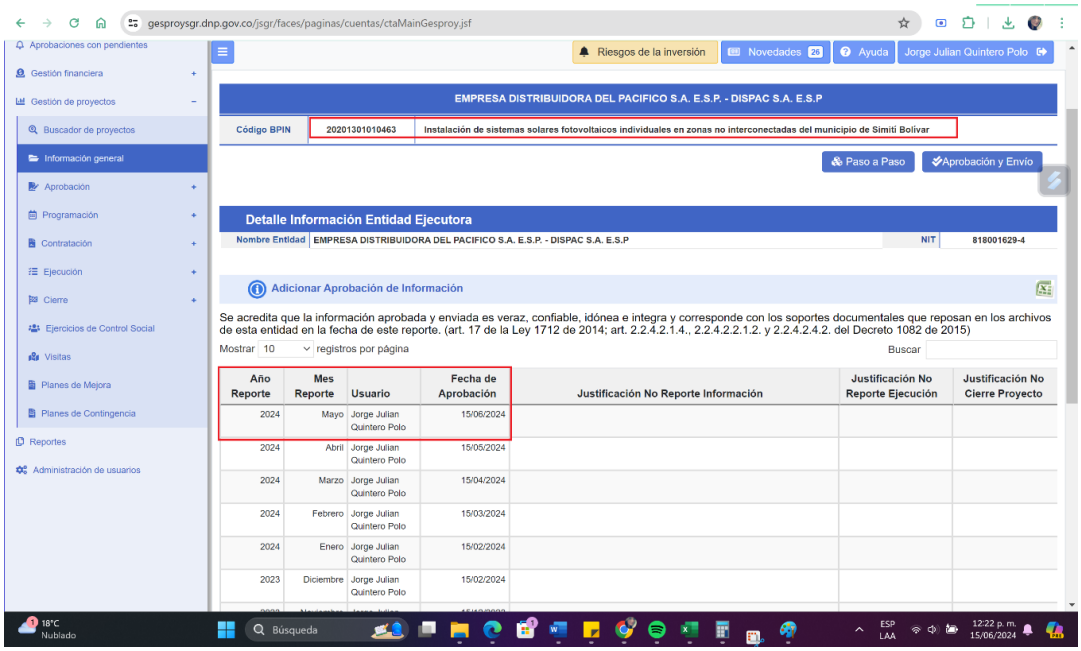


- **PROYECTO BPIN 20201301010558 - CARMEN DE BOLIVAR**

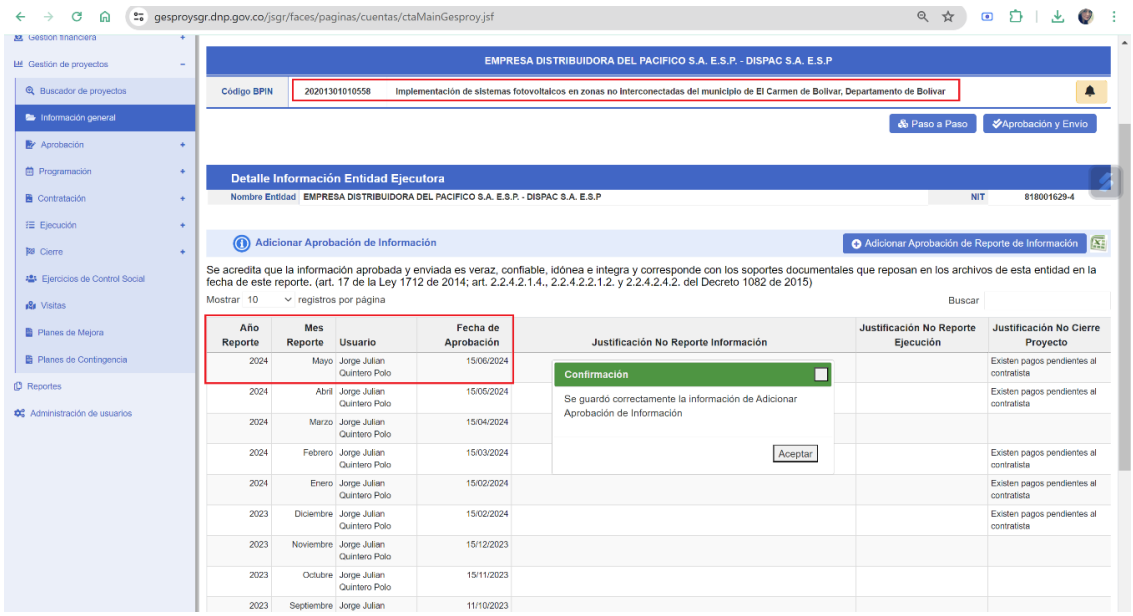


- **PROYECTO BPIN 20201301010861 - PUEBLO BELLO**

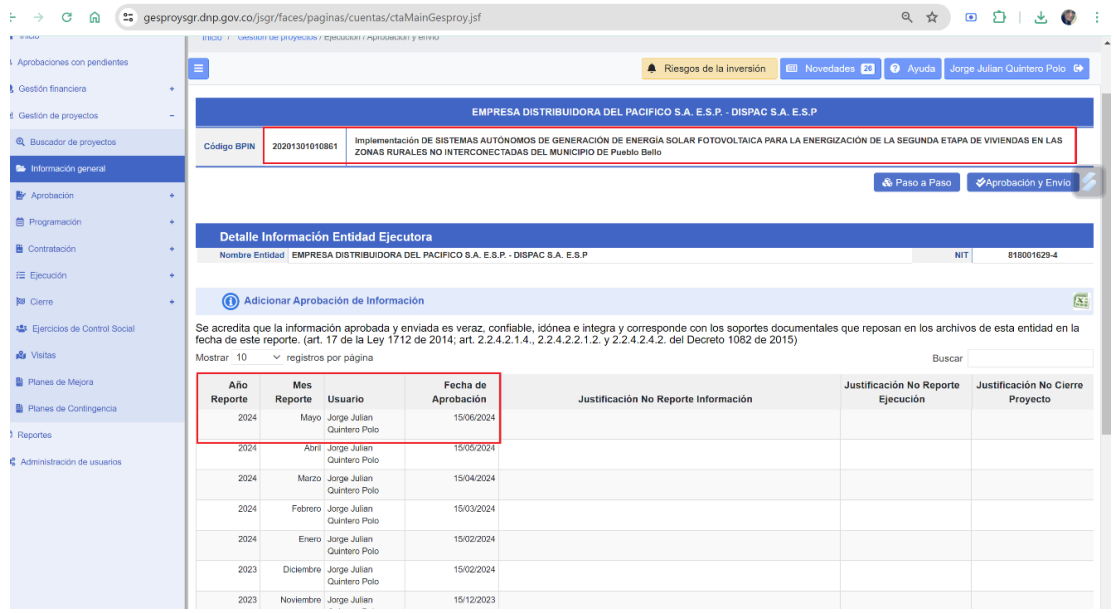


- **PROYECTO BPIN 20201301011070 – NOVITA**

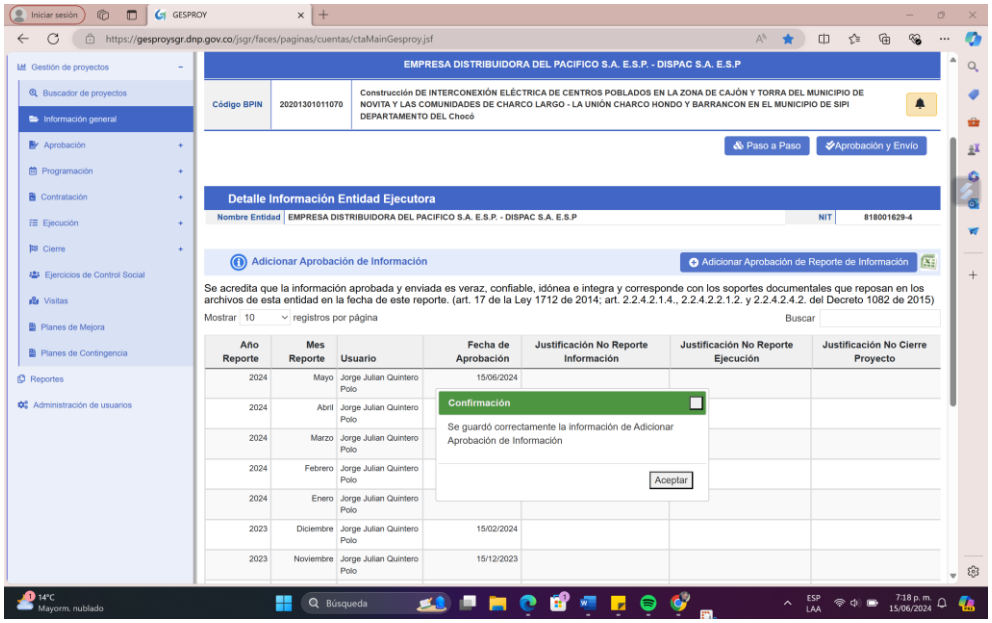

- **PROYECTO BPIN 20201301011744 – CIÉNAGA**

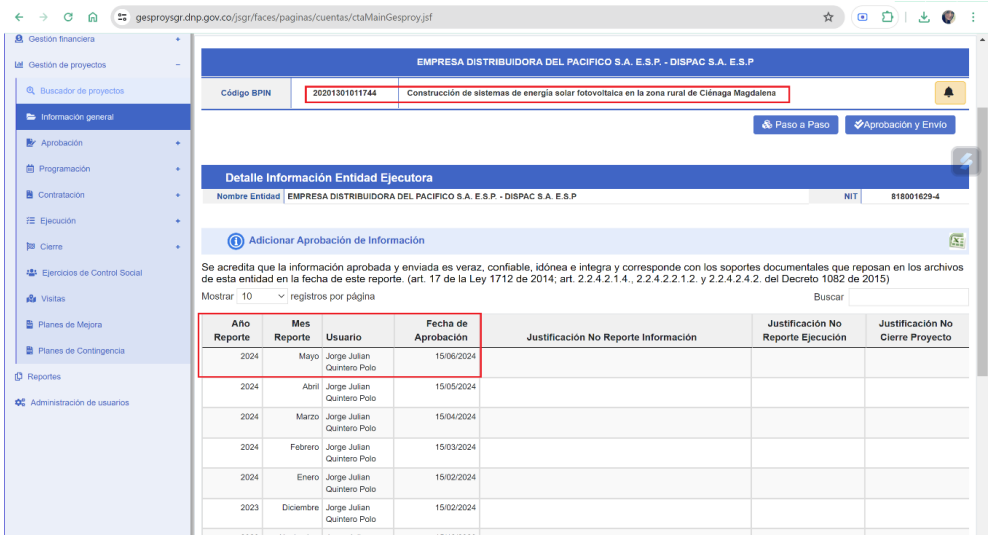

- **PROYECTO BPIN 20201301011863 – CIÉNAGA**

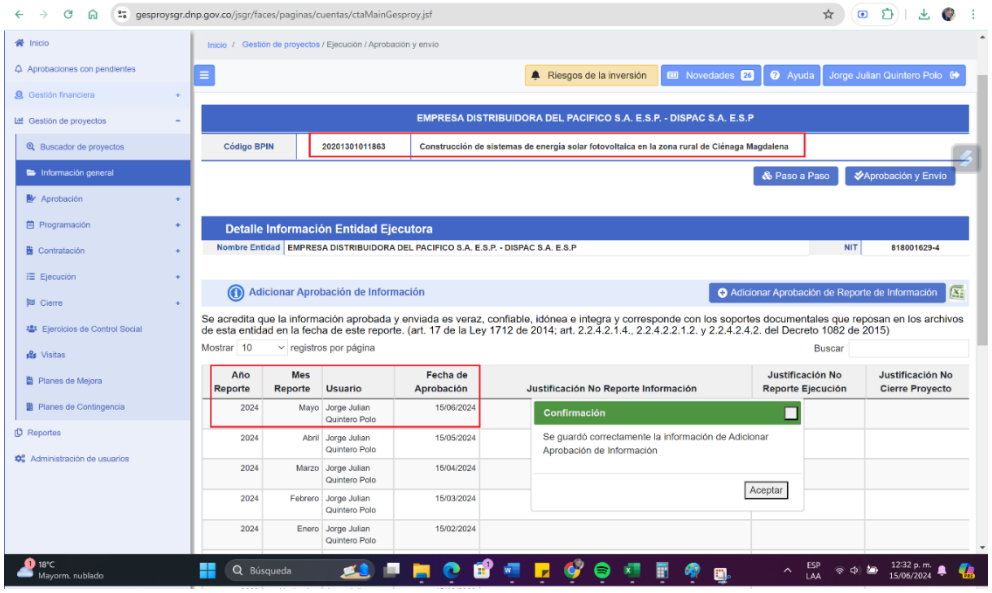

14. **Participar en las reuniones con el DNP, OCAD PAZ, y aquellas entidades en donde se requiera para tratar los asuntos relacionados con el manejo de la plataforma por parte de la empresa.**

    Se asiste reuniones programadas para dar respuesta a los requerimientos hechos por el DNP y la Contraloría del proyecto Cauca Nariño.

Cordialmente,

ING. KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ
Ing. Civil
Magister en Gerencia de Proyectos

K V
A R

ING. VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

ANEXO 1 - INFORMES DE CARGUE DE EJECUCIÓN

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010463 - SIMITI - MAYO 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Para: jose leon <dispac.joseleon@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Jose, buenos días.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 20201301010463- **Simiti**, en la plataforma GESPROY, conforme a lo conversado el día Jueves 13 de Junio.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Mayo 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Mayo de 2024**, se carga la siguiente información de ejecución, así:

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: No se genera cargue de ejecución teniendo en cuenta la suspensión, sin embargo, **se cargan las siguientes observaciones al avance de ejecución.**

*Continua la suspensión del contrato de obra DG-098-2022.	JOSE HERNANDO LEÓN GÓMEZ

De antemano agradecemos su colaboración y quedamos atentos a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--
Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

---

jose leon <dispac.joseleon@gmail.com> 17 de junio de 2024, 7:17
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

bueno dia Vanessa, Acorde a nuestra conversación, la observación que pones es válida y se moldea a la realidad del proyecto.

De mi parte se avala.

Att;

JLEON
[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 17 de junio de 2024, 10:26
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Cordial saludo, favor realizar el cargue conforme a lo reportado por el supervisor
[El texto citado está oculto]
--
Cordialmente,

MELISSA RODRÍGUEZ CHADID
CONTRATISTA PROYECTOS
mrodriguez@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010861 - PUEBLO BELLO - MAYO 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenos días.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 20201301010861 **- Pueblo Bello** conforme lo revisado en la reunión del día 12 de Junio.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Mayo 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: El avance de ejecución del proyecto es de 100%, por cuanto no se carga avance de ejecución.

Se carga la siguiente información como observación al avance de ejecución, así:

* Se inicia proceso de liquidación de los contratos del proyecto.	JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ

De antemano agradezco tu colaboración y quedo atenta a tu respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--
Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 17 de junio de 2024, 9:50
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 12 y 13 de junio de los corrientes.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 17 de junio de 2024, 10:03
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Cordial saludo, favor realizar el cargue conforme a lo reportado por el supervisor
[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010558 - CARMEN DE BOLIVAR - MAYO 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 20201301010558 - Carmen de Bolívar en la plataforma GESPROY, conforme a lo acordado en la reunión del 12 de Junio de 2024.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Mayo 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Mayo 2024**, se carga la siguiente información como observaciones a la ejecución:

Observaciones a la Ejecución

Registrar Observaciones a la Ejecución

Mostrar 10 registros por página

Buscar

		Concepto Seguimiento	Conceptuó	Fecha	% Ejecución Física
		• Se registran 2.792 beneficiarios, que corresponde a un promedio de 4 beneficiarios por cada una de las 698 soluciones fotovoltaicas instaladas. • A la fecha, continua la medida de suspensión de giros impuesta por el DNP, por cuanto, aún se tiene pendiente el último pago a la Interventoría, ocasionando que el proyecto no pueda cumplir con la totalidad de requisitos de cierre.	JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ	15/03/2024	
		• A la fecha, continua la medida de suspensión de giros impuesta por el DNP, por cuanto, aún se tiene pendiente el último pago a la Interventoría, ocasionando que el proyecto no pueda cumplir con la totalidad de requisitos de cierre.	JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ	15/04/2024	
		• A la fecha, continua la medida de suspensión de giros impuesta por el DNP, por cuanto, aún se tiene pendiente el último pago a la Interventoría, ocasionando que el proyecto no pueda cumplir con la totalidad de requisitos de cierre.	JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ	15/06/2024	

A hoy, el proyecto se encuentra terminado, con **1 alerta asociada al cierre del proyecto.**

gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf

Departamento Nacional de Planeación - **DNP**

gesproy 3.0

Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control

- Inicio
- Gestión de proyectos
  - Buscador de proyectos
  - Información general
  - Aprobación
  - Programación
  - Contratación
  - Ejecución
    - Hitos del proyecto
    - Registro de avance Ejecución
    - Desempeño del Proyecto
    - Ejecución de Indicadores de Producto
    - Pagos
    - Registro Audiovisual
  - Cierre
  - Ejercicios de Control Social
  - Visitas

Inicio / Gestión de proyectos / Ejecución / Registro de Avance Ejecución

Riesgos de la inversión | Novedades 26 | Ayuda | JUAN CA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301010558	Implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas no interconectadas del municipio de El Carmen de Bolivar, Departar

Cargue de Ejecución

Detalle Informaci

Valor Total del Proyecto a P

Valor Actividades Pro

Valor Actividades E

Descargar archivo de p

Descargar archivo de e

Producto MGA: Unidades

GESPROY - Google Chrome

gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainRiesgosInversionProy.jsf?bpin=20201301010558

Riesgos de la inversion por proyecto

Aqui se visualizan los riesgos de inversión detectados para su proyecto 20201301010558

Alertas para el proyecto 20201301010558

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-24 ⚠	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 228	$228			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramirez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 17 de junio de 2024, 9:35
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 12 y 13 de junio de los corrientes.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodriguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 17 de junio de 2024, 10:04
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Cordial saludo, favor realizar el cargue conforme a lo reportado por el supervisor
[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 2021005940004 - BARRANCOMINAS - MAYO 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 15
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>, Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 2021005940004 - Barrancominas, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día 13 de Junio.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Mayo de 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se genera el archivo de cargue de ejecución para las siguientes actividades:

- **EXTENDER LÍNEAS ELÉCTRICAS**

Actividad MGA: EXTENDER LINEAS ELECTRICAS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
1	1.6.1 Construcción de redes de distribución	und	1.05	84	No		Inicial																										
							Prog	1	85.804.407	85.804.407								0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09					
							Eje	0,91	85.804.407	78.082.010,37								0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07					

- **1.5. INSTALAR SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO - TABLERO SINCRONISMO 2 GENERADORES, TABLERO SINCRONISMO 1 GENERADOR y MAIN CONTROL (UNIDAD DE AUTOMATISMO Y CONTROL):**

Actividad MGA: INSTALAR SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
1	1.5.1 TABLERO SINCRONISMO 2 GENERADORES Compra de equipos y materiales importados	und	2.01	100	No		Inicial																										
							Prog	1	164.221.102	164.221.102						0,5	0,5																	
							Eje	1	164.221.102	164.221.102						0,5	0,5																	
2	1.5.2 TABLERO SINCRONISMO 2 GENERADORES Nacionalización de equipos y materiales importados	und	.5	100	No		Inicial																										
							Prog	1	41.055.276	41.055.276								1															
							Eje	1	41.055.276	41.055.276								1															
3	1.5.3 TABLERO SINCRONISMO 2 GENERADORES Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución	und	.5	100	No		Inicial																										
							Prog	1	41.055.276	41.055.276									0,25	0,25	0,25	0,25											
							Eje	1	41.055.276	41.055.276									0,25	0,25	0,25	0,25											
4	1.5.4 TABLERO SINCRONISMO 2 GENERADORES Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	2.01	77	No		Inicial																										
							Prog	1	164.221.102	164.221.102												0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12					
							Eje	0,88	164.221.102	144.514.569,76												0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11					
5	1.5.5 TABLERO SINCRONISMO 1 GENERADOR Compra de equipos y materiales importados	und	2.01	100	No		Inicial																										
							Prog	1	164.708.892	164.708.892						0,5	0,5																	
							Eje	1	164.708.892	164.708.892						0,5	0,5																	
6	1.5.6 TABLERO SINCRONISMO 1 GENERADOR Nacionalización de equipos y materiales importados	und	.5	100	No		Inicial																										
							Prog	1	41.177.224	41.177.224											0,5	0,5											
							Eje	1	41.177.224	41.177.224											0,5	0,5											
7	1.5.7 TABLERO SINCRONISMO 1 GENERADOR Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución	und	.5	100	No		Inicial																										
							Prog	1	41.177.224	41.177.224								0,2	0,2	0,2	0,2	0,2											
							Eje	1	41.177.224	41.177.224								0,2	0,2	0,2	0,2	0,2											
8	1.5.8 TABLERO SINCRONISMO 1 GENERADOR Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	2.01	77	No		Inicial																										
							Prog	1	164.708.892	164.708.892												0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12					
							Eje	0,88	164.708.892	144.943.824,96												0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11					
9	1.5.9 MAIN CONTROL (UNIDAD DE AUTOMATISMO Y CONTROL) Compra de equipos y materiales importados	und	5.1	100	No		Inicial																										
							Prog	1	417.368.751	417.368.751						0,33	0,33	0,34																	
							Eje	1	417.368.751	417.368.751						0,33	0,33	0,34																	
10	1.5.10 MAIN CONTROL (UNIDAD DE AUTOMATISMO Y CONTROL) Nacionalización de equipos y materiales importados	und	1.28	100	No		Inicial																										
							Prog	1	104.342.187	104.342.187												0,5	0,5											
							Eje	1	44.609.613	44.609.613												0,5	0,5											
11	1.5.11 MAIN CONTROL (UNIDAD DE AUTOMATISMO Y CONTROL) Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución	und	1.28	100	No		Inicial																										
							Prog	1	104.342.187	104.342.187										0,25	0,25	0,25	0,25											
							Eje	1	104.342.187	104.342.187										0,25	0,25	0,25	0,25											
12	1.5.12 MAIN CONTROL (UNIDAD DE AUTOMATISMO Y CONTROL) Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	5.1	74	No		Inicial																										
							Prog	1	417.368.751	417.368.751													0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13					
							Eje	0,85	417.368.751	354.763.438,35													0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,11					

- **1.3. SISTEMA FOTOVOLTAICO: (CONTRAPARTIDA)**

Actividad MGA: Instalar SISTEMA FOTOVOLTAICO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
1	1.3.3.1 Inversores Compra de equipos y materiales importados	und	1.34	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	109.167.407	109.167.407						0,5	0,5																		
							Eje	1	109.167.407	109.167.407																									
2	1.3.4.1 Tableros Compra de equipos y materiales nacionales	und	2.35	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	192.553.269	192.553.269						0,25	0,25	0,25	0,25																
							Eje	1	192.553.269	192.553.269																									
3	1.3.6.1 Cluster de baterias Compra de equipos y materiales importados	und	9.24	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	755.423.054	755.423.054							0,2	0,2	0,2	0,2	0,2														
							Eje	1	755.423.054	755.423.054																									
4	1.3.7.1 Transformador Compra de equipos y materiales nacionales	und	.41	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	33.123.882	33.123.882						0,25	0,25	0,25	0,25																
							Eje	1	33.663.882	33.663.882																									
5	1.3.8.1 Transformador Compra de equipos y materiales nacionales	und	.44	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	36.005.765	36.005.765						0,25	0,25	0,25	0,25																
							Eje	1	36.005.765	36.005.765																									
6	1.3.5.1 Celda de interrupción Compra de equipos y materiales nacionales	und	2	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	163.341.308	163.341.308						0,25	0,25	0,25	0,25																
							Eje	1	163.341.318	163.341.318																									
7	1.3.1.1 Panel solar Mono facial Compra de equipos y materiales importados	und	4.31	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	352.825.683	352.825.683					0,5	0,5																			
							Eje	1	352.825.683	352.825.683																									
8	1.3.1.2 Panel solar Mono facial Nacionalización de equipos y materiales importados.	und	1.08	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	88.206.421	88.206.421							0,33	0,33	0,34																
							Eje	1	88.206.421	88.206.421																									
9	1.3.1.3 Panel solar Mono facial Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución.	und	1.08	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	88.206.421	88.206.421								0,5	0,5																
							Eje	1	88.206.421	88.206.421																									
10	1.3.2.1 Estructuras de fijación Compra de equipos y materiales nacionales	und	1.72	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	140.269.476	140.269.476						0,5	0,5																		
							Eje	1	140.269.476	140.269.476																									
11	1.3.3.2 Inversores Nacionalización de equipos y materiales importados	und	.33	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	27.291.852	27.291.852								1																	
							Eje	1	27.291.852	27.291.852																									
12	1.3.3.3 Inversores Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución	und	.33	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	27.291.852	27.291.852									0,25	0,25	0,25	0,25													
							Eje	1	27.291.852	27.291.852																									
13	1.3.3.4 Inversores Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	1.34	77	Si		Inicial																											
							Prog	1	109.167.407	109.167.407													0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12				
							Eje	0,9	109.167.407	98.250.666,3																									
14	1.3.4.2 Tableros Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución	und	.47	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	38.510.653	38.510.653									0,25	0,25	0,25	0,25													
							Eje	1	38.510.633	38.510.633																									
15	1.3.4.3 Tableros Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	1.88	74	Si		Inicial																											
							Prog	1	154.042.615	154.042.615														0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13				
							Eje	0,9	155.642.615	140.078.353,5																									
16	1.3.5.2 Celda de interrupción Transporte de equipos y materiales importados a zona de	und	.4	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	32.668.262	32.668.262									0,2	0,2	0,2	0,2	0,2												
							Eje	1	32.668.262	32.668.262																									
17	1.3.5.3 Celda de interrupción Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	1.6	74	Si		Inicial																											
							Prog	1	130.673.046	130.673.046														0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13				
							Eje	0,9	130.673.046	117.605.741,4																									
18	1.3.6.2 Cluster de baterias Nacionalización de equipos y materiales importados	und	2.31	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	188.855.764	188.855.764												0,5	0,5												
							Eje	1	188.855.764	188.855.764																									
19	1.3.6.3 Cluster de baterias Transporte de equipos y materiales importados a zona de	und	2.31	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	188.855.764	188.855.764										0,25	0,25	0,25	0,25												
							Eje	1																											
20	1.3.6.4 Cluster de baterias Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	9.24	74	Si		Inicial																											
							Prog	1	755.423.054	755.423.054														0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13				
							Eje	0,9	755.423.054	679.880.748,6																									
21	1.3.8.2 Transformador Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución	und	.09	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	7.201.153	7.201.153									0,25	0,25	0,25	0,25													
							Eje	1	7.201.153	7.201.153																									
22	1.3.7.2 Transformador Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución	und	.08	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	6.624.777	6.624.777									0,33	0,33	0,34														
							Eje	1	6.624.777	6.624.777																									
23	1.3.7.3 Transformador Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	.32	77	Si		Inicial																											
							Prog	1	26.499.105	26.499.105													0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12				
							Eje	0,92	26.499.105	24.379.176,6																									
24	1.3.8.3 Transformador Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	.35	86	Si		Inicial																											
							Prog	1	28.804.612	28.804.612														0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13				
							Eje																											
25	1.3.1.4 Panel solar Mono facial Instalación de equipos, materiales y mantenimientos.	und	4.31	50	Si		Inicial																											
							Prog	1	352.825.683	352.825.683													0,5	0,5											
							Eje	0,5	352.825.683	176.412.641,5																									
26	1.3.2.2 Estructuras de fijación Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución	und	.34	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	28.053.895	28.053.895								0,5	0,5																
							Eje	1	28.053.895	28.053.895																									
27	1.3.2.3 Estructuras de fijación Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	1.37	100	Si		Inicial																											
							Prog	1	112.215.581	112.215.581										0,25	0,25	0,25	0,25												
							Eje	1	112.214.581	112.214.581																									
28	1.3.8.4 Certificación RETIE	und	.03	0	Si		Inicial																											
							Prog	1	2.515.158	2.515.158																					0,5	0,5			
							Eje		0	0																									

-
- **INSTALAR SISTEMAS DE PROTECCIÓN**

Actividad MGA: INSTALAR SISTEMAS DE PROTECCIÓN

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
1	1.4.1 Sistemas de protección Compra de equipos y materiales nacionales	und	2.69	100	No		Inicial																											
							Prog	1	220.234.703	220.234.703											0,5	0,5												
							Eje	1	220.234.703	220.234.703											0,5	0,5												
2	1.4.2 Sistemas de protección Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución	und	.54	100	No		Inicial																											
							Prog	1	44.046.941	44.046.941												0,5	0,5												
							Eje	1	44.046.941	44.046.941												0,5	0,5												
3	1.4.3 Sistemas de protección Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	2.15	74	No		Inicial																											
							Prog	1	176.187.762	176.187.762														0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13				
							Eje	0,85	176.187.762	149.759.597,7														0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,11					

- **1.11. INTERVENTORÍA**

Actividad MGA: REALIZAR LA INTERVENTORÍA

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06
1	1.1.1 INTERVENTORIA DE OBRA	und	4.91	90	No		Inicial																								
							Prog	1	401.486.520	401.486.520	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
							Eje	0,95	396.002.672,52	376.202.538,89	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	

- **1.9. REALIZAR OBRAS CIVILES:**

Actividad MGA: Realizar obras civiles

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
1	1.9.1 Replanteo	und	.04	100	No		Inicial																											
							Prog	1	3.081.683	3.081.683	0,5	0,5																						
							Eje	1	3.081.683	3.081.683	0,5	0,5																						
2	1.9.2 Gestión de permisos ambientales	und	.04	100	No		Inicial																											
							Prog	1	3.081.680	3.081.680				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1											
							Eje	1	3.081.680	3.081.680				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1											
3	1.9.3 Fundaciones civiles para clúster, bases trafos y carcamos	und	.36	100	No		Inicial																											
							Prog	1	29.507.225	29.507.225										0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16									
							Eje	1	29.507.225	29.507.225										0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16									
4	1.9.4 Zanjado para conductores	und	.2	80	No		Inicial																											
							Prog	1	16.698.966	16.698.966												0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					
							Eje	0,9	16.698.966	15.029.069,4												0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					
5	1.9.5 Obras civiles de retoque y pintura en planta existente	und	.26	100	No		Inicial																											
							Prog	1	20.863.281	20.863.281												0,5	0,5												
							Eje	1	20.863.281	20.863.281												0,5	0,5												
6	1.9.6 Casa de maquinas nueva para Instalación de tableros T1T2T3AT3B	und	.49	80	No		Inicial																											
							Prog	1	39.912.642	39.912.642												0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					
							Eje	0,92	39.912.642	36.719.630,64												0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12					

- **RETIRAR (ANTIGUAS) E INSTALAR PLANTAS GENERADORAS (NUEVAS)**

Actividad MGA: RETIRAR (ANTIGUAS) E INSTALAR PLANTAS GENERADORAS (NUEVAS)

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
1	1.10.1 Compra de equipos y materiales importados	und	4.34	100	No		Inicial																											
							Prog	1	355.180.479	355.180.479				0,25	0,25	0,25	0,25																	
							Eje	1	355.180.479	355.180.479				0,25	0,25	0,25	0,25																	
2	1.10.2 Nacionalización de equipos y materiales importados	und	1.09	100	No		Inicial																											
							Prog	1	88.795.119	88.795.119								0,33	0,33	0,34															
							Eje	1	88.795.119	88.795.119								0,33	0,33	0,34															
3	1.10.3 Transporte de equipos y materiales importados a zona de ejecución	und	1.09	100	No		Inicial																											
							Prog	1	88.795.119	88.795.119											0,5	0,5													
							Eje	1	88.795.119	88.795.119											0,5	0,5													
4	1.10.4 Instalación de equipos, materiales y mantenimientos	und	4.34	77	No		Inicial																											
							Prog	1	355.180.479	355.180.479													0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12					
							Eje	0,88	355.180.479	312.558.821,52													0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11					
5	1.10.5 Retiro de plantas existentes del sitio y dejadas en obra	und	.22	81	No		Inicial																											
							Prog	1	18.300.654	18.300.654											0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1					
							Eje	1	18.300.654	18.300.654											0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,19					

Para el mes de MaYo/2024 se carga la siguiente información como observación al avance de ejecución, así:

• Se remitió al IPSE solicitud de prórroga del contrato interadministrativo, en virtud de los retrasos presentados por parte del Operador de Red EMELCE en las actividades de mantenimiento en la planta de generación de energía, así como los tiempos en el proceso de puesta en funcionamiento y protocolo de pruebas por parte de DHIBRYD. • En virtud de lo anterior, se suscribió la modificación No.6 del contrato interadministrativo, en el cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de julio de 2024. • Asimismo, y considerando los retrasos expuestos por el contratista de obra y validados por la interventoría, y en concordancia con el plazo establecido en la Modificación No.6 del contrato interadministrativo, se suscribió Otrosí No. 5 del contrato de obra DG-126-2022 ampliando el plazo hasta el 30 de junio de 2024. • De igual manera, se amplió el plazo del contrato de interventoría DG-058-2022 por el término del contrato de obra (30-06-2024) más cuatro meses para efectos de la liquidación del contrato de obra, es decir, fue prorrogado el plazo hasta el 30 de octubre de 2024 • El contratista de obra continúa avanzando con la ejecución de las actividades establecidas en el contrato según su cronograma de obra, según reporte de interventoría el avance general de obra con corte al presente informe es del 94%. • Se realizó reunión virtual con IPSE y Gobernación del Guainía, sobre el avance de ejecución del contrato interadministrativo.	JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ	14/06/2024	

A hoy el proyecto se encuentra contratado y en ejecución, con **0 alertas.**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	2021005940004	Instalación del sistema de generación híbrido solar - almacenamiento - diesel - Barrancominas - Guainía

Paso a Paso | Aprobación y Env

Alcance

Realizar la construcción de un campo generador constituido por 728 módulos fotovoltaicos, Instalación de dos (2) inversores de 175 kW nuevos, se incorporarán al sistema los 6 inversores existentes de 20 KW _SMA a la barra del tablero T_2 de salida, tres (3) plantas Diésel de potencia en uso continuo, una (1) G1 de 350 KW y dos (2) G_2 y G_3 de 175 KW a 440 V


Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
10/09/2021	31/10/2024	CONTRATADO EJECUCI

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 8.176.898.568	$ 4.000.255.649	

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estad

En su ejecución física se tiene un 88,84% y ejecución financiera de 87,09% (Pendiente actualización de la plataforma para ver reflejado el valor de Mayo 2024)

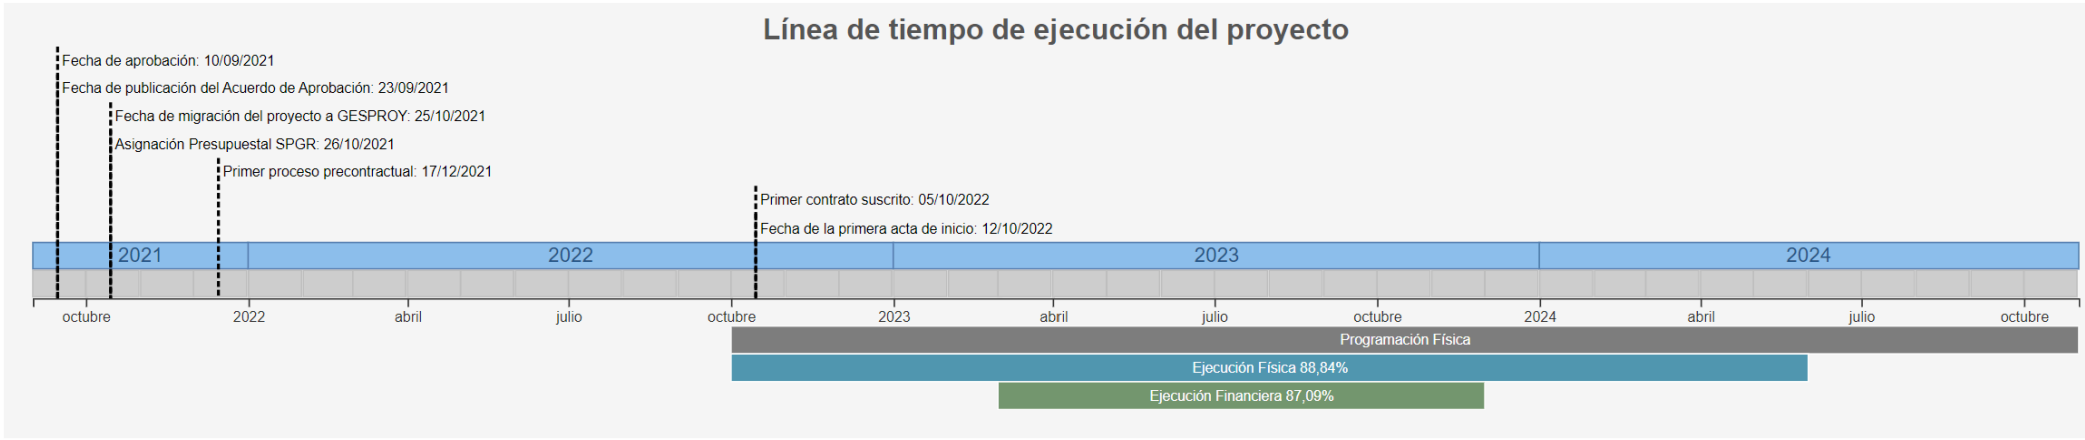

Indicadores de desempeño de la eficiencia - curva S (Pendiente actualización de la plataforma para ver reflejado el valor de Mayo 2024)


EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	2021005940004	Instalación del sistema de generación híbrido solar - almacenamiento - diesel - Barrancominas - Guainía

Paso a Paso | Aprobación y Env

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S

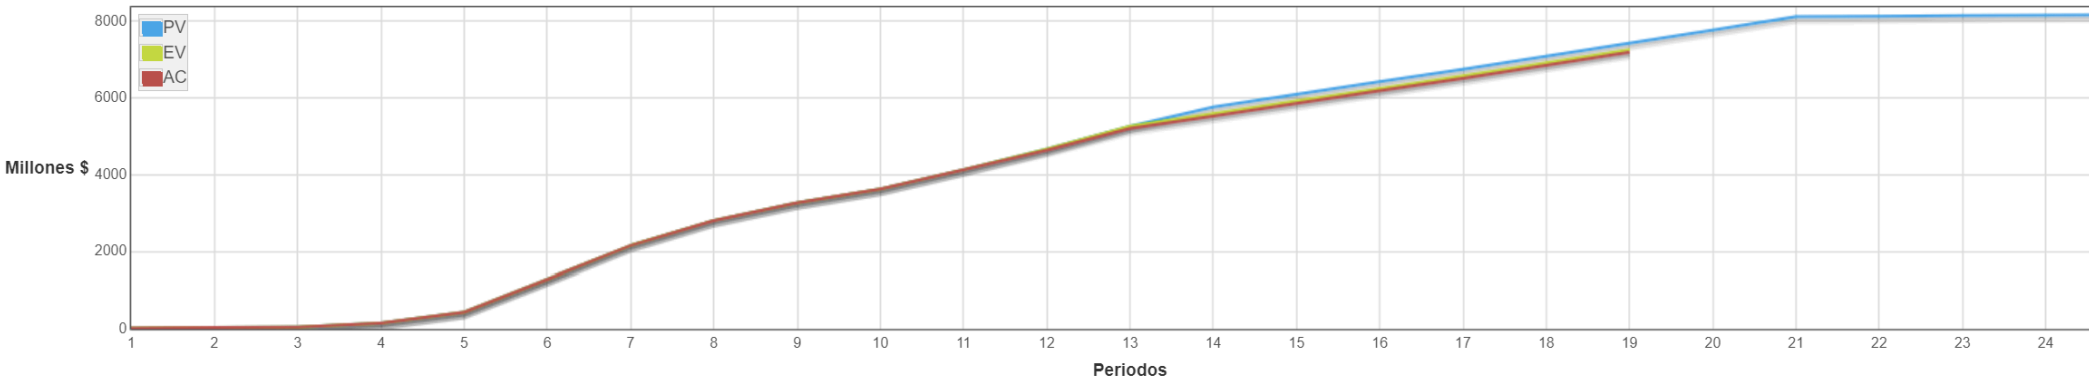

Línea	Periodos																							
	1 oct-22	2 nov-22	3 dic-22	4 ene-23	5 feb-23	6 mar-23	7 abr-23	8 may-23	9 jun-23	10 jul-23	11 ago-23	12 sep-23	13 oct-23	14 nov-23	15 dic-23	16 ene-24	17 feb-24	18 mar-24	19 abr-24	20 may-24	21 jun-24	22 jul-24	23 ago-24	24 sep-24
* Valor Planeado (PV)	18	35	51	156	438	1289	2158	2809	3273	3632	4137	4675	5268	5773	6102	6431	6755	7096	7437	7779	8131	8143	8155	8166
* Valor Ganado (EV)	18	35	51	156	438	1289	2158	2809	3273	3632	4137	4675	5271	5600	5929	6258	6582	6923	7265					
* Costo Actual (AC)	17	35	51	156	437	1288	2156	2807	3272	3630	4135	4643	5209	5538	5866	6196	6520	6861	7202					
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98					
Cumplimiento del costo (CPI)	1,01	1,01	1,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01					
Retraso SV(t) Meses														0,43	0,57	0,60	0,60	0,53	0,60					

*** Valores en millones de pesos**

De antemano agradezco tu colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--
Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

17 de junio de 2024, 9:05

Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 12 y 13 de junio de los corrientes.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 - 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 17 de junio de 2024, 10:05
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Cordial saludo, favor realizar el cargue conforme a lo reportado por el supervisor
[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

REPROGRAMACIÓN GUAJIRA FASE II

1 mensaje

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 27 de junio de 2024, 17:06
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>

Juan, buenas tardes.

Adjunto al presente archivo de reprogramación por actividades y diagrama Gantt del proyecto Guajira Fase II.

En el archivo de excel encontrarás en color azul las actividades que van por contrapartida, valor que corresponde a la adición realizada por el IPSE y en verde las actividades nuevas de proceso de liquidación y la modificación de las internas (se integraron las 3 subactividades en 1 sola).

Bajo este panorama, la obra finalizó el 31 de Mayo de 2024, Inspección RETIE el 30 de Junio y la liquidación el 28 de Septiembre.

Quedo atenta a tu aprobación para proceder con la programación por períodos.

--
--
Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

2 adjuntos

PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES.xlsx
18K

Gantt impreso 06_27_2024 5_04 p. m. - Seguimiento Proyectos.pdf
1163K

Bogotá DC, Julio 2024

Doctor
JORGE JULIAN QUINTERO POLO
Representante Legal Suplente
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO – DISPAC S. A. E.S.P
Ciudad**.**

Respetado Doctor:

En mi calidad de SUPERVISORA del contrato DG-070-2024 relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY, que se ha suscrito con KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ, me permito certificar que el desarrollo de actividades ha venido siendo atendido de conformidad, por lo tanto, emito mi visto bueno, para el trámite correspondiente al pago pactado.

Agradezco su atención,



MELISSA RODRIGUEZ
Supervisor contrato DG-070-2024

Proyectó	Elaboró	Revisó	No. de folios	Anexos
* MRODRIGUEZ *	*MRODRIGUEZ*	MRODRIGUEZ	1	1
