INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 15/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: — SEMANA No.: 16 del 8/04/2024 al 14/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE HERNAN HURTADO GARCÍA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RIJHAAR GIL PASTRANA MORALES

OBJETO CONTRATO DE CONSULTORIA: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Realizar los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA", a nivel de FASE II.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y capítulos de acuerdo con el objeto contractual, y conforme al alcance de cada volumen definido en el presente documento "Anexo Técnico", el cual incluye los siguientes volúmenes:

- VOLUMEN I IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS
- VOLUMEN II ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
- VOLUMEN III ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
- VOLUMEN IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.
- VOLUMEN V ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.
- VOLUMEN VI ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
- VOLUMEN VII ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.
- VOLUMEN VIII ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
- VOLUMEN IX ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.
- VOLUMEN X EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y FINANCIERA
- VOLUMEN XI INFORME FINAL EJECUTIVO

CONTRATO DE CONSULTORIA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALTAS INTERVENTORES	INTERVENTOR:	INCONFLAN S.A.S.	
INTEGRANTES:	INGPROTECTO LIMITADA Y BRAIN INGENIERIA SAS	INTEGRANTES:	INCONFLAN S.A.S.	
CONTRATO No.	6925 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 1.761.504.195,00	CONTRATO No. 4921 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 300.000.000,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 1.761.504.195,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2025 — VALOR ACUMULADO: $ 300.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
			$ -	VALOR AMORTIZADO: $ -
			$ -	SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONSULTORIA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE CONSULTORIA (A):	$ 1.495.146.349,00	9,63%
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 343.008.400,00	19,35%
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 39.962.797,00	9%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
		9%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 343.008.400,00	9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39.962.797,00	9%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
		9%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252.190.840,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.507.733,00	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.507.733,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.507.733,00	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

No.	VOLUMEN TECNICO ENTREGABLE	PESO % VOLUMEN	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO
1	IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS	9,64%		
	Análisis de la información y antecedentes		25%	15,50%
	Metodología general (matriz multicriterio)		25%	20,00%
	Diagnóstico y priorización de los sitios críticos		25%	5,00%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría		25%	
2	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
3	ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	12,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
4	ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	13,92%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Estudio Hidrológico aprobado			
	Estudio Hidráulico aprobado			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
5	ESTUDIO DE ESTRUCTURAS.	20,34%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
6	ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTO.	7,49%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
7	ESTUDIOS COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL.	10,71%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
8	ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS.	6,85%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
9	ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD	6,42%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
10	EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	5,35%		
	Metodología aprobada por Interventoría		50%	20%
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
11	INFORME FINAL EJECUTIVO			
	Entrega del informe final aprobado por Interventoría			
	TOTAL	100,00%		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACION:	N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El Consultor deberá entregar un documento en el que se evidencie su investigación y las diferentes actividades que se deben ir esarrollar en cumplimiento a la realización de un documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	CONSULTORIA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LOS EMPLEOS GENERADOS CORRESPONDEN A LOS PROFESIONALES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 8/04/24 al 14/04/24 se realizaron las siguientes actividades:
1.La interventoria recibe respuesta del comunicado No. 2024-IN012-0414, del 20 de febrero de 2024 y 2024- IN012-0249 del 5 de febrero de 2024, la ratificacion y aprobacion de las hojas de vidas mediante el radicado No. 2024S-VBOG-019503, el dia 8 de abril del 2024.
2. La interventoria recibe respuesta del comunicado No. 2024-IN012-0249 del 5 de febrero de 2024, 2024-IN012-0414 del 20 de febrero de 2024, 2024-IN012-0575 del 7 de marzo de 2024 con radicado INVIAS No2024E-VUVRAZ-009974, No 2024E-VUVRAZ-015101,2024E-VUVRAZ-021113, mediante el radicado No.2024S-VBOG-021085, la ratificacion y aprobacion de las hojas de vidas,el dia 12 de abril.
3. El dia 12 de abril de 2024 se realizo reunión virtual y presencial en INVIAS territorial Choco y conto con la presencia de la supervision de la Interventoría por parte del Invias, Interventoria y la Consultoria (Temas tratados: Visita tecnica y componente social (acercamiento con los centros poblados


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas para semana del 15/04/24 al /04/24 se realizaran las siguientes actividades:
1. Se programa mesa de trabajo interna de la interventoria (para induccion del personal tecnico de la zona), para el dia 22 de abril del 2024.
2. Se programa reunión para capacitacion del personal de interventoría.
3. Revición de de documentación entregada por parte de la de la consultoria
4. Revición del informe semanal No 16 de la consultoria periodo comprendido de 8 de al 14 abril del 2024


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

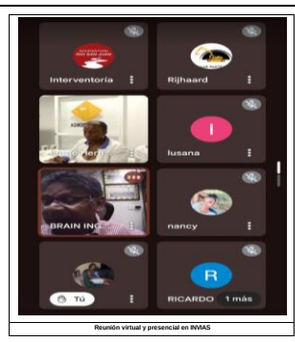

Reunión virtual y presencial en INVIAS

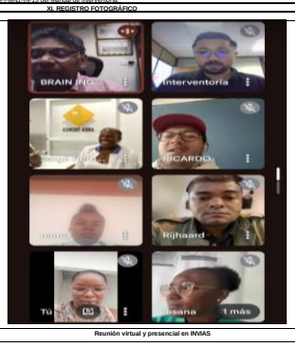

Reunión virtual y presencial en INVIAS



Reunión virtual y presencial en INVIAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FABIO ERNESTO VILLAMIL PÁEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-20541
