INFORME ACTA PARCIAL N° 1
De 27 de diciembre de 2024 a 15 de noviembre de 2024

Informe Del Contrato De Interventoría No. 1114 De 2023
Para El Contrato De Obra No. 1127 De 2023

OBJETO:
"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA"

CONTRATANTE:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTES

Bogotá D, C. 18/11/2024 VERSIÓN 2

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 9

3. ÁREA JURÍDICA 16

3.1. CONTRATO DE OBRA No 1127 DE 2023 16
3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1114 DE 2023 17
3.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS 18
3.3.1. Contrato de Obra No. 1127 de 2023 18
3.3.2. Contrato De Interventoría 1114 de 2023 23

4. ÁREA TÉCNICA 26

4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 26
Fabricación 26
Municipio De Tocaima 41
Municipio De Apulo Barrio Chicó 56
Municipio De El Colegio - Barrio Chapinero 79
Municipio De El Colegio- Inspección El Triunfo Parque 103
Municipio De Sibaté Barrio San Martin 116
Municipio De Sibaté - Centro Poblado Barrio Santa Teresa Urbanización El Mirado 128
Municipio De Silvania- Inspección De Subia La Florida 135
Municipio De Fusagasugá- Vereda La Cascada 142
Municipio De Subachoque - Vereda Canica Baja 158
Municipio De Facatativá - Urbanización Villas De Manjui 172
Municipio De Madrid - Vereda Los Árboles Camellón Fresas San Ramon 182
4.2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA 211
4.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 212

5. ÁREA ADMINISTRATIVA: 213

5.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 213
5.2. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA E INTEVERTORIA 213

6. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA: 214

6.1. CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN 214

7. CONCLUSIONES 214

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo principal la creación y mejora de espacios recreativos y saludables mediante la instalación de parques infantiles y biosaludables en predios específicos aprobados por la entidad responsable. Estos parques están destinados a ofrecer áreas de esparcimiento y actividad física para niños y adultos, promoviendo un estilo de vida activo y saludable.

Los diseños estipulados en el Anexo Técnico del Contrato de Obra No. 1127 de 2023, son los siguientes:

MODELO 1. Parque Biosaludable de área 70 m2, el cual costa de ocho (8) módulos.

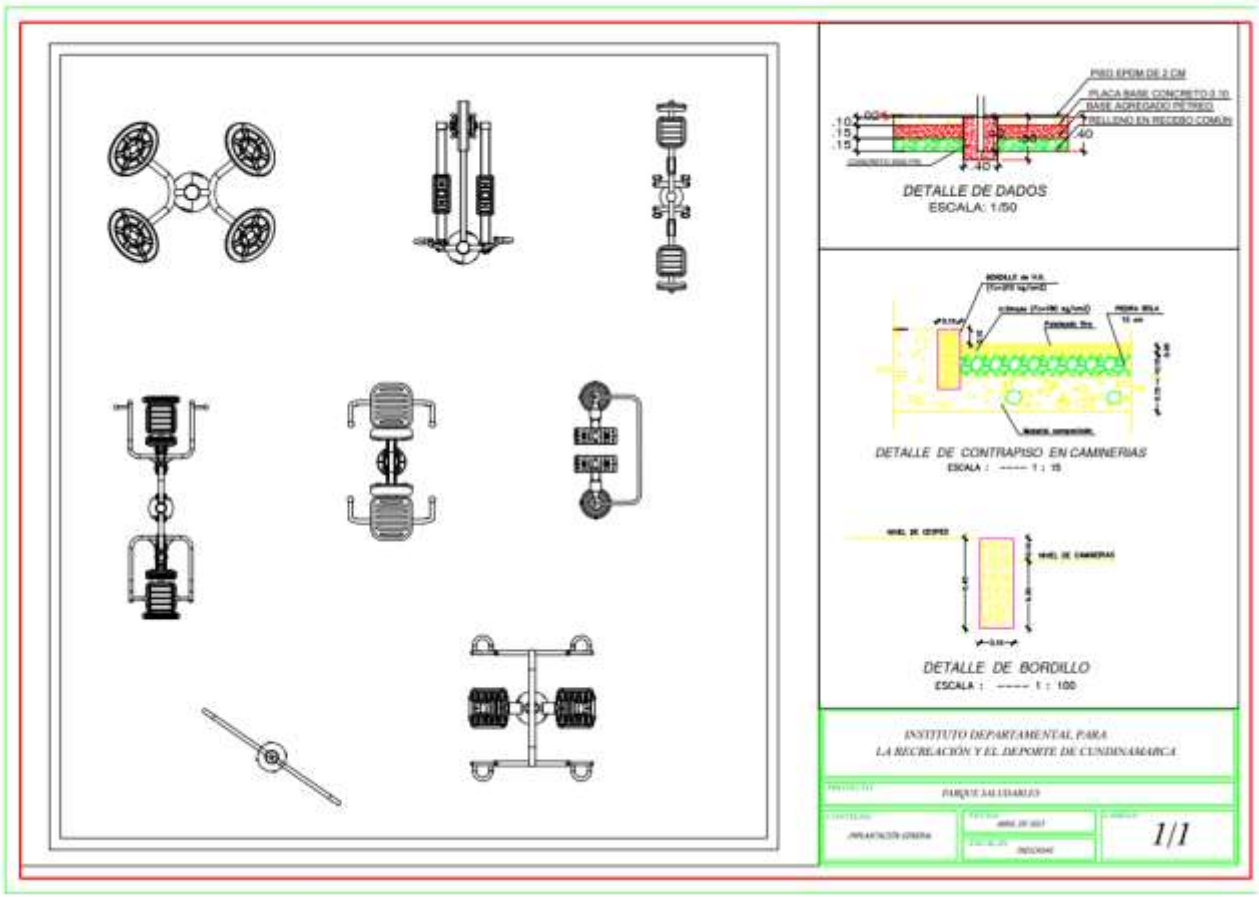


Ilustración 1 Modelo 1 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 2. Parque Biosaludable de área 50 m2, el cual contiene seis (6) módulos.

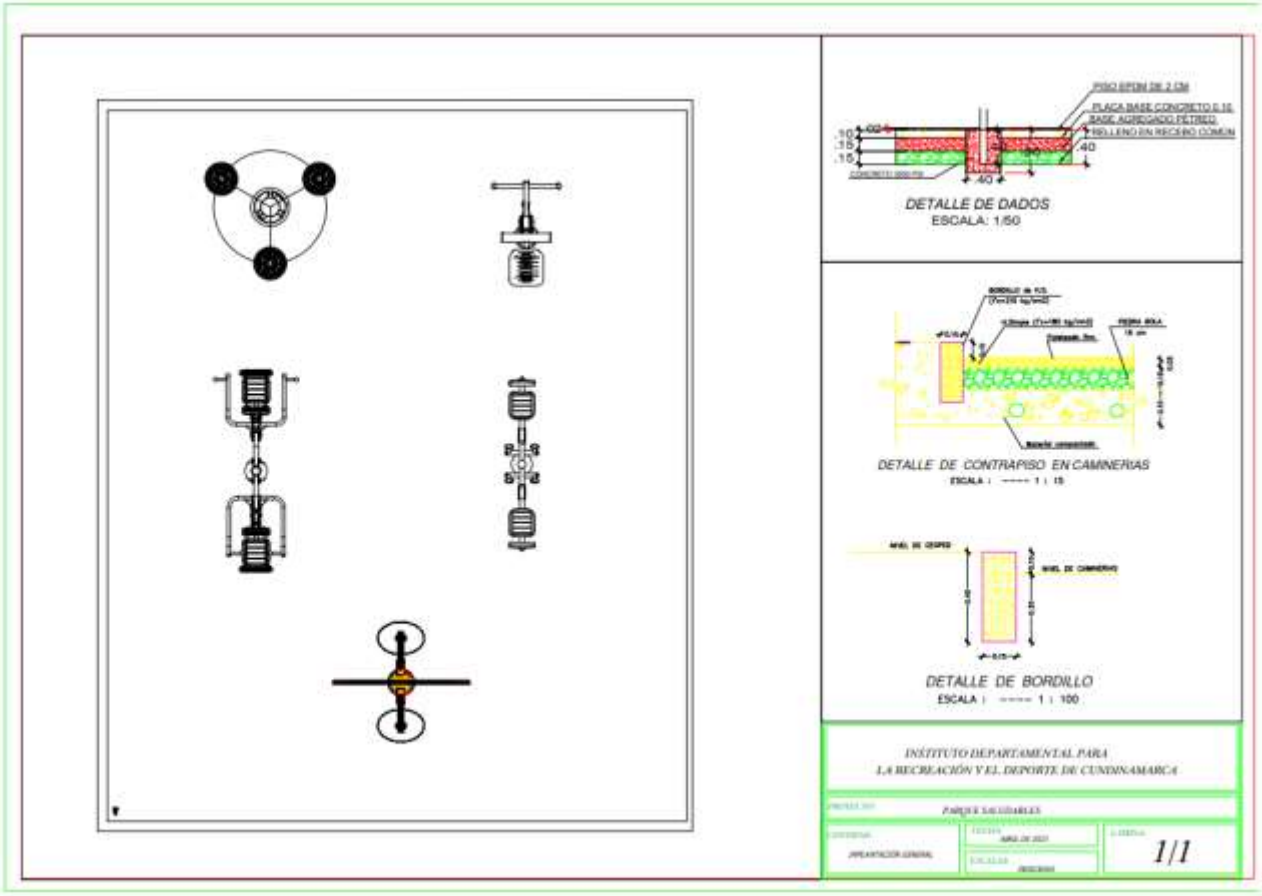


Ilustración 2 Modelo 2 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 3. Parque infantil de área 70 m2, el cual contiene seis (6) módulos.

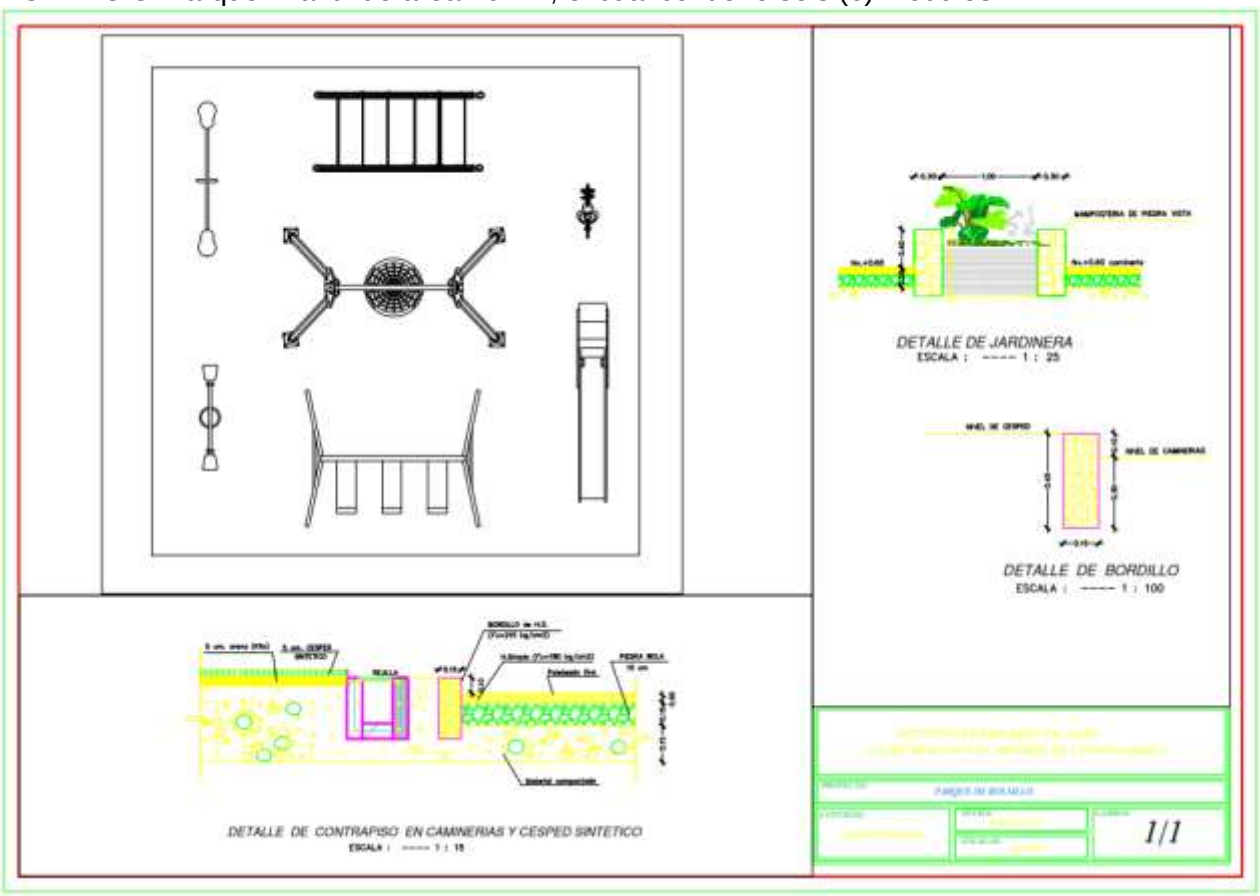


Ilustración 3 Modelo 3 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 4. Parque Infantil de área 56 m2, el cual contiene siete (7) módulos.

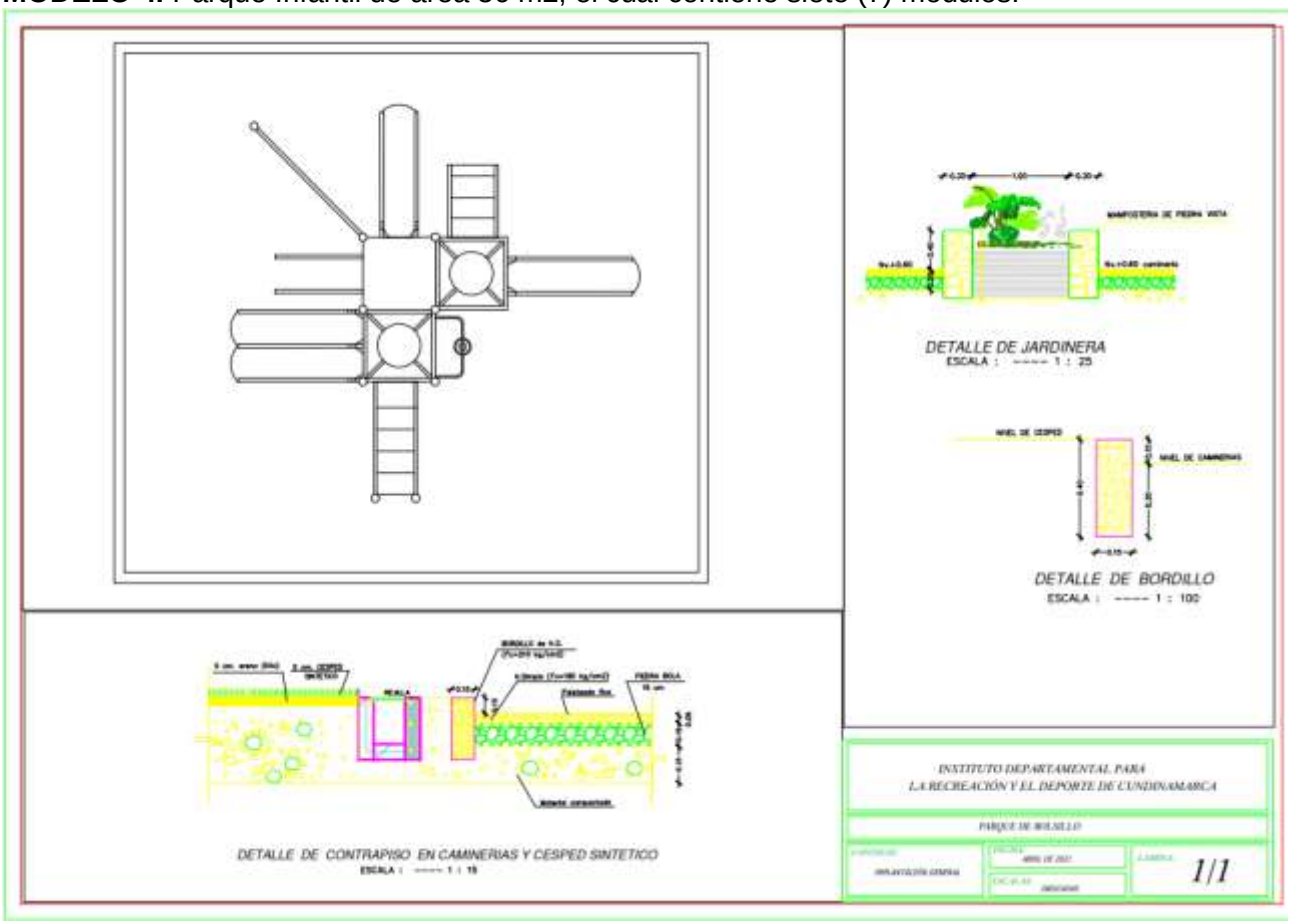


Ilustración 4 Modelo 4 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 5. Parque Infantil de área 40 m2, el cual contiene cinco (5) módulos.

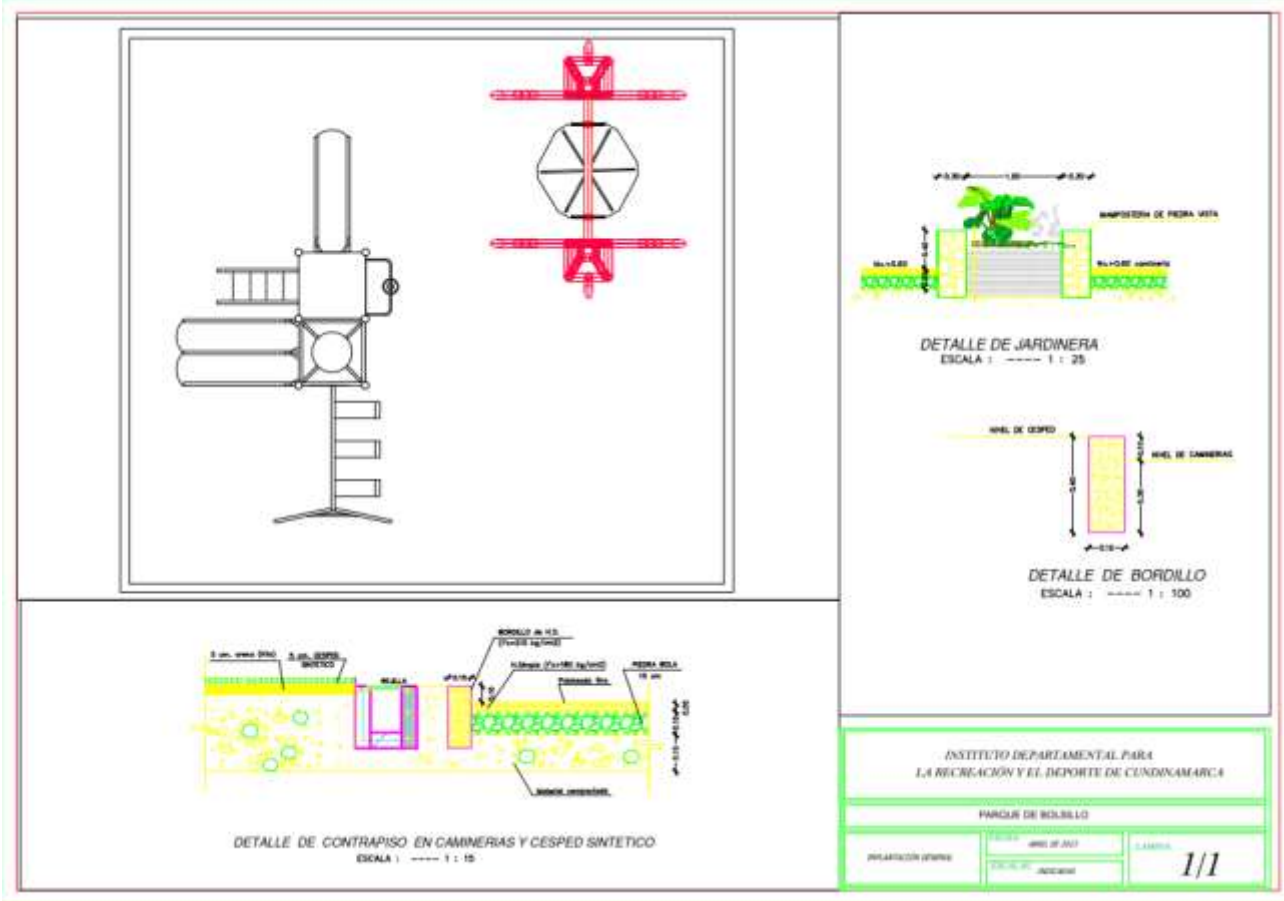


Ilustración 5 Modelo 5 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

Inicialmente se tenían estipulados de la siguiente manera; para los 29 lugares.

LISTADO APROBADO EN EL MARCO CONTRATO DE OBRA No. 1127-2023 PARQUES			
N°	**MUNICIPIO**	**BARRIO / VEREDA**	**TIPOLOGIA**
1	CAPARRAPI	VEREDA PUEBLO VIEJO	BIOSALUDABLES
2	CAPARRAPI	BARRIO LAS FERIAS	BIOSALUDABLES
3	MEDINA	BARRIO SAN NICOLAS	BIOSALUDABLES
4	FOMEQUE	VEREDAS LADERAS	BIOSALUDABLES
5	EL COLEGIO	INSPECCION EL TRIUNFO PARQUE	BIOSALUDABLES
6	SIBATE	CENTRO POBLADO SAN BENITO	BIOSALUDABLES
7	SILVANIA	INSPECCION DE SUBIA LA FLORIDA	BIOSALUDABLES
8	SAN CAYETANO	VEREDA CAMANCHA	BIOSALUDABLES
9	SOACHA	COMUNA 4 BARRIO CIUDADELA SUCRE SECTOR 2	BIOSALUDABLES
10	UBALA	INSPECCION DE MAMBITA	BIOSALUDABLES
11	ZIPACON	VEREDA PUEBLO VIEJO	BIOSALUDABLES
12	FACATATIVA	URBANIZACION VILLAS DE MANJUI	BIOSALUDABLES
13	MADRID	VEREDA LOS ARBOLES CAMELLON FRESAS SAN RAMON	BIOSALUDABLES
14	EL ROSAL	SECTOR LA UNION "VILLA MARIA, LESTAR, BACHUE"	BIOSALUDABLES
15	SOACHA	COMUNA 1 BARRIO COMPARTIR	BIOSALUDABLES
16	CHAGUANI	CENTRO	BIOSALUDABLES
17	FUSAGASUGA	LA CASCADA	BIOSALUDABLES

N°	**MUNICIPIO**	**BARRIO / VEREDA**	**TIPOLOGIA**
1	FOMEQUE	ESCUELA DE CHINIA	PARQUE INFANTILES
2	GACHALA	CASCO URBANO VIA LA PEPITA-PUERTO LAS PALMAS	PARQUE INFANTILES
3	SUBACHOQUE	VEREDA CANICA BAJA	PARQUE INFANTILES
4	SIBATE	BARRIO SAN MARTIN	PARQUE INFANTILES
5	GUADUAS	BARRIO VICTOR MANUEL ZAMBRANO	PARQUE INFANTILES
6	VILLETA	BARRIO VILLA MARIA	PARQUE INFANTILES
7	PUERTO SALGAR	BARRIO LA 52	PARQUE INFANTILES
8	TOCAIMA	BARRIO SAN FERNANDO	PARQUE INFANTILES
9	CHAGUANI	CENTRO	PARQUE INFANTILES
10	APULO	BARRIO CENTRO	PARQUE INFANTILES
11	GUASCA	VEREDA SANTA BARBARA	PARQUE INFANTILES
12	EL COLEGIO	BARRIO CHAPINERO	PARQUE INFANTILES

Ilustración 6 Lista de parques inicialmente Aprobado por INDEPORTES

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Durante el primer mes de ejecución del contrato se realizaron visitas de viabilidad a cada municipio, en las cuales se verificaron las condiciones de los terrenos, los cuales no se encuentren en zona de riesgo, que el uso del suelo sea institucional y compatible con la actividad, que no tenga ninguna afectación vial o por obra pública. Lo anterior, con el fin de asignar un tipo de parque para cada predio.
Luego de las visitas, de acuerdo a las condiciones de cada terreno comprobadas tanto por el contratista de obra como el de interventoría y del reporte presentado; el día 7 de febrero de 2024, INDEPORTES envía listado oficial, de tipo de parques para cada predio. Quedando de la siguiente manera:

MUNICIPIOS	FINAL	MEDIDAS TERRENO	AREA
CAPARRAPI	BIOSALUDABLES	50 m2	10 MTS X 5 MTS
FUSAGASUGA	BIOSALUDABLES	50m2	10 MTS X 5 MTS
SIBATE	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
APULO	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
TOCAIMA	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
GUASCA	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
GACHALA	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
FOMEQUE	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
FOMEQUE	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
CHAGUANI	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
VILLETA	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
EL COLEGIO	PARQUE INFANTILES	56 m2	7 MTS X 8 MTS
SILVANIA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
SIBATE	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
SOACHA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
SOACHA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
CAPARRAPI	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
PUERTO SALGAR	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
EL COLEGIO	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
SUBACHOQUE	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
EL ROSAL	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
FACATATIVA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
ZIPACON	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
MADRID	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
CHAGUANI	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
GUADUAS	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
MEDINA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
UBALA	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS
SAN CAYETANO	BIOSALUDABLES	70 m2	10 MTS X 7 MTS

19 - PARQUES BIOSALUDABLES
10 - PARQUES INFANTILES

Ilustración 7 Listado Aprobado para construcción de parques. Fuente: Supervisión INDEPORTES.

Adicional a la información de la tabla anterior se complementa listado con coordenadas de cada predio, de la siguiente manera:

MUNICIPIO	VEREDA/BARRIO	DIRECCIÓN	COORDENADAS
CAPARRAPI	BARRIO LAS FERIAS	Barrio las Ferias, Casco Urbano Caparrapí	5°21'07.6"N 74°29'21.6"W
FUSAGASUGA	LA CASCADA	Vereda la cascada, Vía Principal, Sentido Fusagasugá - Silvania	4°23'05.8"N 74°23'23.8"W
SIBATE	BARRIO SAN MARTIN	Tv. 10 #10 Sibaté, Cundinamarca	4°29'32.6"N 74°15'43.1"W
APULO	BARRIO CENTRO	Cl 9 #4 Apulo, Cundinamarca	4°31'05.0"N 74°35'36.1"W
TOCAIMA	BARRIO SAN FERNANDO	Carrera 6 Calle 15	4°27'22.1"N 74°38'28.6"W
GUASCA	VEREDA SANTA BARBARA	Vereda Santa Barbara	4°52'42.2"N 73°50'53.2"W
GACHALA	CASCO URBANO VIA LA PEPITA-PUERTO LAS PALMAS	Casco urbano, Vía La Pepita- Puerto Palmas	4°41'45.8"N 73°31'00.7"W
FOMEQUE	VEREDAS LADERAS	Vereda Las Laderas	4°26'41.0"N 73°52'44.7"W
FOMEQUE	ESCUELA DE CHINIA	Escuela de Chinia	4°30'22.1"N 73°51'54.0"W
CHAGUANÍ	BARRIO CENTRO	Cl 2 #4-35 Chaguaní, Cundinamarca	4°56'53.8"N 74°35'41.5"W
VILLETA	BARRIO VILLA MARÍA	Calle 7 entre Carreras 5 y 6	5°00'52.4"N 74°28'20.6"W
EL COLEGIO	BARRIO CHAPINERO	Carrera 2C con Calle 2A	4°34'38.1"N 74°26'31.9"W
SILVANIA	INSPECCION DE SUBIA LA FLORIDA	La Florida, Inspección de Subia	4°28'05.7"N 74°23'08.1"W
SIBATE	CENTRO POBLADO BARRIO SANTA TERESA URBANIZACION EL MIRADO	Km 4, Vía Sibaté - Pasca, Vda San Benito, Sibaté	4°29'09.0"N 74°15'20.6"W
SOACHA	CIUDADELA SUCRE	Cl 42a #42 Este-1 a 42 Este-65, Soacha, Cundinamarca	4°34'03.3"N 74°11'14.9"W
SOACHA	BARRIO COMPARTIR	Cl 16a sur#2 Sur-1 a 2 Sur-65, Soacha, Cundinamarca	4°34'29.9"N 74°14'10.5"W
CAPARRAPI	VEREDA PUEBLO NUEVO	Vereda Pueblo Viejo, Caparrapí	5°20'11.7"N 74°35'32.3"W
PUERTO SALGAR	BARRIO LA 52	Carrera 3B con calle 14D, Casco Urbano Puerto Salgar	5°28'08.5"N 74°38'58.2"W
EL COLEGIO	INSPECCIÓN EL TRIUNFO	Parque principal, Inspección El Triunfo	4°32'33.5"N 74°28'23.6"W
SUBACHOQUE	VEREDA CANICA BAJA	Vía subachoque Tabio, Colegio Departamental sede vereda Canica Baja	4°55'54.6"N 74°07'56.2"W
EL ROSAL	SECTOR LA UNION "VILLA MARIA, LESTAR, BACHUE"	Cra. 2 calle 12A El Rosal, Cundinamarca	4°51'22.1"N 74°15'34.5"W
FACATATIVA	URBANIZACION VILLAS DE MANJUI	Cl. 1 #3 Sur-73 a 3 Sur-1, Facatativá, Cundinamarca	4°48'13.0"N 74°21'10.4"W
ZIPACON	VEREDA PUEBLO VIEJO	Vía Zipacón - Facatativá	4°46'42.4"N 74°22'30.7"W
MADRID	VEREDA LOS ARBOLES CAMELLON FRESAS SAN RAMON	Camellón San Ramón, Km 7.5 via Madrid - Puente Piedra Madrid	4°47'23.7"N 74°15'48.4"W
CHAGUANÍ	BARRIO CENTRO	Cl. 2#4-35, Chaguaní, Cundinamarca	4°56'53.8"N 74°35'41.5"W
GUADUAS	BARRIO VICTOR MANUEL ZAMBRANO	Cl Real, entre carreras 9 y 10, Guaduas, Cundinamarca	5°04'12.1"N 74°35'57.7"W
MEDINA	BARRIO SAN NICOLÁS	Calle 2 entre carreras 10 y 11	4°30'10.4"N 73°21'01.2"W
UBALÁ	INSPECCIÓN DE MAMBITA	Inspección Mambita	4°45'50.0"N 73°19'36.1"W
SAN CAYETANO	VEREDA CAMANCHA	Centro Poblado Camancha	5°24'31.9"N 74°05'22.5"W

Ilustración 8 Municipios y tipos de parques a construir. Fuente: Consorcio Parques IC.

Se presenta mapa de Cundinamarca con las ubicaciones de los predios en cada municipio.

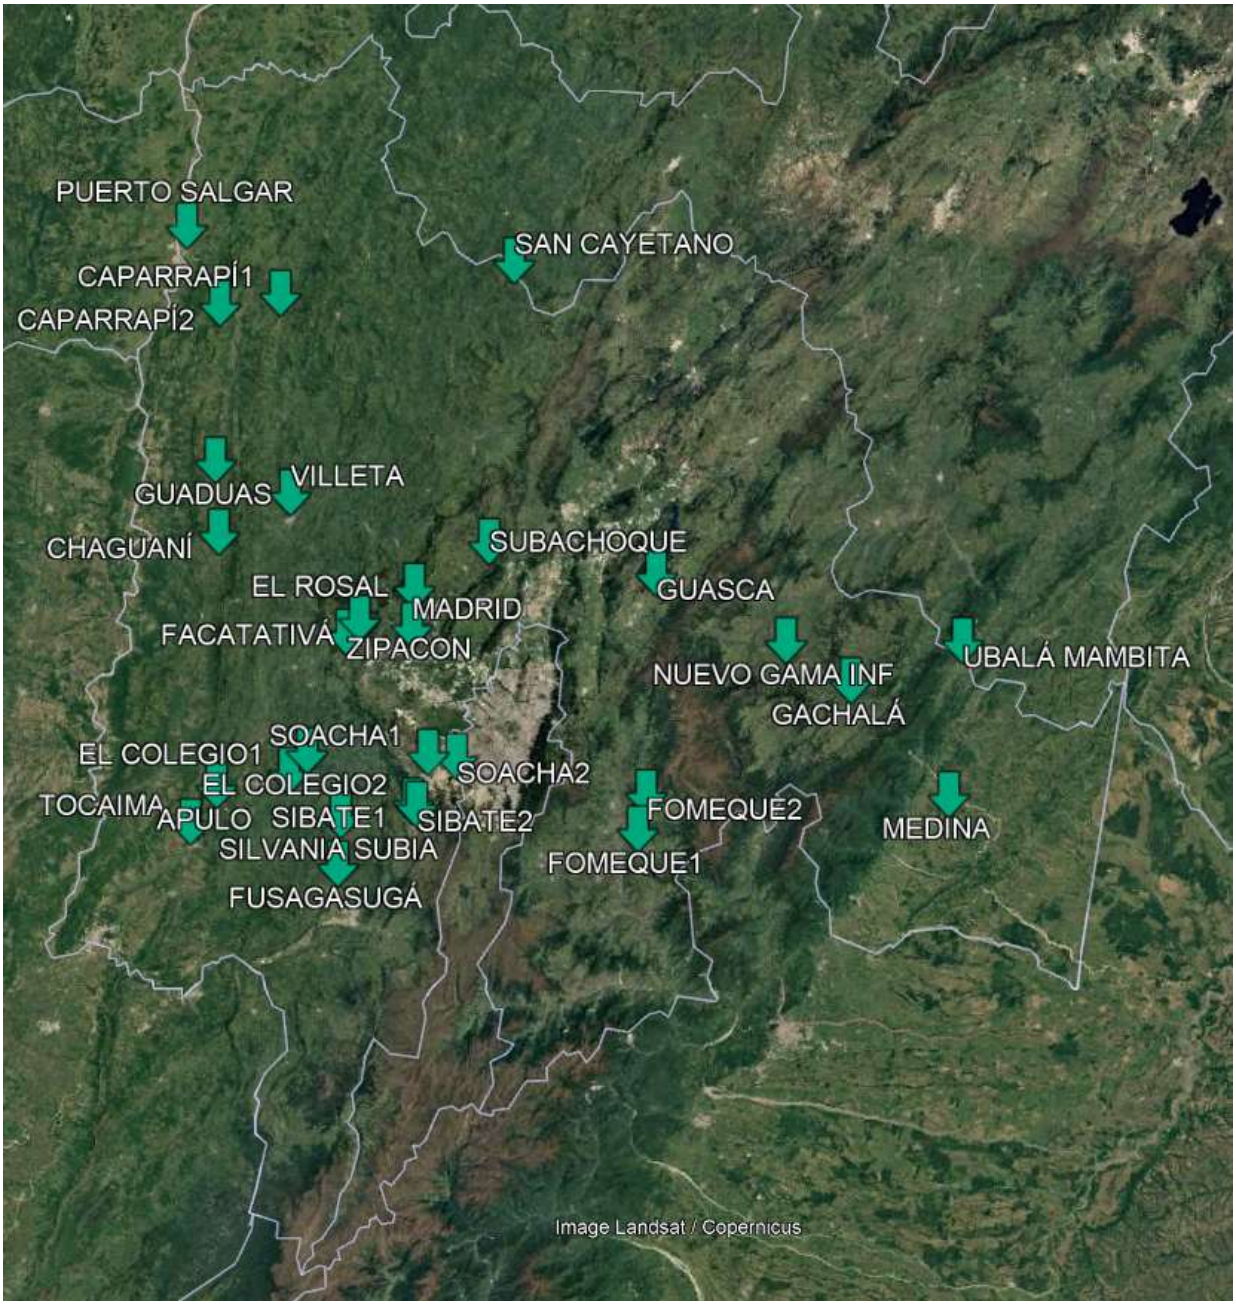


Ilustración 9 Localización de parques, Cundinamarca.

Dado lo anterior, se definen los siguientes diseños a construir de acuerdo a la asignación de la Ilustración 7.

MODELO 1. Parque Biosaludable de área 70 m2, el cual costa de ocho (8) módulos.

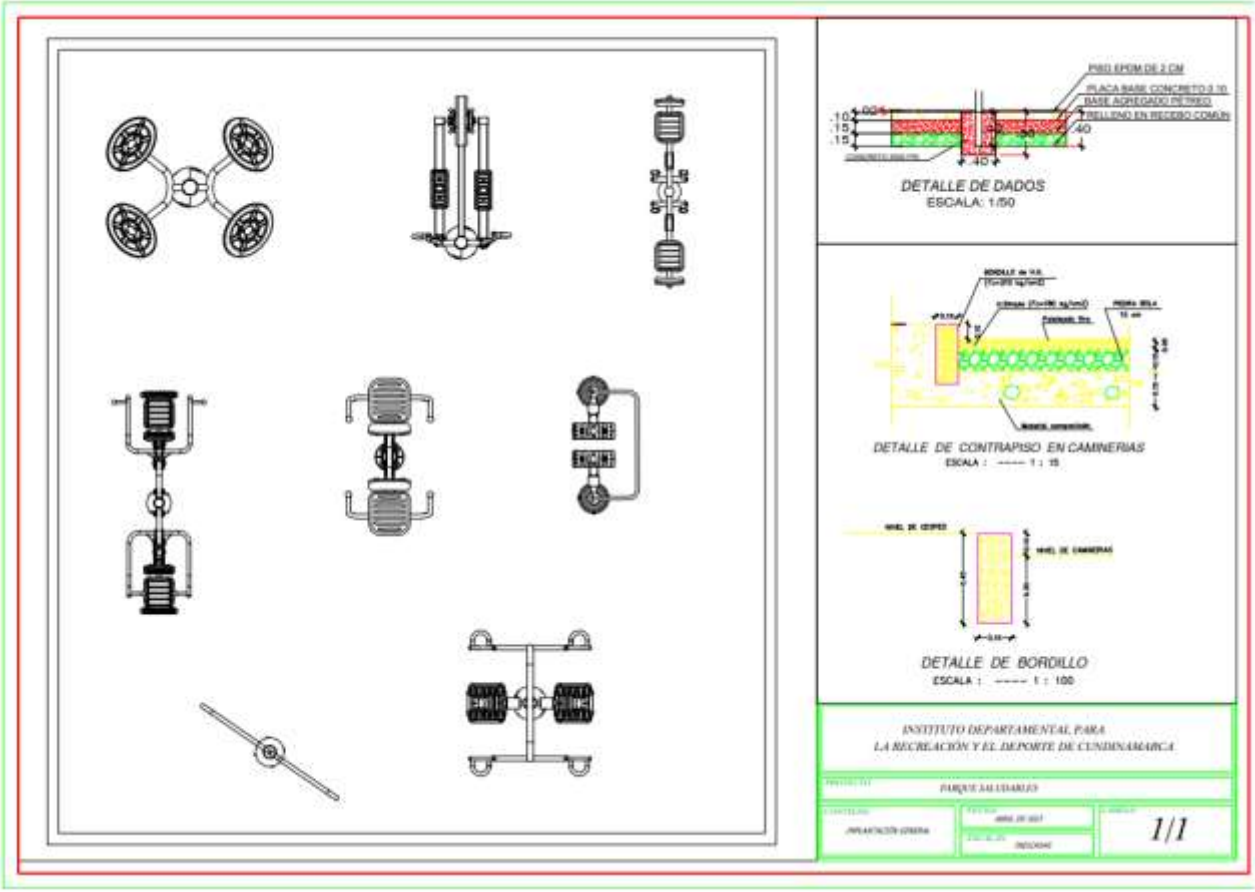


Ilustración 10 Modelo 1 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 2. Parque Biosaludable de área 50 m2, el cual contiene seis (6) módulos.

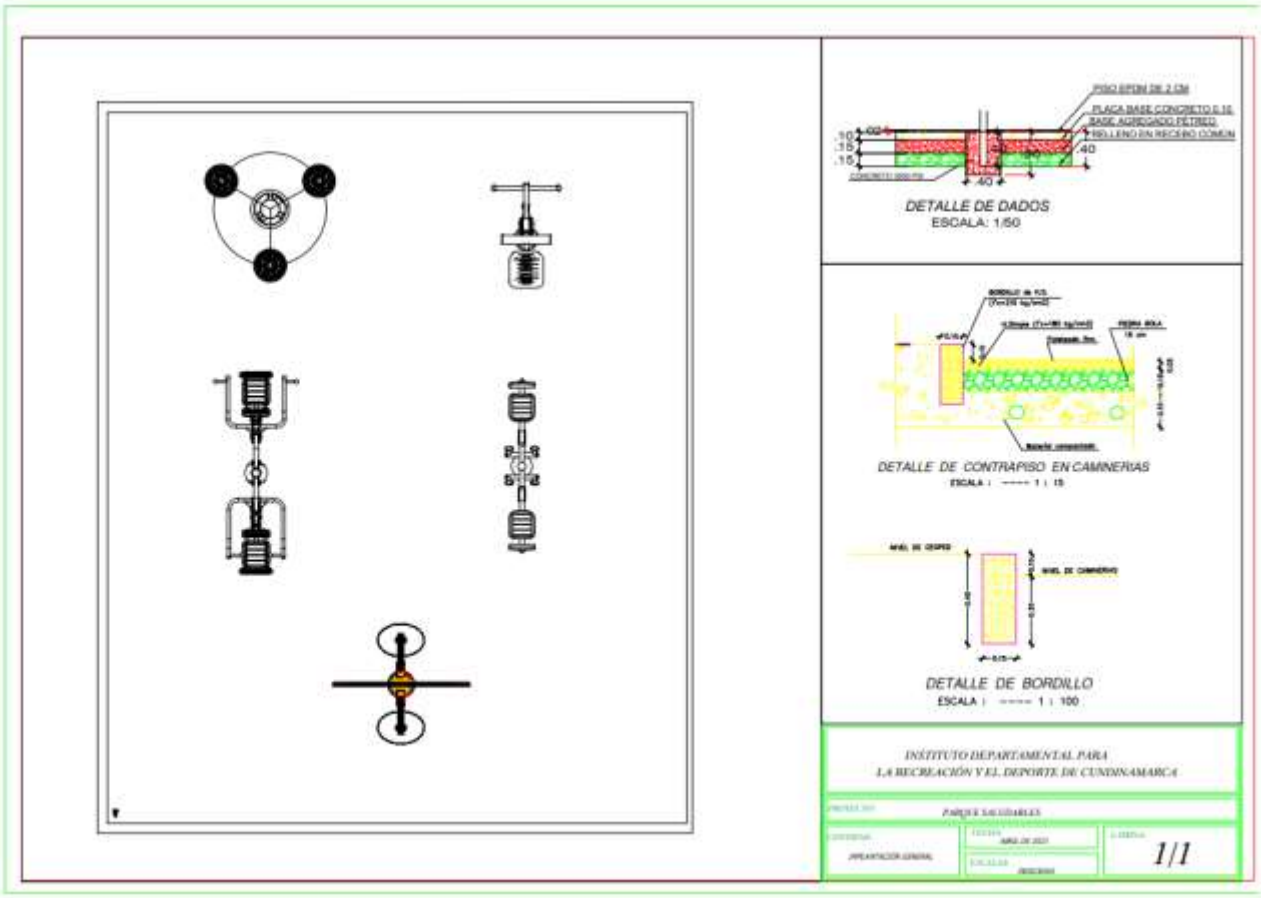


Ilustración 11 Modelo 2 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

MODELO 4. Parque Infantil de área 56 m2, el cual contiene siete (7) módulos.

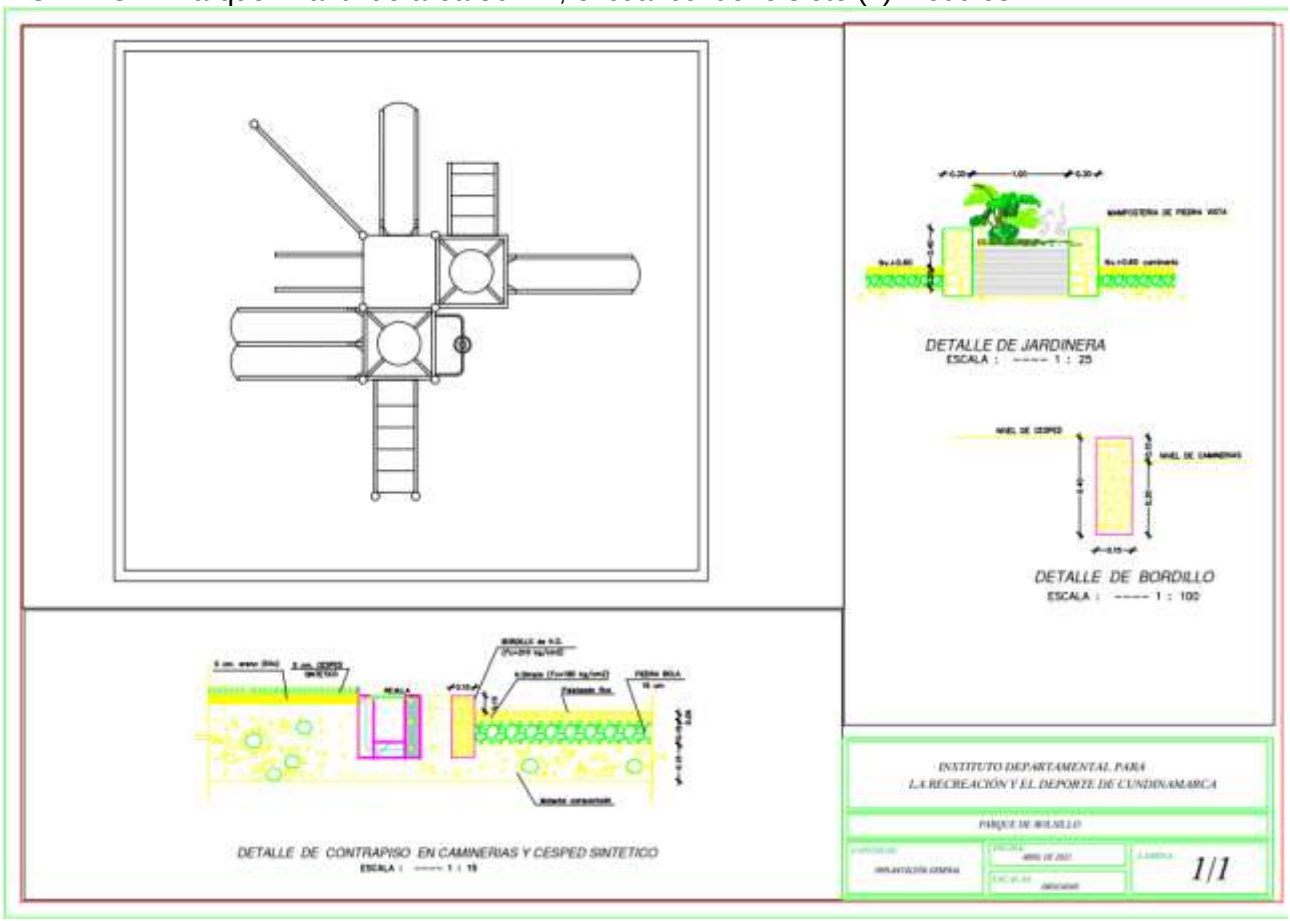


Ilustración 12 Modelo 4 (Fuente: Anexo Técnico Cce-Eicp-Idi-32)

En el desarrollo de las actividades se realizaron actualizaciones en las ubicaciones, quedando de la siguiente manera:

MUNICIPIO	VEREDA/BARRIO	DIRECCIÓN	COORDENADAS	TIPO PARQUE	ÁREA	
APULO	BARRIO CENTRO	Cl 9 #4 Apulo, Cundinamarca	4°31'05.0"N 74°35'36.1"W	INFANTIL	56 m2	APROBADO EL DÍA 18/6/24
		CAMBIO DE PREDIO A Calle 12 #5-15	**4°31'04.5"N 74°35'48.5"W**			
CHAGUANÍ	BARRIO CENTRO	Cl 2 #4-35 Chaguaní, Cundinamarca	4°56'53.8"N 74°35'41.5"W	INFANTIL	56 m2	APROBADO EL DÍA 26/7/24
		CAMBIO DE PREDIO A Calle 2B Carrera 1C	**4°56'54.5"N 74°35'35.5"W**			
CHAGUANÍ	BARRIO CENTRO	Cl. 2#4-35, Chaguaní, Cundinamarca	4°56'53.8"N 74°35'41.5"W	BIOSALUDABLE	70 m2	APROBADO EL DÍA 26/7/24
		CAMBIO DE PREDIO A Calle 2B Carrera 1C	**4°56'54.5"N 74°35'35.5"W**			
EL COLEGIO	INSPECCIÓN EL TRIUNFO	Parque principal, Inspección El Triunfo	4°32'33.5"N 74°28'23.6"W	BIOSALUDABLE	70 m2	APROBADO EL DÍA 26/7/24
		CAMBIO DE PREDIO A Inspección El Triunfo, Atrás de la Iglesia	4°32'36.0"N 74°28'22.6"W			
VILLETA	BARRIO VILLA MARÍA	Calle 7 entre Carreras 5 y 6	5°00'52.4"N 74°28'20.6"W	INFANTIL	56 m2	APROBADO EL DÍA 23/9/24
		CAMBIO DE PREDIO A Calle 11 Carrera	**5° 0'55.1"N 74°28'16.6"W**			
PUERTO SALGAR	BARRIO LA 52	**Carrera 3B con calle 14D, Casco Urbano Puerto Salgar**	**5°28'08.5"N 74°38'58.2"W**	BIOSALUDABLE	70 m2	APROBADO EL DÍA 03/10/24
				BIOSALUDABLE	**50 m2**	
CAPARRAPI	BARRIO LAS FERIAS	Barrio las Ferias, Casco Urbano Caparrapí	5°21'13.8"N 74°29'20.5"W	BIOSALUDABLE	50 m2	
FUSAGASUGA	LA CASCADA	Vereda la cascada, Vía Principal, Sentido Fusagasugá - Silvania	4°23'05.8"N 74°23'23.8"W	BIOSALUDABLE	50m2	
SIBATE	BARRIO SAN MARTIN	Tv. 10 #10 Sibaté, Cundinamarca	4°29'32.6"N 74°15'43.1"W	INFANTIL	56 m2	
TOCAIMA	BARRIO SAN FERNANDO	Carrera 6 Calle 15	4°27'22.1"N 74°38'28.6"W	INFANTIL	56 m2	
GUASCA	VEREDA SANTA BARBARA	Vereda Santa Barbara	4°52'42.2"N 73°50'53.2"W	INFANTIL	56 m2	
GACHALA	CASCO URBANO VIA LA PEPITA-PUERTO LAS PALMAS	Casco urbano, Vía La Pepita- Puerto Palmas	4°41'45.8"N 73°31'00.7"W	INFANTIL	56 m2	
FOMEQUE	VEREDAS LADERAS	Vereda Las Laderas	4°26'41.0"N 73°52'44.7"W	INFANTIL	56 m2	
FOMEQUE	ESCUELA DE CHINIA	Escuela de Chinia	4°30'22.1"N 73°51'54.0"W	INFANTIL	56 m2	
EL COLEGIO	BARRIO CHAPINERO	Carrera 2C con Calle 2A	4°34'37.5"N 74°26'31.8"W	INFANTIL	56 m2	
SILVANIA	INSPECCION DE SUBIA LA FLORIDA	La Florida, Inspección de Subia	4°28'4.30"N 74°23'5.6"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
SIBATE	CENTRO POBLADO BARRIO SANTA TERESA URBANIZACION EL MIRADO	Km 4, Vía Sibaté - Pasca, Vda San Benito, Sibaté	4°29'09.0"N 74°15'20.6"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
SOACHA	CIUDADELA SUCRE	Cl 42a #42 Este-1 a 42 Este-65, Soacha, Cundinamarca	4°34'03.3"N 74°11'14.9"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
SOACHA	BARRIO COMPARTIR	Cl 16a sur#2 Sur-1 a 2 Sur-65, Soacha, Cundinamarca	4°34'29.9"N 74°14'10.5"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
CAPARRAPI	VEREDA PUEBLO NUEVO	Vereda Pueblo Viejo, Caparrapí	5°20'11.7"N 74°35'32.3"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
SUBACHOQUE	VEREDA CANICA BAJA	Vía subachoque Tabio, Colegio Departamental sede vereda Canica Baja	4°55'54.6"N 74°07'56.2"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
EL ROSAL	SECTOR LA UNION "VILLA MARIA, LESTAR, BACHUE"	Cra. 2 calle 12A El Rosal, Cundinamarca	4°51'22.1"N 74°15'34.5"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
FACATATIVA	URBANIZACION VILLAS DE MANJUI	Cl. 1 #3 Sur-73 a 3 Sur-1, Facatativá, Cundinamarca	4°48'06.4"N 74°21'10.4"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
ZIPACON	VEREDA PUEBLO VIEJO	Vía Zipacón - Facatativá	4°46'42.4"N 74°22'30.7"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
MADRID	VEREDA LOS ARBOLES CAMELLON FRESAS SAN RAMON	Camellón San Ramón, Km 7.5 via Madrid - Puente Piedra Madrid	4°47'23.7"N 74°15'48.4"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
GUADUAS	BARRIO VICTOR MANUEL ZAMBRANO	Cl Real, entre carreras 9 y 10, Guaduas, Cundinamarca	5°04'12.1"N 74°35'57.7"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
MEDINA	BARRIO SAN NICOLÁS	Calle 2 entre carreras 10 y 11	4°30'10.4"N 73°21'01.2"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
UBALÁ	INSPECCIÓN DE MAMBITA	Inspección Mambita	4°45'50.0"N 73°19'36.1"W	BIOSALUDABLE	70 m2	
SAN CAYETANO	VEREDA CAMANCHA	Centro Poblado Camancha	5°24'31.6"N 74° 5'23.6"W	BIOSALUDABLE	70 m2	

Ilustración 13 Condiciones actualizadas predios aprobados por INDEPORTES

3. ÁREA JURÍDICA

3.1. CONTRATO DE OBRA No 1127 DE 2023

NÚMERO DE CONTRATO	1127 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTES
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ANGELA GARZON SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS MI PAIS
OBJETO	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA"
VALOR INICIAL	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 2.808.853.234)
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No 1	33 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO	06 DE MAYO DE 2024
FEHA DE TERMINACIÓN	29 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 1	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 2	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1114 de 2023

NÚMERO DE CONTRATO	1114 de 2023
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATANTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA - INDEPORTES
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES IC
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($280.885.321).
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución será hasta el plazo de ejecución del contrato de obra a intervenir y un mes más, termino contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de la garantía única y expedición del certificado de registro presupuestal, en todo caso el plazo se extenderá hasta la liquidación del contrato de obra a intervenir.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No 1	33 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO	06 DE MAYO DE 2024
FEHA DE TERMINACIÓN	29 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No. 1	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 DE OCTUBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12 DE DICIEMBRE DE 2024

3.3. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS

3.3.1. Contrato de Obra No. 1127 de 2023

CONTRATO DE OBRA

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 01/12/2023

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 0	$280,885,323.40	21/11/2023	21/11/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	21/11/2023	21/04/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 01/12/2023

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 0	$464,000,000.00	21/11/2023	21/04/2027
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$464,000,000.00	21/11/2023	21/04/2027
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$464,000,000.00	21/11/2023	21/04/2027

ACTA DE INICIO

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 28/12/2023

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 2	$280,885,323.40	27/12/2023	27/12/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	27/12/2023	27/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento
Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 18/04/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 2	$464,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$464,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$464,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 18/04/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 4	$280,885,323.40	27/12/2023	30/01/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	27/12/2023	27/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 18/04/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 4	$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024

PRÓRROGA No. 1

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 28/06/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 5	$280,885,323.40	27/12/2023	29/03/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	27/12/2023	29/09/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 28/06/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 5	$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$520,000,000.00	27/12/2023	27/05/2024

PRÓRROGA No. 2

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-44-101244623
Fecha de expedición: 25/09/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101244623 ANEXO No. 6	$280,885,323.40	27/12/2023	29/05/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		$280,885,323.40	6 MESES 1 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORARES		$140,442,661.70	27/12/2023	29/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$561,770,646.80	5 AÑOS	

Seguimiento póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza número: 33-40-101077423
Fecha de expedición: 25/09/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	33-40-101077423 ANEXO No. 6	$520,000,000.00	27/12/2023	29/11/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$520,000,000.00	27/12/2023	29/11/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$520,000,000.00	27/12/2023	29/11/2024

3.3.2. Contrato De Interventoría 1114 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Seguimiento póliza de cumplimiento
Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 20/11/2023

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 0	$56,177,064.20	03/11/2023	03/11/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	03/11/2023	03/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	03/05/2024	03/11/2024

ACTA DE INICIO
Seguimiento póliza de cumplimiento
Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 14/02/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 1	$56,177,064.20	27/12/2023	28/12/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	28/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	28/12/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

Seguimiento póliza de cumplimiento
Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 04/04/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 2	$56,177,064.20	27/12/2023	23/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	23/09/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	23/03/2025

REINICIO No. 1
Seguimiento póliza de cumplimiento
Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 22/05/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 3	$56,177,064.20	27/12/2023	26/04/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	26/10/2027
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	25/04/2025

PRÓRROGA No. 1
Seguimiento póliza de cumplimiento
Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537

Fecha de expedición: 27/06/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 4	$56,177,064.20	27/12/2023	24/07/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	24/01/2028
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	24/07/2025

PRÓRROGA No. 2

Seguimiento póliza de cumplimiento

Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza número: 980-47-994000026537
Fecha de expedición: 02/10/2024

AMPARO	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	980-47-994000026537 ANEXO No. 5	$56,177,064.20	27/12/2023	24/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y INDEMNIZACIONES LABORARES		$28,088,532.10	27/12/2023	24/02/2028
CALIDAD DEL SERVICIO		$56,177,064.20	27/06/2024	24/08/2025

4. ÁREA TÉCNICA

4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Fabricación

Durante el periodo de febrero a mayo (teniendo en cuenta que se suspendió el contrato por un periodo de 33 días, del 3 de abril al 5 de mayo) se realizó la fabricación de las siguientes máquinas, discriminadas de la siguiente manera:

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	%
1 RODADERO SENCILLO, 1 RODADERO DOBLE, CULUMPIOS 3 PUESTOS, 1 TABLERO DIDACTICO 1 PASAMANOS RECTO, 1 PASAMANOS CURVO.	$ 63,371,308.00	10	$ 633,713,080.00	22.6%
CINTURA	$ 4,560,637.00	3	$ 13,681,911.00	0.5%
VOLANTES DOBLES	$ 3,788,706.00	19	$ 71,985,414.00	2.6%
POTRO	$ 3,748,313.00	19	$ 71,217,947.00	2.5%
COLUMPIO DOBLE	$ 3,824,767.00	19	$ 72,670,573.00	2.6%
ASCENSOR DOBLE -DORSAL ANCHO	$ 4,518,999.00	19	$ 85,860,981.00	3.1%
PECTORAL SENTADO DOBLE	$ 4,560,637.00	16	$ 72,970,192.00	2.6%
DOBLE SWINGER-SURF	$ 3,441,180.00	16	$ 55,058,880.00	2.0%
CAMINADOR-PATINADOR AEREO	$ 3,822,761.00	16	$ 61,164,176.00	2.2%
ELIPTICA-ESQUI	$ 4,031,544.00	16	$ 64,504,704.00	2.3%
VALOR MAQUINAS			$ 1,202,827,858.00	42.8%
VALOR DEL CONTRATO			$ 2,808,853,234.00	

Ilustración 14 Relación de máquinas fabricadas

De lo anteriormente relacionado, se encuentran fabricadas las maquinas correspondientes a 10 parques infantiles de 56m2, 2 parques biosaludables de 50m2 que constan de 5 máquinas y 12 parques biosaludables de 70m2 que consta de 8 máquinas.

A continuación, se muestra registro fotográfico de la fabricación.

PARQUES INFANTILES



Ilustración 15 Fabricación de juegos parque infantil



Ilustración 16 Partes pintadas



Ilustración 17 Rodadero doble



Ilustración 18 Elementos pintados y partes plásticas



Ilustración 19 plataforma metálica parque infantil



Ilustración 20 Plataforma de parques infantiles



Ilustración 21 Proceso de fabricación de máquinas biosaludables



Ilustración 22 Elementos para maquina Volantes dobles



Ilustración 23 estructura de maquina Volantes dobles



Ilustración 24 Partes de maquina Caminador



Ilustración 25 Estructura de Caminador



Ilustración 26 Bases de máquinas biosaludables



Ilustración 27 Partes que componen la máquina Potro

Durante los meses de junio a noviembre, se llevaron a cabo diversas actividades de obra en un total de 20 municipios. De estos, se han entregado a la comunidad 11 parques, distribuidos de la siguiente manera:

AVANCE DE OBRAS														
				1				2		3	4			
MUNICIPIO	VEREDA/BARRIO	TIPO PARQUE	ÁREA	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ACERO FIGURADO 60000 PSI	PLACA BASE CONCRETO ,10 M DE 2500 PSI	PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y RECOMENDACIONES	PARQUE INSTALADO	TRANSPORTE	ENTREGA FINAL
TOCAIMA	BARRIO SAN FERNANDO	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI	NO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
APULO	BARRIO CENTRO	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
SIBATE	BARRIO SAN MARTIN	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EL COLEGIO	INSPECCION EL TRIUNFO PARQUE	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
SILVANIA	INSPECCION DE SUBIA LA FLORIDA	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SIBATE	CENTRO POBLADO BARRIO SANTA TERESA URBANIZACION EL MIRADO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EL COLEGIO	BARRIO CHAPINERO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
SUBACHOQUE	VEREDA CANICA BAJA	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
FACATATIVA	URBANIZACION VILLAS DE MANJUI	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
MADRID	VEREDA LOS ARBOLES CAMELLON FRESAS SAN RAMON	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FUSAGASUGA	LA CASCADA	BIOSALUDABLES	50 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Ilustración 28 Relación de las actividades del presente informe

Municipio De Tocaima

En el municipio de **Tocaima** se tiene asignado para el **Barrio San Fernando** un **parque infantil de 56 m2**, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 29 Se realiza relleno en recebo común con espesor de 10 cm



Ilustración 30 Se realiza compactación de relleno y encofrado para fundir bordillo



Ilustración 31 Se realiza fundida de bordillo en concreto de 2500 PSI



Ilustración 32 Se realiza armado de malla en varilla #2 para posterior fundida de placa



Ilustración 33 Espaciamiento acero placa



Ilustración 34 Se realiza fundida de placa en concreto de 2500 PSI



Ilustración 35 Verificación bordillo



Ilustración 36 Verificación bordillo



Ilustración 37 Se realiza la instalación de pasamanos curvo



Ilustración 38 Se realiza la instalación de rodadero doble, pasamanos recto y tablero didáctico



Ilustración 39 Se realiza la instalación de rodadero sencillo



Ilustración 40 Instalación tablero didáctico



Ilustración 41 Instalación columpio tres puestos



Ilustración 42 Tapete instalado



Ilustración 43 Tapete instalado

Municipio De Apulo Barrio Chicó

En el municipio de **Apulo** se tenía asignado para el barrio Centro Cl 9 #4 y por motivo de *"teniendo en cuenta la necesidad de un espacio recreativo para el gozo y disfrute de la infancia Apuleña, ya que en la ubicación inicial en donde se planteó el parque, la población infantil es menor en comparación a donde se pretende realizar el traslado, de igual forma, en este lugar a donde se pretende realizar el traslado, no se encuentran zonas de recreación infantil cercanas a diferencia del lugar inicial donde se plantea la ubicación de esta obra la cual se encuentra a una cuadra del parque del municipio."* Se realiza solicitud a la entidad mediante Oficio PIC-14052024-003, el día 14 de Mayo de 2024 y se aprueba el traslado del **parque Infantil de 56 m2**, el día 18 de Junio de 2024, por parte de INDEPORTES.

Para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 44 relleno en recebo común



Ilustración 45 Compactación relleno



Ilustración 46 Armado Acero placa



Ilustración 47 Verificación espaciamiento acero



Ilustración 48 Espesor placa



Ilustración 49 Fundida de placa



Ilustración 50 Placa fundida



Ilustración 51verificación placa



Ilustración 52 Verificación placa



Ilustración 53 Verificación placa



Ilustración 54 Verificación placa



Ilustración 55 Verificación bordillo



Ilustración 56 verificación bordillo



Ilustración 57 Evacuación de agua de la placa



Ilustración 58 verificación distancia para instalación de tapete



Ilustración 59 Parque infantil instalado, pasamanos curvo, rodadero sencillo



Ilustración 60 Parque infantil instalado, pasamanos curvo, rodadero sencillo



Ilustración 61 Parque infantil instalado, tablero didáctico



Ilustración 62 Parque infantil instalado, columpio tres puestos



Ilustración 63 Parque infantil instalado, rodadero doble, pasamanos recto



Ilustración 64 Parque infantil instalado



Ilustración 65 Parque infantil instalado, columpios tres puestos

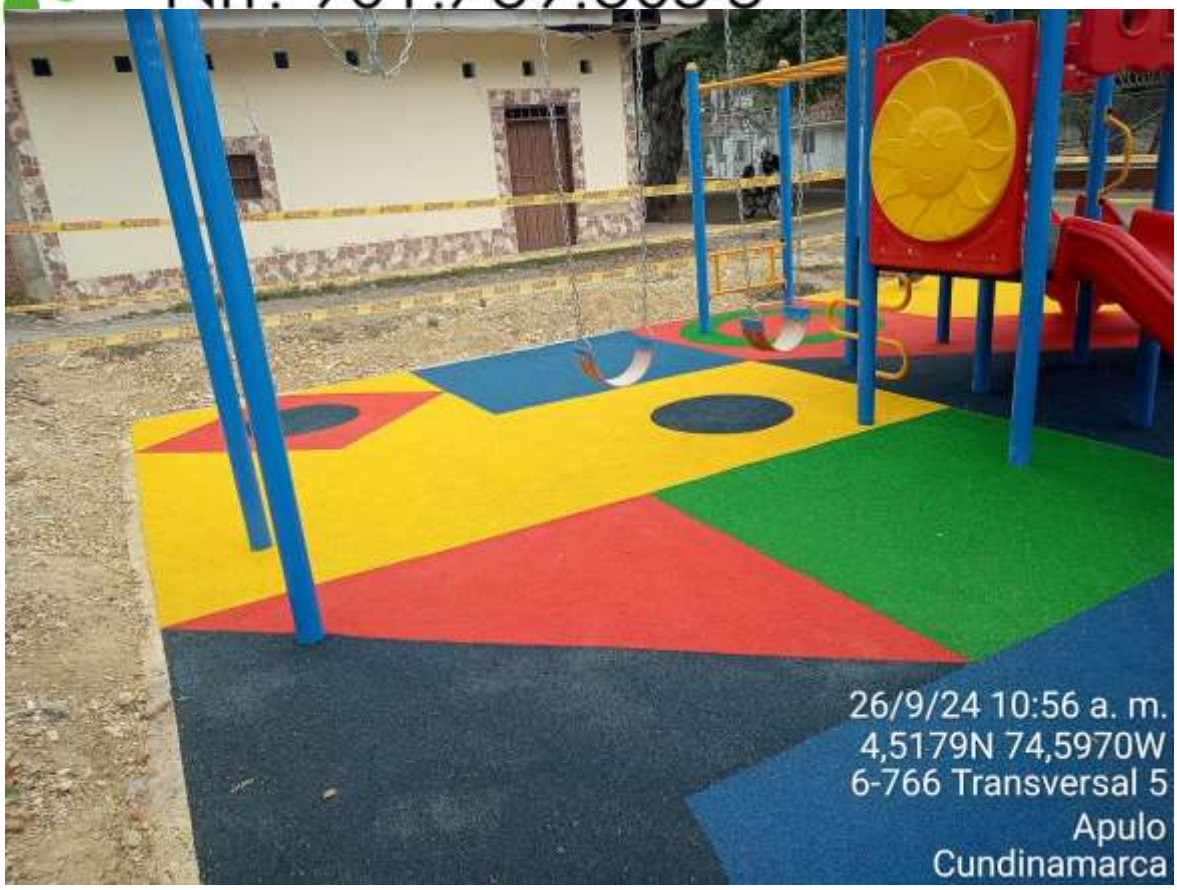


Ilustración 66 Tapete instalado

Municipio De El Colegio - Barrio Chapinero

En el municipio de **El Colegio** se tiene asignado para el **barrio Chapinero** un **parque Biosaludable de 70 m2**, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 67 Encofrado de bordillo y relleno en recebo común



Ilustración 68 Acero bordillo



Ilustración 69 Encofrado y acero de bordillo



Ilustración 70 Bordillo fundido de 2500 psi



Ilustración 71 Bordillo y materiales de mezcla



Ilustración 72 Excavación para dados de concreto



Ilustración 73 Excavación para dados de concreto



Ilustración 74 Dados de concreto



Ilustración 75 Dados de concreto



Ilustración 76 Verificación dados de concreto



Ilustración 77 Acero para placa



Ilustración 78 Acero para placa



Ilustración 79 Acero de placa base



Ilustración 80 Verificación espesor de placa



Ilustración 81 Fundida de placa base



Ilustración 82 Placa base finalizada



Ilustración 83 Placa base finalizada



Ilustración 84 Maquina Caminador - Patinador Aéreo, Tapete Instalado



Ilustración 85 Columpio doble y Tapete Instalado



Ilustración 86 Elíptica Esquí y Tapete Instalado



Ilustración 87 Potro y Tapete Instalado



Ilustración 88 Ascensor Doble – Dorsal Ancho



Ilustración 89 Pectoral Sentado Doble



Ilustración 90 Doble Swinger Surf y Tapete Instalado



Ilustración 91 Volantes Dobles y Tapete

Municipio De El Colegio- Inspección El Triunfo Parque

En el municipio de El Colegio se tiene asignado para la “Inspección El Triunfo Parque” un parque Infantil de 56 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 92 Encofrado de bordillo



Ilustración 93 Acero de refuerzo de bordillo



Ilustración 94 Acero de refuerzo bordillo



Ilustración 95 Acero de refuerzo bordillo



Ilustración 96 Bordillo fundido



Ilustración 97 Relleno en recebo común



Ilustración 98 Acero de refuerzo placa base



Ilustración 99 Acero de refuerzo placa base



Ilustración 100 Maestras para fundida de placa



Ilustración 101 Fundida de placa



Ilustración 102 Parque y tapete instalados



Ilustración 103 Parque y tapete instalado



Ilustración 104 Parque y tapete instalados

Municipio De Sibaté Barrio San Martin

En el municipio de Sibaté se tiene asignado para el barrio San Martín un parque Infantil de 56 m2, en el cual se realizó un cambio de sitio dentro del mismo predio ya que en el sitio inicialmente previsto, la secretaria de planeación nos indicó que se tenía proyectado otro parque, por lo cual se realizó el cambio dentro del mismo predio, como quedó expresado en el Oficio PIC-13062024-001 que se envió a contratista de obra.



Ilustración 105 Descripción del cambio

Para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 106 Formaleta de bordillo



Ilustración 107 Relleno en recebo común y armado de acero placa base



Ilustración 108 Verificación medidas acero



Ilustración 10909 Espaciamiento de acero placa



Ilustración 110 Espesor de placa



Ilustración 111 Proceso fundida de placa 2500 PSI



Ilustración 112 Proceso fundida placa 2500 PSI



Ilustración 113 Placa fundida 2500 PSI



Ilustración 114 Instalación parque infantil



Ilustración 115 Instalación parque infantil



Ilustración 116 Tapete instalado



Ilustración 117 valla instalada

Municipio De Sibaté - Centro Poblado Barrio Santa Teresa Urbanización El Mirado

En el municipio de Sibaté se tiene asignado para el Centro poblado Barrio Santa Teresa Urbanización El Mirado un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 118 Instalación de relleno en recebo común



Ilustración 119 Instalación de relleno en recebo común



Ilustración 120 Bordillo fundido en concreto de 2500 PSI



Ilustración 121 Placa en concreto de 2500 PSI



Ilustración 122 Paca en concreto de 2500PSI



Ilustración 123 Parque biosaludable 8 máquinas instalado



Ilustración 124 Valla instalada

Municipio De Silvania- Inspección De Subia La Florida

En el municipio de Silvania se tiene asignado para la Inspección de Subia La Florida un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 125 Armado de acero para bordillo y placa, encofrado y fundida de bordillo



Ilustración 126 Armado de acero para bordillo y placa, encofrado y fundida de bordillo



Ilustración 127 Acero de placa



Ilustración 128 Dados y bases para máquinas



Ilustración 129 Fundida de placa



Ilustración 130 Instalación de bases para posterior instalación de máquinas



Ilustración 131 Instalación de bases para posterior instalación de máquinas



Ilustración 132 Instalación de 8 máquinas



Ilustración 133 Instalación máquinas y valla



Ilustración 134 tapete instalado

Municipio De Fusagasugá- Vereda La Cascada

En el municipio de Fusagasugá se tiene asignado para la Vereda La Cascada un parque Biosaludable de 50 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 135 Adecuación del terreno y relleno con recebo común



Ilustración 136 Bordillo 8cm X 15cm



Ilustración 137 Acero placa e instalación de bases para máquinas



Ilustración 138 Armado de parrilla para fundir losa y armado acero bordillo para fundirlos en concreto de 2500PSI



Ilustración 139 Fundida de placa



Ilustración 140 Placa fundida



Ilustración 141 verificación bordillo



Ilustración 142 verificación bordillo



Ilustración 143 Instalación de máquinas



Ilustración 144 Volantes dobles extensión de brazos



Ilustración 145 Ascensor dobel brazos



Ilustración 146 Columpio doble piernas



Ilustración 147 Cintura



Ilustración 148 Potro



Ilustración 149 tapete instalado



Ilustración 150 valla instalada

Municipio De Subachoque - Vereda Canica Baja

En el municipio de Subachoque se tiene asignado para la Vereda Canica Baja un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 151 Se realiza instalación de relleno en recebo común



Ilustración 152 Se realiza instalación de relleno en recebo común



Ilustración 153 Se realiza armado de acero para placa y bordillo



Ilustración 154 Se realiza fundida de placa e instalación de bases para posterior instalación de máquinas



Ilustración 155 Fundida de placa y bordillo



Ilustración 156 Parque instalado



Ilustración 157 Ascensor Doble – Dorsal Ancho



Ilustración 158 Columpio Doble- Piernas



Ilustración 159 Elíptica Esquí



Ilustración 160 Caminador Patinador Aéreo



Ilustración 161 Volantes dobles extensión de brazos



Ilustración 162 Pectoral Sentado Doble



Ilustración 163 Doble Swinger Surf-Dorsales



Ilustración 164 Potro



Ilustración 165 Tapete instalado

Municipio De Facatativá - Urbanización Villas De Manjui

En el municipio de Facatativá se tiene asignado para la Urbanización Villas De Manjui un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 166 Encofrado y acero bordillo



Ilustración 167 Relleno en recebo común



Ilustración 168 Relleno en recebo común



Ilustración 169 Proceso fundida placa base 2500 PSI



Ilustración 170 Placa base 2500 PSI



Ilustración 171 Fraguado placa base 2500 PSI



Ilustración 172 Verificación bordillo



Ilustración 173 Verificación bordillo



Ilustración 174 Verificación espacio para tapete



Ilustración 175 Instalación de tapete y 8 maquinas

Municipio De Madrid - Vereda Los Árboles Camellón Fresas San Ramon

En el municipio de Madrid, se tiene asignado para la “Vereda Los Árboles Camellón Fresas San Ramón”, un parque Biosaludable de 70 m2, para la construcción del mismo se han llevado a cabo las siguientes actividades:



Ilustración 176 Formaleta bordillo



Ilustración 177 Relleno en recebo común



Ilustración 178 Relleno en recebo común, formaleta bordillo, instalación acero bordillo e instalación de pases para desagüe



Ilustración 179 Relleno en recebo común



Ilustración 180 Instalación de bases para máquinas



Ilustración 181 verificación acero placa



Ilustración 182 verificación acero placa



Ilustración 183 Pr4oceso Acero para placa de 2500 PSI



Ilustración 184 Acero placa 2500 PSI



Ilustración 185 proceso placa base de 2500 PSI



Ilustración 186 proceso placa base de 2500 PSI



Ilustración 187 Fraguado Placa



Ilustración 188 Parque instalado 8 maquinas



Ilustración 189 Verificación bordillo



Ilustración 190 Verificación bordillo



Ilustración 191 Verificación bordillo



Ilustración 192 Verificación bordillo



Ilustración 193 Verificación espacio para tapete



Ilustración 194 Pases



Ilustración 195 Elíptica Esquí



Ilustración 196 Doble Swinger Surf-Dorsales



Ilustración 197 Ascensor Doble – Dorsal Ancho



Ilustración 198 Columpio Doble- Piernas



Ilustración 199 Potro



Ilustración 200 Pectoral Sentado Doble



Ilustración 201 Volantes dobles extensión de brazos



Ilustración 202 Caminador Patinador Aéreo



Ilustración 203 Instalación de tapete



Ilustración 204 Instalación de valla

4.2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

A la fecha se ha llevado con normalidad todas las actividades de interventoría, “Las acciones que se deben cumplir para lograr una buena Interventoría, se orientan a: Controlar y vigilar, Solicitar y reorientar, Exigir, Colaborar, Absolver, Prevenir, Verificar”, se puede detallar un seguimiento en la Relación de correspondencia.

Adicional se realizaron las siguientes actividades:

- Realizar seguimiento del avance y estado del proyecto.
- Verificar cada una de las cantidades de las actividades realizadas por el contratista garantizando calidad en su ejecución.
- Verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad.
- Llevar registro de las cantidades ejecutadas.
- Revisión de la documentación enviada por parte del contratista
- Realizar informes mensuales de interventoría
- Control presupuestal programado y ejecutado del proyecto.
- Evaluar y validar los informes técnicos y financieros presentados por el contratista para asegurar su veracidad y cumplimiento con lo estipulado en el contrato.
- Realizar auditorías periódicas para garantizar la transparencia y correcta ejecución de los recursos.
- Coordinar reuniones de seguimiento con el contratista y las partes interesadas para abordar avances, obstáculos y soluciones.
- Identificar y gestionar riesgos asociados al proyecto, proponiendo acciones correctivas cuando sea necesario.
- Asesorar al contratista en la implementación de buenas prácticas y mejora continua en los procesos.
- Verificar el cumplimiento de normativas y regulaciones vigentes relacionadas con la ejecución del proyecto.
- Realizar inspecciones in situ para observar el avance físico y la calidad de las obras.
- Llevar un registro detallado de incidentes, problemas y decisiones tomadas durante la ejecución del proyecto.

4.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

En el transcurso del periodo del 27 de diciembre de 2023 al 15 de noviembre de 2024 y de acuerdo con la planificación establecida en el cronograma, según la re programación de obra No. 2 se proyectaba alcanzar un avance de obra del 92.11% representado por un valor monetario de $2,587,140,768. Sin embargo, para la presente acta de cobro se presentará soporte de un avance de 11 parques entregados a la comunidad, lo cual equivale a un 31.90% correspondiente a un valor de $896,066,955.

En la *Ilustración 203 Relación de ítems a cobrar en Acta N 1 del contrato de obra N. 1127 de 2023,* se presenta una discriminación de lo que se cobrará en el acta parcial de obra N 1.

Se anexa cronograma de obra de acuerdo a prórroga 2. Anexo 1.

AVANCE DE OBRAS														
				1				2		3	4			
MUNICIPIO	VEREDA/BARRIO	TIPO PARQUE	ÁREA	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ACERO FIGURADO 60000 PSI	PLACA BASE CONCRETO ,10 M DE 2500 PSI	PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y RECOMENDACIONES	PARQUE INSTALADO	TRANSPORTE	ENTREGA FINAL
TOCAIMA	BARRIO SAN FERNANDO	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI	NO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
APULO	BARRIO CENTRO	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
SIBATE	BARRIO SAN MARTIN	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EL COLEGIO	INSPECCION EL TRIUNFO PARQUE	PARQUE INFANTILES	56 m2	SI		SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
SILVANIA	INSPECCION DE SUBIA LA FLORIDA	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SIBATE	CENTRO POBLADO BARRIO SANTA TERESA URBANIZACION EL MIRADO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EL COLEGIO	BARRIO CHAPINERO	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
SUBACHOQUE	VEREDA CANICA BAJA	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
FACATATIVA	URBANIZACION VILLAS DE MANJUI	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
MADRID	VEREDA LOS ARBOLES CAMELLON FRESAS SAN RAMON	BIOSALUDABLES	70 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FUSAGASUGA	LA CASCADA	BIOSALUDABLES	50 m2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Ilustración 205 Relación de ítems a cobrar en Acta N 1 del contrato de obra N. 1127 de 2023

5. ÁREA ADMINISTRATIVA:

5.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

En el Anexo 2. Se presenta la relación de correspondencia del periodo en cuestión.

5.2. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA E INTEVERTORIA

PERSONAL DE TRABAJO DE CONTRATISTA		
CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	1.020.776.092
RESIDENTE DE OBRA	LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO	1.118.827.928
ESPECIALISTA SISO	CRISTIAN TORRES SANTIAGO	17.903.953
TOPÓGRAFO	LEIBER MARTINEZ VALBUENA	1.078.347.417
PROFESIONAL DE APOYO	JEAN CARLOS PEREZ	1.102.864.232

Tabla 1 Personal del contratista

PERSONAL DE TRABAJO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACIÓN**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LUIS CARLOS GALVIS VELASCO	91.297.471
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA I	SANDRA CAMILA COY RAMIREZ	1.020.759.608
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA II	EIDER LOPEZ ANGARITA	1.091.661.328
SISOMA	JULLIETH VIVIANA ORTEGA	1.078.347.417
PROFESIONAL DE APOYO	LAURA VANESA AVILA	1.233.905.383
PROFESIONAL DE APOYO	NIDIA YASMIN RUBIANO	1.193.369.301

Tabla 2 Personal de interventoría

6. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA:

6.1. CONTROL DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN

En el Anexo 3 se presenta el porcentaje ejecutado mensualmente hasta la fecha.

7. CONCLUSIONES

- ✓ Se concluye que el contratista avanza con normalidad la construcción de los parques en la cuales la interventoría sigue cada proceso que se ejecute.
- ✓ El contratista avanza con suministro de material a diferentes predios para no parar en los rendimientos óptimos que se han tenido.
- ✓ A la fecha del 15 de noviembre de 2024, se han entregado 11 parques a la comunidad. Tal como se muestra en la *Ilustración 203 Relación de ítems a cobrar en Acta N 1 del contrato de obra N. 1127 de 2023.*
- ✓ Interventoría a estado pendiente de revisiones tanto técnicas como administrativas ante cualquier eventualidad que se presente durante el periodo de los contratos.
- ✓ Se continua con un ritmo constante de trabajo para alcanzar el objeto del proyecto en el tiempo contractual establecido.

Sin otro particular;

Atentamente,

_____

CAMILO EDUARDO GONZALEZ OLMOS
C.C. 1.015.425.472 DE BOGOTÁ D. C.
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboró: Sandra Camila Coy – Residente de Interventoría
Revisó: Luis Carlos Galvis – Director de Interventoría
Aprobó: Luis Carlos Galvis – Director de Interventoría

ACTIVIDADES	28 DIC - 21 ENE				22 ENE - 18 FEB				19 FEB - 17 MAR				18 MAR - 2 ABR	
	28 DIC - 31 DIC	1 ENE-7 ENE	8 ENE-14 ENE	15 ENE-21 ENE	22 ENE-28 ENE	29 ENE-4 FEB	5 FEB-11 FEB	12 FEB-18 FEB	19 FEB-25 FEB	26 FEB-3 MAR	4 MAR-10 MAR	11 MAR-17 MARZ	18 MAR-24 MAR	25 MAR-2 ABR
ETAPA DIAGNOSTICA														
* VISITAS DE VIABILIDAD														
ETAPA DE FABRICACION														
ETAPA DE CONSTRUCCION														
* RELLENO EN RECEBO COMUN														
* BORDILLO DE 8*15 CM														
* DADO CONCRETO 3500PSI														
ACERO FIGURADO 60000 PSI														
* CONCRETO 2500PSI PLACA BASE														
* SUMINISTRO E INSTALACION PISO EPM														
* SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS														
* LIMPIEZA GENERAL														
Inversion Semanal					$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832	$ 15,127,832
Inversion Acumulado					$ 15,127,832	$ 30,255,664	$ 45,383,496	$ 60,511,328	$ 75,639,160	$ 90,766,992	$ 105,894,824	$ 121,022,656	$ 136,150,488	$ 151,278,320
% Inversion Semanal					0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%
% Inversion Acumulado					0.54%	1.08%	1.62%	2.15%	2.69%	3.23%	3.77%	4.31%	4.85%	5.39%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DURACION

3 ABR - 5 MAY					6 MAY-2 JUN				3 JUN-29 JUN				30 JUN-27 JUL		
3 ABR-9 ABR	10 ABR-16 ABR	17 ABR-23 ABR	24 ABR-30 ABR	1 MAY-5 MAY	6 MAY-12 MAY	13 MAY-19 MAY	20 MAY-26 MAY	27 MAY-2 JUN	3 JUN-9 JUN	10 JUN-16 JUN	17 JUN-23 JUN	24 JUN-29 JUN	30 JUN-6 JUL	7 JUL-13 JUL	14 JUL-20 JUL
SUSPENSION															
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,021,601	$ 60,021,601	$ 60,021,601	$ 60,021,601	$ 67,273,936	$ 67,273,936	$ 67,273,936	$ 67,273,936	$ 66,902,411	$ 66,902,411	$ 66,902,411
$ 151,278,320	$ 151,278,320	$ 151,278,320	$ 151,278,320	$ 151,278,320	$ 211,299,921	$ 271,321,522	$ 331,343,123	$ 391,364,724	$ 458,638,660	$ 525,912,596	$ 593,186,532	$ 660,460,468	$ 727,362,879	$ 794,265,290	$ 861,167,701
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.14%	2.14%	2.14%	2.14%	2.40%	2.40%	2.40%	2.40%	2.38%	2.38%	2.38%
5.39%	5.39%	5.39%	5.39%	5.39%	7.52%	9.66%	11.80%	13.93%	16.33%	18.72%	21.12%	23.51%	25.90%	28.28%	30.66%

	28 JUL-24 AGO				25 AGO-21 SEP				22 SEP-20 OCT				
21 JUL-27 JUL	28 JUL-3 AGO	4 AGO-10 AGO	11 AGO-17 AGO	18 AGO-24 AGO	25 AGO-31 AGO	1 SEP-7 SEP	8 SEP-14 SEP	15 SEP-21 SEP	22 SEP-29 SEP	30 SEP-6 OCT	7 OCT-13 OCT	14 OCT-20 OCT	21 OCT-27 OCT
$ 66,902,411	$ 87,341,545	$ 87,341,545	$ 87,341,545	$ 87,341,545	$ 105,713,643	$ 105,713,643	$ 105,713,643	$ 105,713,643	$ 110,856,238	$ 110,856,238	$ 110,856,238	$ 110,856,238	$ 110,856,238
$ 928,070,112	$ 1,015,411,657	$ 1,102,753,202	$ 1,190,094,747	$ 1,277,436,292	$ 1,383,149,935	$ 1,488,863,578	$ 1,594,577,221	$ 1,700,290,864	$ 1,811,147,102	$ 1,922,003,340	$ 2,032,859,578	$ 2,143,715,816	$ 2,254,572,054
2.38%	3.11%	3.11%	3.11%	3.11%	3.76%	3.76%	3.76%	3.76%	3.95%	3.95%	3.95%	3.95%	3.95%
33.04%	36.15%	39.26%	42.37%	45.48%	49.24%	53.01%	56.77%	60.53%	64.48%	68.43%	72.37%	76.32%	80.27%

21 OCT-17 NOV			18 NOV-29 NOV	
28 OCT-3 NOV	4 NOV-10 NOV	11 NOV-17 NOV	18 NOV-24 NOV	25 NOV-29 NOV
$ 110,856,238	$ 110,856,238	$ 110,856,238	$ 110,856,238	$ 110,856,238
$ 2,365,428,292	$ 2,476,284,530	$ 2,587,140,768	$ 2,697,997,006	$ 2,808,853,234
3.95%	3.95%	3.95%	3.95%	3.95%
84.21%	88.16%	92.11%	96.05%	100.00%

CONSORCIO PARQUES IC
NIT: 901.769.605-5

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA CONSORCIO PARQUES IC

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PARQUES IC	**SEMANA**	**OBJETO:**	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA".		
Radicación No.	**Fecha**		**Dirigido a**	**Asunto**	**Anexos**	**RESPUESTA CONTRATISTA**
Oficio PIC-03012024-001	3/01/2024	1	Consorcio Obras Mi País	Solicitud de documentos Contrato de obra No. 1127 de 2023		
Oficio PIC-12012024-001	12/01/2024	2	Consorcio Obras Mi País	Repuesta Cronograma – Visitas de Viabilidad		
Oficio PIC-18012024-001	18/01/2024	3	Consorcio Obras Mi País	Reiteración Solicitud de documentos Contrato de obra No. 1127 de 2023		
Oficio PIC-23012024-001	23/01/2024	4	Consorcio Obras Mi País	Respuesta a oficio Documentos iniciales		
Oficio PIC-31012024-001	31/01/2024	5	INDEPORTES	Entrega de documentos Contrato de Interventoría No. 1114 de 2023		
Oficio PIC-31012024-002	31/01/2024	5	Consorcio Obras Mi País	Respuesta a oficio Documentos iniciales N°3		
Oficio PIC-31012024-003	31/01/2024	5	Consorcio Obras Mi País	Solicitud Mesa Técnica.		
Oficio PIC-31012024-004	31/01/2024	5	INDEPORTES	Informe de Visitas Viabilidad - Interventoría		
Oficio PIC-31012024-005	31/01/2024	5	Consorcio Obras Mi País	Solicitud Fichas Técnicas Parques		
Oficio PIC-02022024-001	5/02/2024	6	INDEPORTES	Repuesta Propuesta de Tipos de Parque.		
Oficio PIC-02022024-001	5/02/2024	6	Consorcio Obras Mi País	Repuesta Propuesta de Tipos de Parques		
Oficio PIC-02022024-002	5/02/2024	6	Consorcio Obras Mi País	Solicitud de Informe de Actividades N° 1.		
Oficio PIC-07022024-001	7/02/2024	6	Consorcio Obras Mi País	Respuesta Solicitud de Suspensíon		
Oficio PIC-08022024-001	8/02/2024	6	Consorcio Obras Mi País	Solicitud de Pólizas Contrato 1127 DE 2023.		
Oficio PIC-08022024-002	8/02/2024	6	Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Entrega de Fichas Técnicas.		
Oficio PIC-08022024-003	8/02/2024	6	Consorcio Obras Mi País	Respuesta PROPUESTA DISEÑO PARQUES Y SOLICITUD INCLUSION ITEMS NO PREVISTOS		
Oficio PIC-13022024-001	13/02/2024	7	Consorcio Obras Mi País	Respuesta a oficio Documentos iniciales N°4		
Oficio PIC-13022024-002	13/02/2024	7	Consorcio Obras Mi País	Respuesta a oficio "Solicitudes Contrato"		
Oficio PIC-15022024-001	15/02/2024	7	Consorcio Obras Mi País	Reiteración envío Fichas Técnicas		
Oficio PIC-16022024-002	16/02/2024	7	Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Entrega de Fichas Técnicas V2		
Oficio PIC-20022024-001	20/02/2024	8	Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Entrega de Fichas Técnicas V3		
Oficio PIC-20022024-002	20/02/2024	8	Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Complemento técnico Y modificación de la propuesta de refuerzo		
Oficio PIC-20022024-003	20/02/2024	8	Consorcio Obras Mi País	Reiteración - Respuesta a oficio Documentos iniciales - 06 de febrero 2024		
Oficio PIC-21022024-001	21/02/2024	8	INDEPORTES	Solicitud o Aclaración De Valla Informativa.		NO RESPONDIDO
Oficio PIC-23022024-001	23/02/2024	8	Consorcio Obras Mi País	Respuesta Entrega Informe N°1 V2		

Oficio PIC-23022024-002	23/02/2024	8	Consorcio Obras Mi País	Respuesta a oficio Documentos iniciales V4		PENDIENTE RESPONDER
Oficio PIC-28022024-001	28/02/2024	9	Consorcio Obras Mi País	Respuesta Items No Previstos V4		
Oficio PIC-28022024-002	28/02/2024	9	Consorcio Obras Mi País	Respuesta Solicitud Cambio en Ficha Técnica		
Oficio PIC-29022024-001	29/02/2024	9	INDEPORTES	Remisión – Solicitud Inclusión No Previstos Contrato De Obra No 1127 De 2023		
Oficio PIC-04032024-001	4/03/2024	10	Consorcio Obras Mi País	Solicitud de Visita Taller de Fabricación		
Oficio PIC-05032024-001	5/03/2024	10	Consorcio Obras Mi País	Aval Informe N° 1		
Oficio PIC-05032024-002	5/03/2024	10	Consorcio Obras Mi País	Solicitud de Informe de Actividades N° 2		
Oficio PIC-07032024-001	7/03/2024	10	Consorcio Obras Mi País	Respuesta Documentos Iniciales V5		
Oficio PIC-07032024-002	7/03/2024	10	INDEPORTES	Reitación - Solicitud Inclusión No Previstos Contrato De Obra No 1127 De 2023		
Oficio PIC-07032024-003	7/03/2024	10	Consorcio Obras Mi País	Solicitud de Aviso - Responsable Parques		
Oficio PIC-11032024-001	11/03/2024	11	Consorcio Obras Mi País	Reiteración Solicitud de Información – Inicio Etapa de Construcción		
Oficio PIC-11032024-002	11/03/2024	11	Consorcio Obras Mi País	Reiteración N° 1 Solicitud de Informe de Actividades N° 2		
Oficio PIC-13032024-001	13/03/2024	11	Consorcio Obras Mi País	Respuesta Avance de Fabricación de Maquinas.		
Oficio PIC-13032024-002	13/03/2024	11	INDEPORTES	Reitación N°2 - Solicitud Inclusión No Previstos Contrato De Obra No 1127 De 2023		
Oficio PIC-13032024-003	13/03/2024	11	Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Solicitud De Informacion Sobre La Inclusion De Items No Previstos		
Oficio PIC-13032024-005	13/03/2024	11	Consorcio Obras Mi País	Segunda Reiteración Solicitud de Información – Inicio Etapa de Construcción		
Oficio PIC-13032024-006	13/03/2024	11	Consorcio Obras Mi País	Segunda Reiteración Solicitud de Informe de Actividades N° 2		
Oficio PIC-14032024-001	14/03/2024	11	Consorcio Obras Mi País	Remisión – Respuesta INDEPORTES Solicitud Inclusión No Previstos Contrato De Obra No 1127 De 2023		
Oficio PIC-14032024-002	14/03/2024	11	INDEPORTES	Remisión – Cambio de Predio Soacha (Comuna 4 Barrio Ciudadela Sucre Sector 2)		
Oficio PIC-14032024-003	14/03/2024	11	Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Propuesta De Distribucion De Maquinas		17/05/2024 RESPUESTA AL OFICIO PIC-14032024-003
Oficio PIC-18032024-001	18/03/2024	12	Consorcio Obras Mi País	Reiteración - Envio Documentos Iniciales V5		
Oficio PIC-18032024-002	18/03/2024	12	Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Adecuacion De Los Terrenos		
Oficio PIC-18032024-003	18/03/2024	12	Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Solicitud Suspensión		
Oficio PIC-19032024-001	19/03/2024	12	Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Solicitud De Comité De Obra		
Oficio PIC-19032024-002	19/03/2024	12	INDEPORTES	Reiteración - Solicitud o Aclaración De Valla Informativa.		
Oficio PIC-20032024-001	20/03/2024	12	INDEPORTES	Respuesta - Solicitud de Suspensión		
Oficio PIC-02042024-001	2/04/2024	14	Consorcio Obras Mi País	Observaciones Informe mensual No. 2 V1		Se reitera mediante Oficio PIC-27052024-002
Oficio PIC-06052024-001	6/05/2024	15	Consorcio Obras Mi País	Solicitud Oficio Para Reinicio del Contrato de Obra		

Oficio PIC-06052024-002	6/05/2024	15	Consorcio Obras Mi País	Solicitud Concepto Técnico Predio Ubicado en Soacha Ciudadela Sucre		
Oficio PIC-06052024-003	6/05/2024	15	INDEPORTES	Solicitud Mesa Técnica		
Oficio PIC-06052024-004	6/05/2024	15	INDEPORTES	Remisión – Solicitud Inclusión No Previstos Contrato De Obra No 1127 De 2023		
Oficio PIC-06052024-005	6/05/2024	15	INDEPORTES	Solicitud Reinicio de Contrato de Obra e Interventoría		
Oficio PIC-07052024-001	7/05/2024	15	INDEPORTES	Remisión – Concepto Técnico Predio Soacha Ciudadela Sucre (Interventoría)		NO RESPONDIDO
Oficio PIC-10052024-001	10/05/2024	15	Consorcio Obras Mi País	Remisión Estado Actual Predio Soacha Ciudadela Sucre.		23/05/2024 INDEPORTES
Oficio PIC-14052024-001	14/05/2024	16	Consorcio Obras Mi País	Remisión – Solicitud Inclusión No Previstos Contrato De Obra No 1127 De 2023		23/05/2024 INDEPORTES
Oficio PIC-14052024-002	14/05/2024	16	Consorcio Obras Mi País	Solicitud Cronograma de Obra Ajustado a Reinicio		17/05/2024 CONTRATISTA
Oficio PIC-14052024-003	14/05/2024	16	INDEPORTES	Remisión – Solicitud Para El Traslado De Ubicación De La Construcción Del Parque Infantil APULO		17/05/2024 INDEPORTES
Oficio PIC-14052024-004	14/05/2024	16	Consorcio Obras Mi País	Inicio de Obras Municipio de Apulo, Barrio Centro		
Oficio PIC-15052024-001	15/05/2024	16	INDEPORTES	Remisión–Obras Realizadas Por La Comunidad En El Predio Ubicado En Soacha, Ciudadela Sucre		
Oficio PIC-16052024-001	16/05/2024	16	Consorcio Obras Mi País	Observaciones Informe mensual No. 3 V1		Se reitera mediante Oficio PIC-27052024-002 Respondido 08072024
Oficio PIC-16052024-002	16/05/2024	16	INDEPORTES	Solicitud De Respuesta Solicitud Inclusión No Previstos Contrato De Obra No 1127 De 2023		23/05/2024 INDEPORTES
Oficio PIC-16052024-003	16/05/2024	16	INDEPORTES	Solicitud Acta De Reinicio Contrato De Obra No 1127 De 2023 Y Contrato De Interventoría No. 1114 De 2023		PENDIENTE RESPONDER reiteración
Oficio PIC-16052024-004	16/05/2024	16	INDEPORTES	Solicitud De respuesta Oficio PIC-07052024-001 Remisión – Concepto Técnico Predio Soacha Ciudadela Sucre		23/05/2024 INDEPORTES
Oficio PIC-17052024-001	17/05/2024	16	Consorcio Obras Mi País	Observaciones Cronograma Ajustado a Reinicio de Contrato		Se reitera mediante Oficio PIC-27052024-003
	22/05/2024	17	Consorcio Obras Mi País INDEPORTES	Acta de mesa técnica 20052024		PENDIENTE FIRMAS
Oficio PIC-27052024-001	27/05/2024	18	Consorcio Obras Mi País	Respuesta Entrega De Documentación Para Modificatorio		
Oficio PIC-27052024-002	27/05/2024	18	Consorcio Obras Mi País	Reiteración De Observaciones A Los Informes De Actividades N° 2 Y N°3 (Febrero Y Marzo)		Respondido 08072024
Oficio PIC-27052024-003	27/05/2024	18	Consorcio Obras Mi País	Reiteración Observaciones Cronograma Ajustado a Reinicio de Contrato		NO RESPONDIDO
Oficio PIC-28052024-001	28/05/2024	18	Consorcio Obras Mi País	Respuesta A Reiteración De Adecuaciones De Los Terrenos		
Oficio PIC-28052024-002	28/05/2024	18	Consorcio Obras Mi País	Presunto Incumplimiento		
Oficio PIC-29052024-001	29/05/2024	18	Consorcio Obras Mi País	Aval Cronograma A Reinicio De La Suspensión No. 1.		
observaciones	5/06/2024		Consorcio Obras Mi País	DOCUMENTACIÓN PARA MODIFICATORIO		
Oficio PIC-04062024-001	4/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta Justificación Retraso De Actividades De Obra		

Oficio PIC-05062024-001	5/06/2024		INDEPORTES	Remisión – Solicitud Inclusión No Previsto Y Aclaración Valla - Contrato De Obra No 1127 De 2023		
Oficio PIC-11062024-001	11/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Oficio PIC-05062024-001		
Oficio PIC-12062024-001	12/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta A Inicio De Obra En Los Municipios		
Oficio PIC-12062024-002	12/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta A Inicio De Obra En Los Municipios V2		
Oficio PIC-11062024-002	11/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta A Solicitud De Prórroga		
Oficio PIC-13062024-001	13/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones De Acuerdo A Visita De Obra Realizada		
Oficio PIC-21062024-001	21/06/2024		INDEPORTES	Respuesta A Solicitud De Prórroga No. 1		
	24/06/2024		INDEPORTES	INFORME N° 5_ CONTRATO INT 1114 de 2023		
Oficio PIC-24062024-001	24/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta Ficha Técnica De Valla Instructiva		
Oficio PIC-25062024-001	25/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Incumplimiento Envío De Documentos Pendientes		Se reitera mediante Oficio PIC-28062024-002
Oficio PIC-25062024-002	25/06/2024		INDEPORTES	Solicitud De Respuesta Cambios De Predios		Se reitera mediante Oficio PIC-28062024-001
Oficio PIC-27062024-002	27/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Presunto Incumplimiento por avance de obra		
Oficio PIC-28062024-001	28/06/2024		INDEPORTES	Reiteración de respuesta a Oficio PIC-25062024-002 Solicitud De Respuesta Cambios De Predios		
Oficio PIC-28062024-002	28/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Reiteración de no recepción de documentos solicitados - Presunto Incumplimiento del contrato.		Respuesta parcial 08072024
Oficio PIC-29062024-001	29/06/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones Cronograma E Informe Mensual Junio		Respuesta parcial 27082024
Oficio PIC-02072024-001	2/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones Valla Instructiva		
Oficio PIC-05072024-001	5/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta A Inicio De Obra En Los Municipios V3		
Oficio PIC-06072024-001	6/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones Actividades De Obra		
Oficio PIC-08072024-001	8/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Reiteración Presunto Incumplimiento Envío De Documentos Pendientes		Respuesta parcial 08072024
Oficio PIC-08072024-002	8/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Solicitud De Estado Predio Sibaté San Martín		
Oficio PIC-09072024-001	9/07/2024		INDEPORTES	Aval Valla Instructiva de Obra		
Oficio PIC-11072024-001	11/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Solicitud Y Recomendaciones Actividades De Obra		
Oficio PIC-11072024-002	11/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Aprobación Diseños De Mezcla		
Oficio PIC-15072024-001	15/07/2024		INDEPORTES	Reiteración Y Remisión Caso Predio Chaguaní - Solicitud De Respuesta		26/07/2024 Aprobación por INDEPORTES
Oficio PIC-17072024-001	17/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta A Inicio De Obra En Los Municipios V4		
Oficio PIC-17072024-002	17/07/2024		INDEPORTES	Solicitud De Respuesta - Aval Valla Instructiva de Obra		26/07/2024 Correcciones por INDEPORTES
Oficio PIC-17072024-003	17/07/2024		INDEPORTES	Remisión Modelos Tapete Parques Y Fichas Técnicas De Los Materiales		
Oficio PIC-18072024-001	18/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta Solicitud Traslado De Predio El Colegio Barrio El Triunfo		26/07/2024 Aprobación por INDEPORTES

Oficio PIC-19072024-001	19/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Obras Realizadas Puerto Salgar – Parque Biosaludable 70m2		
Oficio PIC-22072024-001	22/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Solicitud Cambio De Tipo Parque Predio Puerto Salgar		
Oficio PIC-24072024-001	24/07/2024		INDEPORTES	Documentación Según Compromisos - Comité 9 De Julio	Informes Cronograma actualizado Diseños de mezcla plan de mejoramiento Planos ajustados	
	26/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Remito observaciones realizadas por la supervisión a los diseños de valla instructiva propuestos, para corrección de los mismos.		
Oficio PIC-29072024-001	29/07/2024		Consorcio Obras Mi País	Aprobación Cambio de Predio El Colegio Inspección El Triunfo y Chaguaní		
Oficio PIC-01082024-001	1/08/2024		INDEPORTES	Correcciones Valla Instructiva de obra.	Respuesta Al Oficio Correcciones Valla Parques Infantiles Y Saludables.pdf - Oficio contratista.pdf Valla 60X80 Indeportes.cdr Valla 60X80 Indeportes.pdf	
Oficio PIC-01082024-002	1/08/2024		INDEPORTES	Reiteración Aprobación Diseño De Arte Del Ítem Piso De 30mm De Espesor Formado Por Una Base Elástica SBR Negra De 20mm Y Capa De Uso En EPDM De 10mm Color.		
Oficio PIC-05082024-001	5/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Segundas Observaciones Informe Técnico No. 5 Junio		
Oficio PIC-12082024-001	12/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones Modelo Valla y Tapete	VALLA 60X80 INDEPORTES OBSERVACIONES A AJUSTES 12-08-2024.pdf MANUAL DE MARCA CUNDINAMARCA -1 AGOSTO.pdf Imágenes de los modelos de tapete.	
Oficio PIC-14082024-001	14/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Reiteración – Justificación a Solicitud Cambio De Tipo Parque Predio Puerto Salgar		

Oficio PIC-15082024-001	15/08/2024		INDEPORTES	Remisión Correcciones Valla Instructiva de obra.	Oficio de remisión del contratista de obra. Correcciones a las obras de arte.pdf – Vallas Instructivas. Diseño de tapete.	
Oficio PIC-16082024-001	16/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta Estado De Predios		
Oficio PIC-16082024-002	16/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta A Inicio De Obra En Los Municipios V5		
Oficio PIC-20082024-001	21/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Presunto Incumplimiento Por Atraso De Actividades De Obra		
Oficio PIC-23082024-001	23/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Reiteración N2 – Justificación a Solicitud Cambio De Tipo Parque Predio Puerto Salgar		
Oficio PIC-23082024-002	23/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Solicitud de Información sobre Fecha de Inicio de Actividades		
Oficio PIC-23082024-002	23/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones Actividades De Obra N2		
Oficio PIC-26082024-001	26/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Solicitud Informes.		
Oficio PIC-26082024-002	26/08/2024		INDEPORTES	Remisión – Solicitud Aprobación Cambio de Tipo de Parque en Puerto Salgar.		
Oficio PIC-28082024-001	28/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Remisión Observaciones Emitidas Por La Secretaría De Prensa, Vallas Y Tapetes		
Oficio PIC-28082024-002	28/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Presunto Incumplimiento Por Atraso De Actividades De Obra		
Oficio PIC-28082024-003	28/08/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones a Informe de obra #6- Julio		
Oficio PIC-02092024-001	2/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones Valla Instructiva		
Oficio PIC-03092024-001	3/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Solicitud informe de obra No. 6 - Agosto		
Oficio PIC-03092024-002	3/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Respuesta – Justificación Atraso De Obra		
Oficio PIC-10092024-001	10/09/2024		INDEPORTES	Solicitud De Respuesta Casos Villeta Y Soacha Ciudadela Sucre		
Oficio PIC-10092024-002	10/09/2024		INDEPORTES	Respuesta A Observaciones Informes Contrato De Obra		
Oficio PIC-10092024-003	10/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Reiteración - Solicitud informe de obra No. 6 - Agosto.		
Oficio PIC-10092024-004	10/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Solicitud De Correcciones De Acuerdo Con Las Observaciones Al Modelo De La Valla Instructiva.		
Oficio PIC-11092024-001	11/09/2024		INDEPORTES	Aval Valla Instructiva de Obra VF		
Oficio PIC-16092024-001	16/09/2024		Consorcio Obras Mi País	Observaciones Actividades de Obra.		
Oficio PIC-16092024-002	16/09/2024		INDEPORTES	Respuesta A Solicitud De Prórroga No. 2.		
Oficio PIC-23092024-001	23/09/2024		INDEPORTES	Respuesta A Solicitud De Prórroga No. 2.		

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA CONSORCIO OBRAS MI PAIS

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MI PAIS	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA No. LP-002 DE 2023, “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PARQUES SALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA".	**CONTRATO DE OBRA No. 1143 de 2023**

CONTRATISTA

Radicación No.	Fecha	Recibido de	Asunto	Anexos	OFICIO RESPUESTA
			Solicitud De Diseños Y Estudios Del Proyectos		
CTO LP- 002 - 2023	9/01/2024	Consorcio Obras Mi País	Propuesta De Cronograma De Visitas	CRONOGRAMA_VISITAS _V2.xlsx	
	19/01/2024	Consorcio Obras Mi País	Entrega De Documentación Inicial	PLAN DE TRABAJO, PROGRAMA PERSONAL, PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, HOJAS_DE_VIDA.rar	-
	22/01/2024	Consorcio Obras Mi País	Retraso En El Inicio De La Ejecucion De Obra Y Solicitud Suspension Del Contrato.	-	
	29/01/2024	Consorcio Obras Mi País	Entrega De Documentacion Inicial	CARTAS DE COMPROMISOS, HV TOPOGRAFIA, PLAN DE TRABAJO	-
	29/01/2024	Consorcio Obras Mi País	Solicitud de Suspensión		
	2/02/2024	Consorcio Obras Mi País	Propuesta De Tipos De Parques		Oficio PIC-08022024-003
	8/02/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-08022024-001		
	9/02/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUDES CONTRATO		Oficio PIC-13022024-002
	14/02/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-02022024-002		
	14/02/2024	Consorcio Obras Mi País	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA E INCLUSIÓN DE NUEVOS ÍTEMS AL CONTRATO DE OBRA N°1127 DE 2023.	-	
	14/02/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD Y/O ACLARACION DE VALLA INFORMATIVA	-	
	14/02/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-08022024-002	-	
	15/02/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-15022024-001	FICHAS TECNICAS Y PLANO PARQUE INFANTIL	
	21/02/2024	Consorcio Obras Mi País	Respuesta - Oficio PIC-20022024-002	REQUERIMIENTOS PARA NP'S	

	12/03/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE INICIO DE OBRA.		
	2/04/2024	Consorcio Obras Mi País	JUSTIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEM NO PREVISTO	PROYECCION DE PARQUES Y PRESUPUESTO-VFINAL1 BALANCE CON ITEMS NO PREVISTOS-VFINAL1 JUSTIFICACION-DE-ITEM-NO-PREVISTOS-V2	Oficio PIC-06052024-004 Remisión a INDEPORTES
	6/05/2024	Consorcio Obras Mi País	AMPLIACIÓN DE SUSPENSION	AMPLIACIÓN DE SUSPENSION.docx	
	6/05/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE COMITE DE OBRA.	SOLICITUD DE COMITE DE OBRA.pdf	Oficio PIC-06052024-003 Remisión a INDEPORTES
	6/05/2024	Consorcio Obras Mi País	CONCEPTO DE VIABILIDAD. (contratista)	CONCEPTO DE VIABILIDAD.pdf	Oficio PIC-07052024-001 Remisión a INDEPORTES
	8/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 06052024-972 SOLICITUD DE COMITE DE OBRA.		
	9/05/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE REINICIO DE CONTRATO	SOLICITUD DE REINICIO DE CONTRATO.pdf	Remisión a INDEPORTES
	10/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 09052024-1000 SOLICITUD DE REINICIO DE CONTRATO		Oficio PIC-06052024-005 Remisión a INDEPORTES
	10/05/2024	Consorcio Obras Mi País	JUSTIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEM NO PREVISTO V3	JUSTIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEM NO PREVISTO V3.pdf	Oficio PIC-14052024-001 Remisión a INDEPORTES
	14/05/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO	SOLICITUD_SILVANIA.pdf	23/05/2024 INDEPORTES
	14/05/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO	SOLICITUD_SIBATE-SAN_MARTIN.pdf	23/05/2024 INDEPORTES
	14/05/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO	SOLICITUD_SIBATE-SANTA_TERESA.pdf	23/05/2024 INDEPORTES
	14/05/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO	SOLICITUD_APULO.pdf	Oficio PIC-14052024-004
	14/05/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO	SOLICITUD_EL_COLEGIO-EL_TRIUNFO.pdf	23/05/2024 INDEPORTES
	14/05/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO	SOLICITUD_FOMEQUE-CHINIA.pdf	23/05/2024 INDEPORTES
	14/05/2024	Consorcio Obras Mi País	INFORME DE ACTIVIDADES N° 3	Informe mensual N°3 INDEPORTES.pdf	Oficio PIC-16052024-001

	14/05/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD PARA EL TRASLADO DE UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL.	SOLICITUD PARA EL TRASLADO DE UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL.pdf 19-03-2024 RD SALIDA No 009083 JOSE LUIS LAMUS 20240319.pdf	Oficio PIC-14052024-003 Remisión a INDEPORTES
	14/05/2024	JAC SOACHA CIUDADELA SUCRE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE MUNICIPIO DE SOACHA.	AVANCE PARQUE BIOSALUDABLE SOACHA-Ciudadela sucre.pdf	Oficio PIC-15052024-001 Remisión a INDEPORTES y a CONTRATISTA
	17/05/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-14052024-002	RESPUESTA AL OFICIO PIC-14052024-002.pdf cronograma y plan de inversión actualizado.pdf	Oficio PIC-17052024-001
	17/05/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-14032024-003	Adaptacion modelos parques anexo tecnico	
	17/05/2024	Consorcio Obras Mi País	REITERACIÓN DE APROBACION DE MODIFICATORIO		23/05/2024 INDEPORTES
	23/05/2024	INDEPORTES	JUSTIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEM NO PREVISTO		
	23/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 20052024-1086 REITERACIÓN DE APROBACION DE MODIFICATORIO		
	23/05/2024	INDEPORTES	Respuesta radicado No. 20052024-1083 Solicitud De respuesta Oficio PIC-07052024-001 Remisión – Concepto Técnico Predio Soacha Ciudadela Sucre		
	23/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICACO No. 09052024-998 CONCEPTO DE VIABILIDAD PREDIO DE SOACHA		
	23/05/2024	INDEPORTES	Respuesta radicado No. 20052024-2081 Solicitud de respuesta oficio PIC-06052024-004 Remisión solicitud de inclusión no previstos Contrato de Obra No. 1127 de 2023enviado por Camilo Eduardo Gonzalez Olmos Representante Legal Consorcio Parques IC		
	23/05/2024	INDEPORTES	Respuesta Radicado No. 09052024-1058 Remisión–Obras Realizadas Por La Comunidad En El Predio Ubicado En Soacha, Ciudadela Sucre		
	23/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 14052024-1038 Remisión – Solicitud Inclusión No Previsto Contrato De Obra No 1127 De 2023		
	23/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 14052024-1035 SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO JAC VEREDA LA CHINIA DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE		
	23/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 14052024-1034 SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO JAC INSPECCION EL TRIUNFO MUNICIPIO EL COLEGIO		
	23/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 14052024-1029 SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO JAC BARRIO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SIBATE		
	23/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 14052024-1028 SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO JAC BARRIO SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SIBATE		

	23/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 14052024-1027 SOLICITUD DE ADECUACION DEL TERRENO JAC INSPECCIÒN DE SUBIA MUNICIPIO DE SILVANIA		
	23/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 14052024-1022 JUSTIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE ÍTEM NO PREVISTO		
	23/05/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 10052024-1015 CONCEPTO DE VIABILIDAD PREDIO SOACHA CIUDADELA SUCRE		
	24/05/2024	Consorcio Obras Mi País	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA MODIFICATORIO	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA MODIFICATORIO.pdf ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA MODIFICATORIO.rar	Oficio PIC-27052024-001
	25/05/2024	Consorcio Obras Mi País	REITERACIÓN DE ADECUACIONES DE LOS TERRENOS	REITERACIÓN DE ADECUACIONES DE LOS TERRENOS.pdf	
	28/05/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-17052024-001	RESPUESTA AL OFICIO PIC-17052024-001.pdf CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIÓN ACTUALIZADO- V1.pdf	
	29/05/2024	JAC Villa María Villeta	Solicitud reubicación parque	SOLICITUD REUBICACIÓN PARQUE VILLA MARIA.pdf	
	30/05/2024	Consorcio Obras Mi País	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PARQUES	CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PARQUES.pdf	
	30/05/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-27052024-001 Observaciones planos	RESPUESTA AL OFICIO PIC-27052024-001.pdf	COMITÉ 31 DE MAYO
	31/05/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-28052024-002 Presunto incumplimiento	RESPUESTA AL OFICIO PIC-28052024-002.pdf	
	31/05/2024	Alcaldía Apulo	REITERACION DE SOLICITUD PARA EL TRASLADO DE UBICACION DE LA CONTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL.	31-05-2024 N°011049 JOSE LUIS LAMUS.pdf	
	4/06/2024	Consorcio Obras Mi País	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA MODIFICATORIO	DOCUMENTACION PARA MODIFICATORIO.pdf ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA MODIFICATORIO.rar	

	4/06/2024	Alcaldía Chaguaní	Solicitud de Cambio de Ubicación del Predio para el Parque Infantil y Biosaludable	SPOP-OF-2024-124-04062024_ SOLICITUD CAMBIO DE UBICACIÓN PARQUES CHAGUANÍ.pdf P-20 Proyectos Urbanos Estrategicos.pdf P-15 Sistema vial en suelo urbano y de explanación.pdf	
	5/06/2024	Consorcio Obras Mi País	ACLARACIÓN Y DE PROPUESTA DE VALLA INFORMATIVA.		se realizó modificatorio
	7/06/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-04062024-001 CASO CHAGUANI		
	7/06/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA A OFICIO PIC-04062024-001 CASO VILLETA		
	7/06/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA A OFICIO PIC-04062024-001 CASO APULO		YA FUE APROBADO EL DÍA 18/6/24
	7/06/2024	INDEPORTES	respuesta radicado No. 06062024-1229 Documentación para modificatorio Contrato de Obra 1127 de 2023 Consorcio de Obras Mi País; acuso recibido de la información. Envio a la oficina Juridica solicitud modificatorio, para su respectivo trámite.		
	7/06/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO 060602024-1232 DOCUMENTACIÓN PARA MODIFICATORIO POR CONTRATO DE INTERVENTORIA		
	7/06/2024	INDEPORTES	respuesta radicado No. 06062024-1234 Aclaración y de propuesta de valla informativa enviado por Consorcio Obras Mi País; acuso recibido de la información. Envio a la oficina Juridica solicitud modificatorio, para su respectivo trámite.		
	7/06/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO No. 060062024-1237 SOLICITUD INCLUSIÒN NO PREVISTO Y ACLARACION VALLA		
	7/06/2024	INDEPORTES	RESPUESTA RADICADO 07062024-1247 CAMBIO PREDIO MUNICIPIO APULO INSTALAACIÒN DE PARQUE INFANTIL		SE AUTORIZÓ CAMBIO POR PARTE DE INDEPORTES
	10/06/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE INICIO DE OBRA.		Oficio PIC-12062024-002
	11/06/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE PRÓRROGA Y/O ADICIÓN EN TIEMPO		
	11/06/2024	Consorcio Obras Mi País	PROBLEMÁTICADE PREDIO DE SAN MARTIN EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ		
	12/06/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE INICIO DE OBRA.		Oficio PIC-12062024-002
	18/06/2024	INDEPORTES	Remisión – Solicitud Para El Traslado De Ubicación De La Construcción Del Parque Infantil- APULO BARRIO CENTRO		SE AUTORIZÓ CAMBIO POR PARTE DE INDEPORTES
	18/06/2024	INDEPORTES	Respuesta al requerimiento No. 13062024-1280 Solicitud de inicio de obra contrato 1127 de 2023 enviado por el Consorcio de Obras Mi País INICIO DE OBRAS POR SUPERVISIÓN		
	18/06/2024	INDEPORTES	Respuesta al requerimiento No. 14062024-1287 Respuesta a inicio de obra en los municipios enviado por Consorcio Parques IC		
	20/06/2024	Consorcio Obras Mi País	FICHATECNICA DE VALLA INSTRUCTIVA		Oficio PIC-24062024-001
	21/06/2024	Consorcio Obras Mi País	INFORME AVANCE DE OBRA DE JUNIO DE 2024		
	24/06/2024	Consorcio Obras Mi País	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS.		
	24/06/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE PRORROGA Y/O ADICION EN TIEMPO		Oficio PIC-21062024-001

	24/06/2024	INDEPORTES	REMISION ACTA DE REUNION 18-06-2024 INDEPORTES; Contratos Parques Saludables e Infantiles		
	24/06/2024	INDEPORTES	Respuesta No. 20052024-1082 Solicitud Acta de Reinicio Contrato de Obra No. 1127 de 2023 y contrato de interventoría No.1114 de 2023	MODIFICATORIO N 1	
	26/06/2024	Consorcio Obras Mi País	INFORME AVANCE DE OBRA DE JUNIO DE 2024-V1		
	26/06/2024	Consorcio Obras Mi País	FICHA TÉCNICA DE VALLA INSTRUCTIVA Y OBRAS DE ARTE.		
	28/06/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-25062024-001 (Incumplimiento Envío De Documentos Pendientes)	Pólizas	
	2/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al No. Oficio PIC-04062024 Respuesta Justificación Retraso De Actividades De Obra; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información.		
	2/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al requerimiento No. 06062024-1232 Documentación para modificatorio Interventoría Parques IC 1114 de 2023 enviado por Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información		
	2/07/2024	INDEPORTES	Dando Respuesta al requerimiento No. 06062024-1237 Solicitud inclusión no previsto y aclaración valla contrato de obra No. 1127 de 2023 enviado por Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información		
	2/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al Oficio PIC-11062024-001 Presunto Incumplimiento por avance de obra; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información Esta información fue remitida al área jurídica para su conocimiento.		
	2/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al Oficio PIC-11062024-002 Respuesta A Solicitud De Prórroga; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información Esta información fue remitida al área jurídica para su conocimiento.		
	2/07/2024	INDEPORTES	Requerimiento sobre los aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos Contratos Parques Saludables e Infantiles	REQUERIMIENTO INTERVENTORIA.pdf	
	3/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al Oficio PIC-12062024-001Respuesta A Inicio De Obra En Los Municipios; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información Esta información fue remitida al área jurídica para su conocimiento.		
	3/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al Oficio PIC-13062024-001Observaciones De Acuerdo A Visita De Obra Realizada; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información		
	4/07/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE INICIO DE OBRA. Facatativá y Sibaté		Oficio PIC-05072024-001
	5/07/2024	INDEPORTES	citación a reunión contrato No 1114 interventoría parques		
	8/07/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-02072024-001 diseño vallas		
	8/07/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-08072024-002 solicitud aval sibaté san martin		Oficio PIC-05072024-001
	8/07/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-08072024-001 doc pendientes	informes	
	9/07/2024	Consorcio Obras Mi País	PROPUESTA DE DISEÑO DE VALLAS INSTRUCTIVAS. VF		

	10/07/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD PARA EL TRASLADO DE UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y DEL PARQUE BIOSALUDABLE.chaguani		Oficio PIC-15072024-001 Oficio PIC-29072024-001 Respuesta
	11/07/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-12062024-002	diseños de mezcla	Oficio PIC-11072024-002
	15/07/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE INICIO DE OBRA. Caparrapi, puerto salgar, san cayetano y gachalá		Oficio PIC-17072024-001
	17/07/2024	INDEPORTES	REMISIÓN ACTA DE COMITÉ No.004 DEL 9 DE JULIO DE 2024, PARQUES SALUDABLES E INFANTILES, CONTRATOS No. 1127-2023 Y 1114-2023		
	17/07/2024	Consorcio Obras Mi País	FICHAS TECNICA Y ARTES PROPUESTOS – ITEM PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR.		Remitido a INDEPORTES Oficio PIC-17072024-003
	18/07/2024	Consorcio Obras Mi País	NOTIFICACION SOLICITUD TRANSLADO DE PREDIO EL COLEGIO BARRIO EL TRIUNFO		Observaciones en Oficio PIC-18072024-001
	18/07/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD CAMBIO DE TIPO DE PARQUE PUERTO SALGAR		Oficio PIC-22072024-001
	19/07/2024	Consorcio Obras Mi País	NOTIFICACION SOLICITUD TRANSLADO DE PREDIO EL COLEGIO BARRIO EL TRIUNFO		Oficio PIC-29072024-001
	22/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al requerimiento No. 24062024-1386 Respuesta solicitud de prórroga No. 01 Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información.		
	22/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al requerimiento No. 24062024-1387 Informe No. 05 Contrato de Interventoría No. 1114 de 2023 Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información.		
	22/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al requerimiento No. 24062024-1395 Respuesta a inicio de obra en los municipios - contrato de interventoría No. 1114 de 2023 y contrato de obra No. 1127 de 2023 enviado por Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información.		
	22/07/2024	INDEPORTES	CITACIÓN A COMITÉ A REALIZARSE EL DÍA 24 DE JULIO DE 2024, INSTALACIONES INDEPORTES CUNDINAMARCA, PARQUES SALUDABLES E INFANTILES CONTRATOS 1127 DE 2023 Y 1114 DE 2023		
	22/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al requerimiento No. 04072024-1434 Presunto incumplimiento por avance de obra del contrato de obra No. 1127 de 2023 enviado por Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información.		
	22/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al requerimiento No. 04072024-1440 Reiteración de respuesta a oficio PIC-25062024-002 Solicitud de respuesta cambios de predios enviada por Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información.		
	22/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al requerimiento No. 11072024-1494 Reiteración presunto incumplimiento envió de documentos pendientes contrato de interventoría No. 1114 de 2023 y contrato de obra No. 1127 de 2023 Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información.		

	22/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al requerimiento No. 27062024-1398 Solicitud de respuesta cambios de predios consorcio parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca recibió el requerimiento y dio aprobación del cambio de predio .		
	23/07/2024	Consorcio Obras Mi País	PROGRAMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA 1127 - 2023	Project	
	23/07/2024	Consorcio Obras Mi País	NUEVA REITERACION DEL AVAL DEL ARTE DE LA VALLA INSTRUCTIVA.		
	23/07/2024	Consorcio Obras Mi País	REITERACION DEL AVAL DEL ARTE DEL ITEM PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR		
	23/07/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-29062024-001 Observaciones Cronograma E Informe Mensual Junio	Planos Informes 2, 3 y 4 Cronograma	
	23/07/2024	Consorcio Obras Mi País	JUSTIFICACION DE DADOS EN CONCRETO DE 3500 PSI.	Proyección Balance Memorias	
	23/07/2024	Consorcio Obras Mi País	REITERACION DE SOLICITUDES DECAMBIOS DE TERRENOS.		26/07/2024 INDEPORTES Oficio PIC-29072024-001 a contratista
	26/07/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al radicado No. 25072024-1642, solicitud cambio de terreno o predio en los MUNICIPIOS DE CHAGUANI y EL COLEGIO. Al respecto, me permito informarles que una vez realizo el contacto con los responsables, se AUTORIZA EL CAMBIO DEL PREDIO PARA LA INSTALACION DE LOS PARQUES PERTINENTES.		
	26/07/2024	INDEPORTES	Correcciones valla parques infantiles y saludables		
	31/07/2024	INDEPORTES	Solicitud Indeportes - Revisión y aprobación (ajustes a Valla por parte de Prensa)		
	31/07/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO CORRECCIONES VALLA PARQUES INFANTILES Y SALUDABLES	Valla 60X80 Indeportes.cdr Valla 60X80 Indeportes.pdf	
	31/07/2024	Consorcio Obras Mi País	ENTREGA DE INFORME N° 5	Informe Tecnico Mensual No 5-VOBS1.pdf Plan de manejo ambiental.pdf Anexo Tocaima.pdf Anexo Silvania.pdf Anexo Fusagasugá.pdf	Oficio PIC-05082024-001
	31/07/2024	Consorcio Obras Mi País	NUEVA REITERACION DEL AVAL DEL ARTE DEL ITEM PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR.		
	5/08/2024	INDEPORTES	Acta de reunión No 5 INDEPORTES		
	9/08/2024	Consorcio Obras Mi País	CORRECCION DEL PLAN DE MANEJO		
	9/08/2024	Consorcio Obras Mi País	INFORME TECNICO N° 6	Informe y anexos	

	12/08/2024	INDEPORTES	Correcciones Valla Instructiva	Valla 60x80 Indeportes	Oficio PIC-12082024-001
	12/08/2024	INDEPORTES	Correcciones Arte Tapete	Manual de marca imágenes con correcciones	Oficio PIC-12082024-001
	14/08/2024	INDEPORTES	CITACIÓN A COMITÉ DE OBRA A REALIZARSE EL DÍA 15-08-2024 PRESENCIAL INDEPORTES, CONTRATOS PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		
	14/08/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-12082024-001 Correcciones Diseños Valla Y tapete		
	14/08/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE INICIO DE OBRA.		Oficio PIC-16082024-002
	14/08/2024	Consorcio Obras Mi País	ADECUACIÓN DE LOS TERRENOS A INTERVENIR		Oficio PIC-16082024-001
	14/08/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-22072024-001 Justificación Puerto Salgar		Oficio PIC-14082024-001
	15/08/2024	Consorcio Obras Mi País	CORRECCIONES A LAS OBRAS DE ARTE DE LAS VALLAS INSTRUCTIVAS.		Oficio PIC-15082024-001
	20/08/2024	INDEPORTES	Dando respuesta radicado No. 12072024-1517 Aval valla instructiva de obra contrato de interventoría No. 1114 de 2023 y contrato de obra No. 1127 de 2023 enviado por Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información. Esta información remitida al aérea de Planeación para su respetiva revisión y aprobación.		
	20/08/2024	INDEPORTES	Dando respuesta radicado No. 12072024-1520 Aval valla instructiva de obra contrato de interventoría No. 1114 de 2023 enviado por Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información. Esta información remitida al aérea de Planeación para su respetiva revisión y aprobación.		
	20/08/2024	INDEPORTES	Dando respuesta radicado No. 19072024-1571 Reiteración y remisión caso predio Chaguaní- Solicitud de respuesta Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información. Esta información remitida al aérea de Planeación para su respetiva revisión y aprobación.		
	20/08/2024	INDEPORTES	Dando respuesta radicado No. 22072024-1574 Solicitud de respuesta aval valla instructiva de obra contrato de interventoría No. 1114 de 2023 Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información. Esta información remitida al aérea de Planeación para su respetiva revisión y aprobación.		
	20/08/2024	INDEPORTES	Dando respuesta radicado No. 22072024-1575 Remisión modelos tapete parques y fichas técnicas de los materiales contrato de interventoría No. 1114 de 2023 Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información.		

	20/08/2024	INDEPORTES	Dando respuesta No. 05082024-1721 Correcciones valla instructiva de obra Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información. Esta información remitida a la aérea planeación para su revisión y concepto técnico.		
	20/08/2024	INDEPORTES	Dando respuesta radicado No. 05082024-1722 Reiteración aprobación diseño de arte del ítem piso de 30mm de espesor formado por una base elástica SBR negra de 20mm y capa de uso en EPDM de 10mm color enviada por Consorcio Parques IC; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca da acuso recibido de la información. Esta información remitida a la aérea planeación para su revisión y concepto técnico; el cual fue devuelto con observaciones y para realizar ajustes pertinentes.		
	20/08/2024	Consorcio Obras Mi País	OBSERVACIONES AL INFORME N°5	Informe Anexo ambiental Anexo social	
	24/08/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-23082024-001 - Justificación caso Puerto Salgar	RESPUESTA AL OFICIO PIC-23082024-001.pdf	Oficio PIC-26082024-002
	27/08/2024	INDEPORTES	REMISIÓN OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE PRENSA, VALLAS Y TAPETES, CONTRATOS PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		Oficio PIC-28082024-001
	27/08/2024	Consorcio Obras Mi País	OBSERVACIONES AL INFORME N° 6	Informe Julio Anexo ambiental Julio Anexo social Julio	Oficio PIC-28082024-003
	28/08/2024	INDEPORTES	REMISIÓN ACTA DE COMITÉ No. 6, CONTRATOS PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		
	30/08/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-20082024-001 y PIC-28082024-002 Presunto incumplimiento		
	31/08/2024	Consorcio Obras Mi País	CORRECCIONES A LAS OBRAS DE ARTE DE LAS VALLAS INSTRUCTIVAS-VF		
	31/08/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN OFICIAL DE LA OBRA DE ARTE DEL PISO DE 30MMDE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO ENEPDM DE 10MM COLOR		
	2/09/2024	INDEPORTES	Remisión diseño piso parques		
	2/09/2024	INDEPORTES	REMISIÓN DISEÑO TAPETES PARQUES SALUDABLES E INFANTILES APROBADO POR SECRETARÍA DE PRENSA DE CUNDINAMARCA		
	6/09/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD RESPUESTA A LOS CASOS DE VILLETA Y SOACHA.		
	9/09/2024	INDEPORTES	OBSERVACIONES INFORMES No. 2, 3 y 4 CONTRATO DE OBRA No. 1127 DE 2023, PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		
	9/09/2024	INDEPORTES	DEVOLUCIÓN INFORME JUNIO 2024 CON OBSERVACIONES, CONTRATO DE OBRA No. 1127 DE 2023, PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		
	9/09/2024	INDEPORTES	CITACIÓN A COMITÉ A REALIZARSE EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024, INSTALACIONES INDEPORTES CUNDINAMARCA, PARQUES SALUDABLES E INFANTILES CONTRATOS 1127 DE 2023 Y 1114 DE 2023		
	10/09/2024	INDEPORTES	DEVOLUCIÓN INFORME No. 5 CON OBSERVACIONES, INTERVENTORÍA CONTRATO PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		

	10/09/2024	Consorcio Obras Mi País	RESPUESTA AL OFICIO PIC-02092024-001		
	11/09/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE PRORROGA N° 2 Y PLANDE TRABAJO		
	12/09/2024	INDEPORTES	REMISIÓN ACTA DE REUNIÓN No. 7, CONTRATOS PARQUES SALUDABLES E INFANTILES		
	14/09/2024	Consorcio Obras Mi País	REITERACION DE SOLICITUD DE PRORROGA N° 2		
	16/09/2024	INDEPORTES	REMISIÓN DE MENSAJE DE APROBACIÓN VALLA INSTRUCTIVA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE PRENSA		
	23/09/2024	INDEPORTES	AUTORIZACION CAMBIO PREDIO MUNICIPIO DE VILLETA		
	23/09/2024	Consorcio Obras Mi País	SOLICITUD DE PRORROGA N° 2 Y PLANDE TRABAJO		
	26/09/2024	INDEPORTES	Dando respuesta al radicado No. 060520242958 JUSTIFICACION ITEM PREVISTOS CONTRATO PARQUES 2023. Al respecto me permito informarle, que dicha solicitud fue Aprobada en su momento.		

PARQUE INFANTIL AREA 56 M2					CANT PARQUES= 10		CANT EJECUTADA ENERO	CANT EJECUTADA FEBRERO	CANT EJECUTADA MARZO
DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
CIMIENTOS									
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	5.6	$ 167,850	$ 939,960	56.0	$ 9,399,600	0	0	0
DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	1.0	$ 896,293	$ 896,293	10.0	$ 8,962,930	0	0	0
BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ml	30.3	$ 31,160	$ 944,771	303.2	$ 9,447,712	0	0	0
ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	220.7	$ 10,425	$ 2,300,589	2206.8	$ 23,005,890	0	0	0
Subtotal				**$ 5,081,613**		**$ 50,816,132**			
PISOS, BASES									
PLACA BASE CONCRETO ,10 M DE 2500 PSI	m2	56.0	$ 85,665	$ 4,797,240	560.0	$ 47,972,400	0	0	0
PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR	m2	56.0	$ 424,210	$ 23,755,760	560.0	$ 237,557,600	0	0	0
Subtotal				$ 28,553,000		$ 285,530,000			
OBRAS DE ARTE									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y RECOMENDACIONES	und	1.0	$ 1,020,661	$ 1,020,661	10.0	$ 10,206,610	0	0	0
Subtotal				$ 1,020,661		$ 10,206,610			
PISOS, BASES									
1 RODADERO SENCILLO, 1 RODADERO DOBLE, CULUMPIOS 3 PUESTOS, 1 TABLERO DIDACTICO 1 PASAMANOS RECTO, 1 PASAMANOS CURVO.	un	1.0	$ 63,371,308	$ 63,371,308.00	10.0	$ 633,713,080	0	4.2	2.1
TRANSPORTE	un	1.0	$ 1,210,300	$ 1,210,300.00	10.0	$ 12,103,000	0	0	0
Subtotal				$ 64,581,608		$ 645,816,080			
SUBTOTAL OBRAS				$ 99,236,882		$ 992,368,822			

PARQUE BIOSALUDABLE AREA 70 M2					CANT PARQUES= 17		CANT EJECUTADA ENERO	CANT EJECUTADA FEBRERO	CANT EJECUTADA MARZO
DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
CIMIENTOS									
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	7.0	$ 167,850	$ 1,174,950	119.0	$ 19,974,150	0	0	0
DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	2.8	$ 896,293	$ 2,509,620	47.6	$ 42,663,547	0	0	0
BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ml	34.3	$ 31,160	$ 1,069,411	583.4	$ 18,179,990	0	0	0
ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	269.3	$ 10,425	$ 2,807,036	4577.4	$ 47,719,604	0	0	0
Subtotal				**$ 7,561,017**		**$ 128,537,291**			
PISOS, BASES									
PLACA BASE CONCRETO 0,10 M DE 2500 PSI	m2	70.0	$ 85,697	$ 5,998,790	1190.0	$ 101,979,430	0	0	0
PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR.	m2	70.0	$ 424,210	$ 29,694,700	1190.0	$ 504,809,900	0	0	0
Subtotal				$ 35,693,490		$ 606,789,330			
OBRAS DE ARTE									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y RECOMENDACIONES	und	1.0	$ 1,020,661	$ 1,020,661	17.0	$ 17,351,237	0	0	0
Subtotal				$ 1,020,661		$ 17,351,237			
PISOS, BASES									
COLUMPIO DOBLE	un	1.0	$ 3,824,767	$ 3,824,767	17.0	$ 65,021,039	0	2.1	1.4
ASCENSOR DOBLE -DORSAL ANCHO	un	1.0	$ 4,518,999	$ 4,518,999	17.0	$ 76,822,983	0	2.1	1.4
PECTORAL SENTADO DOBLE	un	1.0	$ 4,560,637	$ 4,560,637	17.0	$ 77,530,829	0	2.1	1.4
DOBLE SWINGER-SURF	un	1.0	$ 3,441,180	$ 3,441,180	17.0	$ 58,500,060	0	2.1	1.4
CAMINADOR-PATINADOR AEREO	un	1.0	$ 3,822,761	$ 3,822,761	17.0	$ 64,986,937	0	2.1	1.4
ELIPTICA-ESQUI	un	1.0	$ 4,031,544	$ 4,031,544	17.0	$ 68,536,248	0	2.1	1.4
VOLANTES DOBLES	un	1.0	$ 3,788,706	$ 3,788,706	17.0	$ 64,408,002	0	2.1	1.4
POTRO	un	1.0	$ 3,748,313	$ 3,748,313	17.0	$ 63,721,321	0	2.1	1.4
TRANSPORTE	un	1.0	$ 1,210,300	$ 1,210,300	17.0	$ 20,575,100	0	0	0
Subtotal				$ 32,947,207		$ 560,102,519			
SUBTOTAL OBRAS				$ 77,222,375		$ 1,312,780,377			

PARQUE BIOSALUDABLE AREA 50 M2					CANT PARQUES= 2		CANT EJECUTADA ENERO	CANT EJECUTADA FEBRERO	CANT EJECUTADA MARZO
DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL			
CIMIENTOS									
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	5.0	$ 167,850	$ 839,250	10.0	$ 1,678,500	0	0	0
DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	m3	1.9	$ 896,293	$ 1,702,957	3.8	$ 3,405,913	0	0	0
BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ml	30.3	$ 31,160	$ 944,771	60.6	$ 1,889,542	0	0	0
ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	196.1	$ 10,425	$ 2,044,551	392.2	$ 4,089,102	0	0	0
Subtotal				$ 5,531,529		**$ 11,063,058**			
PISOS, BASES									
PLACA BASE CONCRETO 0,10 M DE 2500 PSI	m2	50.0	$ 85,697	$ 4,284,850	100.0	$ 8,569,700	0	0	0
PISO DE 30MM DE ESPESOR FORMADO POR UNA BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10MM COLOR.	m2	50.0	$ 424,210	$ 21,210,500	100.0	$ 42,421,000	0	0	0
Subtotal				$ 25,495,350		$ 50,990,700			
OBRAS DE ARTE									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y RECOMENDACIONES	und	1.0	$ 1,020,661	$ 1,020,661	2.0	$ 2,041,322	0	0	0
Subtotal				$ 1,020,661		$ 2,041,322			
PISOS, BASES									
COLUMPIO DOBLE-PIERNAS	un	1.0	$ 3,824,767	$ 3,824,767	2.0	$ 7,649,534	0	0.7	0
ASCENSOR DOBEL- BRAZOS	un	1.0	$ 4,518,999	$ 4,518,999	2.0	$ 9,037,998	0	0.7	0
CINTURA	un	1.0	$ 4,560,637	$ 4,560,637	2.0	$ 9,121,274	0	0.7	0
VOLANTES DOBLES-EXTENSIÓN DE BRAZOS	un	1.0	$ 4,031,545	$ 4,031,545	2.0	$ 8,063,090	0	0.7	0
POTRO	un	1.0	$ 3,748,313	$ 3,748,313	2.0	$ 7,496,626	0	0.7	0
TRANSPORTE	un	1.0	$ 1,210,300	$ 1,210,300	2.0	$ 2,420,600	0	0	0
Subtotal				$ 21,894,561		$ 43,789,122			
SUBTOTAL OBRAS				$ 53,942,101		$ 107,884,202			
								12.36%	6.32%

SUBTOTAL PARQUES	**$ 230,401,358**		**$ 2,413,033,401**
VALOR CONTRACTUAL	**$ 2,808,853,234**		
VALOR POR EJECUTAR	**$ 395,819,834**		

ABRIL SUSPENDIDO	CANT EJECUTADA MAYO	CANT EJECUTADA JUNIO	CANT EJECUTADA JULIO	CANT EJECUTADA AGOSTO	CANT EJECUTADA SEPTIEMBRE	CANT EJECUTADA OCTUBRE	CANT EJECUTADA NOVIEMBRE	CANT EJECUTADA TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
0	0	16.8	16.8	5.6	5.6	0	0	44.8	$ 7,519,680.00	0.27%	11.2	$ 1,879,920.00	0.07%
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	$ -	0.00%	10.0	$ 8,962,930.00	0.32%
0	0	90.96	90.96	30.32	30.32	0	0	242.6	$ 7,558,169.60	0.27%	60.6	$ 1,889,542.40	0.07%
0	0	662.04	662.04	220.68	0	220.68	0	1765.4	$ 18,404,712.00	0.66%	441.4	$ 4,601,178.00	0.16%
0	0	168	168	0	56	56	0	448.0	$ 38,377,920.00	1.37%	112.0	$ 9,594,480.00	0.34%
0	0	0	0	0	168	0	56	224.0	$ 95,023,040.00	3.38%	336.0	$ 142,534,560.00	5.07%
0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	$ 1,020,661.00	0.04%	9.0	$ 9,185,949.00	0.33%
0	0	0.9	0.9	0	0.3	0	0	8.4	$ 532,318,987.20	18.95%	1.6	$ 101,394,092.80	3.61%
0	0	3	3	0	1	0	0	7.0	$ 8,472,100.00	0.30%	3.0	$ 3,630,900.00	0.13%

ABRIL SUSPENDIDO	CANT EJECUTADA MAYO	CANT EJECUTADA JUNIO	CANT EJECUTADA JULIO	CANT EJECUTADA AGOSTO	CANT EJECUTADA SEPTIEMBRE	CANT EJECUTADA OCTUBRE	CANT EJECUTADA NOVIEMBRE	CANT EJECUTADA TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
0	0	28	21	21	7	7	0	84.0	$ 14,099,400.00	0.50%	35.0	$ 5,874,750.00	0.21%
0	0	5.6	4.2	4.2	0	2.8	0	16.8	$ 15,057,722.40	0.54%	30.8	$ 27,605,824.40	0.98%
0	0	137.28	102.96	102.96	34.32	34.32	0	411.8	$ 12,832,934.40	0.46%	171.6	$ 5,347,056.00	0.19%
0	0	1077.04	807.78	807.78	0	538.52	0	3231.1	$ 33,684,426.00	1.20%	1346.3	$ 14,035,177.50	0.50%
0	0	280	210	210	0	140	0	840.0	$ 71,985,480.00	2.56%	350.0	$ 29,993,950.00	1.07%
0	0	0	0	0	70	210	140	420.0	$ 178,168,200.00	6.34%	770.0	$ 326,641,700.00	11.63%
0	0	0	0	0	0	3	3	6.0	$ 6,123,966.00	0.22%	11.0	$ 11,227,271.00	0.40%
0	3.5	0.6	0.3	0	0.6	0.3	0.3	9.1	$ 34,805,379.70	1.24%	7.9	$ 30,215,659.30	1.08%
0	3.5	0.6	0.3	0	0.6	0.3	0.3	9.1	$ 41,122,890.90	1.46%	7.9	$ 35,700,092.10	1.27%
0	3.5	0.6	0.3	0	0.6	0.3	0.3	9.1	$ 41,501,796.70	1.48%	7.9	$ 36,029,032.30	1.28%
0	3.5	0.6	0.3	0	0.6	0.3	0.3	9.1	$ 31,314,738.00	1.11%	7.9	$ 27,185,322.00	0.97%
0	3.5	0.6	0.3	0	0.6	0.3	0.3	9.1	$ 34,787,125.10	1.24%	7.9	$ 30,199,811.90	1.08%
0	3.5	0.6	0.3	0	0.6	0.3	0.3	9.1	$ 36,687,050.40	1.31%	7.9	$ 31,849,197.60	1.13%
0	3.5	0.6	0.3	0	0.6	0.3	0.3	9.1	$ 34,477,224.60	1.23%	7.9	$ 29,930,777.40	1.07%
0	3.5	0.6	0.3	0	0.6	0.3	0.3	9.1	$ 34,109,648.30	1.21%	7.9	$ 29,611,672.70	1.05%
0	0	2	1	0	2	1	1	7.0	$ 8,472,100.00	0.30%	10.0	$ 12,103,000.00	0.43%

ABRIL SUSPENDIDO	CANT EJECUTADA MAYO	CANT EJECUTADA JUNIO	CANT EJECUTADA JULIO	CANT EJECUTADA AGOSTO	CANT EJECUTADA SEPTIEMBRE	CANT EJECUTADA OCTUBRE	CANT EJECUTADA NOVIEMBRE	CANT EJECUTADA TOTAL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
0	0	5	0	5	5	0	5	20.0	$ 3,357,000.00	0.12%	-10.0	-$ 1,678,500.00	-0.06%
0	0	0.875	0	0.875	0.875	0	0.875	3.5	$ 3,137,025.50	0.11%	0.3	$ 268,887.90	0.01%
0	0	30.32	0	30.32	30.32	0	30.32	121.3	$ 3,779,084.80	0.13%	-60.6	-$ 1,889,542.40	-0.07%
0	0	196.12	0	196.12	196.12	0	196.12	784.5	$ 8,178,204.00	0.29%	-392.2	-$ 4,089,102.00	-0.15%
0	0	50	0	50	50	0	50	200.0	$ 17,139,400.00	0.61%	-100.0	-$ 8,569,700.00	-0.31%
0	0	0	0	0	0	0	50	50.0	$ 21,210,500.00	0.76%	50.0	$ 21,210,500.00	0.76%
0	0	0	0	0	0	0	1	1.0	$ 1,020,661.00	0.04%	1.0	$ 1,020,661.00	0.04%
0	0	0.3	0	0	0.3	0	0	1.3	$ 4,972,197.10	0.18%	0.7	$ 2,677,336.90	0.10%
0	0	0.3	0	0	0.3	0	0	1.3	$ 5,874,698.70	0.21%	0.7	$ 3,163,299.30	0.11%
0	0	0.3	0	0	0.3	0	0	1.3	$ 5,928,828.10	0.21%	0.7	$ 3,192,445.90	0.11%
0	0	0.3	0	0	0.3	0	0	1.3	$ 5,241,008.50	0.19%	0.7	$ 2,822,081.50	0.10%
0	0	0.3	0	0	0.3	0	0	1.3	$ 4,872,806.90	0.17%	0.7	$ 2,623,819.10	0.09%
0	0	1	0	0	1	0	0	2.0	$ 2,420,600.00	0.09%	0.0	$ -	0.00%
	3.95%	6.22%	4.82%	1.78%	5.98%	4.71%	4.60%						

% ejecutado acumulado	**50.73%**
$ ejecutado acumulado	$ 1,425,057,366.90
% por ejecutar	**49.27%**
$ por ejecutar	$ 1,383,795,867.10
