

Id	Modo de tarea	Número1	Nombre de tarea	Texto1	Texto2	Duración
1		**0.1**	**ACANDÍ**			**74.13 días**
2		**1**	**PRELIMINARES**	**UND**	**CANT**	**43.13 días**
3		1.01	Desmonte de cubierta en asbesto cemento	m2	329	8 días
4		1.02	Desmonte de caballete de eternit	m	20	3 días
5		1.03	Desmonte de canal en lámina ó pvc	m	66.5	3 días
6		1.04	Desmonte de estructura en madera	m2	329	2 días
7		1.05	Desmonte de luminarias	Un	30	3 días
8		1.06	Desmonte de cielo raso	m2	192.5	3 días
9		1.07	Desmonte de letrero/ aviso luminoso	m2	3.2	2 días
10		1.08	Desmonte de Tanque	Un	2	2 días
11		1.09	Demolición de estructuras en concreto	m3	6.2	6 días
12		1.1	Regata para tubería electr. (Incl. mortero de resane)	m	36	3 días
13		1.11	Demolición manual de enchape (cocina, y Baños)	m2	26	5 días
14		**2**	**CUBIERTA**	**UND**	**CANT**	**50.13 días**
15		2.01	Teja ondulada No. 6 P7	m2	329.00	7 días
16		2.02	Perfil metálico C 220x80x2.5 mm	m	158.00	4 días
17		2.03	Pintura con esmalte en lámina a= 28 cm	m	158.00	2 días
18		2.04	Pañete de filos y dilataciones	m	93.00	2 días
19		2.05	Caballete en teja ondulada P7	m	20.00	1 día
20		2.06	Flanche en lámina galvanizada Cal. 26	m	26.60	1 día
21		2.07	Regata en piso para tubería (Incl. mortero de resane)	m	26.60	2 días
22		2.08	Sellado de dilatación con Sikaflex 1A	m	26.60	1 día
23		2.09	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm	m	67.00	10 días
24		2.1	Bajante pvc amazona	m	59.70	2 días

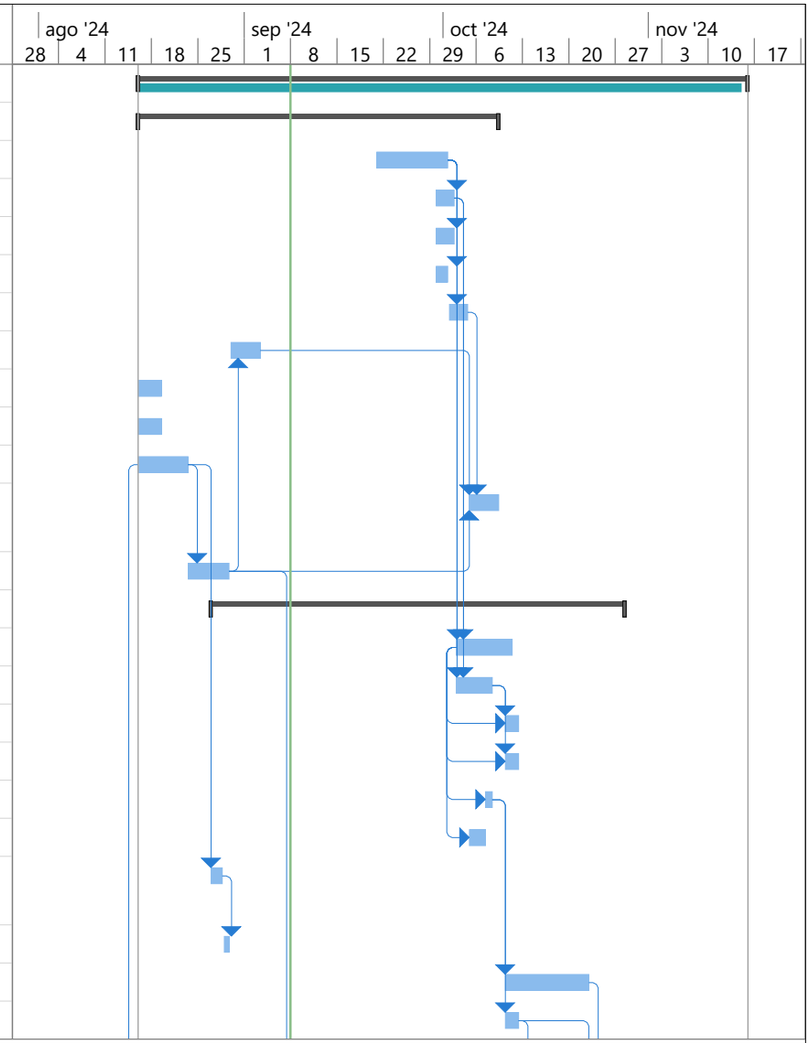

Proyecto: Proyecto ACAN
Fecha: dom 8/09/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			


Id	Modo de tarea	Número1	Nombre de tarea	Texto1	Texto2	Duración
25		2.11	Cielo raso en tablilla machihembrada de pino	m2	28.50	4 días
26		**3**	**CIELO RASO**	**UND**	**CANT**	**4 días**
27		3.01	Cielo raso en eterboard 6 mm (Incluye pintura)	m2	101.00	4 días
28		**4**	**ELECTRICO**	**UND**	**CANT**	**7 días**
29		4.01	Bomba eléctrica 2 HP 220 V	Un	1.00	1 día
30		4.02	Panel led 60x60 cm 38W (bodega 1, bodega 2 y ed princioal)	Un	33.00	1 día
31		4.03	Salida tomacorriente doble polo a tierra tubo emt 1/2 (bodega 1, bodega 2 y ed princioal)	Un	44.00	2 días
32		4.04	Salida interruptor doble en tubo emt 1/2	Un	5.00	1 día
33		4.05	Salida eléctrica alumbrado fluorescente tubo emt 1/2	Un	33.00	1 día
34		4.06	Salida interruptor sencillo en tubo emt 1/2	Un	22.00	1 día
35		4.07	Suministro e instalación interruptor monopolar 15-50 A	Un	10.00	1 día
36		**5**	**PINTURA Y PAÑETE**	**UND**	**CANT**	**61.13 días**
37		5.01	Pañete muro (Incluye filos y dilataciones) para las Bodegas	m2	415.00	7 días
38		5.02	Pintura exterior en Koraza	m2	540.00	8 días
39		5.03	Pintura con vinilo en cielos	m2	140.00	3 días
40		5.04	Pintura con vinilo en muros	m2	688.00	23 días
41		5.05	Protección de piso con cartón corrugado 3 capas	m2	30.00	20 días
42		5.06	Estuco acrílico en muros	m2	163.00	4 días
43		5.07	Impermeabilización piso y muros con SikaTop Seal 107	m2	64.00	15 días
44		**6**	**CARPINTERIA METALICA**	**UND**	**CANT**	**3 días**
45		6.01	Puerta en aluminio de 1.00 x 2.05 m	Un	2.00	3 días

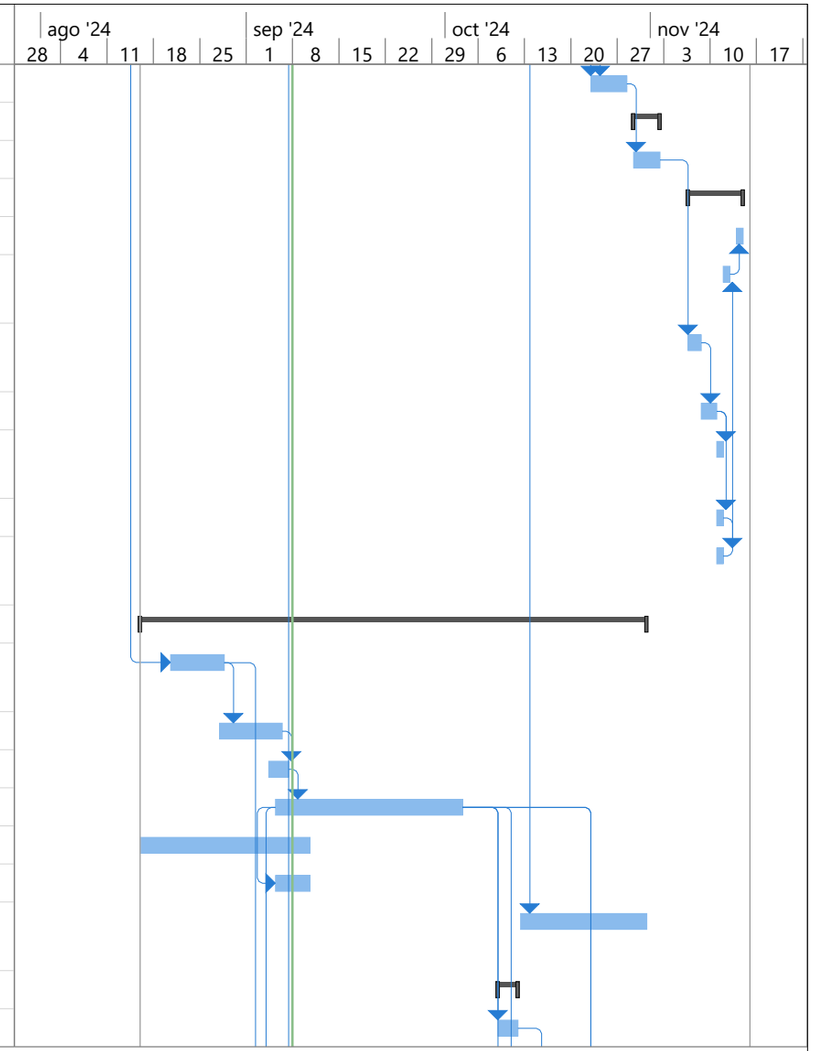

Proyecto: Proyecto ACAN
Fecha: dom 8/09/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Número1	Nombre de tarea	Texto1	Texto2	Duración
46		6.02	Ventana en aluminio fija (vidrio 4 mm)	m2	1.00	3 días
47		6.03	Valla informativa instalada	m2	1.00	1 día
48		**7**	**CARPINTERIA MADERA**	**UND**	**CANT**	**4 días**
49		7.01	Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m	Un	15.00	4 días
50		7.02	Mueble inferior de cocina h= 90 cm	m	2.85	4 días
51		**8**	**COCINA**	**UND**	**CANT**	**45 días**
52		8.01	Enchape en cerámica 20.5x20.5 cm	m2	12.50	7 días
53		8.02	Lavaplatos sencillo acero inoxidable 0.60x0.40 m	Un	1.00	2 días
54		8.03	Grifería lavaplatos Mónaco	Un	1.00	2 días
55		8.04	Mesón en mármol negro san gil	m2	2.00	2 días
56		8.05	Tuberia pvc presión Ø= 1/2" (Incluye accesorios)	m	8.00	5 días
57		**9**	**OTROS**	**UND**	**CANT**	**33 días**
58		9.01	Mortero ó plantilla de nivelación para piso e= 4 cm	m2	19.50	5 días
59		9.02	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m	m2	2.00	4 días
60		9.03	Impermeabilización de terraza con broncoelástico	m2	13.75	5 días
61		9.04	Enchape en cerámica 33.8x33.8 cm (pisos ed principal y escaleras)	m2	266.75	14 días
62		9.05	Aire acondicionado mini split inverter 9,000 BTU	Un	2.00	3 días
63		9.06	Tanque de agua en fibra de vidrio 1,000 L	Un	2.00	2 días
64		**10**	**ASEO GENERAL**	**UND**	**CANT**	**30 días**
65		10.01	Limpieza y aseo general	m2	329.00	30 días
66		**0.2**	**UNGUIA**			**74.13 días**
67		**1**	**PRELIMINARES**	**UND**	**CANT**	**62.13 días**
68		1.01	Desmonte de unidad de aire acondicionado	Un	2.00	8 días
69		1.02	Desmonte de vidrios	m2	5.00	3 días

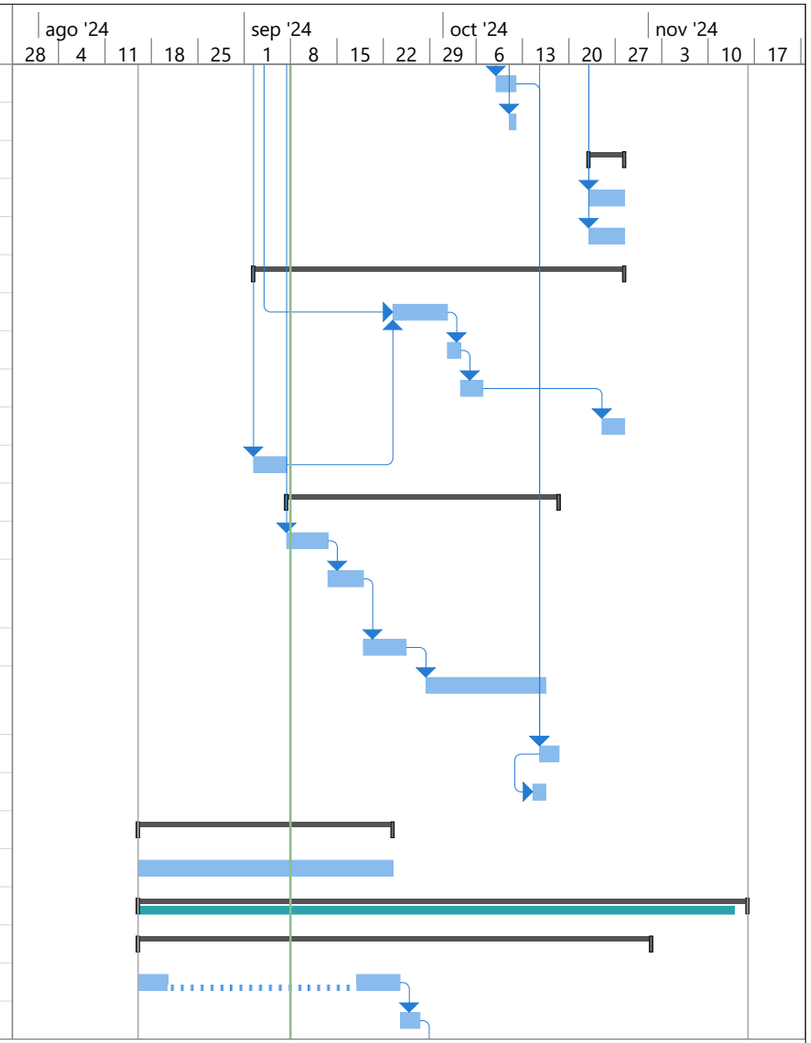

Proyecto: Proyecto ACAN
Fecha: dom 8/09/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Número1	Nombre de tarea	Texto1	Texto2	Duración
70		1.03	Desmonte de división en madera (división madera fachada)	m2	4.20	3 días
71		1.04	Desmonte de letrero/ aviso luminoso	m2	3.00	2 días
72		1.05	Desmonte de tanque	Un	2.00	3 días
73		1.06	Desmonte de cielo raso (baños)	m2	13.15	3 días
74		1.07	Desmonte de canal en lámina ó pvc	m	24.50	3 días
75		1.08	Desmonte de carteleras, cuadros, extintores	Un	35.00	3 días
76		1.09	Desmonte de red interior eléctrica	m	190.50	5 días
77		1.1	Desmonte de estructura en madera	m2	21.00	2 días
78		1.11	Demolición manual de enchape o pañete (revoque) (cocina, y Baños)	m2	25.50	3 días
79		1.12	Desmonte de aparato sanitario	Un	1.00	2 días
80		1.13	Desmonte de cubierta en asbesto cemento	m2	58.00	5 días
81		1.14	Desmonte de canaleta 43 ó 90	m2	22.50	2 días
82		1.15	Regata para tubería de agua. (Incl. mortero de resane)	m	1.00	1 día
83		**2**	**CARPINTERIA METALICA**	**UND**	**CANT**	**3 días**
84		2.01	Puerta en aluminio corrediza con vidrio	m2	8.40	3 días
85		2.02	Ventana en aluminio fija (vidrio 4 mm)	m2	21.00	3 días
86		2.03	Vidrio de 3 mm (con Sikaflex 1A)	m2	12.00	3 días
87		**3**	**CARPINTERIA MADERA**	**UND**	**CANT**	**3 días**
88		3.01	Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m	Un	13.00	3 días
89		3.02	Ventana en madera flormorado	m2	12.00	3 días
90		**4**	**ELECTRICO**	**UND**	**CANT**	**10 días**
91		4.01	Panel led sobreponer 24W	Un	18.00	2 días

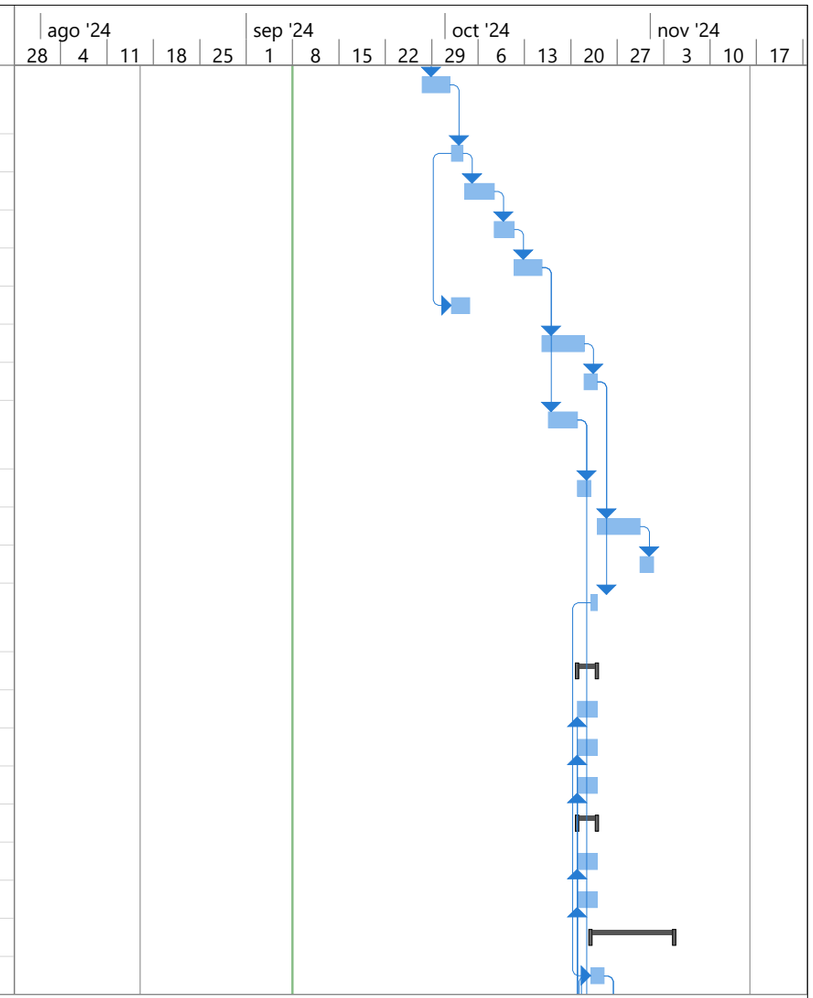

Proyecto: Proyecto ACAN
Fecha: dom 8/09/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Número1	Nombre de tarea	Texto1	Texto2	Duración
92		4.02	Salida tomacorriente doble polo a tierra tubo emt 1/2"	Un	16	3 días
93		4.03	Salida interruptor doble en tubo emt 1/2"	Un	3	2 días
94		4.04	Salida eléctrica alumbrado fluorescente tubo emt 1/2	Un	18	2 días
95		4.05	Salida interruptor sencillo en tubo emt 1/2	Un	12	3 días
96		4.06	Suministro e instalación interruptor monopolar 15-50 A	Un	6.00	2 días
97		4.07	Suministro e instalación reflector de piso 400W	Un	2.00	2 días
98		**5**	**PINTURA Y PAÑETE**	**UND**	**CANT**	**35 días**
99		5.01	Pañete muro (Incluye filos y dilataciones) para garaje y para muro exterior parte trasera	m2	150.00	10 días
100		5.02	Pintura exterior en Koraza (incluye pedestales cerramiento)	m2	377.00	7 días
101		5.03	Pintura con vinilo en muros	m2	326.50	16 días
102		5.04	Protección de piso con cartón corrugado 3 capas	m2	30.00	16 días
103		5.05	Estuco acrílico en muros a 1m de altura	m2	54.00	5 días
104		5.06	Impermeabilización piso y muros con SikaTop Seal 107	m2	123.00	7 días
105		5.07	Pintura con barniz	m2	88.00	9 días
106		5.08	Pintura con esmalte pasamanos tubería HG 1 ½ a 2	m	252.00	8 días
107		**6**	**BAÑOS**	**UND**	**CANT**	**10 días**
108		6.01	Enchape en cerámica 20.5x30.5 cm + COCINA	m2	26.50	3 días
109		6.02	Cielo raso en tablilla machihembrada de pino	m2	4.20	2 días
110		6.03	Sanitario Aquapro alongado blanco	Un	1.00	1 día
111		6.04	Lavamanos con pedestal Acuacer blanco	Un	1.00	1 día
112		6.05	Grifería lavamanos Marruecos	Un	1.00	1 día

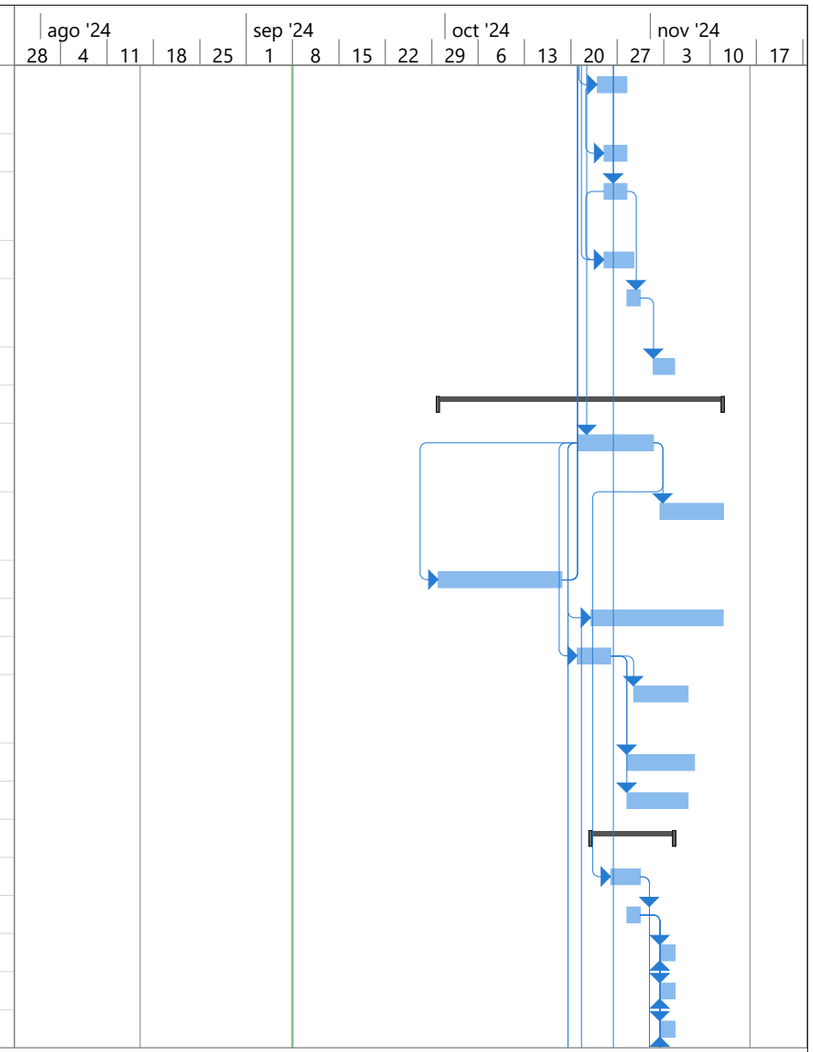

Proyecto: Proyecto ACAN
Fecha: dom 8/09/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			


Id	Modo de tarea	Número1	Nombre de tarea	Texto1	Texto2	Duración
113		6.06	Punto sanitario pvc de 4" (3 m)	Un	1.00	2 días
114		6.07	Punto hidráulico cpvc de 1/2" (3 m)	Un	1.00	2 días
115		6.08	Ducha sencilla Piscis	Un	1.00	1 día
116		**7**	**CUBIERTA**	**UND**	**CANT**	**11 días**
117		7.01	Teja ondulada No. 6 P7	m2	58.00	8 días
118		7.02	Pañete de filos y dilataciones	m	22.50	6 días
119		7.03	Flanche en lámina galvanizada Cal. 26	m	50.35	5 días
120		7.04	Regata en muro para (Incl. mortero de resane)	m	41.00	3 días
121		7.05	Sellado de dilatación con Sikaflex 1A	m	41.00	3 días
122		7.06	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm	m	24.50	3 días
123		7.07	Bajante pvc amazona	m	10.40	3 días
124		**8**	**OTROS**	**UND**	**CANT**	**10 días**
125		8.01	Aire acondicionado mini split inverter 9,000 BTU	Un	3.00	2 días
126		8.02	Tanque de agua en fibra de vidrio 1,000 L	Un	3.00	2 días
127		8.03	Mortero ó plantilla de nivelación para piso e= 4 cm	m2	9.35	5 días
128		8.04	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m	m2	25.00	5 días
129		8.05	letrero con logo ICA	m2	1.50	1 día
130		**9**	**ASEO GENERAL**	**UND**	**CANT**	**72.13 días**
131		9.01	Limpieza y aseo general	m2	173.00	16 días
132		9.02	Lavado y desmanchado de piso y pedestales cerramiento	m2	113.00	15 días
133		**0.3**	**BAHIA SOLANO**			**55.63 días**
134		**1**	**PRELIMINARES**	**UND**	**CANT**	**13 días**
135		1.01	Desmonte de canaleta 43 ó 90	m2	130.00	10 días
136		1.02	Desmonte de canal en lámina ó pvc	m	1.00	1 día

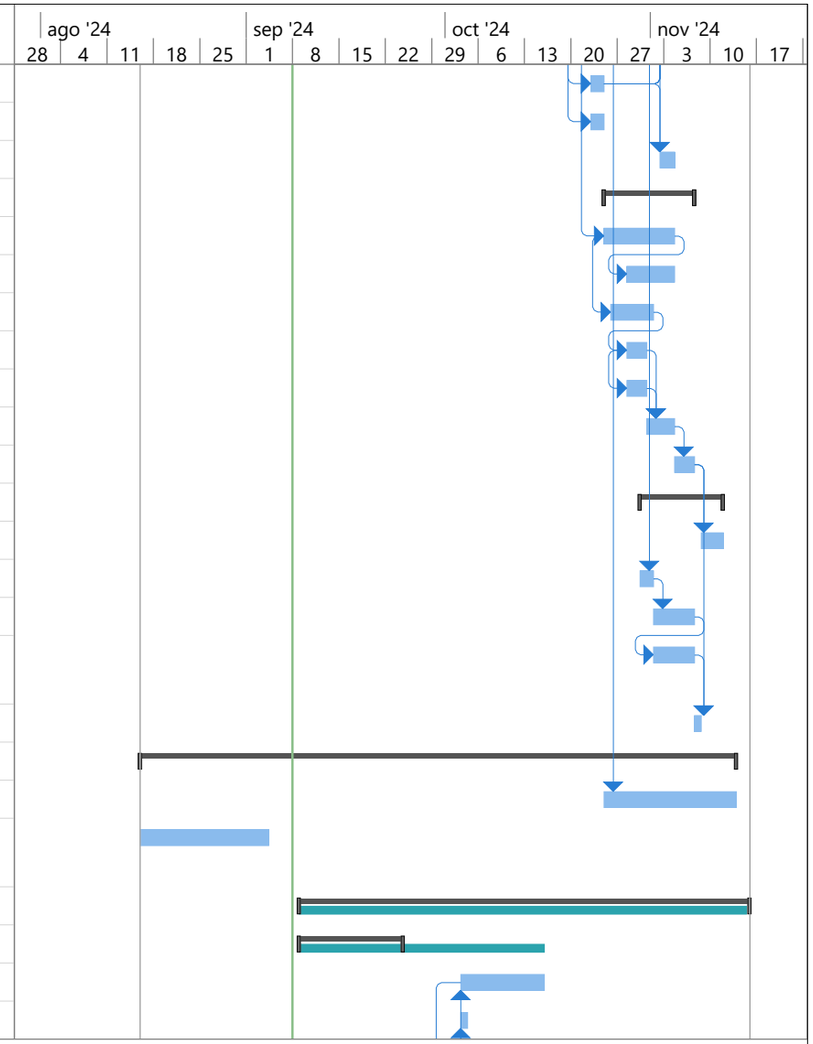

Proyecto: Proyecto ACAN
Fecha: dom 8/09/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	


Id	Modo de tarea	Número1	Nombre de tarea	Texto1	Texto2	Duración
137		1.03	Desmonte de ventanas	m2	1.40	1 día
138		1.04	Demolición manual de muro e= 0.20-0.25 m	m2	1.30	3 días
139		1.05	Desmonte de división en madera	m2	7.00	7 días
140		1.06	Demolición de estructuras en concreto	m3	15.10	5 días
141		**2**	**PINTURA Y PAÑETE**	**UND**	**CANT**	**54 días**
142		2.01	Pañete muro (Incluye filos y dilataciones)	m2	40.00	5 días
143		2.02	Pintura exterior en Koraza (incluye pedestales cerramiento)	m2	219.00	10 días
144		2.03	Pintura con vinilo en muros	m2	282.00	9 días
145		2.04	Protección de piso con cartón corrugado 3 capas	m2	30.00	54 días
146		2.05	Estuco acrílico en muros	m2	282.00	11 días
147		2.06	Impermeabilización piso y muros con SikaTop Seal 107	m2	48.00	4 días
148		2.07	Pintura con barniz	m2	48.00	4 días
149		**3**	**CARPINTERIA METALICA**	**UND**	**CANT**	**11 días**
150		3.01	Puerta en aluminio de 1.00 x 2.05 m	Un	5.00	5 días
151		3.02	Ventana en aluminio fija (vidrio 4 mm)	m2	1.50	5 días
152		3.03	Vidrio de 3 mm (con Sikaflex 1A)	m2	7.50	5 días
153		3.04	Sellado de dilatación con Sikaflex 1A	m	1.00	5 días
154		**4**	**CUBIERTA**	**UND**	**CANT**	**33 días**
155		4.01	Teja ondulada No. 6 P7	m2	130.00	11 días
156		4.02	Perfil metálico C 220x80x2.5 mm	m	72.00	11 días
157		4.03	Cubierta Corpatecho Corpacero Cal. 26	m2	1.00	4 días
158		4.04	Reja metálica varilla de 1/2" h= 50 cm (Incl. Pintura)	m	250	4 días
159		4.05	Pintura con esmalte pasamanos tubería HG 1 ½ a 2	m	80.00	4 días
160		4.06	Pañete de filos y dilataciones	m	48.00	3 días

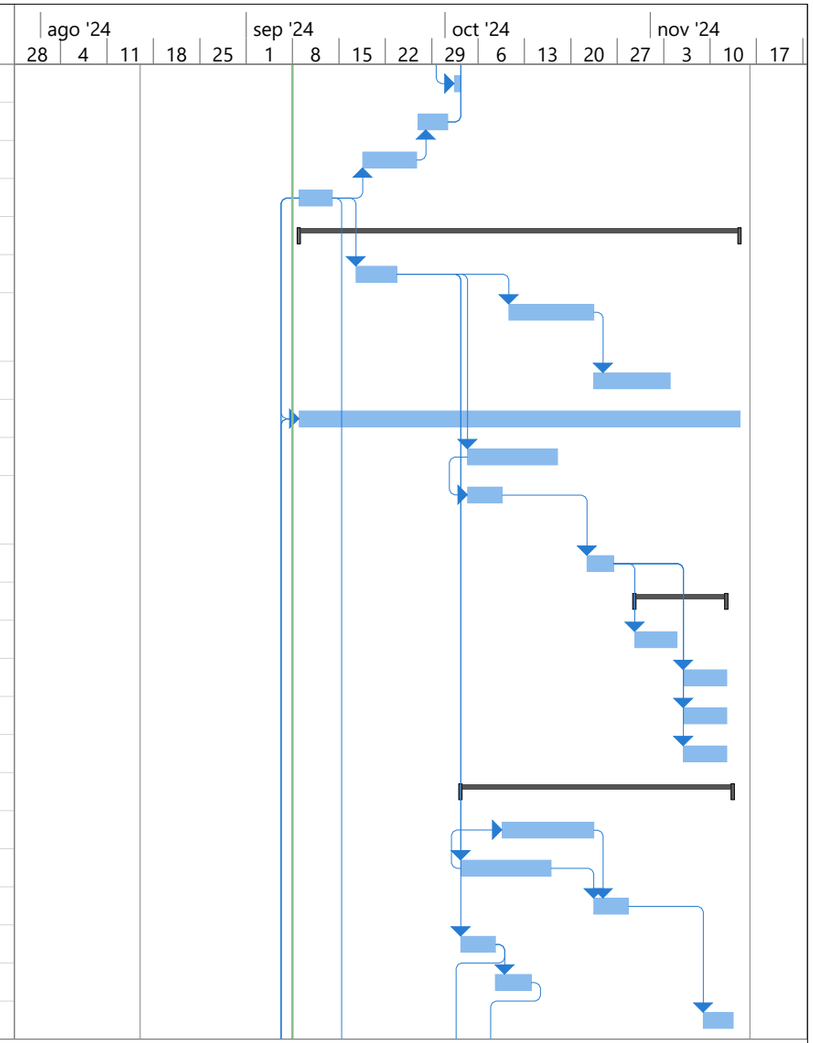

Proyecto: Proyecto ACAN
Fecha: dom 8/09/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			


Id	Modo de tarea	Número1	Nombre de tarea	Texto1	Texto2	Duración
161		4.07	Flanche en lámina galvanizada Cal. 26	m	1.00	4 días
162		4.08	Regata en piso para tubería (Incl. mortero de resane)	m	1.00	1 día
163		4.09	Sellado de dilatación con Sikaflex 1A	m	1.00	1 día
164		4.1	Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm	m	12.00	3 días
165		4.11	Bajante pvc amazona	m	3.00	2 días
166		**5**	**CUARTO NECROPSIA**	**UND**	**CANT**	**37 días**
167		5.01	Muro en ladrillo rayado e= 15 cm	m2	40.00	5 días
168		5.02	Puerta en aluminio de 1.00 x 2.05 m	Un	1.00	1 día
169		5.03	Muro en eterboard de 8 mm (2F) y frescasa 3 ½" SP	m2	3.50	2 días
170		5.04	Mesón cocina acero inoxidable 1.50 m (Incl. grifería)	Un	1.00	3 días
171		5.05	Punto sanitario pvc de 4 (3 m)	Un	1.00	1 día
172		5.06	Punto hidráulico cpvc de 1/2" (3 m)	Un	1.00	1 día
173		5.07	Panel led 60x60 cm 38W	Un	1.00	1 día
174		5.08	Salida tomacorriente doble polo a tierra tubo emt 1/2"	Un	1.00	1 día
175		5.09	Salida interruptor doble en tubo emt 1/2	Un	1.00	1 día
176		5.1	Salida eléctrica alumbrado fluorescente tubo emt 1/2	Un	1.00	1 día
177		5.11	Caja de inspección 100x100x100 cm en concreto	Un	1.00	1 día
178		**6**	**CIELO RASO**	**UND**	**CANT**	**9 días**
179		6.01	Cielo raso en eterboard 6 mm (Incluye pintura)	m2	100.00	9 días
180		**7**	**ANDEN PERIMETRAL**	**UND**	**CANT**	**6 días**
181		7.01	Andén en concreto 20.7 MPa e= 0.10 m	m2	25.00	6 días
182		7.02	Acero de refuerzo Fy= 240 MPa	Kg	65.00	6 días

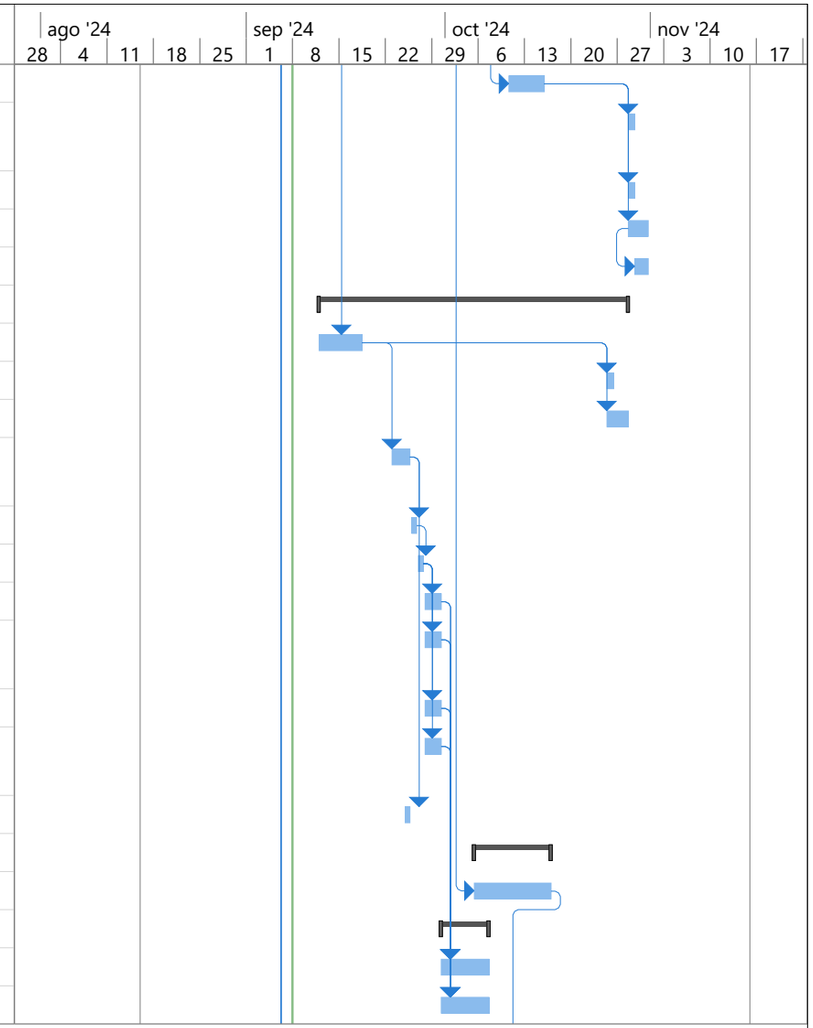

Proyecto: Proyecto ACAN
Fecha: dom 8/09/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Modo de tarea	Número1	Nombre de tarea	Texto1	Texto2	Duración
183		**8**	**ASEO GENERAL**	**UND**	**CANT**	**55 días**
184		8.01	Lavado y desmanchado de piso y pedestales cerramiento	m2	110.00	53 días
185		8.02	Pulido y abrillantado piso (mármol, granito o terrazo)	m2	100.00	27 días
186		8.03	Limpieza y aseo general	m2	130.00	48 días

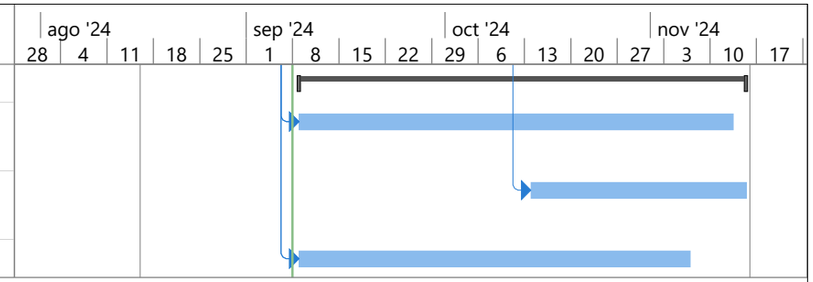

Proyecto: Proyecto ACAN
Fecha: dom 8/09/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	
