TEXVN-ARQ S.A.S **NIT. 900634286-5**
DISEÑO Y CONSTRUCCION

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO - ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO – DEMOLICION - PREPARACION DEL TERRENO - INSTALACIONES ELECTRICAS - INSTALACIONES DE FONTANERIA,CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO - AMPLIACIONES Y REFORMA COMPLETAS DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL –TODAS LAS DEMAS INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

(anexo 1)
RE-PROGRAMACIÓN DE OBRA V-1.0

CALLE 186 B N. 15-78 Teléfonos: 4598535 – 3114768525 – 3125442489
e-mail: texvn-arq@outlook.com
BOGOTA, DC – COLOMBIA
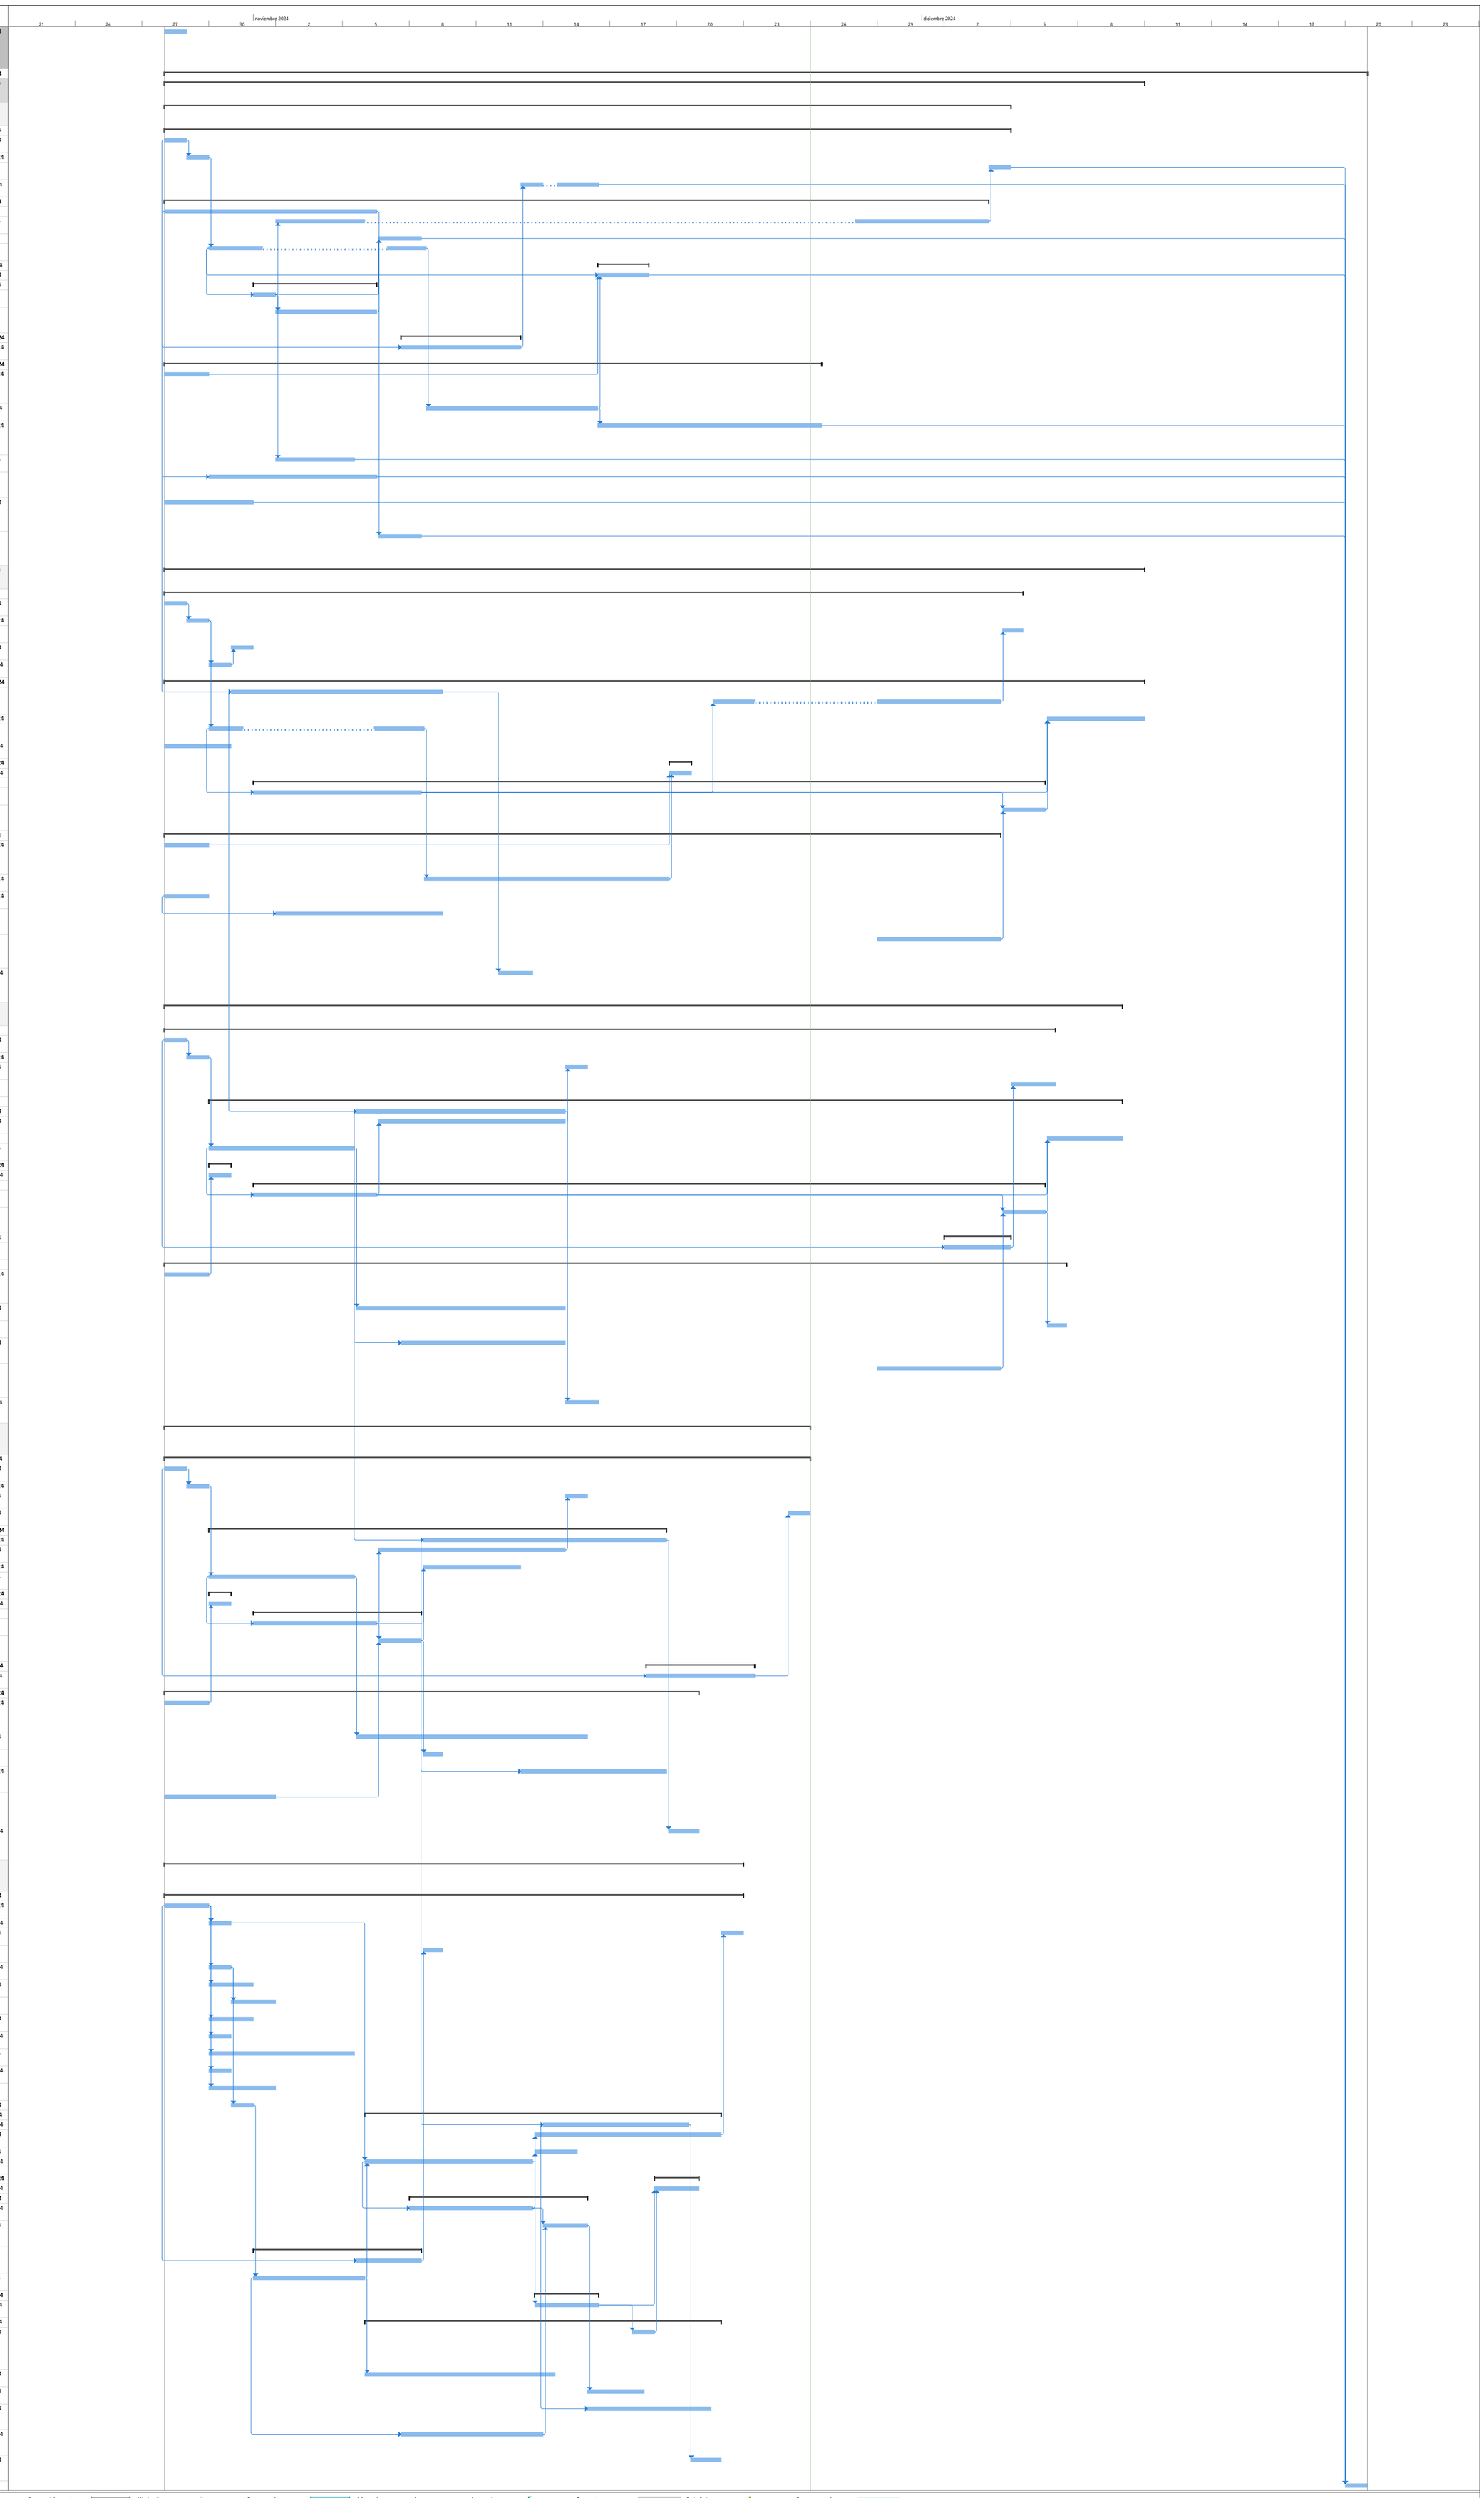
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		SDDE-IPMC 12-2024 REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24
2		**INICIO**	**41,5 días**	**lun 28/10/24**	**vie 20/12/24**
3		ACTIVIDADES PRELIMINARES DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRATIVAS Y DEMAS PROPIAS DEL INICIO DE OBRA.	**33 días**	lun 28/10/24	mar 10/12/24
4		**ACTIVIDADES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL KIOSKO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN SEDE SERVITA**	**28,5 días**	lun 28/10/24	mié 4/12/24
5		**ADECUACIONES**	**28,5 días**	**lun 28/10/24**	**mié 4/12/24**
6		Señalizacion, organización de personal y acopio de mobiliario	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24
7		Desmonte de piso en caucho	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24
8		Suministro e instalacion piso caucho de color	1 día	mié 4/12/24	mié 4/12/24
9		Pintura perimetral del pefil base en color negro esmalte mate	3 días	mié 13/11/24	sáb 16/11/24
10		**MODERNIZACION**	**27,5 días**	**lun 28/10/24**	**mar 3/12/24**
11		Restauración muros panel Deck	7 días	lun 28/10/24	mié 6/11/24
12		Lavado y restauracion de fachadas en Deck a dos caras	6 días	sáb 2/11/24	mar 3/12/24
13		Lavado y restauracion de pisos en Deck	2 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24
14		Lavado instalación y ajuste de cubierta teja upvc.	4 días	mié 30/10/24	vie 8/11/24
15		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**1 día**	**sáb 16/11/24**	**lun 18/11/24**
16		Suministro e instalacion lamparas	1 día	sáb 16/11/24	lun 18/11/24
17		**CARPINTERIA EN ALUMINO**	**3 días**	**vie 1/11/24**	**mié 6/11/24**
18		Ajuste limpieza e instalación de ventanas y montantes	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24
19		Ajustes limpieza e instalacion de puerta corrediza incluye cerradura tipo pico de loro	2 días	sáb 2/11/24	mié 6/11/24
20		**CARPINTERIA METALICA**	**3 días**	**jue 7/11/24**	**mar 12/11/24**
21		Suministro e instalacion de rampas en lamina alfajor incluye pintura	3 días	jue 7/11/24	mar 12/11/24
22		**OTRAS ACTIVIDADES**	**21,38 días**	**lun 28/10/24**	**mar 26/11/24**
23		Suministro e instalación de salida de iluminación para posterior instalación de lamparas, incluye derivacion desde el punto actual mas cercano y canaleta tipo dexson plastica blanca	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24
24		Limpieza y brillado de estructura portante existente en acero inoxidable.	5 días	vie 8/11/24	sáb 16/11/24
25		Corte de raiz de arbol ubicado al costado sur del kiosko, Incluye Desmonte y reinstalación de adoquin de ser necesario.	7 días	sáb 16/11/24	mar 26/11/24
26		Suministro e instalación de manijas para puerta ventana en aluminio.	1 día	sáb 2/11/24	mar 5/11/24
27		Selección y corte de ser necesario en material deck existente para posterior reinstalacion en paneles interiores.	5 días	mié 30/10/24	mié 6/11/24
28		Suministro e instalacion de vidrio tipo laminado 3 + 3 incoloro para fijos en kioskos, incluye desmonte del actual y cambio de empaques de ser necesarios.	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24
29		Suministro e instalación de perfil para remate superior para la correcta instalación del wall panel en fachadas de kioskos de forma vertical con junta.	2 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24
30		**ACTIVIDADES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL KIOSKO UBICADO EN LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**	**33 días**	lun 28/10/24	mar 10/12/24
31		**ADECUACIONES**	**29 días**	**lun 28/10/24**	**jue 5/12/24**
32		Señalizacion, organización de personal y acopio de mobiliario	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24
33		Desmonte de piso en caucho	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24
34		Suministro e instalacion piso caucho de color	1 día	mié 4/12/24	jue 5/12/24
35		Pintura perimetral del pefil base en color negro esmalte mate	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24
36		Pintura de rampa acceso movilidad reducida en color negro esmalte mate	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24
37		**MODERNIZACION**	**33 días**	**lun 28/10/24**	**mar 10/12/24**
38		Restauración muros panel Deck	7 días	jue 31/10/24	sáb 9/11/24
39		Lavado y restauracion de fachadas en Deck a dos caras	6 días	jue 21/11/24	mié 4/12/24
40		Lavado y restauracion de pisos en Deck	3 días	vie 6/12/24	mar 10/12/24
41		Lavado instalación y ajuste de cubierta teja upvc.	4 días	mié 30/10/24	vie 8/11/24
42		Adecuacion perimentral de kiosko (matamaleza y gravilla)	3 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24
43		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**1 día**	**mar 19/11/24**	**mié 20/11/24**
44		Suministro e instalacion lamparas	1 día	mar 19/11/24	mié 20/11/24
45		**CARPINTERIA EN ALUMINO**	**26 días**	**vie 1/11/24**	**vie 6/12/24**
46		Ajuste limpieza e instalación de ventanas y montantes	5 días	vie 1/11/24	vie 8/11/24
47		Ajustes limpieza e instalacion de puerta corrediza incluye cerradura tipo pico de loro	2 días	mié 4/12/24	vie 6/12/24
48		**OTRAS ACTIVIDADES**	**28 días**	**lun 28/10/24**	**mié 4/12/24**
49		Suministro e instalación de salida de iluminación para posterior instalación de lamparas, incluye derivacion desde el punto actual mas cercano y canaleta tipo dexson plastica blanca	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24
50		Limpieza y brillado de estructura portante existente en acero inoxidable.	7 días	vie 8/11/24	mar 19/11/24
51		Nivelación de rampa de acceso al nivel de llegada en piso deck	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24
52		Selección y corte de ser necesario en material deck existente para posterior reinstalacion en paneles interiores.	5 días	sáb 2/11/24	sáb 9/11/24
53		Suminstro e instalacion de vidrio tipo laminado 3 + 3 incoloro para fijos en kioskos, incluye desmonte del actual y cambio de empaques de ser necesarios.	4 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24
54		Suministro e instalación de perfil para remate superior para la correcta instalación del wall panel en fachadas de kioskos de forma vertical con junta.	1,5 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24
55		**ACTIVIDADES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL KIOSKO UBICADO EN LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL**	**32 días**	lun 28/10/24	lun 9/12/24
56		**ADECUACIONES**	**30,5 días**	**lun 28/10/24**	**vie 6/12/24**
57		Señalizacion, organización de personal y acopio de mobiliario	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24
58		Desmonte de piso en caucho	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24
59		Suministro e instalacion piso caucho de color	1 día	vie 15/11/24	vie 15/11/24
60		Pintura perimetral del pefil base en color negro esmalte mate	2 días	jue 5/12/24	vie 6/12/24
61		**MODERNIZACION**	**30 días**	**mié 30/10/24**	**lun 9/12/24**
62		Restauración muros panel Deck	7 días	mar 5/11/24	jue 14/11/24
63		Lavado y restauracion de fachadas en Deck a dos caras	6 días	mié 6/11/24	jue 14/11/24
64		Lavado y restauracion de pisos en Deck	2 días	vie 6/12/24	lun 9/12/24
65		Lavado instalación y ajuste de cubierta teja upvc.	4 días	mié 30/10/24	mar 5/11/24
66		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**1 día**	**mié 30/10/24**	**mié 30/10/24**
67		Suministro e instalacion lamparas	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24
68		**CARPINTERIA EN ALUMINO**	**26 días**	**vie 1/11/24**	**vie 6/12/24**
69		Ajuste limpieza e instalación de ventanas y montantes	3 días	vie 1/11/24	mié 6/11/24
70		Ajustes limpieza e instalacion de puerta corrediza incluye cerradura tipo pico de loro	2 días	mié 4/12/24	vie 6/12/24
71		**CARPINTERIA METALICA**	**3 días**	**lun 2/12/24**	**mié 4/12/24**
72		Suministro e instalacion de rampas en lamina alfajor incluye pintura	3 días	lun 2/12/24	mié 4/12/24
73		**OTRAS ACTIVIDADES**	**31 días**	**lun 28/10/24**	**sáb 7/12/24**
74		Suministro e instalación de salida de iluminación para posterior instalación de lamparas, incluye derivacion desde el punto actual mas cercano y canaleta tipo dexson plastica blanca	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24
75		Limpieza y brillado de estructura portante existente en acero inoxidable.	7 días	mar 5/11/24	jue 14/11/24
76		Suministro e instalación de manijas para puerta ventana en aluminio.	1 día	vie 6/12/24	sáb 7/12/24
77		Selección y corte de ser necesario en material deck existente para posterior reinstalacion en paneles interiores.	5 días	jue 7/11/24	jue 14/11/24
78		Suministro e instalacion de vidrio tipo laminado 3 + 3 incoloro para fijos en kioskos, incluye desmonte del actual y cambio de empaques de ser necesarios.	4 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24
79		Suministro e instalación de perfil para remate superior para la correcta instalación del wall panel en fachadas de kioskos de forma vertical con junta.	1,5 días	vie 15/11/24	sáb 16/11/24
80		**ACTIVIDADES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL KIOSKO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR SEDE UNIVERSIDAD DISTRITAL**	**21 días**	lun 28/10/24	lun 25/11/24
81		**ADECUACIONES**	**21 días**	**lun 28/10/24**	**lun 25/11/24**
82		Señalizacion, organización de personal y acopio de mobiliario	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24
83		Desmonte de piso en caucho	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24
84		Suministro e instalacion piso caucho de color	1 día	vie 15/11/24	vie 15/11/24
85		Pintura perimetral del pefil base en color negro esmalte mate	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24
86		**MODERNIZACION**	**14 días**	**mié 30/10/24**	**mar 19/11/24**
87		Restauración muros panel Deck	7 días	vie 8/11/24	mar 19/11/24
88		Lavado y restauracion de fachadas en Deck a dos caras	6 días	mié 6/11/24	jue 14/11/24
89		Lavado y restauracion de pisos en Deck	2 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24
90		Lavado instalación y ajuste de cubierta teja upvc.	4 días	mié 30/10/24	mar 5/11/24
91		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**1 día**	**mié 30/10/24**	**mié 30/10/24**
92		Suministro e instalacion lamparas	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24
93		**CARPINTERIA EN ALUMINO**	**5 días**	**vie 1/11/24**	**vie 8/11/24**
94		Ajuste limpieza e instalación de ventanas y montantes	3 días	vie 1/11/24	mié 6/11/24
95		Ajustes limpieza e instalacion de puerta corrediza incluye cerradura tipo pico de loro	2 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24
96		**CARPINTERIA METALICA**	**5 días**	**lun 18/11/24**	**sáb 23/11/24**
97		Suministro e instalacion de rampas en lamina alfajor incluye pintura	5 días	lun 18/11/24	sáb 23/11/24
98		**OTRAS ACTIVIDADES**	**17,5 días**	**lun 28/10/24**	**mié 20/11/24**
99		Suministro e instalación de salida de iluminación para posterior instalación de lamparas, incluye derivacion desde el punto actual mas cercano y canaleta tipo dexson plastica blanca	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24
100		Limpieza y brillado de estructura portante existente en acero inoxidable.	8 días	mar 5/11/24	vie 15/11/24
101		Suministro e instalación de manijas para puerta ventana en aluminio.	1 día	vie 8/11/24	sáb 9/11/24
102		Selección y corte de ser necesario en material deck existente para posterior reinstalacion en paneles interiores.	5 días	mié 13/11/24	mar 19/11/24
103		Suministro e instalacion de vidrio tipo laminado 3 + 3 incoloro para fijos en kioskos, incluye desmonte del actual y cambio de empaques de ser necesarios.	5 días	lun 28/10/24	vie 1/11/24
104		Suministro e instalación de perfil para remate superior para la correcta instalación del wall panel en fachadas de kioskos de forma vertical con junta.	1,5 días	mar 19/11/24	mié 20/11/24
105		**ACTIVIDADES PROPIAS DEL DESMONTE, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL KIOSKO UBICADO EN PLAZA DE LOS ARTESANOS**	**19,5 días**	lun 28/10/24	vie 22/11/24
106		**ADECUACIONES**	**19,5 días**	**lun 28/10/24**	**vie 22/11/24**
107		Señalizacion, organización de personal y acopio de mobiliario	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24
108		Desmonte de piso en caucho	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24
109		Suministro e instalacion piso caucho de color	1 día	vie 22/11/24	vie 22/11/24
110		Pintura perimetral del pefil base en color negro esmalte mate	1 día	vie 8/11/24	sáb 9/11/24
111		Desmonte y montaje techo en Upvc Kiosco	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24
112		Desmonte y montaje de paneles laminas madera plastica Deck (Plaza Artesanos)	2 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24
113		Desmonte de marcos y ventanas (Plaza de artesanos)	2 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24
114		Desmonte de ventanas montantes (Plaza de artesanos)	2 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24
115		Desmonte de luces y redes electricas (Plaza de artesanos)	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24
116		Desmonte de estructura metalica de cubierta y base (Plaza de artesanos)	4 días	mié 30/10/24	mar 5/11/24
117		Desmonte de piso en lamina de madera Deck (Plaza de artesanos)	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24
118		Desmonte de estructura metalica de kiosko (Plaza de artesanos)	3 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24
119		Traslado del mobiliario a otro punto	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24
120		**MODERNIZACION**	**12 días**	**mié 6/11/24**	**jue 21/11/24**
121		Restauración muros panel Deck	5 días	jue 14/11/24	mié 20/11/24
122		Lavado y restauracion de fachadas en Deck a dos caras	7 días	mié 13/11/24	jue 21/11/24
123		Lavado y restauracion de pisos en Deck	2 días	mié 13/11/24	vie 15/11/24
124		Lavado instalación y ajuste de cubierta teja upvc.	5 días	mié 6/11/24	mié 13/11/24
125		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**2 días**	**mar 19/11/24**	**mié 20/11/24**
126		Suministro e instalacion lamparas	2 días	mar 19/11/24	mié 20/11/24
127		**CARPINTERIA EN ALUMINO**	**5,5 días**	**vie 8/11/24**	**vie 15/11/24**
128		Ajuste limpieza e instalación de ventanas y montantes	3 días	vie 8/11/24	mié 13/11/24
129		Ajustes limpieza e instalacion de puerta corrediza incluye cerradura tipo pico de loro	2 días	jue 14/11/24	vie 15/11/24
130		**CARPINTERIA METALICA**	**5 días**	**vie 1/11/24**	**vie 8/11/24**
131		Suministro e instalacion de rampas en lamina alfajor incluye pintura	3 días	mar 5/11/24	vie 8/11/24
132		Instalación y armada de estructura para kiosko (Plaza de Artesanos)	2,5 días	vie 1/11/24	mar 5/11/24
133		**OTROS**	**3 días**	**mié 13/11/24**	**sáb 16/11/24**
134		Acometida final para Kiosco (trasalado Plaza de Artesanos)	3 días	mié 13/11/24	sáb 16/11/24
135		**OTRAS ACTIVIDADES**	**12 días**	**mié 6/11/24**	**jue 21/11/24**
136		Suministro e instalación de salida de iluminación para posterior instalación de lamparas, incluye derivacion desde el punto actual mas cercano y canaleta tipo dexson plastica blanca.	1 día	lun 18/11/24	lun 18/11/24
137		Limpieza y brillado de estructura portante existente en acero inoxidable.	6 días	mié 6/11/24	jue 14/11/24
138		Suministro e instalación de manijas para puerta ventana en aluminio.	1 día	sáb 16/11/24	lun 18/11/24
139		Selección y corte de ser necesario en material deck existente para posterior reinstalacion en paneles interiores.	4 días	sáb 16/11/24	jue 21/11/24
140		Suministro e instalacion de vidrio tipo laminado 3 + 3 incoloro para fijos en kioskos, incluye desmonte del actual y cambio de empaques de ser necesarios.	4 días	jue 7/11/24	mié 13/11/24
141		Suministro e instalación de perfil para remate superior para la correcta instalación del wall panel en fachadas de kioskos de forma vertical con junta.	1,5 días	mié 20/11/24	jue 21/11/24
142		FIN	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24
