DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: Subdirección de Empleo y Formación	**Asunto:** Visita de supervisión al kiosco de Usaquén en el marco del contrato 1314-2024 mantenimiento de kioscos
Fecha: 06/11/2024	**Lugar:** Kiosco Usaquén

Asistentes/Participantes:

Arquitecta. Jennifer TEXVN ARQ SAS
Arquitecto: Givert Parra TEXVN ARQ SAS
Ing. Jorge González – Supervisor SDDE

Anexo: Listado de Asistencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar visita de supervisión y seguimiento a los kioscos de la Agencia Distrital de Empleo. En el marco del contrato 1314-2024 mantenimiento de kioscos.

AGENDA DE LA REUNIÓN

Evaluar el avance de obra y conocer las novedades que se estén presentando en la ejecución del contrato

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Se realiza visita de seguimiento y supervisión al kiosco de Usaquén. La visita es atendida por los arquitectos Jennifer Cardenas y Gilvert Parra. La empresa TEXVN ARQ SAS, informa que la adecuación del kiosco se está ejecutando conforme a las actividades planeadas para la fecha. Ya se están limpiando la estructura en general, se retiró el tapete plástico entre otras actividades y se menciona la siguiente novedad:

Los arquitectos de la empresa informan que ha sido muy difícil la consecución del material de panel deck que está actualmente instalado en los kioscos, se ha acudido a varios proveedores de paneles deck en el sector de la construcción, sin embargo, no se identifica la referencia similar y los proveedores han señalado que no conocen el material de la muestra presentada.
Se expresa la preocupación, que dado a que no se logra encontrar el mismo material, solicitan al supervisor evaluar la instalación de otra referencia del panel deck distinto al instalado, para lo cual lo ponen en consideración ante la SDDE y expresan la posibilidad de presentar otra referencia, sin embargo, se determina que cambiaría el diseño original arquitectónico del kiosco.

Se evalúa e inspecciona los paneles deck por parte del supervisor y el contratista, se analiza el material y se evidencia que los paneles instalados no son los paneles originales y no obedecen a una referencia comercial tal como fue instalado. Se evidencia y se concluye que el panel parte de una referencia comercial la cual fue

cortada transversalmente y una de las caras se instaló en el interior del kiosco y la otra cara fue instalada en la parte exterior. Por tanto, no es posible encontrar dicho material y conforme a la evidencia el contratista manifiesta que no es prudente realizar la misma acción pues se perdería todo tipo de garantía sobre el material e igualmente se modificaría su vida útil y composición estructural.

Se anexan las fotos de las evidencias.

La supervisión concluye realizar una reunión con el equipo técnico de la SDDE para evaluar la nueva propuesta de una referencia distinta de panel deck por parte del contratista para ser evaluado, autorizado e instalado.

Se debe preparar la propuesta del material en la nueva configuración y presentarlo ante el comité para su evaluación y posible autorización si este cumple con los requisitos considerados

El supervisor solicita se informen si se presentan novedades adicionales en este proceso de consecución:

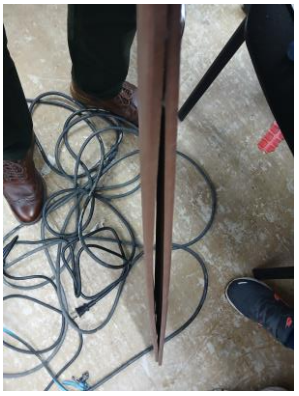

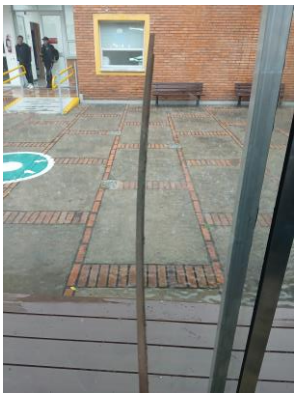

Anexos: Relacione anexos si se contemplan en el desarrollo de la reunión (Presentaciones, archivos Excel u otros)

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**
Presentar propuesta de otra referencia de material Deck en la mayor brevedad posible.	TEXVN ARQ	8/11/2024
Se Convocará reunión con equipo técnico para evaluar proceso a seguir	SUPERVISION	7/11/2024

En constancia de lo anterior firman:

JORGE GONZÁLEZ
SUPERVISOR SDDE

ARQ JENNIFER CARDENAS
TEXVN – ARQ S.A.S

ARQ GILVERT PARRA TEXVN ARQ S.A.S
REP LEGAL
