# CONVENIO 3317-2023

## AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL








## INFORME MENSUAL No. 4

## MARZO DEL 2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Convenio de Obra No.** 3317-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

**Contrato de Interventoría No.** 4804-2023 **Interventoría:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

**Objeto Convenio de Obra:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**INFORME MENSUAL No.** 4 **MES O PERIODO:** MARZO


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 2 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 13 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 7 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 8 |
| 2.1 | Localización | | 8 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 8 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 9 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 9 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 10 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 10 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 11 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 12 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 12 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 15 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 20 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 20 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 20 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 21 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 22 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 22 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 24 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 24 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 24 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 24 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 24 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 25 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 27 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 27 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 28 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 30 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 30 |
| **8** | **Anexos** | | 31 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 31 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


Firma: Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## CONTROL DE APROBACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del documento:** | | Informe Mensual de interventoría No 3 |
| **Código del documento:** | | |
| **Versión:** | **1** | |

| **ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Actividad** | **Fecha** | **Nombre del ejecutor** | **Firma** |
| Elaboración | 30/03/2024 | Gabriel Vesga |  |
| Revisión | 30/03/2024 | Jesús Orlando Vivas |  |
| Verificación | | | |
| Aprobación | | | |

| **DISTRIBUCIÓN** | | |
|---|---|---|
| **Persona a quien se envía** | **Cargo** | **Organización** |
| Mauricio Hoyos | Supervisor | INVIAS |

| **CONTROL DE VERSIONES** | | |
|---|---|---|
| **Versión** | **Fecha** | **Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior** |
| **1** | 10/05/2024 | Envío de informe al supervisor de INVIAS |
| **2** | | |

**TABLA DE CONTENIDO**

## Contenido

1. INTRODUCCIÓN ..... 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 7
2.1 LOCALIZACIÓN ..... 7
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA ..... 8
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 8
3. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA ..... 9
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO ..... 9
3.1.1 Información contractual ..... 9
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 10
3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..... 12
3.3.1 Estado de pólizas ..... 13
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA ..... 14
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO ..... 14
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA ..... 22
4.3 PERSONAL CONVENIO DE OBRA ..... 23
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA ..... 25
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 26
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 26
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO DE OBRA ..... 27

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 10
Tabla 2. Póliza de cumplimiento 12
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual 13
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría 31
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría 32
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría. 34
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida 37
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada 44

## LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto 8

## LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 37
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 58

# 1. INTRODUCCIÓN

Las vías de Puerto Perales, ubicado en el departamento de Antioquia, presentan un lamentable estado de deterioro. Este es un problema que afecta no solo a la comunidad de Puerto Perales, sino también a las diversas veredas cercanas a este corregimiento.

Esta situación también tiene un impacto negativo en la economía de la región, ya que muchas veces se dificulta la movilización de productos agrícolas y ganaderos hacia los mercados. Así mismo, se limita el desarrollo del turismo en la zona, ya que los visitantes evitan transitar por estas vías en mal estado.

Es importante destacar que la falta de mantenimiento y reparación de las vías es un problema recurrente en Puerto Perales y sus veredas. A pesar de los constantes reclamos de la comunidad.

Para darle prioridad a estos lugares apartados, el instituto nacional de vías - INVIAS en conjunto con el gobierno nacional y las juntas de acción comunal desarrollaron el proyecto de caminos comunitarios para la paz total donde Puerto Perales será beneficiado mediante el convenio solidario 3317-2023 suscrito el 13 de septiembre del 2023 con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, el plazo contractual es de 3 meses donde se construirá 111 metros lineales de vía en concreto rígido que espera poder suplir las necesidades actuales mínimas de esta comunidad.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN



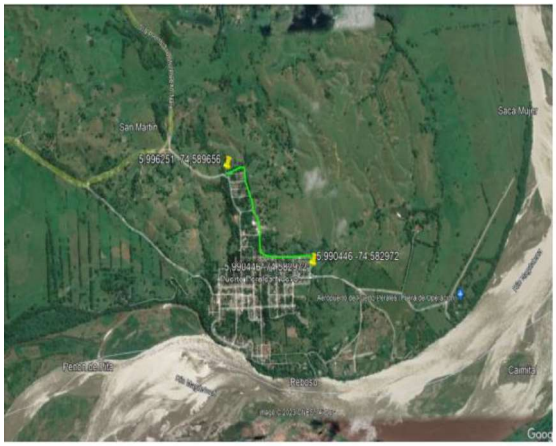



Ilustración 4. Localización de vía a intervenir en Corregimiento Puerto Perales.

Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, municipio de Puerto Triunfo, en la vereda de Puerto Perales. Con este proyecto se pretende cumplir las especificaciones de vía secundaria; es decir, realizar el mejoramiento de suelo, aumentar el ancho de la vía y disminuir la presencia de curvas sucesivas.

### 1.1.1 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENIFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Desde hace mucho tiempo se viene utilizando estas vías por la cual pasan vehículos de carga pesada y liviana que con el pasar del tiempo, las lluvia y escorrentías de las mismas han deteriorado estos cruces.

Esta vía comunica las fincas aledañas con la vía principal de puerto triunfo – puerto Nare que esta a su vez se comunica el interior del casco urbano de puerto perales, este proyecto disminuirá los costos y los tiempos de viaje que venían siendo afectados de una gran manera.

## 2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Las vías de Puerto Perales, se encuentran en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola y minera que se encuentran en la zona, además de extender los tiempos de viaje y aumentar los costos de carga.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Se realiza el replanteo de del tramo de via para toma de niveles y trazo de via en el tramo 2. | Se realiza la instalacion de estacas o cuñas para la identificacion de niveles y trazo de via en el tramo 1 |

## 2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Alcance del proyecto será el mejoramiento con la pavimentación de 111 metros en Puerto perales en el tramo comprendido entre el K0+000 al K0+111 respectivamente. Estas vías internas se encuentran en muy mal estado debido a la poca intervención por parte de los entes territoriales, las precipitaciones que a su vez dificultan el tráfico y aumentan los costos de operación y aumento en el recorrido de las mismas.


El departamento Antioquia realiza inversiones en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía terciaria en la vereda de Puerto perales y las obras complementarias que garanticen la estabilidad de la vía,

según los estudios y diseños aprobados por el INVIAS y de acuerdo con la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales de INVIAS.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada en el objeto del contrato 4804 de 2023.

*Ilustración 2. Estructura de pavimento propuesta*

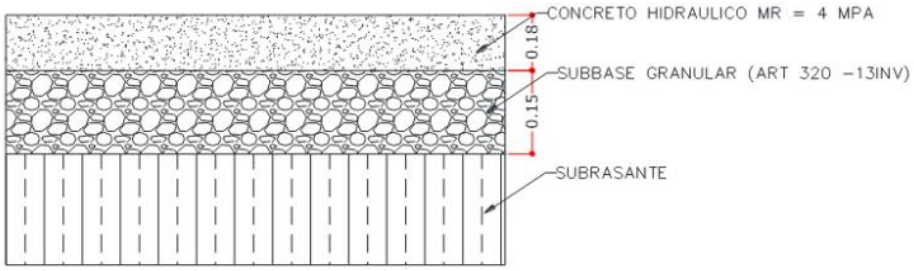


## 3. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA

### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

#### 3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del convenio

| | |
|---|---|
| **CONVENIO No. - FECHA** | 3317 del 13 de septiembre de 2023 |
| **TIPO DE CONVENIO** | Obra |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | Dirección territorial INVIAS |
| **CONTRATISTA** | JAC PUERTO PERALES, MPIO PTO TRIUNFO |
| **C.C. o N.I.T.** | 811017456-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | Edgar Álvaro Macias Quintana |
| **C.C. o N.I.T** | 7.252.077 |
| **OBJETO DEL CONVENIO** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO |

| | |
|---|---|
| | Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."( código BPIN No. 202300000000001)" |
| **VALOR DEL CONVENIO** | $201.333.957.00 |
| **PLAZO O DURACIÓN** | Tres (3) meses |
| **PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN** | De acuerdo con el Adicional No. 01: "Modificar el plazo de ejecución tres (03) meses más". |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | PUERTO TRIUNFO – PUERTO PERALES |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de designación) | MAURICIO HOYOS. Director territorial INVIAS Antioquia. |
| **INTERVENTOR (Externo)** | Interventor Externo Jesús Orlando Vivas Noguera del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 4804 de 2023 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 12/12/2023 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 13/09/2023 |
| **FECHA DE INICIO** | 12/12/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | HASTA 31/12/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 30/04/2024 |

## 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 1-31 de marzo de 2024 de ejecución del convenio 3317 de 2023. El Contratista JAC Puerto perales, realizó las siguientes actividades.

- Se continua con la búsqueda de proveedores de materiales y maquinaria para el inicio de obra.
- Socialización con el presidente de la JAC, topógrafo y personal de interventoría en pro del inicio de actividades de localización y replanteo de los tramos 1 y 2.
- Se continúan con el envío de cotizaciones y la búsqueda de proveedores.
- Se realiza el envío de la solicitud de transferencia #3 para revisión y aprobación de interventoría.

Se adelantarán las siguientes actividades técnicas:

- ➔ Se realiza la localización y replanteo de los tramos de vía que se van a intervenir, instalación de estacas para el trazo e identificación de niveles de conformación de rasante, sub base y pavimento.

- ➔ Se realiza la conformación y compactación por medio de rodillo (binitin) de la rasante y sub base de los tramos 1 y 2.

- ➔ Se realiza el ensayo de humedad y toma de muestras para el ensayo de Proctor modificado en cada tramo.

- ➔ Se realiza la instalación de bordillos en los tramos 1 y 2.



Se realiza la conformacion de la rasante de los tramos 1 y 2 | Se realiza la conformacion de la sub base en los tramos 1 y 2.



Se realiza la compactacion de la sub base por medio del equipo Binitin hasta llegar a la compactacion optima estimada. | Se realiza el ensayo de humedad optima para los tramos 1 y 2, ademas, se toma las muestras de sub base para el ensayo de proctor modificado.



Se realiza la limpieza y descapote del tramo de via y se realiza la instalacion de bordillos en los tramos 1 y 2.

### 3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Por medio de socialización y reunión con la veeduría el día 19 de marzo de 2023 para el seguimiento y avance de obra, la interventoría técnica les solicita la agilidad en las solicitudes de transferencia que hasta el momento no ha afectado las actividades de obra directamente, pero en el transcurso lo hará ya que no hay buen flujo de caja para el buen desarrollo de la obra, es necesario que se realicen con mas recurrencia conforme a lo que se necesite y se avance en la obra ya que el avance de obra va mucho mas adelantado que el avance presupuestal.

Se les ha solicitado de manera recurrente vía WhatsApp y por medio del correo el pago de las retenciones de febrero, el diligenciamiento y entrega de las actas de vecindad, entrega de diseños de mezcla y PMT pertinente para el desarrollo de las actividades, el diseño de mezcla se recibió, pero hasta el momento no ha sido entregado el resto de información

Además, se le ha solicitado al contratista de obra (JAC) realizar socialización de la obra con los habitantes aledaños a los tramos de vía ya que en repetidas ocasiones se ha violado el paso hacia el lugar de obra por habitantes y vehículos, no hay seguimiento ni cumplimiento de estas indicaciones echas por la interventoría técnica, se les hace el llamado de atención verbal para mejorar la señalización y prohibición del paso peatonal y vehicular con la mejora de un cerramiento en lona verde.





### 3.3.1 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de cumplimiento NB - 100284287, con respecto a la fecha de inicio y prorroga, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 20% | $ 40.266.791,40 | 13/09/2023 | 1/03/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.066.697,85 | 13/09/2023 | 30/04/2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.400.187,10 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.100069231, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS SA y aprobada por la gobernación de Antioquia. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | | |
| Predio, labores y operaciones. | 10% | $ 232.000.000,00 | 13/09/2023 | 30/04/2024 |
| Patronal | | | | |
| Vehiculos propios y no propios | | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | | |

Página 2

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

### RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1-31 de marzo de 2024, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

| | | |
|---|---|---|
| | **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA** | **VERSIÓN: 01** |
| | **INFORME MENSUAL No. 4** | **FECHA:1- 31 de marzo de 2024** |
| | **CONTRATO No. 4804 DEL 2023** | |

INSTITUTO NACIONAL DEVÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** mar-24

**CONVENIO No.:** 3317 - 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO PTRIUNFO

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 12/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/01/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL :** $ 201.333.957,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 201.333.957,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ 200.333.957,00
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORI** 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | ML | 111 |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | Muro de Contención | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | ML | 0 | 0 |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | $ 151.512.376,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.545.371,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 44.276.210,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 200.333.957,00 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 47.579.189,00 | 47.579.189,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ - | 0,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 14.753.652,00 | 14.753.652,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 62.332.841,00 | 62.332.841,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 78.955.246,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 62.332.841,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 78,95%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




Foto 1











**Indicar la localización y actividad.** **Indicar la localización y actividad.**



Foto 3










**Indicar la localización y actividad.** **Indicar la localización y actividad.**






**Indicar la localización y actividad.** **Indicar la localización y actividad.**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## 4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°12. (1-7 marzo)

| | | |
|---|---|---|
| | **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA** | **VERSIÓN: 01** |
| | **INFORME MENSUAL No. 4** | **FECHA:1- 31 de marzo de 2024** |
| | **CONTRATO No. 4804 DEL 2023** | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
**INFORME SEMANAL**

| | |
|---|---|
| CODIGO | |
| VERSION | |
| PAGINA | |
| FECHA | 1/04/2024 (Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 12 del 1/03/2024 al 7/03/2024 Último Informe Semanal No (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PAR A EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de pavimento rigido.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de pavimento rigido de 18cm de espesor con un ancho de via de 4 mts en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3317-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4804 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 14/03/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

201.333.957,00

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 201.333.957 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 201.333.957 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 57.596.402 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 57.596.402 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos.)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 201.333.957,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 14.800.000,00 | 7,53% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 14.753.650,00 | 7,33% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 46.349,00 | -0,02% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ | |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 14.800.000,00 | 7,39% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 14.753.650,00 | 7,36% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 46.349,00 | -0,03% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | | 0,00% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | | 0,00% |

Observaciones: Se realizan labores administrativas para el inicio de la obra la proxuima semana

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 18.467.266,00 | 28,57% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.467.266,00 | 28,57% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.350.000,00 | 3,47% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.013.643,00 | 3,25% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024
VALOR FACTURA: $ 10.784.083,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realizan correciones del acta anterior y se encuentra en revision por parte de la supervision de INVIAS

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

**IV. GESTIÓN AMBIENTAL**

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | ARENA, TRITURADO Y MATERIAL PETREO SE COMPRÓ EN FERRETERIAS Y DEPOSITO DE MATERIALES DEBIDAMENTE PERMISADOS EN PUERTO TRIUNFO | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | EL AGUA SE COMPRO AL ACUEDUCTO | PERMISO MINERO: | SI N.A. | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |

**OBSERVACIONES:** Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO X | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO X | N/A | |

**OBSERVACIONES:** se requerira en la medida de ser necesario

**P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

**V. GESTIÓN SOCIAL**

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 1 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | |

**OBSERVACIONES:**

SE REALIZÓ REUNIÓN INICIAL DE SOCIALIZACION EL 27 - 12 - 2023

**VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

Se realiza acompañamiento de parte de la interventoria a la JAC de puerto perales en la gestion documental y socializacion de temas administrativos.
Se presentan lluvias ocasionales
Se continua con la busqueda de proveedores de materiales y maquinaria.
Se realiza la revison y ajuste del presupuesto del convenio con la JAC y la interventoria.

**VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Se tiene programado el inicio de obra con el replanteo de los tramos de via a intervenir para realizar la conformacion de la rasante, sub base y concreto.

**VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**

0

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes a Estudios y diseños | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |
| Placa huella | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |
| alcantarillas | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



REUNION INICIAL DE SOCIALIZACIÓN 27-12-2023

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA** | **VERSIÓN: 01** |
| | **INFORME MENSUAL No. 4** | **FECHA:1- 31 de marzo de 2024** |
| | **CONTRATO No. 4804 DEL 2023** | |

Informe N°13. (8-14 marzo)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 14/02/2024 (Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 13 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PAR A EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de pavimento rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construcción de 111 m de pavimento rígido de 18cm de espesor con un ancho de via de 4 mts en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo

**CONVENIO SOLIDARIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | | |
| CONVENIO No. | 3317-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA | | |
| INTEGRANTES: | N/A | | |
| CONTRATO No. | 4804 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 14/03/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 201.333.957 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 201.333.957 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 57.596.402 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 57.596.402 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 201.333.967,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 19.000.000,00 | 9,44% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 18.753.652,00 | 9,31% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 246.348,00 | -0,12% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 19.000.000,00 | 9,44% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 18.753.652,00 | 9,31% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 246.348,00 | -0,12% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 4.200.000,00 | 2,09% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 4.000.000,00 | 2,00% |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 20.480.909,00 | 32,04% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 20.480.909,000 | 32,04% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.350.000,00 | 3,47% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.013.643,00 | 3,25% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024
VALOR FACTURA: $ 10.784.083,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Se realizan correciones del acta anterior y se encuentra en revision por parte de la supervision de INVIAS

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Estudios y diseños | GL | 1 |
| | | |
| | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Física | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

**IV. GESTION AMBIENTAL**

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | LA ARENA, EL TRITURADO Y EL MATERIAL PETREO SE COMPRÓ EN FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES DEBIDAMENTE PERMISADOS EN PUERTO TRIUNFO | PERMISO MINERO: | SI X | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO |
| UBICACIÓN: | EL AGUA SE COMPRÓ AL ACUEDUCTO | PERMISO MINERO: | SI N.A. | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO |

**OBSERVACIONES:** Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | X | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | X | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | X | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | X | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | X | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | NINGUNO | N/A |

**OBSERVACIONES:** se requerira en la medida de ser necesario

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

**OBSERVACIONES:**

**V. GESTIÓN SOCIAL**

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

**OBSERVACIONES:**

SE REALIZÓ REUNIÓN INICIAL DE SOCIALIZACIÓN EL 27 - 12 - 2023

**VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

Se realiza la socializacion de interventoria, topografia y presidente de junta de accion comunal para la ubicación de los niveles de rasante, sub base y concreto.
Se realiza la localizacion y replanteo de los tramos de via a intervenir.
Se instalan estacas perimetrales para identificacion de niveles de via

**VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

Se espera el inicio del trazo de la via y conformacion de sub base en ambos tramos de intervencion.

**VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**

0

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes a Estudios y diseños | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |
| Placa huella | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |
| alcantarillas | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Localizacion y replanteo de los tramos a intervenir



Instalacion de estacas perimetrales



Conformacion de la rasante

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-398578 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| CALIDAD INVIAS | **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA** | **VERSIÓN: 01** |
| | **INFORME MENSUAL No. 4** | **FECHA:1- 31 de marzo de 2024** |
| | **CONTRATO No. 4804 DEL 2023** | |

# Informe N°14. (15-21 marzo)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 21/03/2024 (Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 14 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de pavimento rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de pavimento rigido de 18cm de espesor con un ancho de via de 4 mts en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3317-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA | | |
| INTEGRANTES: | N/A | | |
| CONTRATO No. | 4804 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 14/03/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 201,333,957 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 201,333,957 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 57.596.402 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 57.596.402 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 201,333,957.00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 41.000.000,00 | 20,36% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 29.585.449,00 | 14,73% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | 11.301.551,00 | 5,63% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 41.000.000,00 | 20,36% |
| TOTAL INVERSION EJECUTADA: | $ 29.648.449,00 | 14,73% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | 11.301.551,00 | 5,63% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 22.000.000,00 | 10,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 10.894.797,00 | 5,41% |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 22.494.552,00 | 35,51% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 22.494.552,00 | 35,51% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.350.000,00 | 3,47% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.013.643,00 | 3,25% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024
VALOR FACTURA: $ 10.784.083,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada % 12,5% — Avance o Atraso Físico % 100%
Meta Física Ejecutada % 12,5%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Localizacion y reeplanteo | GBL | 111 |
| Conformacion de via | mts | 111 |
| Instalacion de bordillos | mts | 111 |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 56 | 55 | | 111 | 100,0% |
| Ejec | 56 | 55 | | 111 | 100,0% |
| Prog | 56 | 55 | | 111 | 100,0% |
| Ejec | 56 | 55 | | 111 | 100,0% |
| Prog | 15 | 0 | | 15 | 13,5% |
| Ejec | 10 | 0 | | 10 | 9,0% |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Localizacion y replanteo | Estacion y equipo topografico | 1 |
| Conformacion de rasante y sub base | Motoniveladora | 1 |
| Conformacion de sub base | Minicargador | 1 |
| Compactacion de sub base | Bistrin | 1 |
| **Total** | | 4 |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector)

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

**IV. GESTIÓN AMBIENTAL**

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | LA ARENA, TRITURADO Y MATERIALES PETREOS SE COMPRARON EN FERRETERIAS Y DEPOSITOS DE MATERIALES LEGALMENTE AUTORIZADOS DE PUERTO TRIUNFO | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | EL AGUA SE COMPRÓ EN EL ACUEDUCTO | PERMISO MINERO: | SI N.A. | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO: | SI | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO X | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO NINGUNO | N/A | |

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Se realizo la solicitud a la junta de accion comunal para el desarrollo del PAGA

OBSERVACIONES:

**V. GESTIÓN SOCIAL**

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 9 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 7 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 2 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 0 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 1 |

OBSERVACIONES:

SE HIZÓ REUNIÓN ICIAL DE SOCIALIZACIÓN EL 27 - 12 - 2023

**VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

Se inicia con la conformacion de la sub base en los tramos 1 y 2 y se procede a compactar con binitin, se presentan lluvias durante las jornadas laborales
Se inicia la instalacion de bordillos en el tramo 1.
Se realiaza la gestion para el desembolso de la tercera solicitud de transferencia para revision y aprobacion de interventoria.
Se realiza la socializacion con la veeduria de la JAC y la IAC e interventoria.

Se programa la instalacion de bordillos en los tramos 1 y 2, se tiene previsto el desembolso de la tercera solicitud de transferencia para el flujo de caja.

**VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**

0

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes a Estudios y diseños | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |
| Placa huella | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |
| alcantarillas | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**


Conformacion de la sub base en los tramos 1 y 2


Señalizacion vial e instalacion de bordillos


Socializacion con la JAC, la veeduria e interventoria, compactacion de la sub base

**NOTA** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA** | **VERSIÓN: 01** |
| | **INFORME MENSUAL No. 4** | **FECHA:1- 31 de marzo de 2024** |
| | **CONTRATO No. 4804 DEL 2023** | |

# Informe N°15. (22-28 marzo)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
**INFORME SEMANAL**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 28/03/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 15 del 22/03/2024 al 28/03/2024 — Último Informe Semanal No (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de pavimento rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de pavimento rigido de 18cm de espesor con un ancho de via de 4 mts en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3317-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4804 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 14/03/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 201.333.957 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 201.333.957 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 57.596.402 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 57.596.402 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos.)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 201.333.957,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 56.300.000,00 | 27,96% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 40.543.246,00 | 20,13% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 15.756.754,00 | 7,83% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ - | - |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 56.300.000,00 | 27,96% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 40.543.246,00 | 20,13% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 15.756.754,00 | 7,83% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: | $ 15.300.000,00 | 7,60% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 10.894.797,00 | 5,41% |

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 24.508.195,00 | 38,98% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 24.508.195,00 | 38,98% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.350.000,00 | 3,47% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.013.643,00 | 3,25% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: $ 14.608.430,00
PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024
VALOR FACTURA: $ 10.784.083,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25% — Avance o Atraso Físico % 100%
Meta Física Ejecutada % 25%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | instalacion de bordillos | mts | 111 |
| 2 | Ensayo de densidad y proctor modificado. | und | 2 |
| 3 | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 46 | 20 | | 66 | 59,5% |
| Ejec | 33 | 10 | | 43 | 38,7% |
| Prog | 1 | 1 | | 2 | 100,0% |
| Ejec | 1 | 1 | | 2 | 100,0% |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| instalacion de bordillos | Herramienta menor | 1 |
| ensayo de densidad y proctor | equipo de densidades | 1 |
| | | |
| | | |
| Total | | 2 |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | LA ARENA, TRITURADO Y MATERIAL PETREO FUERON COMPRADOS EN FERRETERIASN Y DEPOSITOS DE MATERIALES LEGALMENTE AUTORIZADOS DE PUERTO TRIUNFO | PERMISO MINERO: | SI X | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO |
| UBICACIÓN: | EL AGUA SE COMPRO AL ACUEDUCTO | PERMISO MINERO: | SI N.A. | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO |

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO X | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO X | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO X | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO NINGUNO | N/A | |

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Se realizo la solicitud a la junta de accion comunal para el desarrollo del PAGA

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 9 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 7 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 2 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 0 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 1 |

OBSERVACIONES:
SE REALIZÓ REJUNION INICIAL DE SOCIALIZACIÓN

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la instalacion de bordillos en el tramo uno.
se realiza el ensayo de densidades y proctor modificado para determinar el porcentaje de compactacion de la sub base en los dos tramos.
se realiza el desembolso de la solicitud de transferencia #4.
se recibe la vaita para su proxima instalacion

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la terminacion de la instalacion de bordillos en el sector dos para dar inicio al vaciado del concreto, La interventoria solicita a la junta de accion comunal enviar la solicitud de transferencia #4 para proximo desembolso.

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


ENSAYO DE DENSIDAD Y TOMA DE MUESTRA PARA EL ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO


INSTALACION DE BORDILLOS EN EL TRAMO 1


INSTALACION DE BORDILLOS EN EL TRAMO 2

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-39579 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA** | **VERSIÓN: 01** |
| | **INFORME MENSUAL No. 4** | **FECHA:1- 31 de marzo de 2024** |
| | **CONTRATO No. 4804 DEL 2023** | |

Informe N°16. (29 mar- 4 abril)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 4/04/2024<br>(Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 16 del 29/03/2024 al 4/04/2024 Último Informe Semaral Si (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL L MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de pavimento rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de pavimento rigido de 18cm de espesor con un ancho de via de 4 mts en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3317-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

INTEGRANTES: N/A

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4804 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 14/03/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 201,333,957 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 201,333,957 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 57,596,402 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ - | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 57,596,402 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 201,333,957,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 78.900.000,00 | 39,18% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 62.332.841,00 | 30,96% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 16,567,159,00 | 8,23% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 78.900.000,00 | 39,18% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 62.332.841,00 | 30,96% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ 16,567,159,00 | -8,23% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: | $ 22.600.000,00 | 11,23% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: | $ 21.789.595,00 | 10,82% |

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 26.521.842,00 | 42,46% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 26.521.842,00 | 42,46% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.350.000,00 | 3,47% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.013.643,00 | 3,25% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: FEBRERO 2024

VALOR FACTURA: $ 10.784.083,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada %: 35% — Avance o Atraso Físico %: -5%

Meta Física Ejecutada %: 30%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Instalacion de bordillos | mts | 111 |
| | | |
| | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | 0 | 20 | | 20 | 100,0% |
| Ejec | 0 | 15 | | 15 | 75,0% |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Instalacion de bordillos | Herramienta manual | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 1 |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

**IV. GESTION AMBIENTAL**

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | LA ARENA, EL TRITURADO Y EL MATERIAL PETREO FUERON COMPRADOS EN FERRETERIAS Y DEPOSITOS DE MATERIALES LEGALMENTE AUTORIZADOS EN PUERTO TRIUNFO | PERMISO MINERO: | SI X | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO |
| UBICACIÓN | EL AGUA FUE COMPRADA AL ACUEDUCTO | PERMISO MINERO: | SI N/A | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO |

**OBSERVACIONES:** Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | X | NA |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | X | NA |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | X | NA |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | X | NA |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | X | NA |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | X | NA |
| EMISIONES: | SI | | NO | X | NA |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | NINGUNO | NA |

**OBSERVACIONES:** se requerira en la medida de ser necesario

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: Se realizo la solicitud a la junta de accion comunal para el desarrollo del PAGA

**OBSERVACIONES:**

**V. GESTIÓN SOCIAL**

| | OBRA | INTER. |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 9 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 7 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 2 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 1 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 0 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 1 |

**OBSERVACIONES:**

SE REALIZO REUNION INICIAL DE SOCIALIZACIÓN

**VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

Se continua con la instalacion de bordillos en el tramo 2,Se presentan lluvias durante las jornadas laborales.
La interventoria envia la solicitud de transferencia #4 al banco para su desembolso.
La interventoria solicita a la junta de accion comunal por correo tener en cuenta las indicaciones y observaciones que se les realizo para el diseño vigente del proyecto.

**VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

se espera finalizar la instalacion de bordillos en una de las caras del tramo dos y finalizar la instalacion de bordillos en el tramo 1 para dar inicio al vaciado del concreto.

**VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**

0

| | | |
|---|---|---|
| Ajustes a Estudios y diseños | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |
| Placa huella | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |
| alcantarillas | 0 | Programado |
| | 0 | Ejecutado |

El esquema grafico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



REPLANTEO E INSTALACION DE BORDILLOS



REPLANTEO E INSTALACION DE BORDILLOS



REGISTRO FOTOGRAFICO CON LA VALLA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:

NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Matrícula Profesional No.: 68202-39679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

Se describe el estado actual de los equipos y maquinaria a utilizar en este periodo comprendido entre el 1- 31 de marzo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 denominado “Maquinaria y equipo convenio obra”.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 9/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** mar-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONVENIO No.** 3317-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4804-2023 **INTERVENTORÍA:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Motoniveladora | CATERPILLAR 120G - 2015 | 3,7 M | PTO PERALES | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Binitin | KUBOTA - 2018 | 1 TON | PTO PERALES | | | | | | | | | | | | | | | | R | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 2 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 2 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):** El binitin despues del transporte llega con fallas mecanicas que no permitieron tener el equipo operativo, se le compra bateria nueva y se le cambia la instalacion y queda operativo.

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT


Firma
Nombre: GABRIEL MARIO VESGA MEJIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0568545 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.3 PERSONAL CONVENIO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra en el periodo comprendido entre 1-31 de marzo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 denominado “Personal del contratista de obra”.

En el presente período se reporta solo el personal mínimo requerido.

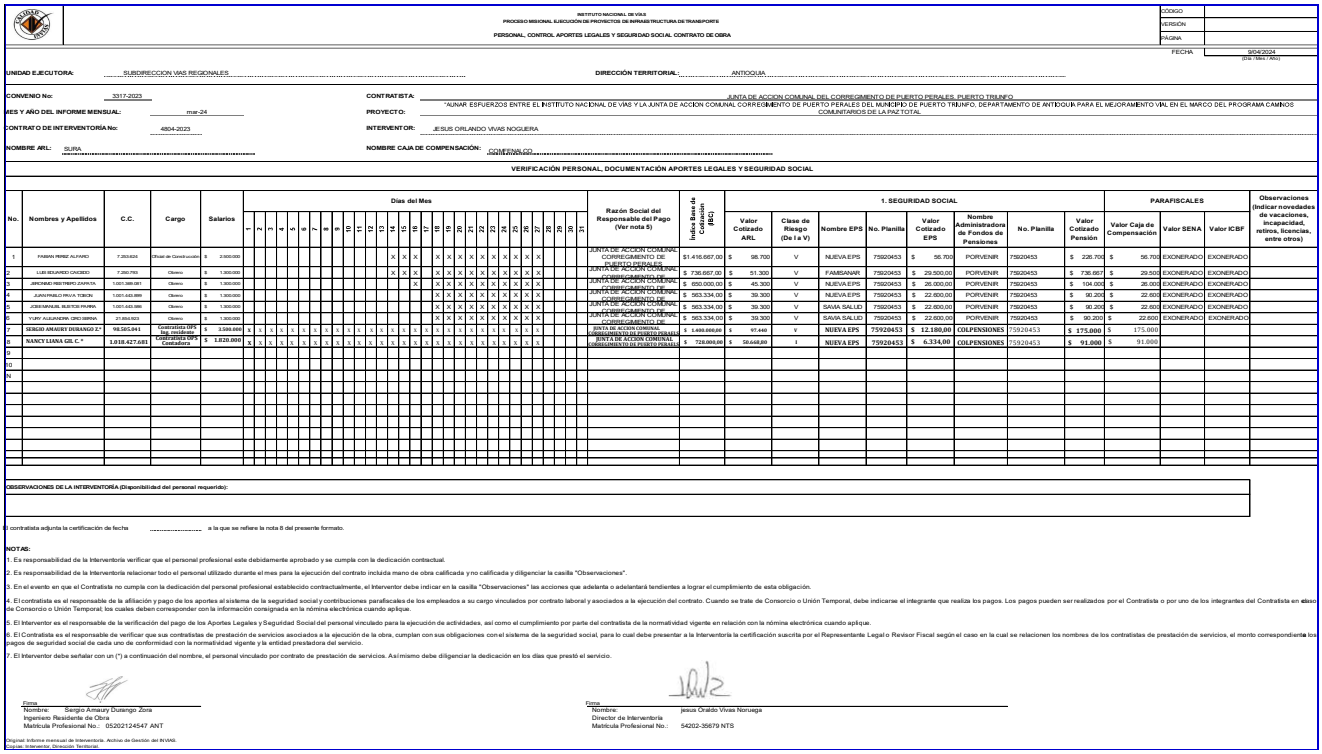

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 9/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA
CONVENIO No: 3317-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24
PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4804-2023
INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
NOMBRE ARL: SURA
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Ingreso Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIAN PEREZ ALPARO | 7.253.624 | Oficial de Construcción | $ 2.500.000 | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 1.416.667,00 | $ 98.700 | V | NUEVA EPS | 75920453 | $ 56.700 | PORVENIR | 75920453 | $ 226.700 | $ 56.700 | EXONERADO | EXONERADO | |
| 2 | LUIS EDUARDO CACERES | 7.260.793 | Obrero | $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 736.667,00 | $ 51.300 | V | FAMISANAR | 75920453 | $ 29.500,00 | PORVENIR | 75920453 | $ 736.667 | $ 29.500 | EXONERADO | EXONERADO | |
| 3 | JERONIMO RESTREPO ZAPATA | 1.001.389.081 | Obrero | $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 650.000,00 | $ 45.300 | V | NUEVA EPS | 75920453 | $ 26.000,00 | PORVENIR | 75920453 | $ 104.000 | $ 26.000 | EXONERADO | EXONERADO | |
| 4 | JUAN PABLO PAVA TOBON | 1.001.443.899 | Obrero | $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 563.334,00 | $ 39.300 | V | NUEVA EPS | 75920453 | $ 22.600,00 | PORVENIR | 75920453 | $ 90.200 | $ 22.600 | EXONERADO | EXONERADO | |
| 5 | JOSE MANUEL BUITRON PARRA | 1.001.443.388 | Obrero | $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 563.334,00 | $ 39.300 | V | SAVIA SALUD | 75920453 | $ 22.600,00 | PORVENIR | 75920453 | $ 90.200 | $ 22.600 | EXONERADO | EXONERADO | |
| 6 | YURY ALEJANDRA ORO SIERRA | 21.554.923 | Obrero | $ 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 563.334,00 | $ 39.300 | V | SAVIA SALUD | 75920453 | $ 22.600,00 | PORVENIR | 75920453 | $ 90.200 | $ 22.600 | EXONERADO | EXONERADO | |
| 7 | SERGIO AMAURY DURANGO Z.* | 98.581.941 | Contratista OPS Ing. residente | $ 3.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 1.400.000,00 | $ 97.440 | V | NUEVA EPS | 75920453 | $ 12.180,00 | COLPENSIONES | 75920453 | $ 175.000 | $ 175.000 | | | |
| 8 | NANCY LIANA GIL C * | 1.018.427.681 | Contratista OPS Contadora | $ 1.820.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 728.000,00 | $ 50.648,00 | I | NUEVA EPS | 75920453 | $ 6.334,00 | COLPENSIONES | 75920453 | $ 91.000 | $ 91.000 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520212454 7 ANT

Firma
Nombre: jesus Oraldo Vivas Noruega
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

## PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 811017456-1 | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | CALLE 19 20 75 CORR DE PUERTO PERALES | 3118478863 | j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | OBRAS CIVILES | 002 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 6 | 0 |
| 2024-04 | 2024-03 | E | | 75920453 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.392.400 | |

### TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830113564-7 | 29.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 103.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.300 | 3 |
| EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900604350-9 | 46.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.300 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 719.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 719.200 | 6 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 313.200 | | | | 313.200 | 0 | 0 | 313.200 | | | 3.132 | 313.200 | 6 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 6 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 3 | 180.000 | 180.000 |
| Pensión | 1 | 719.200 | 719.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 313.200 | 313.200 |
| CCF | 1 | 180.000 | 180.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 1.392.400 | 1.392.400 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2


| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 811017456-1 | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | CALLE 19 20 75 CORR DE PUERTO PERALES | 3118478863 | j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | OBRAS CIVILES | 002 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 6 | 0 |
| 2024-04 | 2024-03 | E | | 75920453 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $1.392.400 | |


### DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Exterior | Ing | Clase de Aportante | IGE | LMA | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1001380081 | RESTREPO ZAPATA JERONIMO | 1 | 0 | | S | X | | | | | | | | | | | 230301 | 650.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 650.000 | 26.000 | 14-11 | 650.000 | 5 | 45.300 | CCF03 | 650.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1001440595 | BUSTOS PARRA JOSE MANUEL | 1 | 0 | | S | X | | | | | | | | | | | 230301 | 563.334 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS040 | 563.334 | 22.600 | 14-11 | 563.334 | 5 | 39.300 | CCF03 | 563.334 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1001443899 | PAVA TOBON JUAN PABLO | 1 | 0 | | S | X | | | | | | | | | | | 230301 | 563.334 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 563.334 | 22.600 | 14-11 | 563.334 | 5 | 39.300 | CCF03 | 563.334 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 21854923 | CIRO SERNA YURI ALEJANDRA | 1 | 0 | | S | X | | | | | | | | | | | 230301 | 563.334 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS040 | 563.334 | 22.600 | 14-11 | 563.334 | 5 | 39.300 | CCF03 | 563.334 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 7250793 | CACEDO LUIS EDUARDO | 1 | 0 | | S | X | | | | | | | | | | | 230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 736.667 | 29.500 | 14-11 | 736.667 | 5 | 51.300 | CCF03 | 736.667 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 7253624 | PEREZ ALFARO FABIAN | 1 | 0 | | S | X | | | | | | | | | | | 230301 | 1.416.667 | 226.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.416.667 | 56.700 | 14-11 | 1.416.667 | 5 | 96.700 | CCF03 | 1.416.667 | 56.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA

Se describe el estado actual financiero del contrato de obra en el periodo comprendido entre el 1-31 de marzo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 denominado “Informe financiero y presupuestal del contrato de obra”. Adicionalmente se resalta que no aplica para este convenio, sin embargo, se adjunto desembolso generado en el mes.

**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL**
**CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES**
**NIT: 811.017.456-1**
Personería jurídica No. 075 de 14-10-1971
Auto de Reconocimiento No. 4465 del 08-06-2022
ID: 504

Corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), 23 de marzo de 2024

Señores
**BANCO AV VILLAS**
Oficina de Rionegro

**Ref: Solicitud de Transferencias vía ACH Cuenta No. 02.**

Respetados Señores:

Con la presente solicito efectuar las siguientes transacciones vía ACH debitando de nuestra cuenta corriente así:

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES<br>Programa "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" – INVIAS |
| NIT: | 811.017.456-1 |
| CUENTA CORRIENTE: | 139011660 |

Transferir a:

| ÍTEM | BANCO | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA | NOMBRE DEL TITULAR | NIT/C.C | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bancolombia | Ahorros | 254-115188-44 | J.A.C Corregimiento de Puerto Perales | 811.017.456-1 | $ 399.000 |
| 2 | Bancolombia | Ahorros | 254-115188-44 | J.A.C Corregimiento de Puerto Perales | 811.017.456-1 | $ 780.000 |
| 3 | Bancolombia | Ahorros | 254-115188-44 | J.A.C Corregimiento de Puerto Perales | 811.017.456-1 | $ 28.000 |
| 4 | Bancolombia | Ahorros | 254-656806-12 | Sergio Amoury Durango Zora | 98.505.041 | $ 3.115.000 |
| 5 | Bancolombia | Ahorros | 254-656806-12 | Sergio Amoury Durango Zora | 98.505.041 | $ 7.292.996 |
| 6 | Bancolombia | Ahorros | 366-000229-16 | Carlos Mario Castrillón Bahos | 1.001.443.137 | $ 1.000.000 |
| 7 | Bancolombia | Ahorros | 556-236784-90 | Yeny Maritza Zuluaga Quintero | 39.452.328 | $ 265.500 |
| 8 | Bancolombia | Ahorros | 254-543680-28 | Sandra Milena Bustamante Zabala | 21.849.508 | $ 500.000 |
| 9 | Bancolombia | Ahorros | 10-5374001-04 | Giovanny Alexander Cartagena Yarce | 71.755.151 | $ 190.000 |
| 10 | Bancolombia | Ahorros | 397-367405-44 | Daniel Antonio Maco Ceballos | 3.580.357 | $ 6.435.000 |
| SUMA TOTAL | | | | | | $ 20.005.495 |

Por favor asociar las cuentas para efectuar la transacción. Lo anterior, en razón a que no contamos con portal empresarial ni otro medio de manejo.

Atentamente,

Firmas autorizadas:

ÉDGAR ÁLVARO MACÍAS QUINTANA
Presidente J.A.C. Puerto Perales

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría

Calle 19 No. 20-75 Parque Principal
Corregimiento de Puerto Perales, Municipio de Puerto Triunfo – Antioquia
Celular: 311-3457308
E-mail: j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com

## 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el 1 - 31 marzo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONVENIO No:** 3317 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE PUERTO PERALES, CORREGIMIENTO PUERTO TRIUNFO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** mar-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4804-2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 715 |
| Lluvias moderadas | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | | | | 4 | 4 | | 1 | | 1 | | 29 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total horas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 744 |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:** El registro del IDEAM no contiene informacion aun del mes en mension.

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT

Firma
Nombre: Gabriel Mario Vesga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0568545 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo se realizo el ensayo de densidad y Proctor modificado, estos resultados serán entregados en el mes de abril ya que este ensayo se realizo el día 23 de marzo.

## 4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS del contrato de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONVENIO No.** 3317-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, MPIO DE PTO TRIUNFO

**OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

**FECHA DE INICIO:** 12/12/2023
**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/04/2024 (Incluye prorrogas y suspensiones)
**VALOR INICIAL:** $ 201.333.957,00
**VALOR ACUMULADO:** $ 201.333.957,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.266.791,40 | 13/09/2023 | 31/10/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.066.697,85 | 13/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.400.187,10 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100284287
**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 1/12/2023

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | | |
| Predio, labores y operaciones. | | $ 232.000.000,00 | 13/09/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | | | | |
| Vehiculos propios y no propios | | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE** 100069231 **OTRAS PÓLIZAS No.**
**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A
**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 1/12/2023

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.266.791,40 | 13/09/2023 | 1/03/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.066.697,85 | 13/09/2023 | 30/04/2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.400.187,10 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100284027
**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 04/12/2023

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | | |
| Predio, labores y operaciones. | | $ 260.000.000,00 | 13/09/2023 | 30/04/2024 |
| Patronal | | | | |
| Vehiculos propios y no propios | | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE** 100069231 **OTRAS PÓLIZAS No.**
**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A
**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 04/12/2023

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA

Nota: A la fecha no se ha entregado los documentos del plan de calidad por parte del contratista de obra a la interventoría.

## 4.9 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

Hasta el momento hemos avanzado en la localización y replanteo de los tramos, la conformación de la sub base e instalación de bordillos, llevamos un buen avance de obra de acuerdo al cronograma de obra con un 51% de avance de obra hasta el momento.

OBJETO : CONVENIO SOLIDARIO PUERTO PITA N. 4398-2023 objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".


| ACTIVIDADES | | | | CRONOGAMA FISICO OBRA DE 1,5 MESES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MARZO | % REAL | %PONDERADO | | % REAL | %PONDERADO | | | |
| METROS DE MEJORAMIENTO L= 120 MT | | | | 18-24 MARZO | | | 25-31 MARZO | | | 1-7 ABRIL | 8-14 ABRIL | 15-21 ABRIL |
| | PAVIMENTO RIGIDO E=18CM | UNIDAD | CANTIDAD | | | | | | | | | |
| 1 | Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m | m3 | 18,75 | 18,8 | 100% | 15% | 0,0 | 0% | 0% | | | |
| 2 | Conformación de la calzada existente | m2 | 756,00 | 756,0 | 100% | 15% | 0,0 | | | | | |
| 3 | Subbase Granular Clase C. | m3 | 118,44 | 118,4 | 100% | 10% | 0,0 | | | | | |
| 4 | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y | M3/KM | 3.171,00 | 2536,8 | 80% | 4% | 0,0 | | | | | |
| 5 | Pavimento en concreto hidráulico, MR 4.2 Mpa, Tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones), formaleta | m3 | 106,60 | | | | | | | | | |
| 6 | Bordillo prefabricado A-80 | ml | 252,00 | 60 | 24% | 4% | 60 | 20% | 3% | | | |
| 7 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | KG | 1.055,30 | | | | | | | | | |
| | EJECUTADO REAL | | | | | 48% | | | 3% | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL AVANCE A LA FECHA | 51% |
| EJECUCION PRESUPUESTAL A LA FECHA | 15% |

ING. SERGIO DURANGO

## 4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2, correspondiente al SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES del convenio de obra.

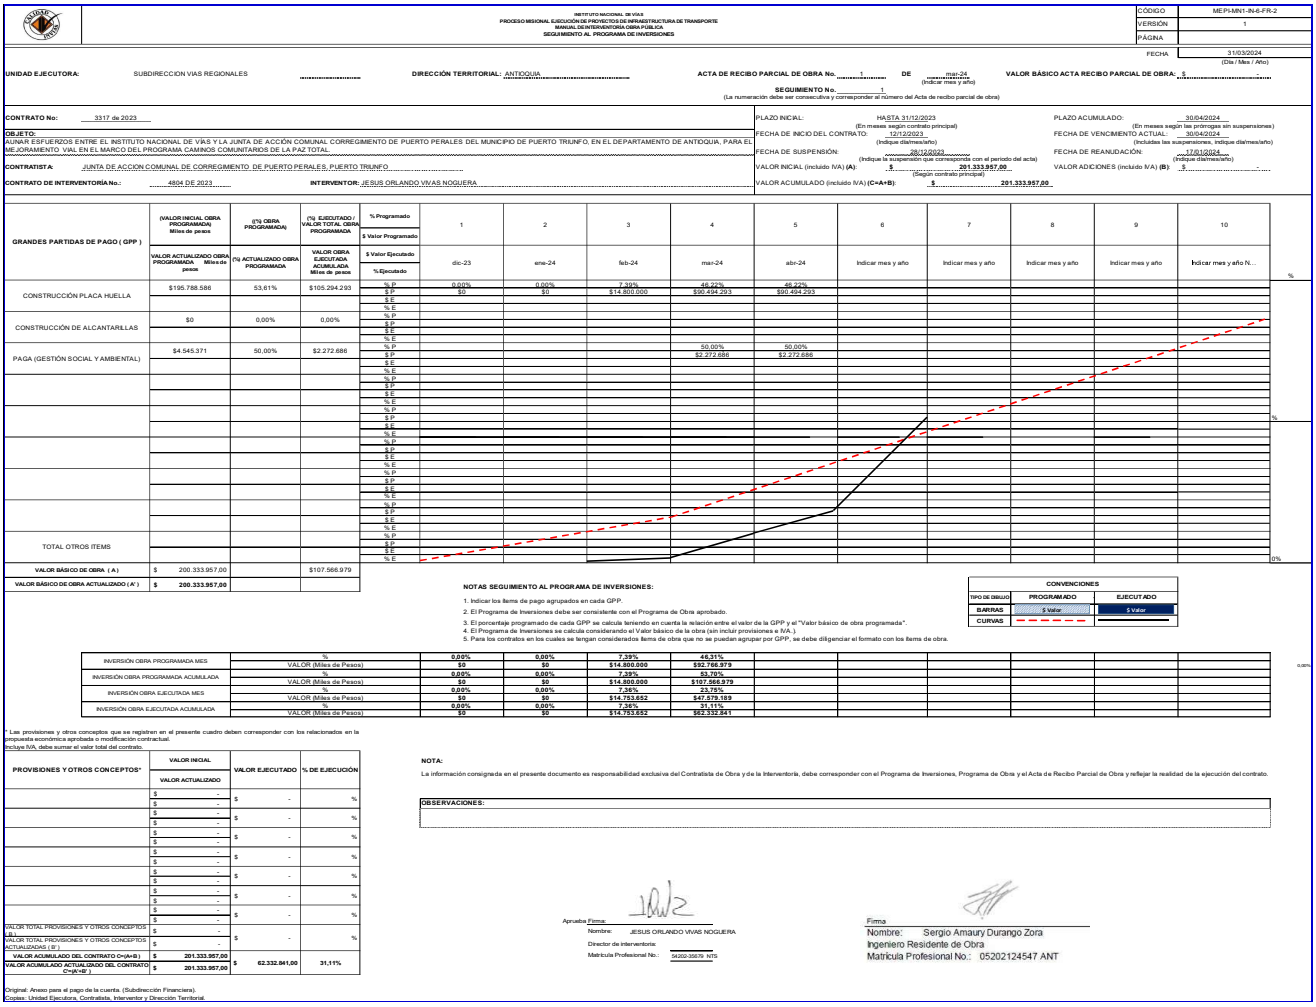

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA:
FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 DE mar-24 (Indicar mes y año) — VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -
SEGUIMIENTO No. 1 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3317 de 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804 DE 2023 — INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 201.333.957,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 201.333.957,00
PLAZO ACUMULADO: 30/04/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA) | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año N... |
| CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA | $195.788.586 | 53,61% | $105.294.293 | % P | 0,00% | 0,00% | 7,39% | 46,22% | 46,22% | | | | | |
| | | | | $ P | $0 | $0 | $14.800.000 | $90.494.293 | $90.494.293 | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS | $0 | 0,00% | 0,00% | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) | $4.545.371 | 50,00% | $2.272.686 | % P | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | |
| | | | | $ P | | | | $2.272.686 | $2.272.686 | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 200.333.957,00 | | $107.566.979 | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 200.333.957,00 | | | | | | | | | | | | | |

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA ).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 7,39% | 46,31% | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $14.800.000 | $92.758.979 | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 7,39% | 53,70% | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $14.800.000 | $107.566.979 | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 0,00% | 0,00% | 7,36% | 23,75% | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $14.753.652 | $47.579.189 | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0,00% | 0,00% | 7,36% | 31,11% | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $0 | $0 | $14.753.652 | $62.332.841 | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | | | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) | $ 201.333.957,00 | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B' ) | $ 201.333.957,00 | $ 62.332.841,00 | 31,11% |

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de interventoría:
Matrícula Profesional No.: 54202-35670 NTS

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520124547 ANT


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


## 5. Anexos

### 5.1 Relación de correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia y fecha de recibo.

Los anexos de correspondencia estarán en un archivo pdf dentro de la carpeta correspondencia con su respectivo cuadro de envío y recibido.


### 5.2 Copia de la bitácora del mes correspondiente.

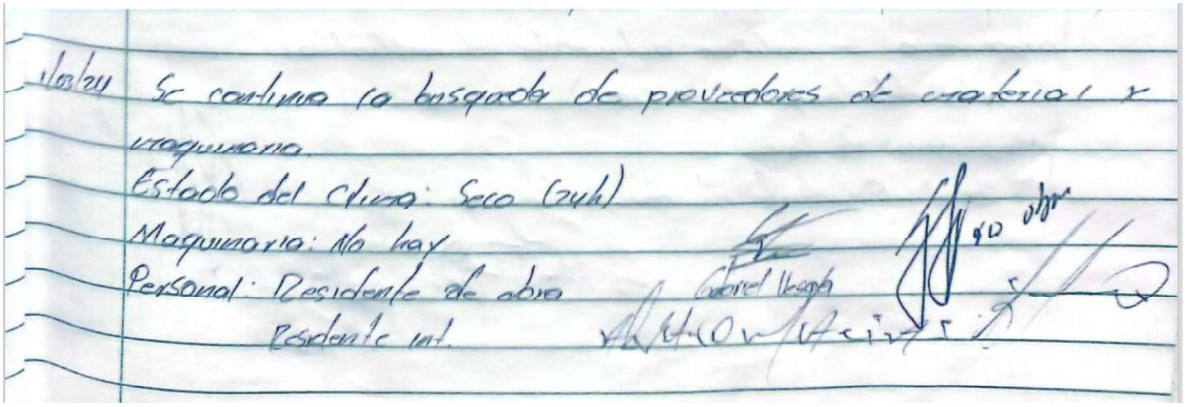

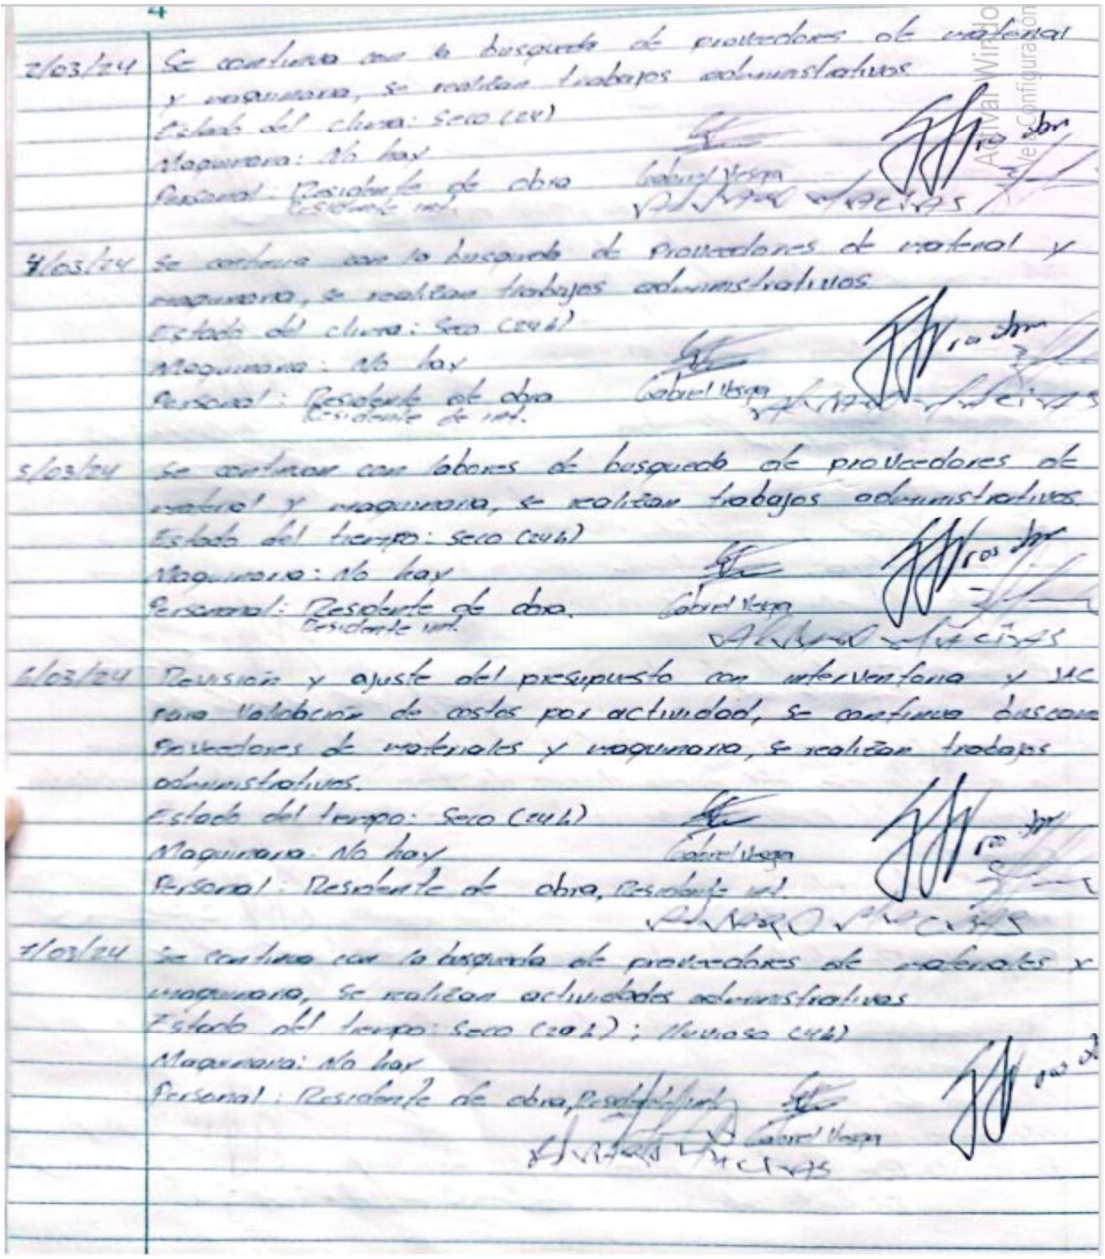

4

| | |
|---|---|
| 2/03/24 | Se continua con la busqueda de proveedores de material y maquinaria, se realizan trabajos administrativos. Estado del clima: Seco (24) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra Residente ind. Gabriel Vega |
| 4/03/24 | Se continua con la busqueda de proveedores de material y maquinaria, se realizan trabajos administrativos. Estado del clima: Seco (24) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra Residente de ind. Gabriel Vega |
| 5/03/24 | Se continua con labores de busqueda de proveedores de material y maquinaria, se realizan trabajos administrativos. Estado del tiempo: Seco (24) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra. Residente ind. Gabriel Vega |
| 6/03/24 | Revision y ajuste del presupuesto con interventoria y VC para Validacion de costos por actividad, se continua buscando Proveedores de materiales y maquinaria, se realizan trabajos administrativos. Estado del tiempo: Seco (24) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente ind. Gabriel Vega |
| 7/03/24 | se continua con la busqueda de proveedores de materiales y maquinaria, se realizan actividades administrativas Estado del tiempo: Seco (20.2); Nuboso (24) Maquinaria: No hay Personal: Residente de obra, Residente ind. Gabriel Vega |

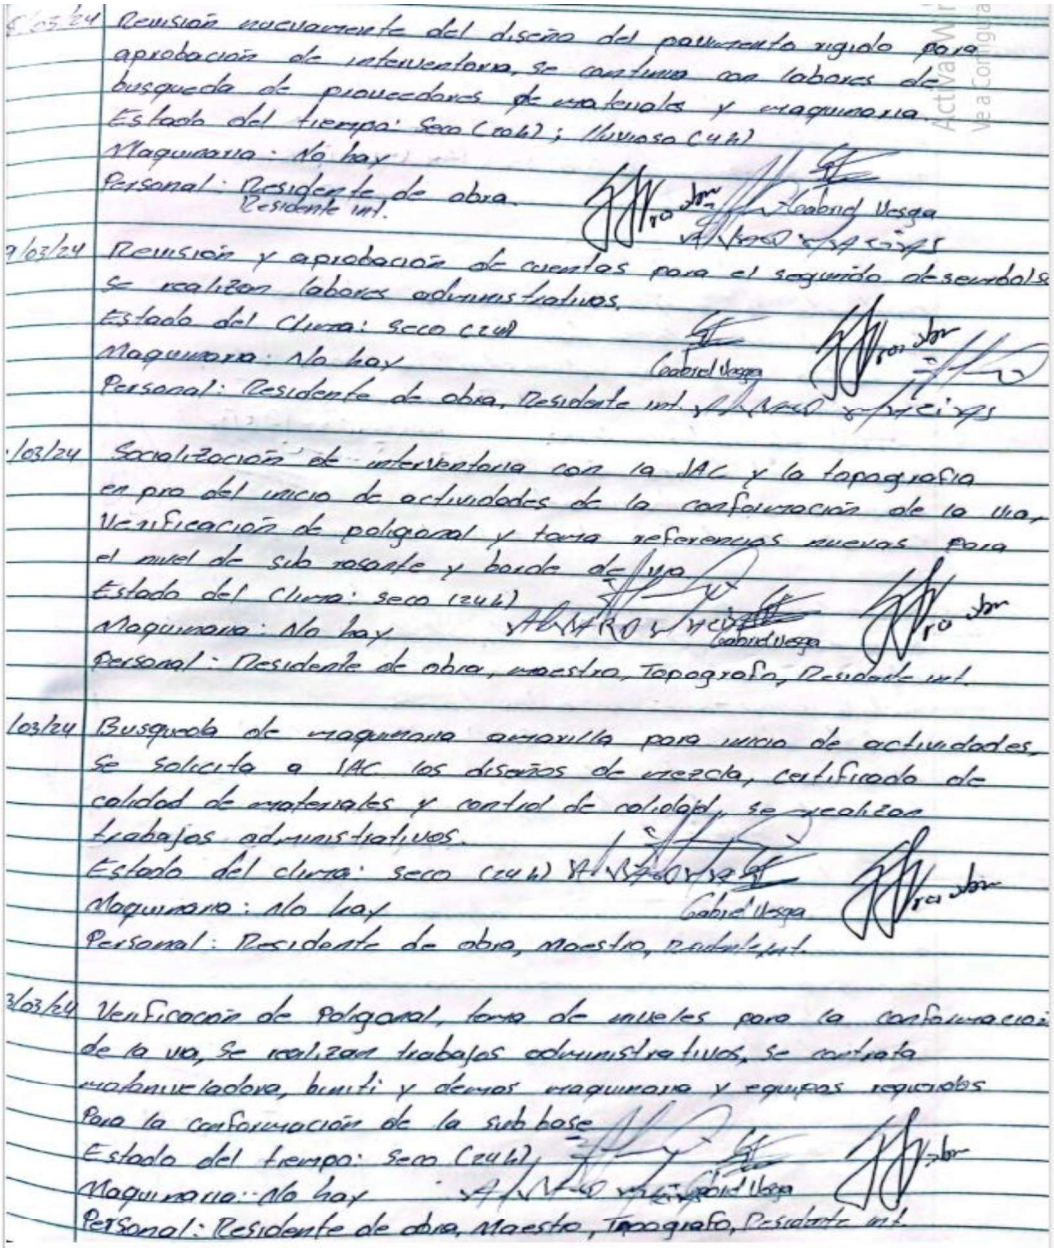


5/03/24 Revisión nuevamente del diseño del pavimento rígido para aprobación de interventoría, se continua con labores de búsqueda de proveedores de materiales y maquinaria.
Estado del tiempo: Seco (24h); Nuboso (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra. Residente int.

7/03/24 Revisión y aprobación de cuentas para el seguido desembolso se realizan labores administrativas.
Estado del Clima: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Residente int.

8/03/24 Socialización de interventoría con la JAC y la topografía en pro del inicio de actividades de la conformación de la vía, Verificación de poligonal y toma referencias nuevas para el nivel de sub rasante y borde de vía
Estado del Clima: seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, maestro, Topografo, Residente int.

10/03/24 Busqueda de maquinaria amarilla para inicio de actividades, Se solicita a JAC los diseños de mezcla, calificado de calidad de materiales y control de calidad, se realizan trabajos administrativos.
Estado del clima: seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Maestro, Residente int.

11/03/24 Verificación de Poligonal, toma de niveles para la conformación de la vía, Se realizan trabajos administrativos, se contrata motoniveladora, bulli y demas maquinaria y equipos requeridos para la conformación de la sub base
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Maestro, Topografo, Residente int.

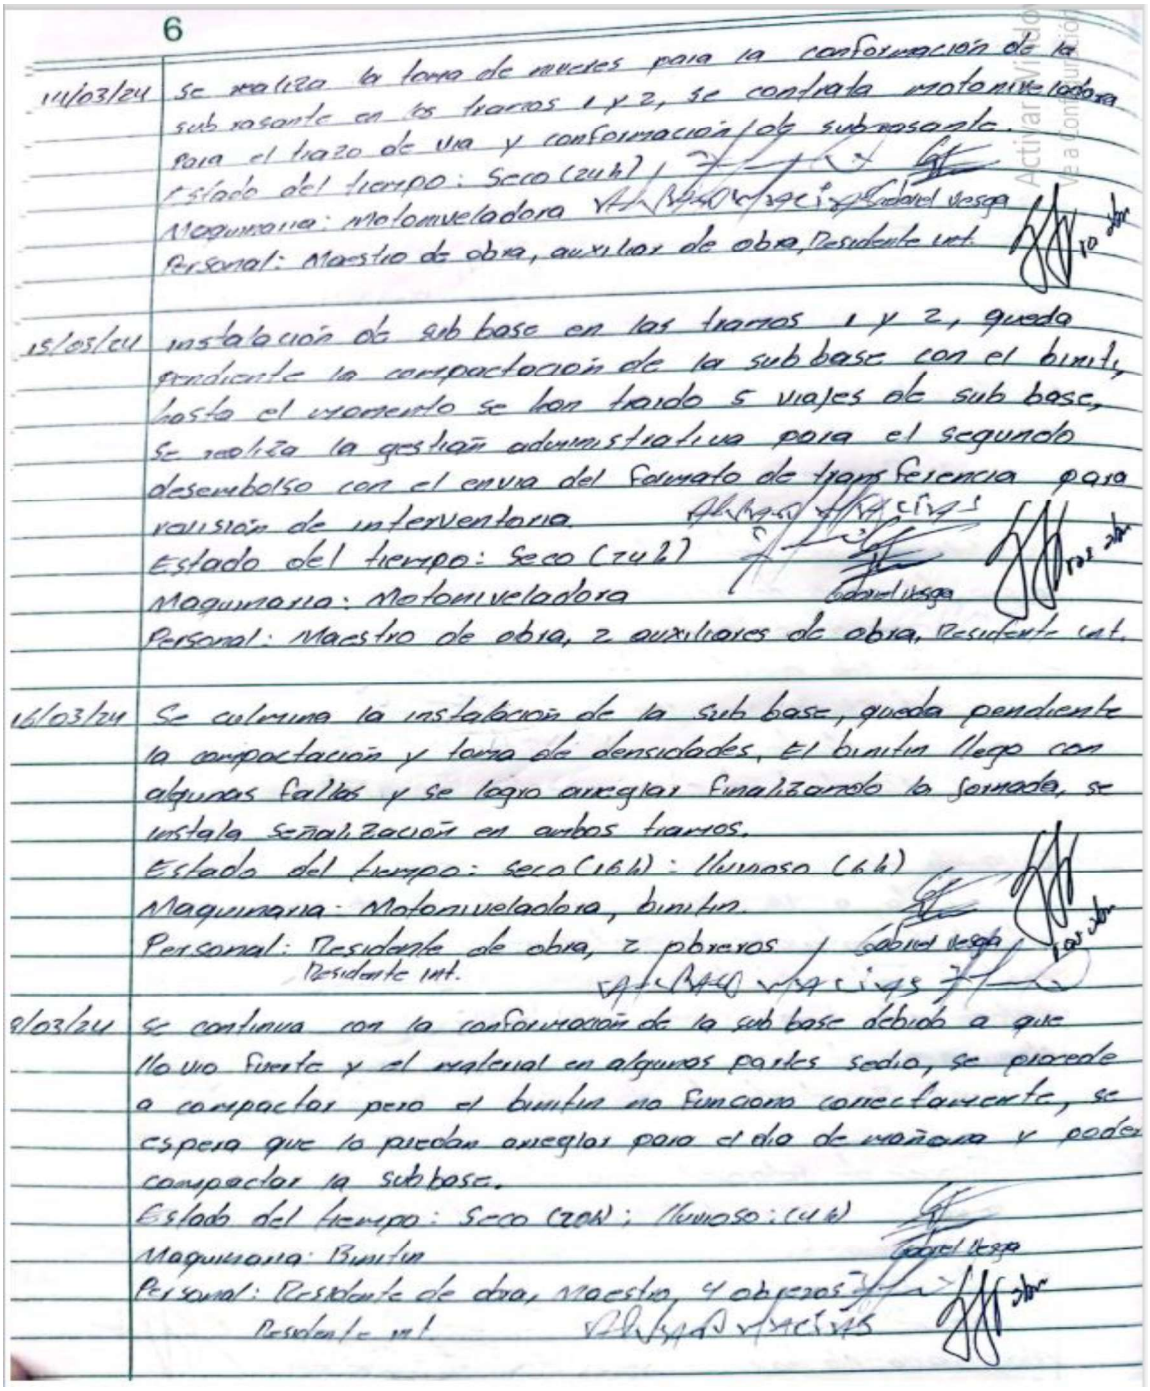


6

11/03/24 Se realiza la toma de niveles para la conformación de la subrasante en los tramos 1 y 2, se contrata motoniveladora para el tiraze de una y conformación de la subrasante.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Motoniveladora
Personal: Maestro de obra, auxiliar de obra, Residente int.

15/03/24 instalación de sub base en los tramos 1 y 2, queda pendiente la compactación de la sub base con el bimtin, hasta el momento se han tirado 5 viajes de sub base, se realiza la gestión administrativa para el segundo desembolso con el envio del formato de transferencia para revisión de interventoria
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Motoniveladora
Personal: Maestro de obra, 2 auxiliares de obra, Residente int.

16/03/24 Se culmina la instalación de la sub base, queda pendiente la compactación y toma de densidades, El bimtin llego con algunas fallas y se logro arreglar finalizando la jornada, se instala señalización en ambos tramos.
Estado del tiempo: seco (16h) : Lluvioso (6h)
Maquinaria: Motoniveladora, bimtin.
Personal: Residente de obra, 2 obreros y Residente int.

9/03/24 Se continua con la conformación de la sub base debido a que llovio fuerte y el material en algunos partes sedio, se procede a compactar pero el bimtin no funciona correctamente, se espera que lo puedan arreglar para el dia de mañana y poder compactar la sub base.
Estado del tiempo: Seco (20h) ; Lluvioso: (4h)
Maquinaria: Bimtin
Personal: Residente de obra, Maestro, 4 obreros
Residente int

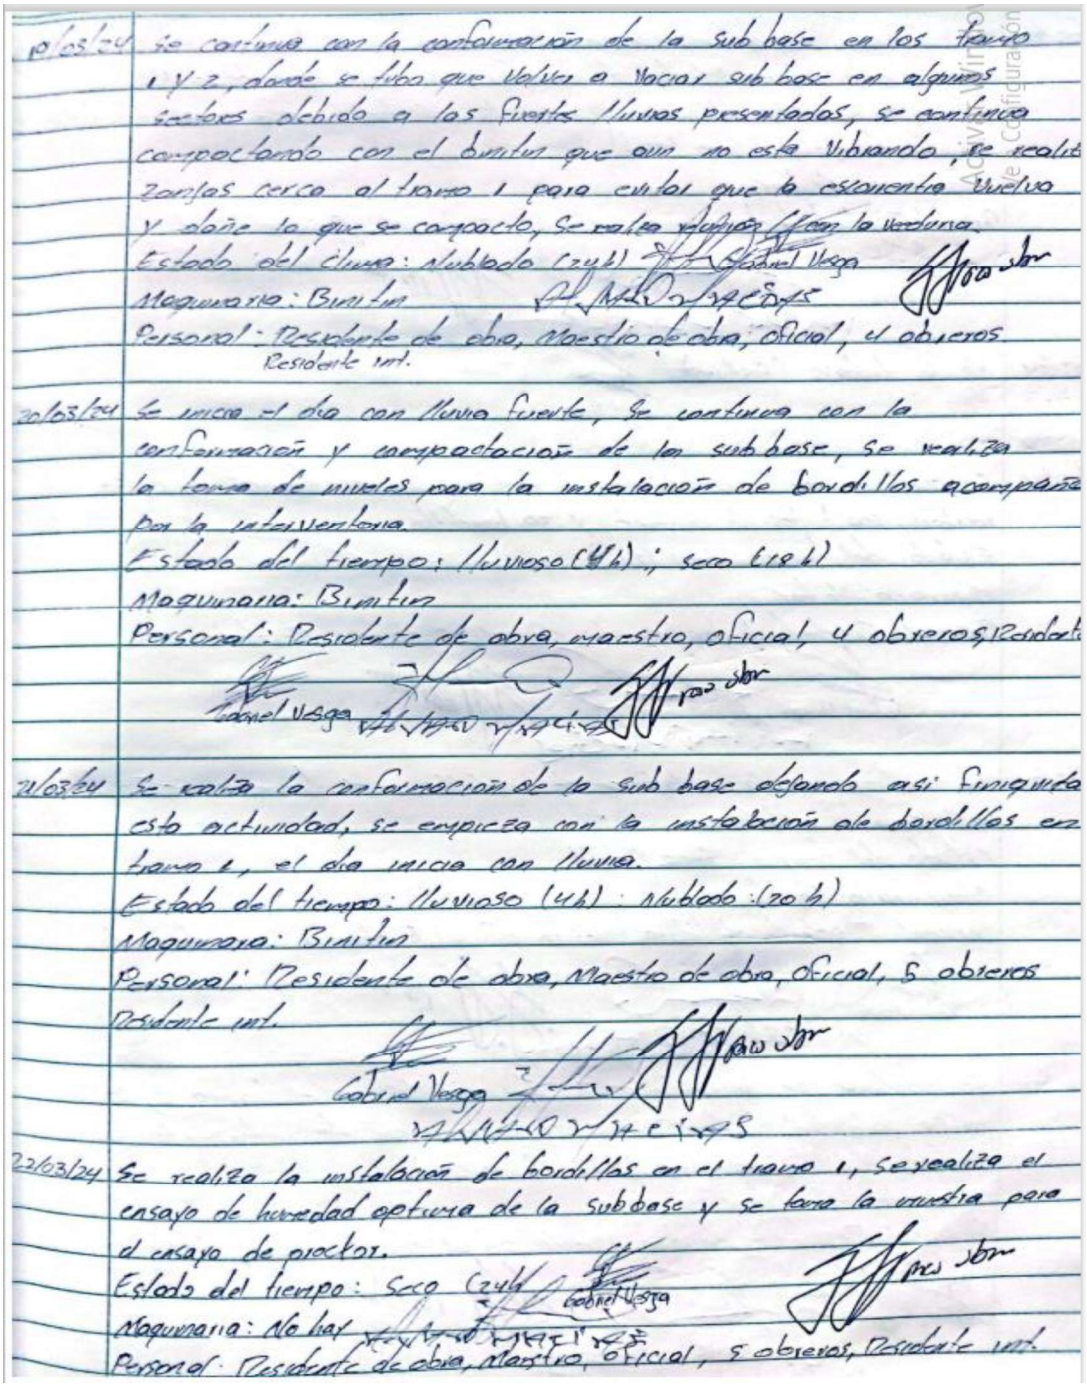

20/03/24 Se continua con la conformación de la sub base en los tramo 1 y 2, donde se tuvo que volver a tocar sub base en algunos sectores debido a las fuertes lluvias presentadas, se continua compactando con el bimtin que aun no esta vibrando, se realiza zanjas cerca al tramo 1 para evitar que la estancada vuelva y dañe lo que se compacto, se retira [illegible] con la volqueta.
Estado del clima: Nublado (7yh) Gabriel Vega
Maquinaria: Bimtin
Personal: Residente de obra, Maestro de obra, oficial, 4 obreros
Residente int.

20/03/24 Se inicia el dia con lluvia fuerte, se continua con la conformación y compactación de la sub base, se realiza la toma de niveles para la instalación de bordillos acompañado por la interventoria.
Estado del tiempo: lluvioso (4h); seco (10h)
Maquinaria: Bimtin
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros, Residente


Gabriel Vega

21/03/24 Se realiza la conformación de la sub base dejando asi finiquitada esta actividad, se empieza con la instalación de bordillos en tramo 1, el dia inicia con lluvia.
Estado del tiempo: lluvioso (4h) : Nublado (20h)
Maquinaria: Bimtin
Personal: Residente de obra, Maestro de obra, oficial, 5 obreros
Residente int.

Gabriel Vega

22/03/24 Se realiza la instalación de bordillos en el tramo 1, se realiza el ensayo de humedad optima de la sub base y se toma la muestra para el ensayo de proctor.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Maestro, oficial, 5 obreros, Residente int.

Gabriel Vega

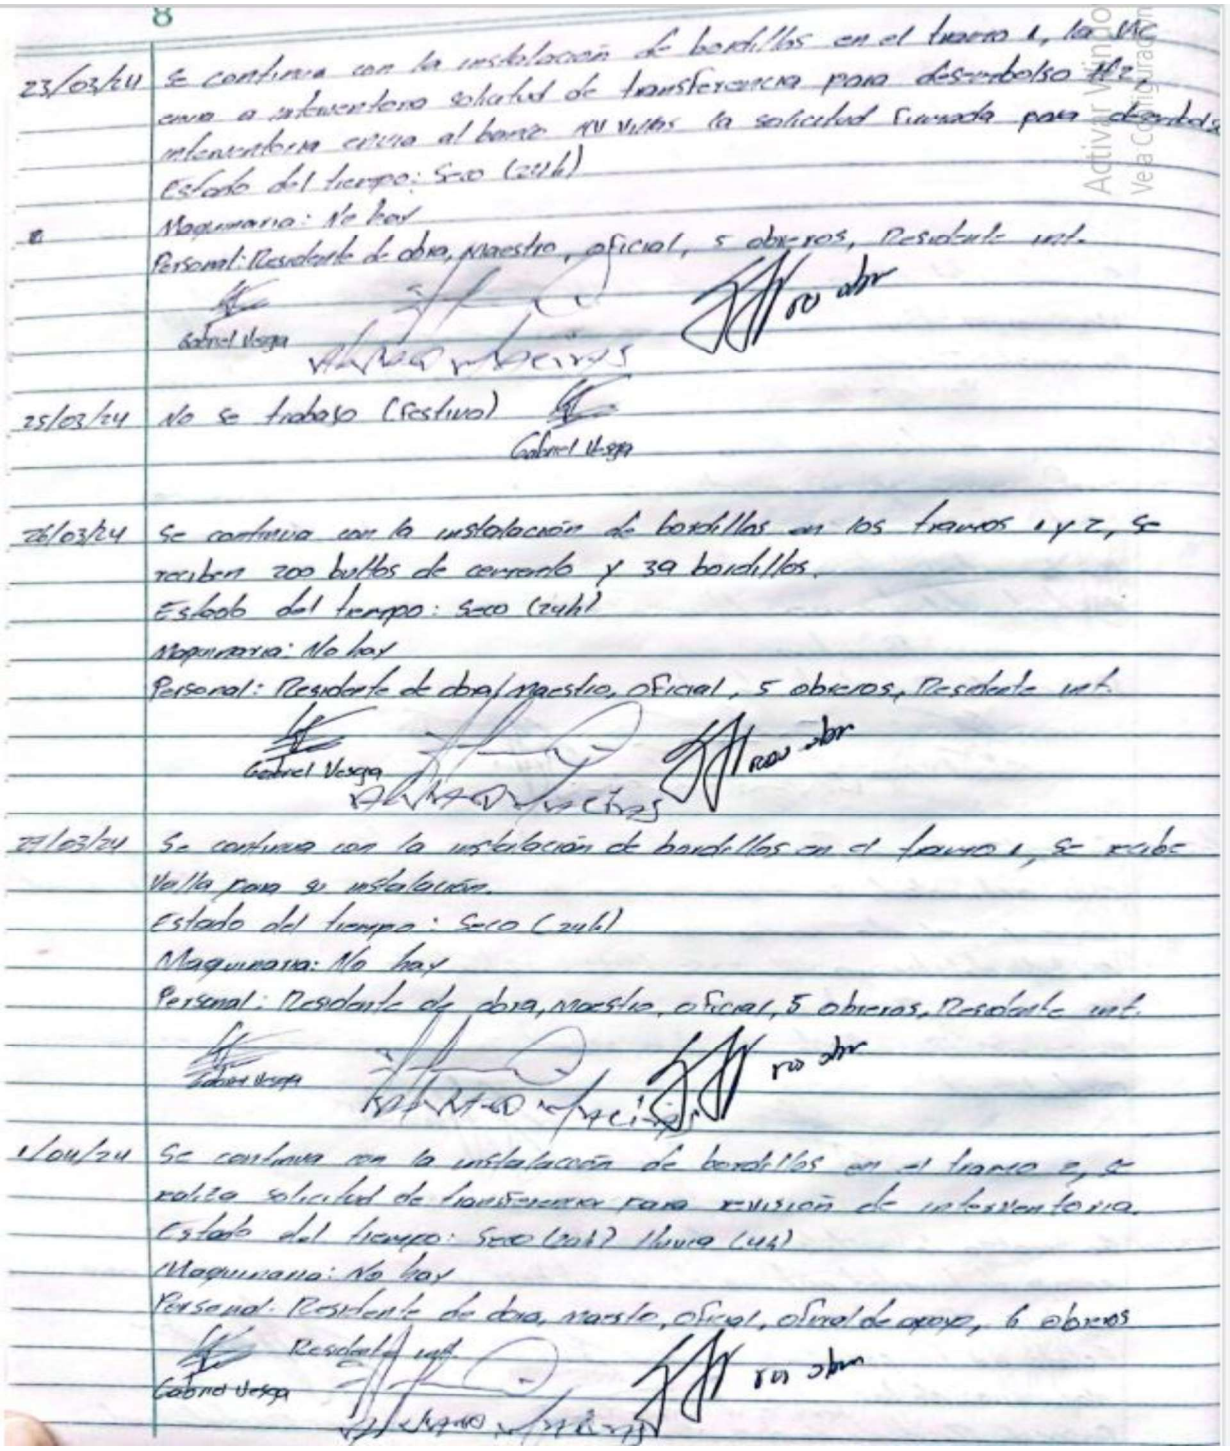

23/03/24 Se continua con la instalacion de bordillos en el tramo 1, la SIC envio a interventoria solicitud de transferencia para desembolso #2, envio a interventoria cierre al bono #1 Ya vistas la solicitud firmada para desembolso
Estado del tiempo: Seco (sol)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 5 obreros, Residente int.
Gabriel Vargas
10 obr


25/03/24 No se trabajo (Festivo)
Gabriel Vargas

26/03/24 Se continua con la instalacion de bordillos en los tramos 1 y 2, Se reciben 200 bultos de cemento y 39 bordillos.
Estado del tiempo: Seco (sol)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 5 obreros, Residente int.
Gabriel Vargas
10 obr

27/03/24 Se continua con la instalacion de bordillos en el tramo 1, Se recibe Valla para su instalacion.
Estado del tiempo: Seco (sol)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 5 obreros, Residente int.
Gabriel Vargas
10 obr

1/04/24 Se continua con la instalacion de bordillos en el tramo 2, Se radica solicitud de transferencia para revision de interventoria.
Estado del tiempo: Seco (sol) Lluvia (ll)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, oficial de apoyo, 6 obreros
Residente int
Gabriel Vargas
10 obr

## 5.3 REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DE OBRA

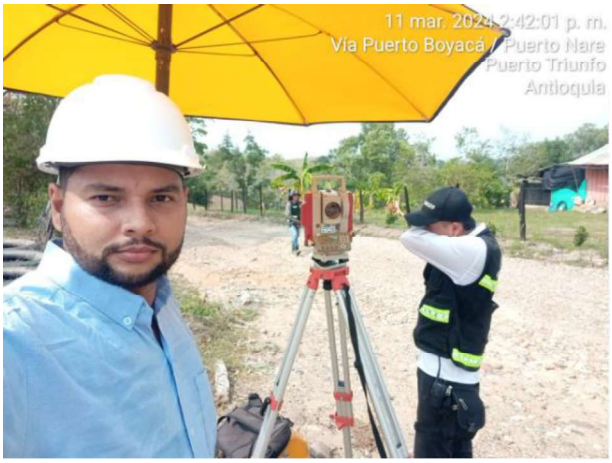





LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LOS TRAMOS 1 Y 2








CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE DE LOS TRAMOS 1 Y 2








CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUB BASE EN LOS TRAMOS 1 Y 2

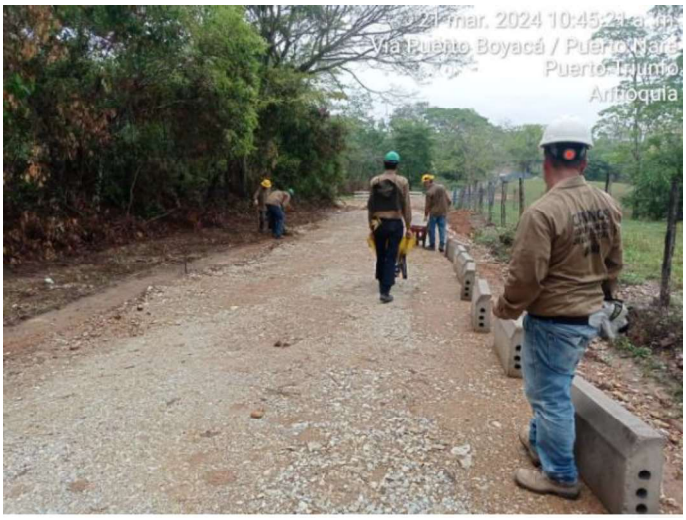


INSTALACION DE BORDILLO EN EL TRAMO 1

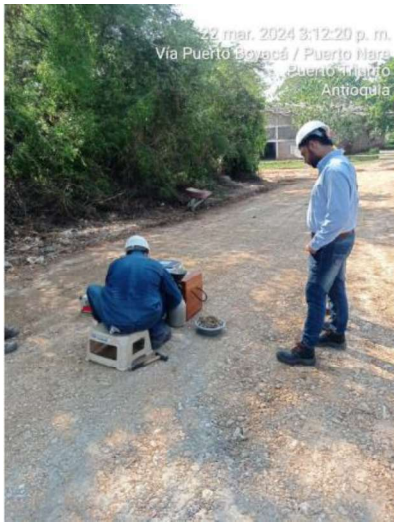


ENSAYO DE DENSIDADES Y TOMA MUESTRAS PARA ENSAYO DE PROCTOR

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato 4843-2023-INVIAS – ANTIOQUIA
Interventor contrato 4804-2023-INVIAS - ANTIOQUIA

**Oficio: Territorial 2024-21**

Cúcuta, 25 de octubre de 2024

Señores
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDEAM
Ciudad.

Asunto: INFORME PLUVIOMETRICO

Estimados Señores

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el registro pluviométrico correspondiente a la estación meteorológica más cercana a las veredas CARLOTA Y PALESTINA, ubicadas en el municipio de PUERTO BERRIO, y al corregimiento de PUERTO PERALES Y VEREDA ESTACION PUERTO PITA ubicadas en el Municipio de PUERTO TRIUNFO departamento de Antioquia, para los meses de abril mayo, junio y septiembre del presente año.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a cualquier documentación o información adicional quese requiera para procesar esta solicitud.

Por favor responder a través de los siguientes correos electrónicos:
interventoria4843.2023@gmail.com ; interventoria4804.2023@gmail.com

Atentamente,



**JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular (57) 3132718526

Gmail **Jesús Vivas <interventoria4843.2023@gmail.com>**

# Respuestas Radicado2

1 mensaje

**Contacto No-Reply** <contacto-no-reply@ideam.gov.co> 25 de octubre de 2024, 4:57 p.m.
Para: "interventoria4843.2023@gmail.com" <interventoria4843.2023@gmail.com>

***Respetado(a) usuario(a)***

***Su solicitud ha sido recibida, radicada con el Número:*** 20249910120474 ***y asignada al área técnica correspondiente.***

***Usted podrá realizar seguimiento a esta solicitud, ingresando al link: "CONSULTA RADICADO WEB ORFEO" a través de la página web del IDEAM link: "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA", para la consulta requiere utilizar el PIN:*** 3118

| IDEAM | |
|---|---|
| | Radicado: 20249910120474<br>Fecha: 2024-10-25 15:53<br>Radico: RADICADOR4<br>Destino: GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO<br>JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA<br>Rem/Des :<br>Asunto : SOLICITUD INFORME PLUVIOMETRICO |

***Favor no contestar este correo***

***Gracias por contar con nosotros.***

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

**GESTIÓN DOCUMENTAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO**
Ventanilla de Correspondencia
contacto@ideam.gov.co
Tel: (571) 352 7160 Ext. 1204
Linea nacional 018000 110 012
Calle 25D No. 96B - 70 Bogotá D.C
www.ideam.gov.co
