CONVENIO 3317-2023

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL









INFORME MENSUAL No. 5

ABRIL DEL 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio de Obra No. 3317-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

Contrato de Interventoría No. 4804-2023 **Interventoría:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Objeto Convenio de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	13
1	**INTRODUCCIÓN**		7
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		8
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		9
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		10
3.1	Información general del contrato		10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		11
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		12
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		12
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	15
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	20
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	20
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	20
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	21
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	22
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	22
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	24
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	24
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	24
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		24
5.1	Información general del contrato		24
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		25
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	27
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	27
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	28
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	30
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		30
8	**Anexos**		31
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		31
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTROL DE APROBACIÓN

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 4
Código del documento:		
Versión:	**1**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	**Fecha**	**Nombre del ejecutor**	**Firma**
Elaboración	30/04/2024	Gabriel Vesga	
Revisión	30/04/2024	Jesús Orlando Vivas	
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
Mauricio Hoyos	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1	09/05/2024	Envío de informe al supervisor de INVIAS
2		

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1 LOCALIZACIÓN 7
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 8
3. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA 9
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 9
3.1.1 Información contractual 9
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 10
3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
3.3.1 Estado de pólizas 13
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 14
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 14
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA 21
4.3 PERSONAL CONVENIO DE OBRA 22
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA 23
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 25
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 25
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO DE OBRA 26

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 10
Tabla 2. Póliza de cumplimiento 12
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual 13
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría 31
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría 32
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría. 34
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida 37
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada 44

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto 8

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 37
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 58

1. INTRODUCCIÓN

Las vías de Puerto Perales, ubicado en el departamento de Antioquia, presentan un lamentable estado de deterioro. Este es un problema que afecta no solo a la comunidad de Puerto Perales, sino también a las diversas veredas cercanas a este corregimiento.

Esta situación también tiene un impacto negativo en la economía de la región, ya que muchas veces se dificulta la movilización de productos agrícolas y ganaderos hacia los mercados. Así mismo, se limita el desarrollo del turismo en la zona, ya que los visitantes evitan transitar por estas vías en mal estado.

Es importante destacar que la falta de mantenimiento y reparación de las vías es un problema recurrente en Puerto Perales y sus veredas. A pesar de los constantes reclamos de la comunidad.

Para darle prioridad a estos lugares apartados, el instituto nacional de vías - INVIAS en conjunto con el gobierno nacional y las juntas de acción comunal desarrollaron el proyecto de caminos comunitarios para la paz total donde Puerto Perales será beneficiado mediante el convenio solidario 3317-2023 suscrito el 13 de septiembre del 2023 con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, el plazo contractual es de 3 meses donde se construirá 111 metros lineales de vía en concreto rígido que espera poder suplir las necesidades actuales mínimas de esta comunidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN



Ilustración 4. Localización de vía a intervenir en Corregimiento Puerto Perales.

Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, municipio de Puerto Triunfo, en la vereda de Puerto Perales. Con este proyecto se pretende cumplir las especificaciones de vía secundaria; es decir, realizar el mejoramiento de suelo, aumentar el ancho de la vía y disminuir la presencia de curvas sucesivas.

1.1.1 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENIFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Desde hace mucho tiempo se viene utilizando estas vías por la cual pasan vehículos de carga pesada y liviana que con el pasar del tiempo, las lluvia y escorrentías de las mismas han deteriorado estos cruces.

Esta vía comunica las fincas aledañas con la vía principal de puerto triunfo – puerto Nare que esta a su vez se comunica el interior del casco urbano de puerto perales, este proyecto disminuirá los costos y los tiempos de viaje que venían siendo afectados de una gran manera.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Las vías de Puerto Perales, se encuentran en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola y minera que se encuentran en la zona, además de extender los tiempos de viaje y aumentar los costos de carga.

	
Se realiza el replanteo de del tramo de via para toma de niveles y trazo de via en el tramo 2.	Se realiza la instalacion de estacas o cuñas para la identificacion de niveles y trazo de via en el tramo 1

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Alcance del proyecto será el mejoramiento con la pavimentación de 111 metros en Puerto perales en el tramo comprendido entre el K0+000 al K0+111 respectivamente. Estas vías internas se encuentran en muy mal estado debido a la poca intervención por parte de los entes territoriales, las precipitaciones que a su vez dificultan el tráfico y aumentan los costos de operación y aumento en el recorrido de las mismas.


El departamento Antioquia realiza inversiones en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía terciaria en la vereda de Puerto perales y las obras complementarias que garanticen la estabilidad de la vía,

según los estudios y diseños aprobados por el INVIAS y de acuerdo con la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales de INVIAS.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada en el objeto del contrato 4804 de 2023.

Ilustración 2. Estructura de pavimento propuesta

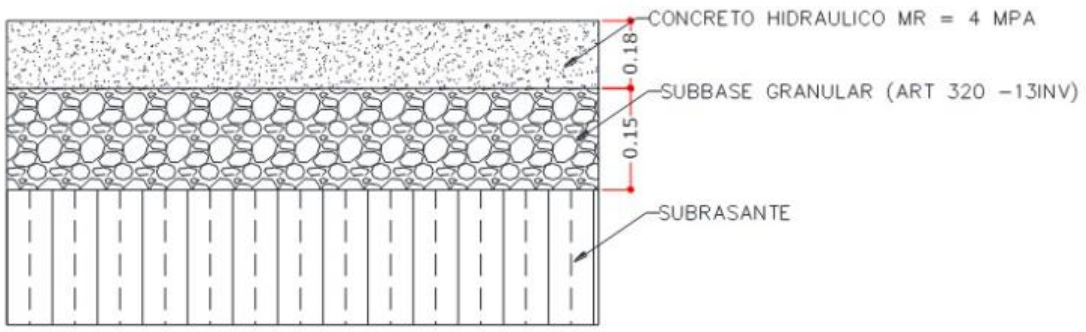

3. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del convenio

CONVENIO No. - FECHA	3317 del 13 de septiembre de 2023
TIPO DE CONVENIO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Dirección territorial INVIAS

CONTRATISTA	JAC PUERTO PERALES, MPIO PTO TRIUNFO
C.C. o N.I.T.	811017456-1
REPRESENTANTE LEGAL	Edgar Álvaro Macias Quintana
C.C. o N.I.T	7.252.077
OBJETO DEL CONVENIO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."(código BPIN No. 202300000000001)"
VALOR DEL CONVENIO	$201.333.957.00
PLAZO O DURACIÓN	Tres (3) meses
PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN	De acuerdo con el Adicional No. 01: "Modificar el plazo de ejecución tres (03) meses más".
LUGAR DE EJECUCIÓN	PUERTO TRIUNFO – PUERTO PERALES
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	MAURICIO HOYOS. Director territorial INVIAS Antioquia.
INTERVENTOR (Externo)	Interventor Externo Jesús Orlando Vivas Noguera del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 4804 de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	12/12/2023
FECHA DE SUSCRIPCION	13/09/2023
FECHA DE INICIO	12/12/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	HASTA 31/12/2023
FECHA PRORROGA 01	HASTA 30/04/2024
FECHA PRORROGA 02	HASTA 15/05/2024
FECHA DE TERMINACION	10/05/2024

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 1-30 de abril de 2024 de ejecución del convenio 3317 de 2023. El Contratista JAC Puerto perales, realizó las siguientes actividades administrativas.

- Se adelantan procesos administrativos para el desarrollo de las solicitudes de transferencias.
- Se realiza el envió de informes de residente de obra del mes de marzo, esta pendiente por entregar los informes de calidad de marzo y los informes de abril.
- Se realiza el envío de la solicitud de transferencia #4 y #5 para revisión y aprobación de interventoría.
- Se adelanta proceso de solicitud de transferencia # 6 para liquidación de proveedores y nómina.
- Se realiza socialización con el invias e interventoría para finiquitar el proceso de prorroga y de desembolsos para liquidar proveedores y nómina.
- Se realiza visita de la profesional social de interventoría para la socialización del plan de trabajo para las actividades de mejoramiento o recreación de la comunidad, a esta reunión asiste el personal de obra y personal de la junta de acción comunal.

Se adelantarán las siguientes actividades técnicas:

- ➔ Se inicia con el proceso de vaciado y vibrado del concreto en los tramos 1 y tramo 2.
- ➔ Se realiza el corte y figurado de acero para la instalación en los tramos 1 y tramo 2.
- ➔ Se para el proceso de instalación de concreto se realiza el ensayo de Slump antes de vaciar para determinar la consistencia de la mezcla.
- ➔ Se realiza la toma de muestras de cilindros de concreto para enviar a laboratorio y realizar las pruebas a compresión.


➔ Se terminan las actividades de vaciado de concreto en los 111 mts proyectados, está pendiente la instalación de unas rampas de acceso y acabados finales e la vía.





INSTALACION DE BORDILLOS



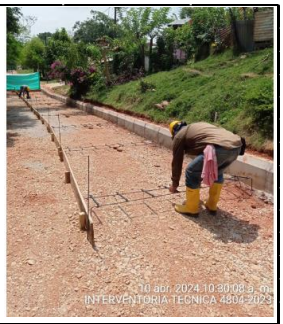

INSTALACION DEL ACERO EN EL TRAMO 2





ENSAYO DE SLUMP



APLICACIÓN DE ANTI SOL





VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO





INSTALACION DE ACERO EN EL TRAMO 1

3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo analizado, el contrato de obra se encuentra en la etapa de ejecución de obra, hasta el momento se lleva un avance de obra del 95% y un avance presupuestal del 78,63 %, se adelantan labores administrativas para el envío de la solicitud de transferencia #6 a interventoría para la revisión, aprobación y próximo desembolso.

De manera constante la interventoría le ha solicitado a la junta de acción comunal y residente de obra los informes de calidad y de obra, ya que se encuentran atrasados en estos temas, adicional, se les reitera por parte de la inspectora sst interventoría el adecuado uso de los implementos de protección personal, esto para evitar futuros accidentes laborales.

La interventoría les solicita el acompañamiento constante del residente de obra, ya que en ocasiones no se encuentra en el sitio de trabajo haciendo de esto un problema para el desarrollo y avance de la obra en temas de calidad y tiempos, también se solicita el cuidado con los tiempos de trabajo de las maquinas (horómetro) para no tener inconvenientes en la aprobación de las solicitudes de transferencias.

3.3.1 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de cumplimiento No NB-100284287, con respecto a la fecha de inicio y prorroga, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Acontinuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.266.791,40	13/09/2023	1/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.066.697,85	13/09/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.400.187,10	30/04/2024	30/04/2029

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.100069231,

expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS SA y aprobada por la gobernación de Antioquia. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Predio, labores y operaciones.		$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Patronal				
Vehiculos propios y no propios				
Contratistas y subcontratistas				

Página 2

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1-30 de abril de 2024, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 5	**FECHA:1- 30 de abril de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** abr-24

CONVENIO No.: 3317 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO PTRIUNFO

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 12/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/05/2024
PLAZO ACUMULADO: 4,3 MESES

VALOR INICIAL : $ 201.333.957,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.333.957,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 200.333.957,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTOR 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	111
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	111	111
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 151.512.376,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.545.371,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.276.210,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.333.957,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 121.267.060,00	121.267.060,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 750.000,00	750.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 35.500.000,00	35.500.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 157.517.060,00	157.517.060,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 171.288.319,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 157.517.060,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 91,96%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Indicar la localización y actividad. **Indicar la localización y actividad.**










Indicar la localización y actividad. **Indicar la localización y actividad.**

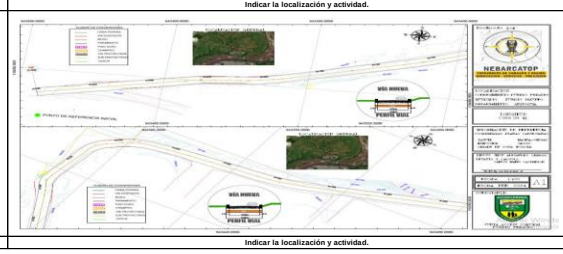Indicar la localización y actividad. **Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°17. (5-11 abril)

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 5	**FECHA:1- 30 de abril de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	12/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 17 del 5/04/2024 al 11/04/2024 Último Informe Semanal No (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de pavimento rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de pavimento rigido de 18cm de espesor con un ancho de via de 4,7 mts en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

CONVENIO No.	3317-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.333.957,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.333.957,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.333.957			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 34.759.947,00			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.333.957			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 26.521.651,00			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) $ -
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	78.900.000, 00	39,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 34.759.947,00	17,26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 44.140.053,00	-21,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 78.900.000,00	39,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 34.759.947,00	17,26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 44.140.053,00	-21,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 29.529.000,00	14,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.573.694,00	13,74%

Observaciones: Se avanza continuamente en los desembolsos y ejecucion de obra conforme se requiere.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.521.651,00	46,0 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.521.651,00	46,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.756.191,00	8,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.756.191,00	8,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGA: 2024E-VUVRAZ-035450 2024-04-22 21:04:57
PERIODO FACTURADO: mar-24
VALOR FACTURA: $ 10.068.219,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Las actas de febrero y marzo se encuentran en revision por el supervisor del contrato invias.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 31,30%
Meta Física Ejecutada % 27,50%
Avance o Atraso Físico % -3,80%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Conformacion y compactacion de sub base	mts	172
*	Instalacion de bordillos	mts	172
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	22	20	130	172	100,0%
Ejec	22	20	110	152	88,4%
Prog	22	20	130	172	100,0%
Ejec	22	20	90	132	76,7%
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
canguro compactador	1	1
herramienta menor	1	1
vibro compactador bintin	1	1
Total		3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA ARENA, TRITURADO Y MATERIAL PETREO SE COMPRÓ EN FERRETERIAS Y DEPOSITOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DE PUERTO TRIUNFO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	EL AGUA SE COMPRÓ DEL ACUEDUCTO	PERMISO MINERO:	SI N.A.	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO NINGUNO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medidade ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica debido a que es una obra de bajo impacto

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
SE HIZO REUNIÓN INICIAL DE SOCIALIZACIÓN EL 27-12-2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la conformacion y compactacion de la sub base
Se continua con la instalacion de bordillos del tramo intervenido
Se realiza visita sst de interventoria para la charla de seguridad y pausas activas del personal de obra
Se continua con el figurado e instalacion de acero y formaletas para el vaciado.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera terminar la instalacion de bordillos e iniciar con el vaciado de concreto
Se programa el figurado de acero transversal y longinudinal del tramo a intervenir.
Se realizaran visitas periodicas de la sst de interventoria para la revision de epps, botiquin y kit de primeros auxilios.
La interventoria solicita a la IAC el informe del PAGA para su respectiva revision.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs. meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 5	**FECHA:1- 30 de abril de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

Informe N°18 (12-18 abril)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO | VERSION | PÁGINA | FECHA: 18/04/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 18 del 12/04/2024 al 18/04/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de pavimento rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de pavimento rigido de 18cm de espesor con un ancho de via de 4,7 mts en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

CONVENIO No. 3317-2023 — VALOR INICIAL: $ 201.333.957,00
FECHA DE INICIO: 12/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201.333.957,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4804 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.333.957			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 62.333.641,0			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.333.957			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 31.277.842,00			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 78.900.000,00	39,18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 62.333.641,0	30,96%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 16.566.359,00	-8,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 78.900.000,00	39,18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 62.333.641,00	30,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:1	$ 16.566.359,00	-8,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.629.000,00	12,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.607.379,00	11,23%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.277.842,00	54,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 31.277.842,00	54,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.756.191,00	8,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.756.191,00	8,26%

NO RADICFACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: — SI: — X: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGA: 2024IE-VUVRAZ-035450 2024-04-22 21:04:57
PERIODO FACTURADO: mar-24
VALOR FACTURA: $ 10.068.219,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Se realizan correciones del acta anterior y se encuentra en revision por parte de la supervision de INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 42,60% — Avance o Atraso Físico %: 4,20%
Meta Física Ejecutada %: 38,40%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Instalacion de bordillos	111	ml
vaciado de concreto	111	ml

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	56	55		111	100,0%
Ejec	56	55		111	100,0%
Prog	56	55		111	100,0%
Ejec	20	27		47	42,3%
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Herramienta menor	1	1
Carmix 2.5 TT	1	1
Vibro concreto	1	1
Pulidora	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	LA ARENA, TRITURADO Y MATERIAL PETREO SE COMPRO EN FERRETERIAS Y DEPOSITOS DE MATERIALES DEBIDAMENTE AUTORIZADOSN DE PUERTO TRIUNFO	PERMISO MINERO: SI X NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	
UBICACIÓN:	EL AGUA SE COMPRÓ DEL ACUEDUCTO	PERMISO MINERO: SI N.A. NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO NINGUNO	N/A	

OBSERVACIONES: se requeriria en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: No aplica debido a que es una obra de bajo impacto

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
SE REALIZÓ REUNIÓN INICIAL DE SOCIALIZACIÓN EL 27-12-2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el vaciado y vibrado de concreto en el tramo 2 seccion 1
Se realiza la instalacion de formaletas en el sector 1 seccion 1
Se realiza el vaciado y vibrado de concreto en el tramo 1 seccion 1, adicionanl se realizan pruebas de asentamiento y se sacan las muestras de los cilindros
Se realiza el fisurado e instalacion del acero

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se espera el envio de la solicitud de transferencia #5 para desembolso.
Se programa continuar con el vaciado y vibrado de concreto en el tramo 1 seccion 1 y tramo 1 seccion 2
Se tiene programado el figurado de acero para su instalacion
Se programa la llegada de la profesional social para realizar las respectivas socializaciones y aportes sociales del proyecto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


VACIADO DE CONCRETO SECTOR 1 SECCION 1 Y 2


INSPECCION Y/E ENTREGA DE EPPS


INSTALACION Y ARMADO DE ACERO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-356774 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

Informe mensual 05 – abril 2023

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 5	**FECHA:1- 30 de abril de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

Informe N°19 (19-25 abril)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 19 del 19/04/2024 al 25/04/2024 Último Informe Semanal No (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de pavimento rigido.

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de pavimento rigido de 18cm de espesor con un ancho de via de 4,7 mts en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES		
CONVENIO No.	3317-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.333.957,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.333.957,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.333.957			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 84.941.020,00			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.333.957			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 36.034.033,00			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 106.700.000,00	53,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 84.941.020,00	42,19%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 21.758.980,00	-10,81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.700.000,00	53,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.941.020,00	42,19%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 21.758.980,00	-10,81%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 75.529.000,00	37,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 72.576.840,00	36,05%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 36.034.033,00	62,56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.034.033,00	62,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.756.385,00	8,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.756.385,00	8,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGA 2024E-VUVRAZ-035450 2024-04-22 21:04:57
PERIODO FACTURADO: mar-24
VALOR FACTURA: $ 10.068.219,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Las actas se encuentran en revision y aprobacion del supervisor de INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 79,00% — Avance o Atraso Físico % -2,50%
Meta Física Ejecutada % 76,50%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
instalacion de bordillos	111	ml
vaciado de concreto	111	ml
instalacion de viga y rampas de acceso	4	und

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	56	55		111	100,0%
Ejec	56	55		111	100,0%
Prog	56	55		111	100,0%
Ejec	6	5		111	100,0%
Prog	2	2		4	100,0%
Ejec	0	0		0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Herramienta menor	1	1
Carmix 2.5 TT	1	1
Vibro concreto	1	1
Pulidora	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	LA ARENA, TRITURADO Y MATERIAL PETREO SE COMPRÓ EN FERRETERIAS Y DEPOSITOS DE MATERIALES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DE PUERTO TRIUNFO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	EL AGUA SE COMPRÓ AL ACUEDUCTO	PERMISO MINERO:	SI N.A.	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: No aplica debido a que es una obra de bajo impacto

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	12	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	3
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
SE REALIZÓ REUNIÓN INICIAL DE SOCIALIZACIÓN EL 27-12-2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el figuarado de acero para las las losas de concreto, vigas y rampa de acceso a los tramos de via
Se realiza socializacion por parte de la profesional social de interventoria para el desarrollo del plan de trabajo social en el convenio
Se realizan inspecciones constantes de epps, botiquin, extintor, etc, se realizan charlas de seguridad e higiene
Se realiza socializacion virtual de interventoria con la IAC, area administrativa y tecnica para las proximas solicitudes de transferencia y entrega de obra
Se programa la instalacion del acero para las vigas y rampas de acceso en los tramos 1 y 2.
Se programa el vaciado y vibrado de concreto entre vigas y rampas de acceso en los tramos 1 y 2.
Se programa realizar el acabdo final de los dos tramos de via, donde se le aplicara pintura para identificacion y sentido de via.
Se programa el mejoramieno de la parte posterior de los bordillos para efectos de durabilidad con un relleno.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 5-4202-36479 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 5	**FECHA:1- 30 de abril de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

Informe N°20 (26 abril- 2 May)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	3/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 20 del 26/04/2024 al 2/05/2024 Ultimo Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de pavimento rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de pavimento rigido de 18cm de espesor con un ancho de via de 4,7 mts en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES		
CONVENIO No.	3317-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.333.957,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.333.957,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10/05/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10/05/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.333.957			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 157.517.860,00			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.333.957			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 40.790.418,00			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 167.300.000,00	83,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 157.517.860,00	78,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:-	$ 9.782.140,00	-4,86%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSI ÓN PROGRAMADA:	$ 167.300.000,00	83,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 157.517.860,00	78,24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.782.140,00	-4,86%
NO		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.529.000,00	22,61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 44.993.537,00	22,35%

Observaciones: Se realiza un estimado de gastos semanales ya que se esperaba que pasaran la solicitud de transferencia para determinar el gasto real.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.790.418,00	70,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.790.418,00	70,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.756.191,00	8,26%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.756.191,00	8,26%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI: x
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	2024E-VUVRAZ-035450 2024-04-22 21:04:57
PERIODO FACTURADO:	mar-24
VALOR FACTURA:	$ 10.068.219,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Se encuentra en proceso de pago

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 85,00 % — Avance o Atraso Físico % - 2,00 %
Meta F sica Ejecutada % 83,00 %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Cantidad	Unidad
* instalacion de viga y rampas de acceso	4	und
* conformacion de la calzada existente (adicional tramo 2)	20	ml
* conformacion de sub base y compactacion (adicional tramo 2)	20	ml

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	2	2	-	4	100,0%
Ejec	2	1	-	3	75,0%
Prog	-	20	-	20	100,0%
Ejec	-	20	-	20	100,0%
Prog	-	20	-	20	100,0%
Ejec	-	20	-	20	100,0%

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Herramienta menor	1	1
CARMIX	1	1
VIBRADOR CONCRETO	1	1
Total		3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA ARENA, TRITURADO Y MATERIAL PETREO SE COMPRÓ EN FERRETEIAS Y DEPOSITOS DE MATERIALES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DE PUERTO TRIUNFO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	EL AGUA SE COMPRÓ AL ACUEDUCTO	PERMISO MINERO:	SI N.A.	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO NINGUNO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: No aplica debido a que es una obra de bajo impacto

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
SE REALIZÓ REUNIÓN INICIAL DE SOCIALIZACIÓN EL 27-12-2023

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza la instalacion de 3 rampas de acceso en donde se instalo 2 en el tramo 1 y una en el tramo 2.
Se inicia con la conformacion de calzada existente en el tramo 2 donde se esta realizando una adicion aproximada de pavimento rigido de 20 mts
Se realiza la instalacion de sub base con material que sobro de los tramos anteriores.
Se realizo la adecuacion de la parte posterior de los bordillos con con concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado la instalacion de formaletas y acero para el vaciado de las placas de concreto
Se programa el vaciado de concreto con la ayuda de un trompo mezclador.
Se tiene programado la actividad social del compartir para entrega de obra

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


ACABADO FINAL DE LAS RAMPAS


ACABADO FINAL DE LAS RAMPAS


ARMADO DE ACERO Y VACIADO DE CONCRETO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

Informe mensual 05 – abril 2023

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

Se describe el estado actual de los equipos y maquinaria a utilizar en este periodo comprendido entre el 1- 30 de abril de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 denominado “Maquinaria y equipo convenio obra”.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 3317-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4804-2023 **INTERVENTORÍA:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CARMIX 2.5 TT	CARMIX	2.5 M3	PTO PERALES					A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
VIBRO CONCRETO	HONDA	6,5 HP- 1400 RPM	PTO PERALES					A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LOS DIAS QUE APARECE LA MAQUINARIA INACTIVA CORRESPONDE A DOMINGOS, LOS DIAS EN BLANCO LA MAQUINARIA ESTABA FUERA DE LA OBRA EN MANOS DE LOS PROPIETARIOS

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT

Firma
Nombre: GABRIEL MARIO VESGA MEJIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0568545 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

EDGAR ALVARO MACIAS QUINTANA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.252.077 de Puerto Boyacá en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES identificada con el NIT 811017456-1, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por Junta de Acción Comunal durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción de este documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en PUERTO PERALES, a los dos (2) días del mes de mayo de 2024.



_____
EDGAR ALVARO MACIAS QUINTANA
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica]

4.3 PERSONAL CONVENIO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra en el periodo comprendido entre 1-30 de abril de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 denominado “Personal del contratista de obra”.

En el presente período se reporta solo el personal mínimo requerido.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO
VERSION
PAGINA
FECHA 30/04/2024 (DIA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONVENIO No: 3317-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24
PROYECTO: "ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4804-2023
INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
NOMBRE ARL: SURA
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	FABIAN PEREZ ALVARO	7.263.624	Oficial de Construcción	$ 2.920.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	J.A.C. CORREGIMIENTO PUERTO PERALES	$ 1.916.667,00	$ 133.500	V	NUEVA EPS	76865501	$ 76.700,00	PORVENIR	76865501	$ 306.700	$ 76.700,00	EXONERADO	EXONERADO	
2	LUIS EDUARDO CACEDO	7.250.793	Cliníco	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	J.A.C. CORREGIMIENTO PUERTO PERALES	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	FAMISANAR	76865501	$ 52.000,00	PORVENIR	76865501	$ 208.000	$ 52.000,00	EXONERADO	EXONERADO	
3	JERONIMO RESTREPO ZAPATA	1.001.366.581	Cliníco	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	J.A.C. CORREGIMIENTO PUERTO PERALES	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	76865501	$ 52.000,00	PORVENIR	76865501	$ 208.000	$ 52.000,00	EXONERADO	EXONERADO	
4	JUAN PABLO RIVA TOBON	1.001.443.999	Cliníco	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	J.A.C. CORREGIMIENTO PUERTO PERALES	$ 910.000,00	$ 63.400	V	NUEVA EPS	76865501	$ 36.400,00	PORVENIR	76865501	$ 145.000	$ 36.400,00	EXONERADO	EXONERADO	
5	JOSE MANUEL BUSTOS RIVERA	1.001.443.586	Cliníco	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	J.A.C. CORREGIMIENTO PUERTO PERALES	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	76865501	$ 52.000,00	PORVENIR	76865501	$ 208.000	$ 52.000,00	EXONERADO	EXONERADO	
6	YURY ALEJANDRA CIRO SIERRA	21.954.923	Cliníco	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	J.A.C. CORREGIMIENTO PUERTO PERALES	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	76865501	$ 52.000,00	PORVENIR	76865501	$ 208.000	$ 52.000,00	EXONERADO	EXONERADO	
7	JESUS ANTONIO MARIN	80.279.761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	J.A.C. CORREGIMIENTO PUERTO PERALES	$ 1.500.000,00	$ 104.400	V	NUEVA EPS	76865501	$ 60.000,00	COLPENSIONES	76865501	$ 240.000	$ 60.000,00	EXONERADO	EXONERADO	
8	Sergio Amaury Durango Zora*	98.509.041	Contratista OPS Ingeniero Residente de Obra	$ 9.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	J.A.C. CORREGIMIENTO PUERTO PERALES	$ 1.400.000,00	$ 97.440	V	NUEVA EPS	76865501	$ 12.180,00	COLPENSIONES	76865501	$ 175.000	$ 175.000			
9	NANCY LILIANA GIL CASTRILLANO(*)	1.016.027.681	Contratista OPS Contadora	$ 3.823.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	J.A.C. CORREGIMIENTO PUERTO PERALES	$ 728.000,00	$ 50.668,80	I	NUEVA EPS	76865501	$ 6.334,00	COLPENSIONES	76865501	$ 91.000	$ 91.000			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:


1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT

Firma
No Edgar Alvaro Macias Quintana
Presidente JAC
Número de CC. 7.252.077

Firma
Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor, Dirección Territorial.

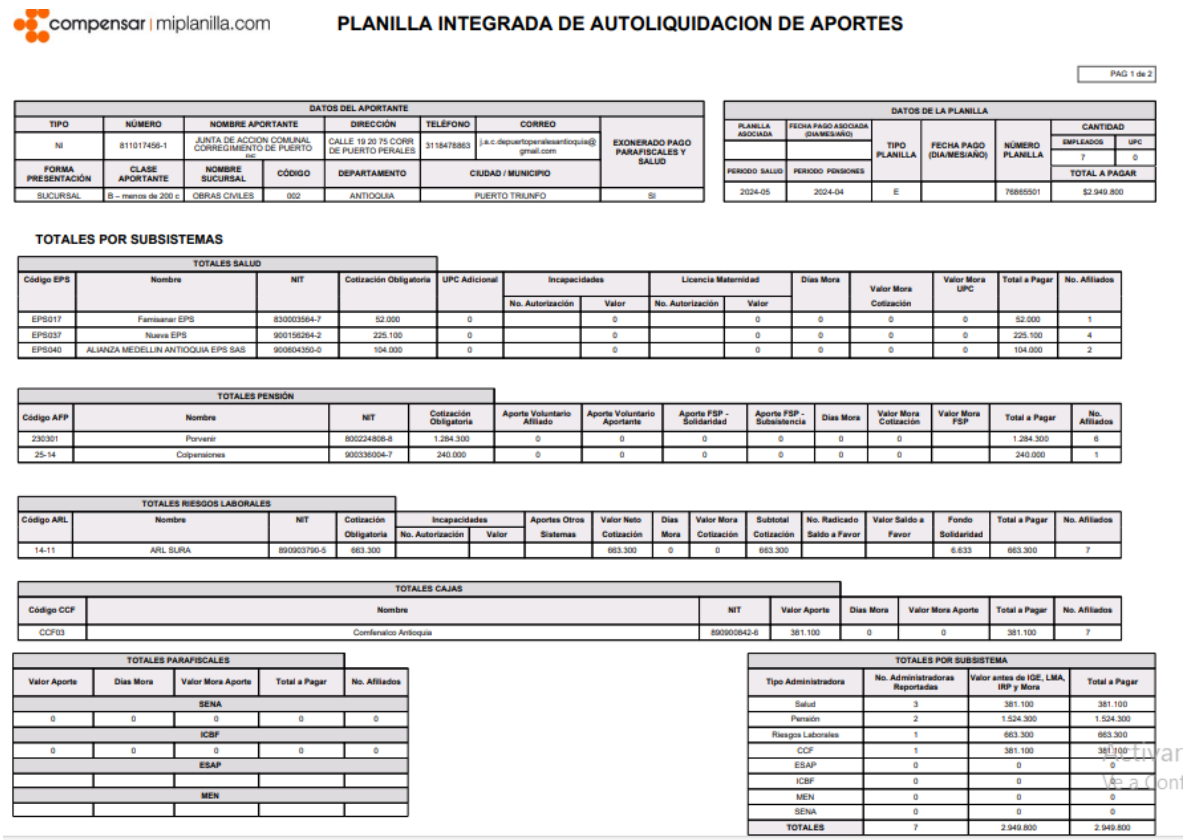

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	811017456-1	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PER	CALLE 19 20 75 CORR DE PUERTO PERALES	3118478863	j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRAS CIVILES	002	ANTIOQUIA	PUERTO TRIUNFO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E		76865501	$2.949.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	225.100	0		0		0	0	0	0	225.100	4
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2


TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.284.300	0	0	0	0	0	0		1.284.300	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	663.300				663.300	0	0	663.300			6.633	663.300	7

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	381.100	0	0	381.100	7

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	381.100	381.100
Pensión	2	1.524.300	1.524.300
Riesgos Laborales	1	663.300	663.300
CCF	1	381.100	381.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.949.800	2.949.800

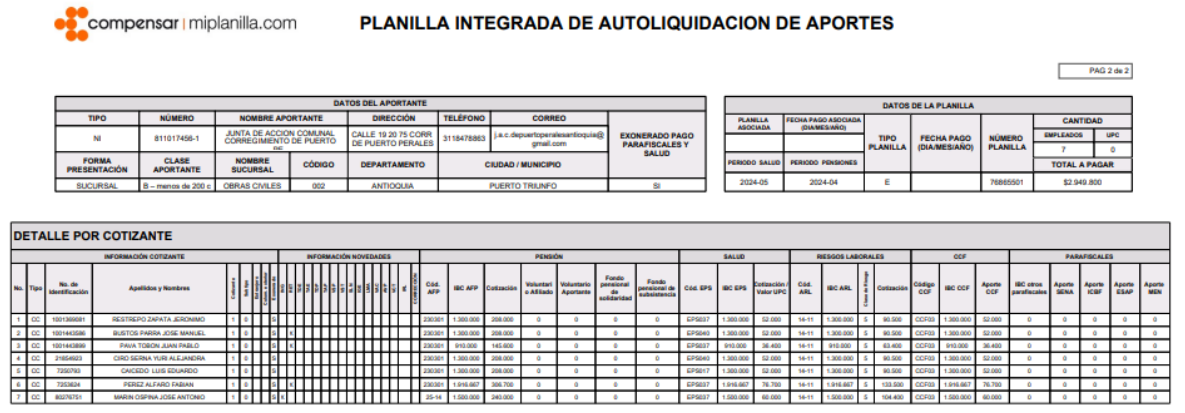

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	811017456-1	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PER	CALLE 19 20 75 CORR DE PUERTO PERALES	3118478863	j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRAS CIVILES	002	ANTIOQUIA	PUERTO TRIUNFO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E		76865501	$2.949.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ctrl	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cod. Novedades	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001366681	RESTREPO ZAPATA JERONIMO	1	0		0															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	90.500	CCF03	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001443586	BUSTOS PARRA JOSE MANUEL	1	0		0															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS040	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	90.500	CCF03	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1001443899	PAVA TOBON JUAN PABLO	1	0		0															230301	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS037	910.000	36.400	14-11	910.000	1	63.400	CCF03	910.000	36.400	0	0	0	0	0
4	CC	21854923	CIRO SERNA YURI ALEJANDRA	1	0		0															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS040	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	90.500	CCF03	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	7250793	CAICEDO LUIS EDUARDO	1	0		0															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	90.500	CCF03	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	7253624	PEREZ ALFARO FABIAN	1	0		0															230301	1.916.667	306.700	0	0	0	0	EPS037	1.916.667	76.700	14-11	1.916.667	1	133.500	CCF03	1.916.667	76.700	0	0	0	0	0
7	CC	80276751	MARIN OSPINA JOSE ANTONIO	1	0		0															25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	104.400	CCF03	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA

Se describe el estado actual financiero del contrato de obra en el periodo comprendido entre el 1-30 de abril de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 denominado “Informe financiero y presupuestal del contrato

de obra". Adicionalmente se resalta que no aplica para este convenio, sin embargo, se adjuntó desembolso generado en el mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO DE OBRA No: 3317-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO

MES INFORME MENSUAL: ABRIL **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804-2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	157523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 200.333.957	
TOTAL						$ 200.333.957	

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 200.333.957,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	DESEMBOLSO	FEBRERO	$ 14.753.652	-	$ 14.753.652	-	-	-	157523 del 31/08/2023	$ 185.580.305	$ 185.580.305				
2	DESEMBOLSO	MARZO	$ 20.005.495	-	$ 34.759.147	-	-	-	157523 del 31/08/2024	$ 165.574.810	$ 165.574.810				
3	DESEMBOLSO	ABRIL	$ 27.573.694	-	$ 62.332.841	-	-	-	157523 del 31/08/2025	$ 138.001.116	$ 138.001.116				
4	DESEMBOLSO	ABRIL	$ 22.607.379	-	$ 84.940.220	-	-	-	157523 del 31/08/2026	$ 115.393.737	$ 115.393.737				
5	DESEMBOLSO	ABRIL	$ 72.576.840	-	$ 157.517.060	-	-	-	157523 del 31/08/2027	$ 42.816.897	$ 42.816.897				
TOTALES			$ 157.517.060		$ 157.517.060					$ 42.816.897	$ 42.816.897				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
DESEMBOLSO ABRIL	$ 122.757.913	-	$ 122.757.913
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			$ 122.757.913

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: EDGAR ÁLVARO MACÍAS QUINTANA
Presidente JAC
Numero de C.C. No. 7.252.077

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el 1 - 30 abril de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No: 3317 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE PUERTO PERALES, CORREGIMIENTO PUERTO TRIUNFO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4804-2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	18	13	24	24	20	20	24	24	24	24	24	24	24	18	20	20	13	20	20	8	14	20	18	19	24	20	24	24	24	641
Lluvias moderadas			6	11														4	11			16	10	4	6	5		4				77
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: El registro del IDEAM no contiene informacion aun del mes en mension.
Hasta el momento en el IDEAM no se encuentran registros para el rango de abril de 2024

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT

Firma
Nombre: Gabriel Mario Vesga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0568545 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024, se realizó la toma de muestras para el ensayo de densidades y Proctor modificado, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 denominado “Resumen ensayos laboratorio”, cuando aplique en la ejecución de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO DE OBRA No.: 3317-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804-2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	21/03/2023	ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y EL PESO UNITARIO EN EL TERRENO	(MYE 001B-P) ENSAYO DE PESO UNITARIO EN EL TERRENO (N.T.C 1667)	MATERIAL DE CANTERA DE SITIO	2	>95%	102,3 - 103	SI	Se toman dos muestras, una por cada tramo de intervencion.
2	21/03/2024	ENSAYO PROCTOR	(ASTM D1557-91)	MATERIAL DE CANTERA DE SITIO	3		W : 9% ; Dseca: 2,18gr/cm3	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: ÉDGAR ÁLVARO MACÍAS QUINTANA
Presidente JAC
Numero de C.C. No. 7.252.077

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS del contrato de obra.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSIÓN: 01**
	INFORME MENSUAL No. 5	**FECHA:1- 30 de abril de 2024**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	4	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3317-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL PUERTO PERALES, CORREGIMIENTO DE PTO PERALES

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 12/12/2023
PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201.333.957,00
VALOR ACUMULADO: $ 201.333.957,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.266.791,40	13/09/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.066.697,85	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.400.187,10	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100284287
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Predio, labores y operaciones.		$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023
Patronal				
Vehiculos propios y no propios				
Contratistas y subcontratistas				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069231 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.266.791,40	13/09/2023	1/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.066.697,85	13/09/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.400.187,10	30/04/2024	30/04/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.NB-100284027
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Predio, labores y operaciones.		$ 260.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Patronal				
Vehiculos propios y no propios				
Contratistas y subcontratistas				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069231 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/11/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO DE OBRA

Se presenta informe del plan de calidad para la ejecución de la obra el cual será identificado como PLAN DE CALIDAD dentro de los recursos enviados en la carpeta de obra, el cual fue revisado y aprobado por interventoría.

4.9 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

De acuerdo al cronograma de obra, hemos finalizado el 100% de la proyección para el convenio en la instalación de 111 metros lineales de concreto rígido, cumpliendo con la meta física establecida

OBJETO : CONVENIO SOLIDARIO PUERTO PERALES N. 3317-2023 objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ACTIVIDADES				CRONOGAMA FISICO OBRA DE 1,5 MESES																		
				MARZO	% REAL	%PONDER		% REAL	% PONDER		% REAL	% PONDER		% REAL	% PONDER		% REAL	% PONDER		% REAL	% PONDER
METROS DE MEJORAMIENTO L= 120 MT				18-24 MARZO			25-31 MARZO			1-7 ABRIL			8-14 ABRIL			15-21 ABRIL			22-28 ABRIL		
	PAVIMENTO RIGIDO E=18CM	UNIDAD	CANTIDAD																			
1	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3	18,75	18,8	100%	15%	0,0	0%	0%													
2	Conformación de la calzada existente	m2	756,00	756,0	100%	15%	0,0															
3	Subbase Granular Clase C.	m3	118,44	118,4	100%	10%	0,0															
4	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m)	M3/KM	3.171,00	2536,8	80%	4%	0,0															
5	Pavimento en concreto hidráulico, MR 4.2 Mpa, Tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones), formaleta	m3	106,60										58,0	54%	16%				48,6	46%	14%
6	Bordillo prefabricado A-80	ml	252,00	60	24%	4%	60	20%	3%	42	17%	3%	90	36%	5%		0%	0%			
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	1.055,30										320	30%	3%	400	38%	4%	655,3	62%	6%
	EJECUTADO REAL					48%			3%			3%			25%			4%			20%

TOTAL AVANCE A LA FECHA	100%
EJECUCION PRESUPUESTAL A LA FECHA 77%	

NOTA: PENDIENTE TRATAMIENTOS DE JUNTAS EN PAVIMENTO RIGIDO

ING. SERGIO DURANGO

Activar Windows

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2, correspondiente al SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES del convenio de obra.

CALIDAD INVIAS	**JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA** **INFORME MENSUAL No. 5** **CONTRATO No. 4804 DEL 2023**	**VERSIÓN: 01** **FECHA:1- 30 de abril de 2024**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	30/04/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** abr-24 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 1 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3317 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804 DE 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 201.333.957,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 201.333.957,00

PLAZO ACUMULADO: 30/04/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO	$195.788.586	53,81%	$195.788.586	% P	0,00%	0,00%	7,39%	46,22%	46,22%					
				$ P	$0	$0	$14.800.000	$90.494.293	$90.494.293					
				$ E										
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	$0	0,00%	0,00%	% P										
				$ P										
				$ E										
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$4.545.371	50,00%	$4.545.371	% P				50,00%	50,00%					
				$ P				$2.272.686	$2.272.686					
				$ E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 200.333.957,00		$200.333.957											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 200.333.957,00**													

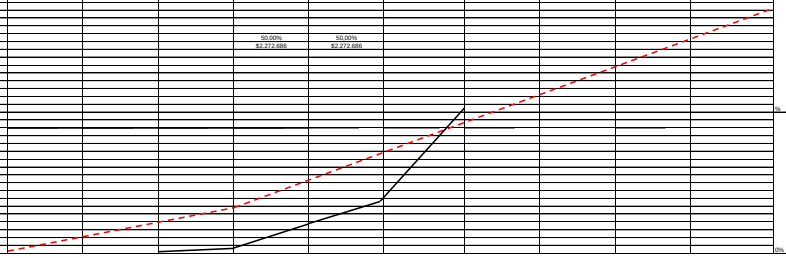

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE GRAFICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**7,39%**	**46,31%**	**46,31%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$14.800.000**	**$92.766.979**	**$92.766.979**					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**7,39%**	**53,70%**	**100,00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$14.800.000**	**$107.566.979**	**$200.333.957**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**7,36%**	**23,75%**	**47,51%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$14.753.652**	**$47.579.189**	**$95.184.219**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**7,36%**	**31,11%**	**78,62%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$14.753.652**	**562.332.841**	**$157.517.060**					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (A)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (A')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 200.333.957,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 200.333.957,00**	**$ 157.517.060,00**	**78,63%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Se espera el envio de la nueva solicitud de transferencia para liquidacion de personal y proveedores.

Aprueba Firma:
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de interventoria:
Matrícula Profesional No.: 94382-95679 NTS

Aprueba Firma:
Nombre: GABRIEL MARIO VESGA MEJIA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 121037-0568545 NTS


Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


5. Anexos

5.1 Relación de correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia y fecha de recibo.

Los anexos de correspondencia estarán en un archivo pdf dentro de la carpeta correspondencia con su respectivo cuadro de envío y recibido.

5.2 Copia de la bitácora del mes correspondiente.

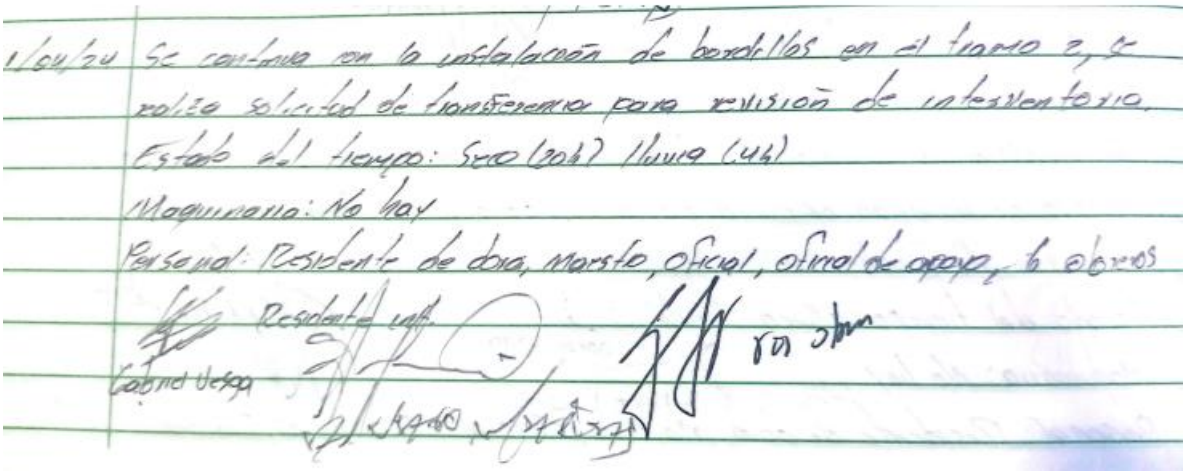

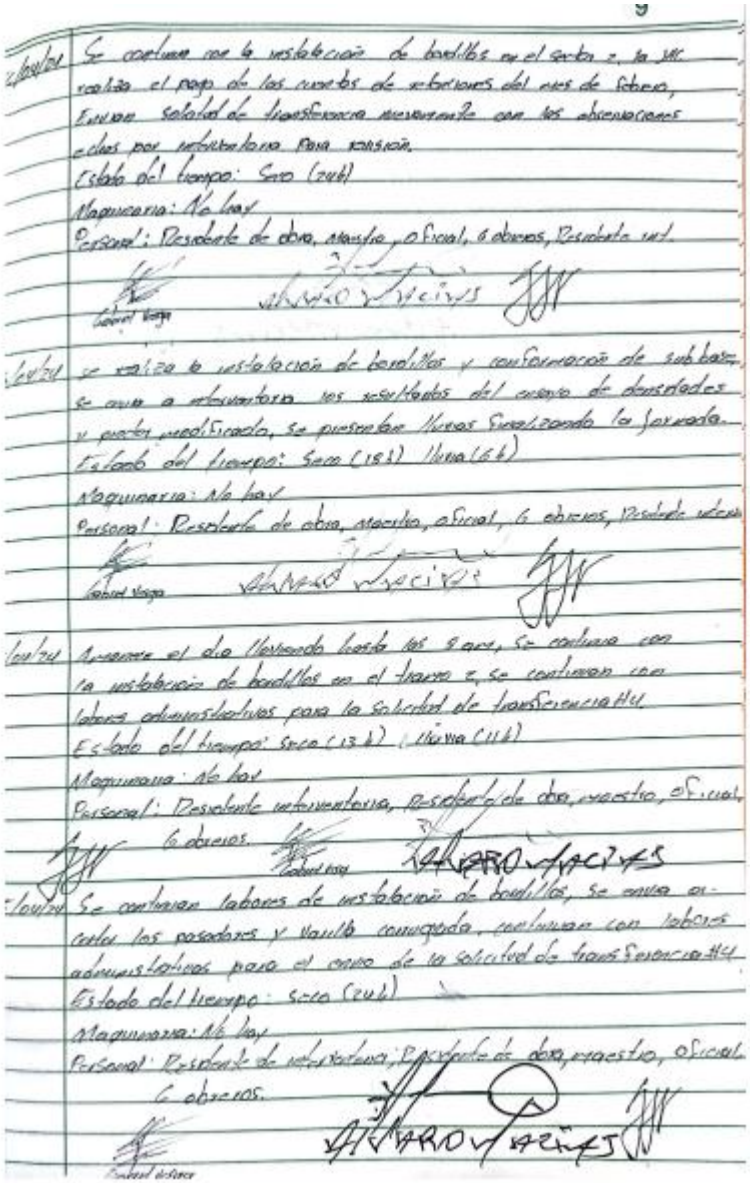


9

2/abril/24 Se continua con la instalación de bordillos en el sector 2, se realiza el pago de los aportes de seguridad social del mes de febrero, Envian solicitud de transferencia nuevamente con las observaciones echas por interventoria para revisión.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros, Residente int.

3/abril/24 se realiza la instalación de bordillos y conformación de subbase, se envia a intervantoria los certificados del cruce de densidades y punto modificado, se presentan lluvias suspendiendo la jornada.
Estado del tiempo: Seco (18h) lluvia (6h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros, Residente inter

4/abril/24 Aparece el dia llevando hasta las 9 am, Se continua con la instalación de bordillos en el tramo 2, se continuan con labores administrativas para la solicitud de transferencia HU.
Estado del tiempo: Seco (13h) lluvia (11h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros.

5/abril/24 Se continuan labores de instalación de bordillos, se envia a revisión los pasadores y vaulb cumplido, continuan con labores administrativas para el cruce de la solicitud de transferencia HU
Estado del tiempo: seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros.

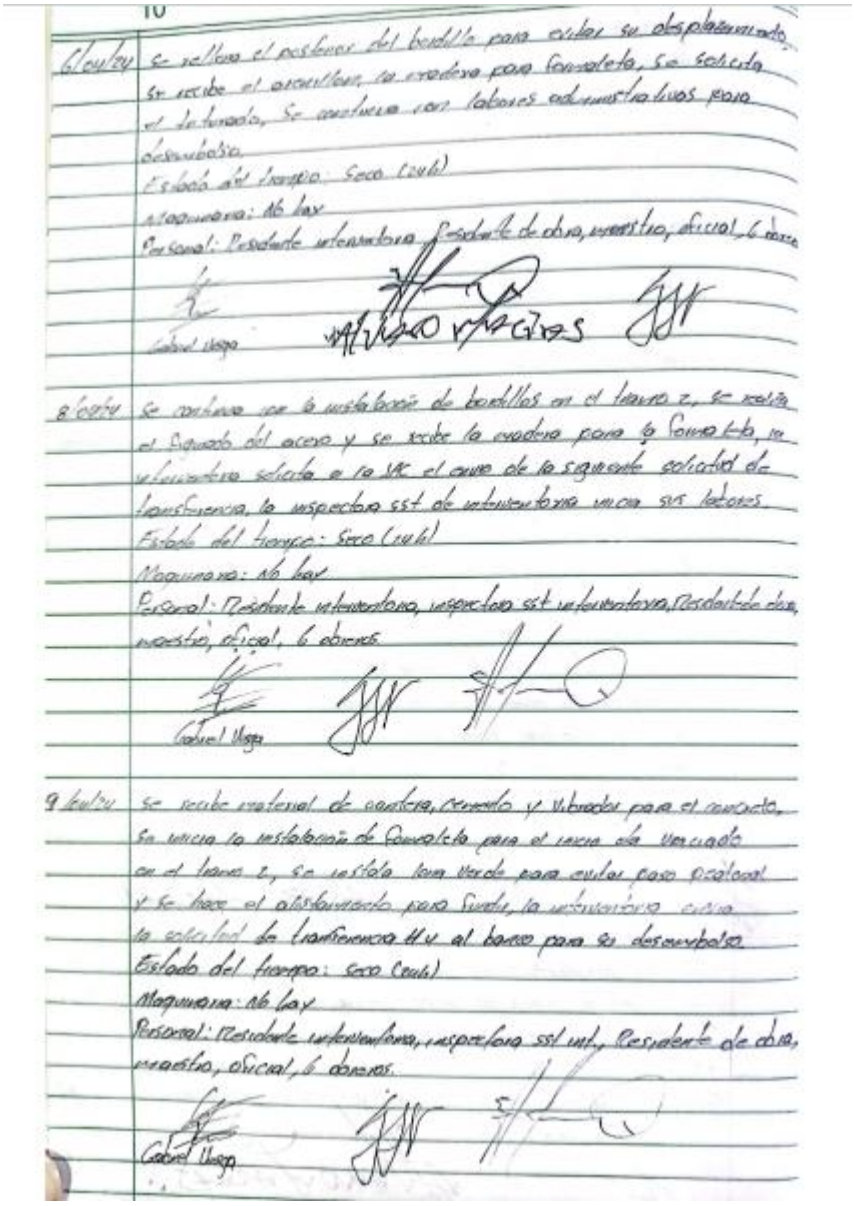

10

6 feb/24 Se retiran el postenor del bordillo para evitar su desplazamiento. Se recibe el concreto, se vaciaron para formaleta, se saturo el terreno, se continua con labores administrativas para desembolso.
Estado del tiempo: Seco (nub)
Maquinaria: N6 hay
Personal: Residente interventoria, residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros


Gabriel Vega

8 feb/24 Se continua con la instalación de bordillos en el tramo 2, se realiza el fraguado del acero y se recibe la madera para la formaleta, se realizo la solicitud a la UE el avance de la siguiente solicitud de transferencia, la inspectora sst de interventoria vincula sus labores.
Estado del tiempo: Seco (nub)
Maquinaria: N6 hay
Personal: Residente interventoria, inspectora sst interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros

Gabriel Vega

9 feb/24 Se recibe material de cantera, cemento y ladrillos para el concreto, se inicia la instalación de formaleta para el vaciado del tramo 2, se instala lona verde para evitar paso peatonal y se hace el abastecimiento para fundir, la interventoria avala la solicitud de transferencia #4 al banco para su desembolso
Estado del tiempo: Seco (nub)
Maquinaria: N6 hay
Personal: Residente interventoria, inspectora ssl int, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros

Gabriel Vega

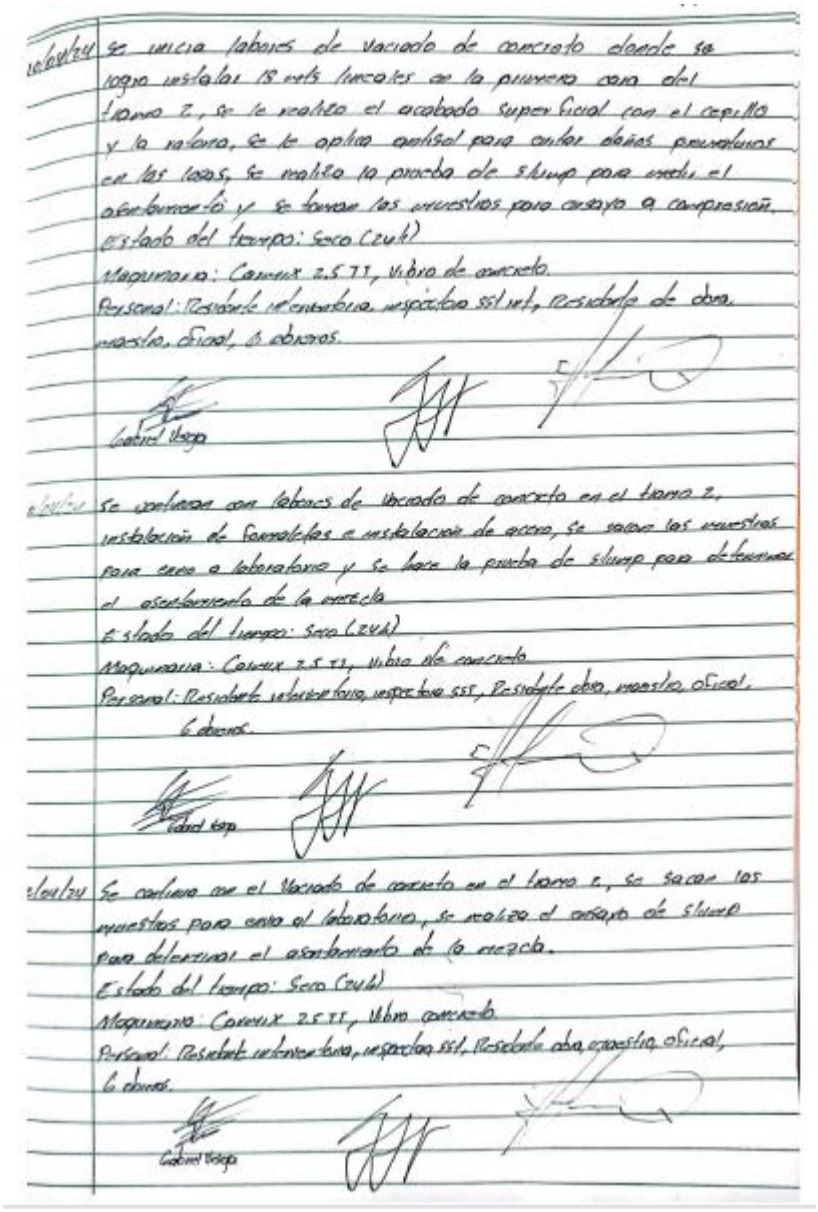

16/04/24 Se inicia labores de vaciado de concreto donde se logro instalar 18 mts lineales de la primera cara del tramo 2, se realizo el acabado superficial con el cepillo y la talocha, se le aplico curisol para curar dichas pruebas en las losas, se realizo la prueba de slump para medir el asentamiento y se tomaron las muestras para ensayo a compresión.
Estado del tiempo: Seco (cub)
Maquinaria: Camion 2.5 TT, Vibro de concreto.
Personal: Residente interventoria, inspector SST, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros.


Gabriel Vega

17/04/24 Se continua con labores de Vaciado de concreto en el tramo 2, instalación de formaletas e instalación de acero, se sacan las muestras para cano a laboratorio y se hace la prueba de slump para determinar el asentamiento de la mezcla
Estado del tiempo: Seco (cub)
Maquinaria: Camion 2.5 TT, Vibro de concreto
Personal: Residente interventoria, inspector SST, Residente obra, maestro oficial, 6 obreros.

Gabriel Vega

18/04/24 Se continua con el Vaciado de concreto en el tramo 2, se sacan las muestras para cano al laboratorio, se realizo el ensayo de slump para determinar el asentamiento de la mezcla.
Estado del tiempo: Seco (cub)
Maquinaria: Camion 2.5 TT, Vibro concreto
Personal: Residente interventoria, inspector SST, Residente obra, maestro oficial, 6 obreros.

Gabriel Vega

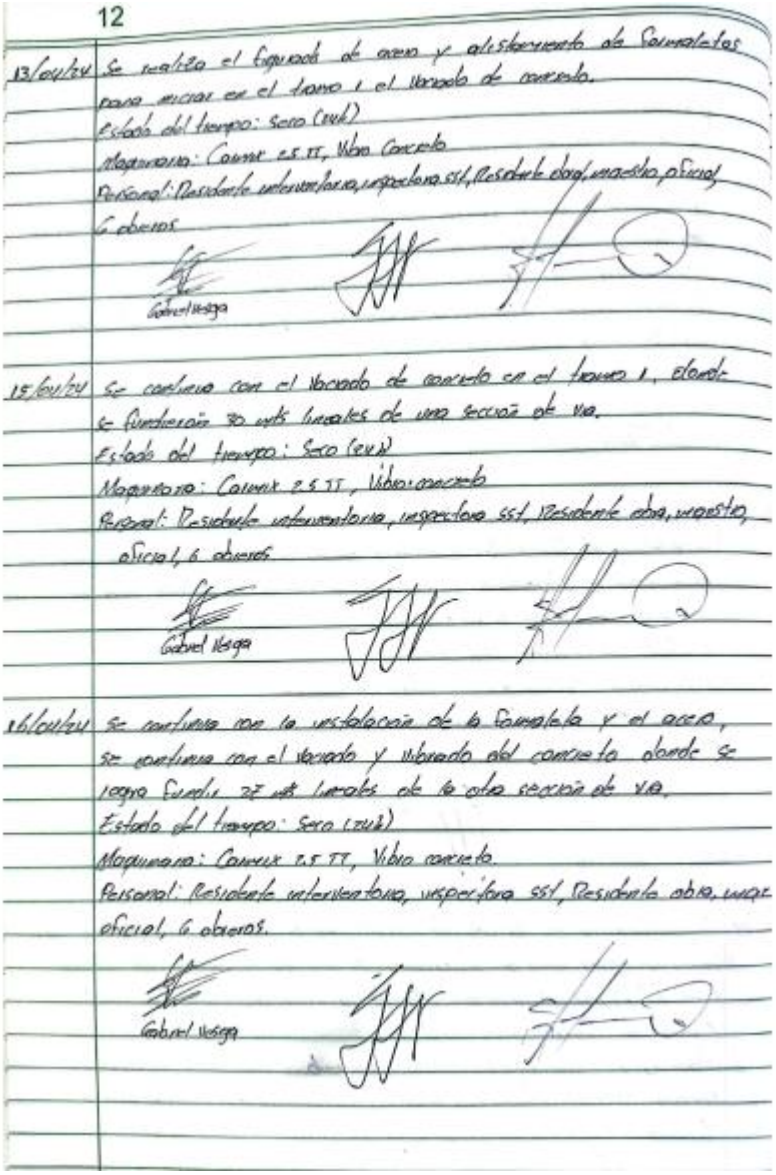

12

13/04/24 Se realiza el fraguado de acero y alistamiento de formaletas para iniciar en el tramo 1 el Vaciado de concreto.
Estado del tiempo: Seco (sol)
Maquinaria: Camion 2.5 TT, Vibro Concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.


Gabriel Vesga

15/04/24 Se continua con el Vaciado de concreto en el tramo 1, donde se fundieron 30 mts lineales de una seccion de via.
Estado del tiempo: Seco (sol)
Maquinaria: Camion 2.5 TT, Vibro concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros

Gabriel Vesga

16/04/24 Se continua con la instalacion de la formaleta y el acero, se continua con el Vaciado y Vibrado del concreto donde se logro fundir 32 mts lineales de la otra seccion de via.
Estado del tiempo: Seco (sol)
Maquinaria: Camion 2.5 TT, Vibro concreto.
Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Residente obra, maestro oficial, 6 obreros.


Gabriel Vesga

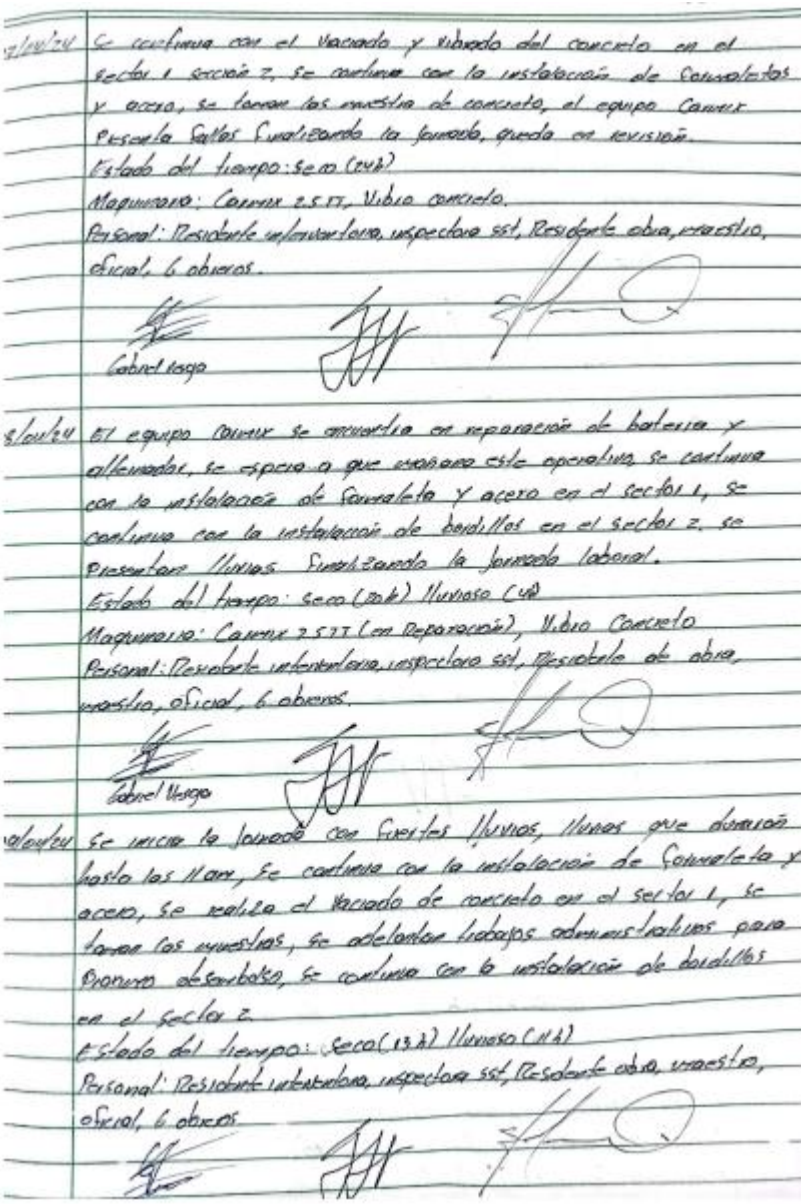

7/04/24 Se continua con el Vaciado y Vibrado del concreto en el Sector 1 sección 7, se continua con la instalación de Cerramientos y acero, se toman las muestra de concreto, el equipo Camión Pescada Salas finalizando la jornada, queda en revisión.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Camión 2.5 m³, Vibro concreto.
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.
Gabriel Vargas

8/04/24 El equipo Camión se encuentra en reparación de batería y alternador, se espera a que ingresen este operativo se continua con la instalación de Cerramiento y acero en el sector 1, se continua con la instalación de bordillos en el sector 2, se presentan lluvias finalizando la jornada laboral.
Estado del tiempo: Seco (24h) Lluvioso (4h)
Maquinaria: Camión 2.5 m³ (en Reparación), Vibro Concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros.
Gabriel Vargas

9/04/24 Se inicia la jornada con fuertes lluvias, lluvias que duraron hasta las 11am, se continua con la instalación de Cerramiento y acero, se realiza el Vaciado de concreto en el sector 1, se toman las muestras, se adelantan trabajos administrativos para Proceso de Cerrado, se continua con la instalación de bordillos en el sector 2.
Estado del tiempo: Seco (13h) Lluvioso (11h)
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.

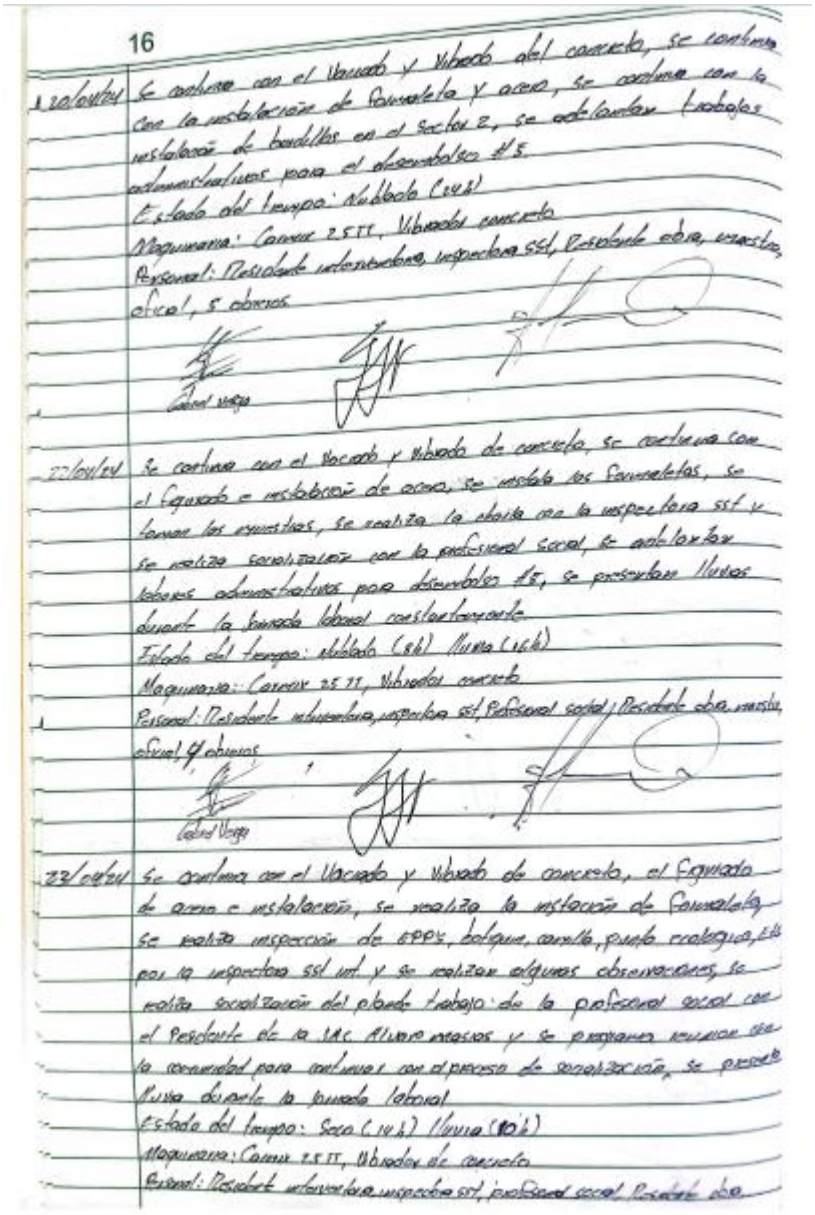

16


22/04/24 Se continua con el Vaciado y Vibrado del concreto, se continua con la instalación de formaleta y acero, se continua con la instalación de bandillas en el sector 2, se adelantan trabajos administrativos para el desembolso #5.
Estado del tiempo: Nublado (14h)
Maquinaria: Camion 2.5 TT, Vibrador concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 5 obreros

Gabriel Vega

23/04/24 Se continua con el Vaciado y Vibrado de concreto, se continua con el Fraguado e instalación de acero, se instala las formaletas, se toman los asentos, se realiza la charla por la inspectora SST y se realiza socialización con la profesional social, se adelantan labores administrativas para desembolso #5, se presentan lluvias durante la jornada laboral nuevamente.
Estado del tiempo: Nublado (8h) Lluvia (16h)
Maquinaria: Camion 2.5 TT, Vibrador concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Profesional social, Residente obra, maestro, oficial, 4 obreros

Gabriel Vega

23/04/24 Se continua con el Vaciado y Vibrado de concreto, el Fraguado de acero e instalación, se realiza la instalación de formaleta, se realiza inspección de EPPS, botiquin, camilla, punto ecologico, etc por la inspectora SST int y se realizan algunas observaciones, se realiza socialización del plande trabajo de la profesional social con el Residente de la IAC Alvaro morales y se pregunta novedades de la comunidad para continuar con el proceso de socialización, se presenta lluvia durante la jornada laboral
Estado del tiempo: Seco (14h) Lluvia (10h)
Maquinaria: Camion 2.5 TT, Vibrador de concreto
Personal: Residente interventoria inspectora SST, profesional social, Residente obra

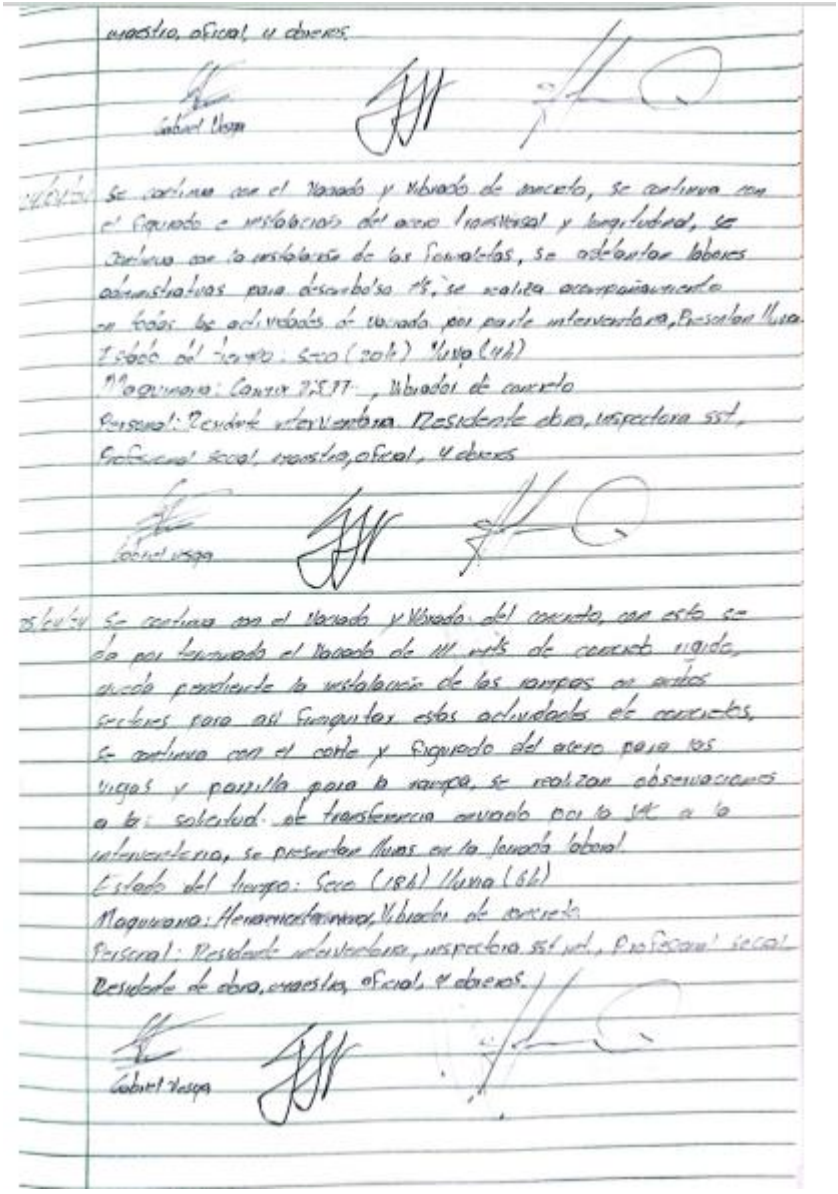

maestro, oficial, y obreros.


Gabriel Vega

Se continua con el Vaciado y Vibrado de concreto, se continua con el Fiquado e instalación del acero transversal y longitudinal, se continua con la instalación de las formaletas, se adelantan labores administrativas para desembolso #5, se realiza acompañamiento en todas las actividades de vaciado por parte interventoria, Presentan lluvia.
Estado del tiempo: Sol (20h) Lluvia (4h)
Maquinaria: Camion 3.5 TT, Vibrador de concreto
Personal: Residente interventoria, Residente obra, inspectora SST, Profesional social, maestro, oficial, y obreros

Gabriel Vega

Se continua con el Vaciado y Vibrado del concreto, con esto se da por terminado el Vaciado de 111 mts de concreto rigido, queda pendiente la instalación de las rampas en todos sentidos para asi fundirlas estas actividades ya concretas, se continua con el corte y fiquado del acero para las vigas y parrilla para la rampa, se realizan observaciones a la solicitud de transferencia enviada con la SIC a la interventoria, se presentan lluvias en la jornada laboral
Estado del tiempo: Sol (18h) Lluvia (6h)
Maquinaria: Herramientas menores, Vibrador de concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora SST ind., Profesional social Residente de obra, maestro, oficial, y obreros.


Gabriel Vega

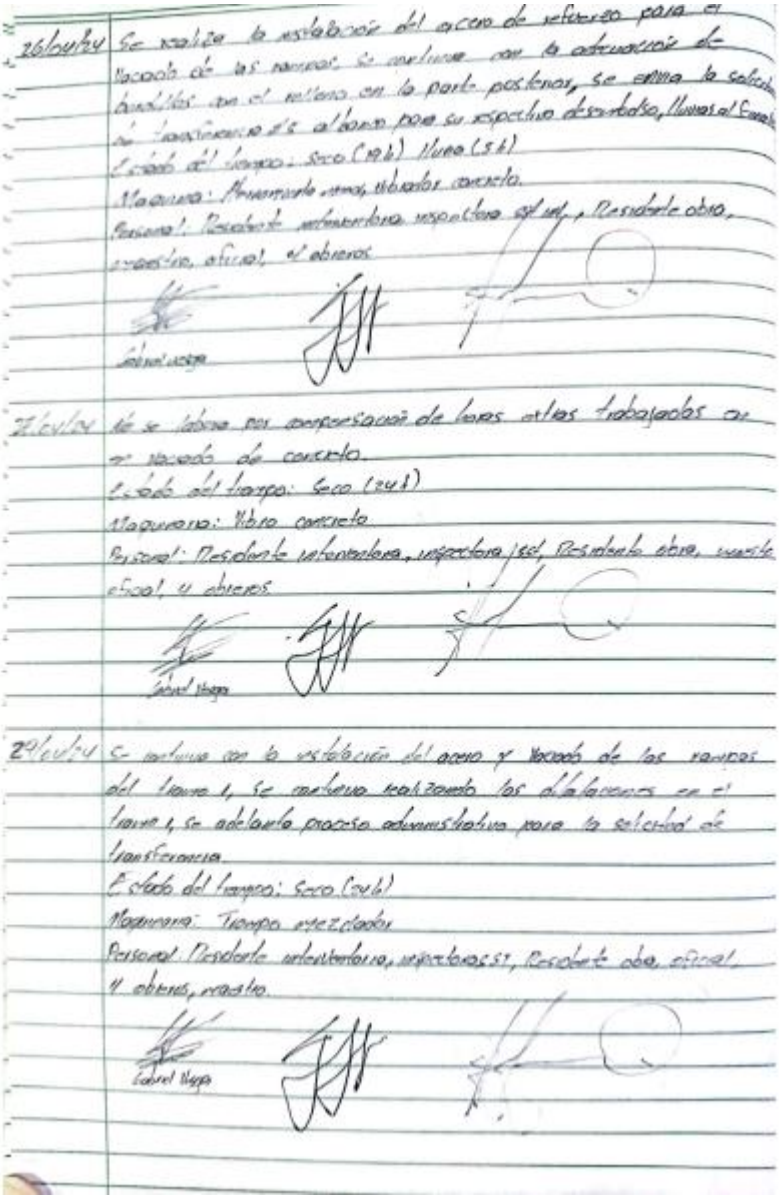

26/04/24 Se realiza la instalación del acero de refuerzo para el vaciado de las rampas se continua con la actividad de bordillos en el relleno en la parte posterior, se emite la solicitud de transferencia #3 al banco para su respectivo desembolso, llueve al finalizar el día del trabajo: Seco (9h) lluvia (3h)
Maquinaria: Amarradora, vibrador concreto.
Personal: Residente infraestructura, inspectora ejecutor, Residente obra, maestro, oficial, 4 obreros

27/04/24 No se labora por compensación de horas a los trabajados en el vaciado de concreto.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Vibro concreto
Personal: Residente infraestructura, inspectora jefe, Residente obra, maestro oficial, 4 obreros

28/04/24 Se continua con la instalación del acero y vaciado de las rampas del tramo 1, se continua realizando los alzamientos en el tramo 1, se adelanta proceso administrativo para la solicitud de transferencia
Estado del tiempo: Seco (9h)
Maquinaria: Tiempo, extendedora
Personal: Residente infraestructura, inspectora SST, Residente obra, oficial 4 obreros, maestro.

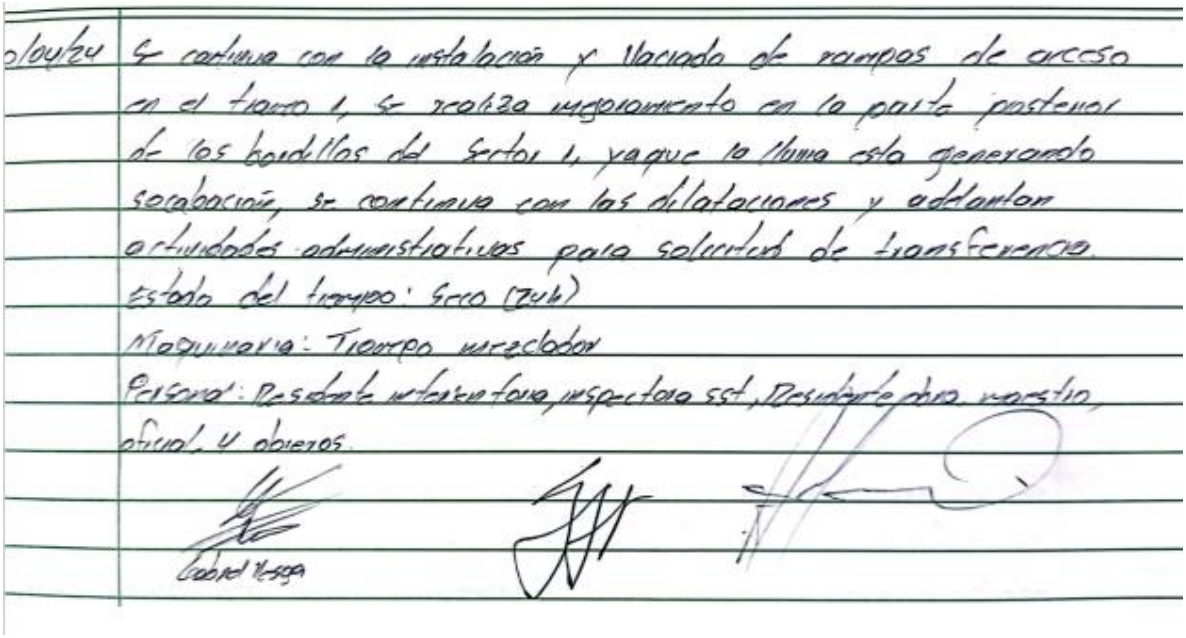

5.3 Registro fotográfico de avance de obra





LIMPPIEZA DE PARTE ALEDÑA ALA VIA E INSTALACION DE BORDILLOS







INSTALACION DEL ACERO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DEL TRAMO 2





ENSAYO PRUEBA DE SLUMP





VACIADO Y BIBRADO DE CONCRETO EN EL TRAMO 2





INSTALACI0N DEL ACERO TRANSVERSAL EN EL TRAMO 1





FINALIZANDO EL VACIADO DEL CONCRETO EN LOS TRAMOS 1 Y 2
