# CONVENIO 3317-2023

## AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL







# INFORME MENSUAL No. 6

# MAYO DEL 2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Convenio de Obra No.** 3317-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

**Contrato de Interventoría No.** 4804-2023 **Interventoría:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

**Objeto Convenio de Obra:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**INFORME MENSUAL No.** 6 **MES O PERIODO:** MAYO


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 2 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 13 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 7 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 8 |
| 2.1 | Localización | | 8 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 8 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 9 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 9 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 10 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 10 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 11 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 12 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 12 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 15 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 20 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 20 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 20 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 21 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 22 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 22 |
| 4.8 | Otros documentos seguimiento mensual | | 24 |
| | | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 24 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 24 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 24 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 24 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 25 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 27 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 27 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 28 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 30 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 30 |
| **8** | **Anexos** | | 31 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 31 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## CONTROL DE APROBACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del documento:** | | Informe Mensual de interventoría No 6 |
| **Código del documento:** | | |
| **Versión:** | **1** | |

| **ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **Actividad** | **Fecha** | **Nombre del ejecutor** | **Firma** |
| Elaboración | 10/05/2024 | Gabriel Vesga |  |
| Revisión | 10/05/2024 | Jesús Orlando Vivas |  |
| Verificación | | | |
| Aprobación | | | |

| **DISTRIBUCIÓN** | | |
|---|---|---|
| **Persona a quien se envía** | **Cargo** | **Organización** |
| Mauricio Hoyos | Supervisor | INVIAS |

| **CONTROL DE VERSIONES** | | |
|---|---|---|
| **Versión** | **Fecha** | **Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior** |
| **1** | 27/06/2024 | Envío de informe al supervisor de INVIAS |
| **2** | | |

**TABLA DE CONTENIDO**

## Contenido

1. INTRODUCCIÓN ..... 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 7
2.1 LOCALIZACIÓN ..... 7
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA ..... 8
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 9
3. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA ..... 10
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO ..... 10
3.1.1 Información contractual ..... 10
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 11
3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA ..... 12
3.3.1 Estado de pólizas ..... 12
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA ..... 14
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO ..... 14
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA ..... 17
4.3 PERSONAL CONVENIO DE OBRA ..... 18
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA ..... 20
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 21
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 21
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO DE OBRA ..... 22

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 10
Tabla 2. Póliza de cumplimiento 12
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual 13
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría 31
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría 32
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría. 34
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida 37
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada 44

## LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto 8

## LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 37
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 58

# 1. INTRODUCCIÓN

Las vías de Puerto Perales, ubicado en el departamento de Antioquia, presentan un lamentable estado de deterioro. Este es un problema que afecta no solo a la comunidad de Puerto Perales, sino también a las diversas veredas cercanas a este corregimiento.

Esta situación también tiene un impacto negativo en la economía de la región, ya que muchas veces se dificulta la movilización de productos agrícolas y ganaderos hacia los mercados. Así mismo, se limita el desarrollo del turismo en la zona, ya que los visitantes evitan transitar por estas vías en mal estado.

Es importante destacar que la falta de mantenimiento y reparación de las vías es un problema recurrente en Puerto Perales y sus veredas. A pesar de los constantes reclamos de la comunidad.

Para darle prioridad a estos lugares apartados, el instituto nacional de vías - INVIAS en conjunto con el gobierno nacional y las juntas de acción comunal desarrollaron el proyecto de caminos comunitarios para la paz total donde Puerto Perales será beneficiado mediante el convenio solidario 3317-2023 suscrito el 13 de septiembre del 2023 con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, el plazo contractual es de 3 meses donde se construirá 111 metros lineales de vía en concreto rígido que espera poder suplir las necesidades actuales mínimas de esta comunidad.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN




Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, municipio de Puerto Triunfo, en la vereda de Puerto Perales. Con este proyecto se pretende cumplir las especificaciones de vía secundaria; es decir, realizar el mejoramiento de suelo, aumentar el ancho de la vía y disminuir la presencia de curvas sucesivas.

### 1.1.1 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Desde hace mucho tiempo se viene utilizando estas vías por la cual pasan vehículos de carga pesada y liviana que con el pasar del tiempo, las lluvia y escorrentías de las mismas han deteriorado estos cruces.


Esta vía comunica las fincas aledañas con la vía principal de puerto triunfo – puerto Nare que esta a su vez se comunica el interior del casco urbano de puerto Perales, este proyecto disminuirá los costos y los tiempos de viaje que venían siendo afectados de una gran manera.

## 2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Las vías de Puerto Perales, se encuentran en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola y minera que se encuentran en la zona, además de extender los tiempos de viaje y aumentar los costos de carga.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Se realiza el replanteo de del tramo de via para toma de niveles y trazo de via en el tramo 2. | Se realiza la instalacion de estacas o cuñas para la identificacion de niveles y trazo de via en el tramo 1 |

ESTADO ACTUAL DE LA VÍA
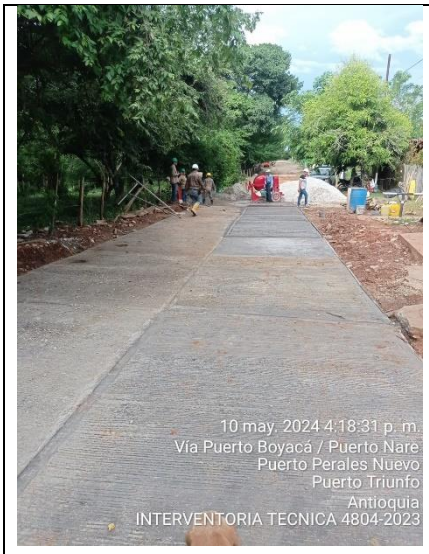
| | |
|---|---|
|  |  |
| Estado actual de la obra Corregimiento Puerto Perales | Estado actual de la obra Corregimiento Puerto Perales |

## 2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


El Alcance del proyecto será el mejoramiento con la pavimentación de 111 metros en Puerto Perales en el tramo comprendido entre el K0+000 al K0+111 respectivamente. Estas vías internas se encuentran en muy mal estado debido a la poca intervención por parte de los entes territoriales, las precipitaciones que a su vez dificultan el tráfico y aumentan los costos de operación y aumento en el recorrido de las mismas.

El departamento Antioquia realiza inversiones en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía terciaria en la vereda de Puerto Perales y las obras complementarias que garanticen la estabilidad de la vía, según los estudios y diseños aprobados por el INVIAS y de acuerdo con la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales de INVIAS.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada en el objeto del contrato 4804 de 2023.

*Ilustración 2. Estructura de pavimento propuesta*

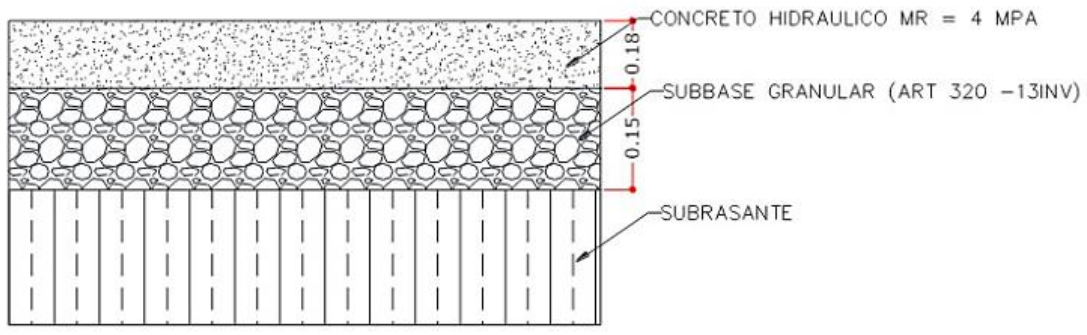

# 3. INFORMACIÓN CONVENIO DE OBRA

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

### 3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del convenio

| | |
|---|---|
| **CONVENIO No. - FECHA** | 3317 del 13 de septiembre de 2023 |
| **TIPO DE CONVENIO** | Obra |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | Dirección territorial INVIAS |
| **CONTRATISTA** | JAC PUERTO PERALES, MPIO PTO TRIUNFO |
| **C.C. o N.I.T.** | 811017456-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | Edgar Álvaro Macias Quintana |
| **C.C. o NIT** | 7.252.077 |
| **OBJETO DEL CONVENIO** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" (código BPIN No. 202300000000001)" |
| **VALOR DEL CONVENIO** | $201.333.957.00 |
| **PLAZO O DURACIÓN** | Tres (3) meses |
| **PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN** | De acuerdo con el Adicional No. 01: "Modificar el plazo de ejecución tres (03) meses más". |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | PUERTO TRIUNFO – PUERTO PERALES |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de designación) | MAURICIO HOYOS. Director territorial INVIAS Antioquia. |
| **INTERVENTOR (Externo)** | Interventor Externo Jesús Orlando Vivas Noguera del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 4804 de 2023 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 12/12/2023 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 13/09/2023 |
| **FECHA DE INICIO** | 12/12/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | HASTA 31/12/2023 |
| **FECHA PRORROGA 01** | HASTA 14/03/2024 |
| **FECHA PRORROGA 02** | HASTA 30/04/2024 |

| | |
|---|---|
| **FECHA PRORROGA 03** | HASTA 30/05/2024 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 10/05/2024 |

## 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 01 al 10 de mayo de 2024 de ejecución del convenio 3317 de 2023, el Contratista JAC Puerto Perales, realizó las siguientes actividades administrativas.

- Se adelantan procesos administrativos para el desarrollo de las solicitudes de transferencias.

- Se realiza el envío de la solicitud de transferencia #6 para revisión y aprobación de interventoría.

- Se realiza socialización con el invias e interventoría para finiquitar el proceso de prorroga y de desembolsos para liquidar proveedores y nómina.

Se adelantarán las siguientes actividades técnicas:

➔ Se realizó la construcción de las rampas de acceso al pavimento rígido en concreto reforzado y detalles finales de obra.



ACABADO FINAL VÍA



ACABADO FINAL VÍA



ACABADO FINAL VÍA

## 3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo analizado, el contrato de obra se encuentra en la etapa de culminación de actividades de obra, con un avance del 100%.

La interventoría reitera al Contratista el adecuado uso de los implementos de protección personal, esto para evitar futuros accidentes laborales.

La interventoría les solicita el acompañamiento constante del residente de obra, ya que en ocasiones no se encuentra en el sitio de trabajo haciendo de esto un problema para el desarrollo y avance de la obra en temas de calidad y tiempos.

### 3.3.1 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presentó la póliza de cumplimiento No 100284287, con respecto a la fecha de inicio y prorroga, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 20% | $ 40.266.791,40 | 13/09/2023 | 10/05/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.066.697,85 | 13/09/2023 | 10/05/2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.400.187,10 | 10/05/2024 | 10/05/2029 |

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.100069231, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS SA y aprobada por la gobernación de Antioquia. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | | |
| Predio, labores y operaciones. | | $ 260.000.000,00 | 13/09/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | | | | |
| Vehiculos propios y no propios | | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | | |

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

## RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 y el 10 de mayo de 2024, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 10/05/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** may-24

**CONVENIO No.:** 3317 - 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 12/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28/12/2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17/01/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/05/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 4 meses y 28 días

**VALOR INICIAL :** $ 201.333.957,00
**VALOR ADICIONALES:** $
**VALOR ACUMULADO:** $ 201.333.957,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ 200.333.957,00
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $

**CONTRATO DE INTERVENTOR** 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

**ALCANCE FÍSICO CONTRATADO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | ML | 130 |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | Muro de Contención | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

**AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | ML | 6 | 130 |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

**AVANCE FINANCIERO**

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | $ 152.512.376,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.545.371,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 44.276.210,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 201.333.957,00 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 165.083.957,00 | 165.083.957,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 750.000,00 | 750.000,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 35.500.000,00 | 35.500.000,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 201.333.957,00 | 201.333.957,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 201.333.957,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 201.333.957,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11


**REGISTRO FOTOGRÁFICO**










Indicar la localización y actividad.




Indicar la localización y actividad.

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor, Dirección Territorial

## 4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°21. (03 al 10 mayo de 2024)

| | | |
|---|---|---|
| | **JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA** | **VERSIÓN: 01** |
| | **INFORME MENSUAL No. 6** | **FECHA: 01 al 10 de mayo de 2024** |
| | **CONTRATO No. 4804 DEL 2023** | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 10/05/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 21 del 3/05/2024 al 10/05/2024 — Ultimo Informe Semanal Si (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de pavimento rigido.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 172 m de pavimento rigido de 18cm de espesor con un ancho de via de 4,7 mts en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo

**CONVENIO SOLIDARIO:**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3317-2023 | VALOR INICIAL: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE INICIO: | 12/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 201.333.957,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

INTEGRANTES: N/A

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 4804 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 57.596.402,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/04/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONVENIO/ CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 201.333.957 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 201.333.957 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 201.333.957 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 57.596.402 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 56.594.082 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 57.596.402 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**CONVENIO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONVENIO (A): | $ 201.333.957,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 201.333.957,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 201.333.957,00 | 100,00% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ | % |
| (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 201.333.957,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 201.333.957,00 | 100,00% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | 0,00% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 42.816.097,00 | 21,27% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 42.816.097,00 | 21,27% |

Observaciones: Se realiza un estimado de gastos semanales ya que se esperaba que pasaran la solicitud de transferencia para determinar el gasto real.

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 57.596.402,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 56.594.082,83 | 98,26% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 9.735.600,00 | 16,28% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 9.735.600,00 | 16,28% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | x | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VJVRAZ-035450 2024-04-22 21:04:57

PERIODO FACTURADO: abril-2024

VALOR FACTURA: $ 19.024.767,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Se encuentra en proceso de pago

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % 0%

Meta Física Ejecutada % 100%

**Meta Física (Programa de Obra)**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| * | Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ | 93,6 | m3 |
| * | | | |
| * | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prog | 93,6 | | | 93,6 | 100,0% |
| | Ejec | 93,6 | | | 93,6 | 100,0% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| Herramienta menor | 1 | 1 |
| Mezcladora de concreto | 1 | 1 |
| Vibrador de concreto eléctrico de aguja | 1 | 1 |
| | | |
| Total | | 3 |

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | LA ARENA, TRITURADO Y MATERIAL PETREO SE COMPRÓ EN LAS FERRETERIAS Y DEPOSITOS DE MATERIALES DE PUERTO TRIUNFO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | EL AGUA SE ADQUIRIO DEL ACUEDUCTO | PERMISO MINERO: | SI N.A. | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO x | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO x | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO X | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO X | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO X | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO X | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO X | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO X | N/A | |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: No aplica porque es una obra de bajo impacto ambiental, por lo tanto se hace Plan de Gestión Ambiental

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 9 | 3 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 7 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 2 | 1 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 3 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 1 |
| ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: | 7 |
| DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 1 |

OBSERVACIONES:

Se hicieron 3 socializaciones

La de inicio con funcionarios de invias

La de atención a la comunidad con la Profesional Social de Interventoria

La de entrega de la obra a la comunidad

## VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó la instalación de formaleta, acero de refuerzo y vaciado de concreto reforzado en el ultimo tramo de via, culminando con las actividades propuestas en el presupuesto de obra.

## VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

## VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ajustes a Estudios y diseños** | 100% | Programado | 100% |
| | 100% | Ejecutado | 100% |
| **Placa huella** | 100% | Programado | 100% |
| | 100% | Ejecutado | 100% |
| **alcantarillas** | 0% | Programado | |
| | 0% | Ejecutado | |

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




ACABADO FINAL VIA




ACABADO FINAL VIA




ACABADO FINAL VIA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA**

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:

NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO DE OBRA

Se describe el estado actual de los equipos y maquinaria a utilizar en este periodo comprendido entre el 1- 10 de mayo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 denominado “Maquinaria y equipo convenio obra”.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** may-24 **PROYECTO:** ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONVENIO No.** 3317-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4804-2023 **INTERVENTORÍA:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO | | 0,2 M3 | PTO PERALES | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIBRO CONCRETO | HONDA | 6,5 HP- 1400 RPM | PTO PERALES | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 2 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 2 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

LOS DIAS EN BLANCO LA MAQUINARIA ESTABA FUERA DE LA OBRA EN MANOS DE LOS PROPIETARIOS

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por “Activo” el estado de la maquinaria disponible y en uso, por “Inactivo” el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y “en reparación” el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla “Observaciones de la Interventoría” las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT

Firma
Nombre: GABRIEL MARIO VESGA MEJIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0568545 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.3 PERSONAL CONVENIO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra en el periodo comprendido entre 01 al 10 de mayo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 denominado “Personal del contratista de obra”.

En el presente período se reporta solo el personal mínimo requerido.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 811017456-1 | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO DE | CALLE 19 20 75 CORR DE PUERTO PERALES | 3118478863 | j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | OBRAS CIVILES | 002 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-05 | E | 21/05/2024 | 77209858 | $661.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 17.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 50.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.800 | 2 |
| EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900604350-0 | 17.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 208.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 208.200 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 133.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 133.400 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 148.700 | | | | 148.700 | 0 | 0 | 148.700 | | | 1.487 | 148.700 | 4 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 85.600 | 0 | 0 | 85.600 | 4 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 3 | 85.600 | 85.600 |
| Pensión | 2 | 341.600 | 341.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 148.700 | 148.700 |
| CCF | 1 | 85.600 | 85.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 7 | 661.500 | 661.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO** | **NÚMERO** | **NOMBRE APORTANTE** | | **DIRECCIÓN** | **TELÉFONO** | **CORREO** |
| NI | 811017456-1 | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PE | | CALLE 19 20 75 CORR DE PUERTO PERALES | 3118478863 | j.a.c.depuertoperalesantioquia@gmail.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | OBRAS CIVILES | 002 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLANILLA ASOCIADA** | **FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)** | **TIPO PLANILLA** | **FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)** | **NÚMERO PLANILLA** | **CANTIDAD** | |
| | | | | | **EMPLEADOS** | **UPC** |
| | | | | | 4 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIONES** | | | | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2024-06 | 2024-05 | E | 21/05/2024 | 77209858 | $661.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Tipo** | **No. de Identificación** | **Apellidos y Nombres** | **Cotizante** | **Subtipo** | **Extranjero** | **Colom. exterior** | **Estudiante** | **ING** | **RET** | **TDE** | **TAE** | **TDP** | **TAP** | **VSP** | **VST** | **SLN** | **IGE** | **LMA** | **VAC** | **AVP** | **VCT** | **IRL** | **CORRECCIÓN** | **Cód. AFP** | **IBC AFP** | **Cotización** | **Voluntario Afiliado** | **Voluntario Aportante** | **Fondo pensional de solidaridad** | **Fondo pensional de subsistencia** | **Cód. EPS** | **IBC EPS** | **Cotización / Valor UPC** | **Cód. ARL** | **IBC ARL** | **Clase de Riesgo** | **Cotización** | **Código CCF** | **IBC CCF** | **Aporte CCF** | **IBC otros parafiscales** | **Aporte SENA** | **Aporte ICBF** | **Aporte ESAP** | **Aporte MEN** |
| 1 | CC | 1001369081 | RESTREPO ZAPATA JERONIMO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 433.334 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 433.334 | 17.400 | 14-11 | 433.334 | 5 | 30.200 | CCF03 | 433.334 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 21854923 | CIRO SERNA YURI ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 433.334 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS040 | 433.334 | 17.400 | 14-11 | 433.334 | 5 | 30.200 | CCF03 | 433.334 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 7250793 | CAICEDO LUIS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 433.334 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 433.334 | 17.400 | 14-11 | 433.334 | 5 | 30.200 | CCF03 | 433.334 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 80276751 | MARIN OSPINA JOSE ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 833.334 | 133.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 833.334 | 33.400 | 14-11 | 833.334 | 5 | 58.100 | CCF03 | 833.334 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

**CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**
**(PERSONAS JURÍDICAS)**

EDGAR ALVARO MACIAS QUINTANA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.252.077 de Puerto Boyacá en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES identificada con el NIT 811017456-1, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por Junta de Acción Comunal durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción de este documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en PUERTO PERALES, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2024.



_____
EDGAR ALVARO MACIAS QUINTANA
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 10/05/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONVENIO No:** 3317-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** may-24 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4804-2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS EDUARDO CAICEDO | 7.250.793 | Obrero | $ 1.300.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 433.334,00 | $ 30.200 | V | FAMISANAR | 77209858 | $ 17.400 | PORVENIR | 77209858 | $ 17.400 | $ 69.400,00 | EXONERADO | EXONERADO | |
| 2 | JERONIMO RESTREPO ZAPATA | 1.001.369.081 | Obrero | $ 1.300.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 433.334,00 | $ 30.200 | V | NUEVA EPS | 77209858 | $ 17.400 | PORVENIR | 77209858 | $ 17.400 | $ 69.400,00 | EXONERADO | EXONERADO | |
| 3 | YURY ALEJANDRA CIRO SERNA | 21.854.923 | Obrero | $ 1.300.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 433.334,00 | $ 30.200 | V | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 77209858 | $ 17.400 | PORVENIR | 77209858 | $ 17.400 | $ 69.400,00 | EXONERADO | EXONERADO | |
| 4 | JOSE ANTONIO MARIN OSPINA | 80.276.751 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 833.334,00 | $ 58.100 | V | NUEVA EPS | 77209858 | $ 33.400 | COLPENSIONES | 77209858 | $ 33.400 | $ 133.400,00 | EXONERADO | EXONERADO | |
| 5 | Sergio Amaury Durango Zora* | 98.505.041 | Contratista OPS Ingeniero Residente de obra | $ 3.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 1.166.667,00 | $ 81.200,00 | V | NUEVA EPS | 77209858 | $ 145.833,00 | COLPENSIONES | 77209858 | $ 175.000 | $ 186.667 | | | |
| 6 | NANCY LILIANA GIL CASTELBLANCO* | 1.018.427.681 | Contratista OPS Contadora | $ 1.820.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | $ 606.667,00 | $ 3.167,00 | I | NUEVA EPS | 77209858 | $ 75.833,00 | COLPENSIONES | 77209858 | $ 91.000 | $ 97.067 | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):**

El contratista adjunta la certificación de fecha 21/05/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT

Firma
Nombre: EDGAR ALVARO MACÍAS QUINTANA
Presidente JAC
Numero de C.C. No. 7.252.077

Firma
Nombre: Jesus Orlondo Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

**A continuación, se adjuntan los oficios enviados y rercibidos a la pagina oficial de IDEAM**

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato 4843-2023-INVIAS – ANTIOQUIA
Interventor contrato 4804-2023-INVIAS - ANTIOQUIA

**Oficio: Territorial 2024-21**

Cúcuta, 25 de octubre de 2024

Señores
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDEAM
Ciudad.

Asunto: INFORME PLUVIOMETRICO

Estimados Señores

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el registro pluviométrico correspondiente a la estación meteorológica más cercana a las veredas CARLOTA Y PALESTINA, ubicadas en el municipio de PUERTO BERRIO, y al corregimiento de PUERTO PERALES Y VEREDA ESTACION PUERTO PITA ubicadas en el Municipio de PUERTO TRIUNFO departamento de Antioquia, para los meses de abril mayo, junio y septiembre del presente año.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a cualquier documentación o información adicional quese requiera para procesar esta solicitud.

Por favor responder a través de los siguientes correos electrónicos:
interventoria4843.2023@gmail.com ; interventoria4804.2023@gmail.com

Atentamente,



**JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular (57) 3132718526

Gmail **Jesús Vivas <interventoria4843.2023@gmail.com>**

# Respuestas Radicado2

1 mensaje

**Contacto No-Reply** <contacto-no-reply@ideam.gov.co> 25 de octubre de 2024, 4:57 p.m.
Para: "interventoria4843.2023@gmail.com" <interventoria4843.2023@gmail.com>

***Respetado(a) usuario(a)***

***Su solicitud ha sido recibida, radicada con el Número:*** 20249910120474 ***y asignada al área técnica correspondiente.***

***Usted podrá realizar seguimiento a esta solicitud, ingresando al link: "CONSULTA RADICADO WEB ORFEO" a través de la página web del IDEAM link: "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA", para la consulta requiere utilizar el PIN:*** 3118

| IDEAM | |
|---|---|
| | Radicado: 20249910120474<br>Fecha: 2024-10-25 15:53<br>Radico: RADICADOR4<br>Destino: GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO<br>JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA<br>Rem/Des :<br>Asunto : SOLICITUD INFORME PLUVIOMETRICO |

***Favor no contestar este correo***

***Gracias por contar con nosotros.***

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

**GESTIÓN DOCUMENTAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO**
Ventanilla de Correspondencia
contacto@ideam.gov.co
Tel: (571) 352 7160 Ext. 1204
Linea nacional 018000 110 012
Calle 25D No. 96B - 70 Bogotá D.C
www.ideam.gov.co

FORMATO MEPI-MN1- IN-15-FR-10

A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el 1 al 10 mayo de 2024, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONVENIO No:** 3317 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4804-2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:** El registro del IDEAM no contiene informacion aun del mes en mension.
Hasta el momento en el IDEAM no se encuentran registros para el rango de mayo de 2024

Firma
Nombre: Sergio Amaury Durango Zora
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 05202124547 ANT

Firma
Nombre: Gabriel Mario Vesga
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 121037-0568545 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2024, se realizó la toma de muestras para el ensayo de densidades y Proctor modificado, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 denominado “Resumen ensayos laboratorio”, cuando aplique en la ejecución de obra.

## 4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS del contrato de obra.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 10 (Día) / 5 (Mes) / 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONVENIO No.** 3317-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL PUERTO PERALES, CORREGIMIENTO DE PTO PERALES

**OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

**FECHA DE INICIO:** 12/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 201.333.957,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 201.333.957,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.266.791,40 | 13/09/2023 | 31/10/2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.066.697,85 | 13/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.400.187,10 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **NB-**100284287

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 16/11/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | | |
| Predio, labores y operaciones. | | $ 260.000.000,00 | 13/09/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | | | | |
| Vehiculos propios y no propios | | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-**100069231 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 16/11/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 20% | $ 40.266.791,40 | 30/04/2024 | 15/03/2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5% | $ 10.066.697,85 | 30/04/2024 | 15/05/2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 60.400.187,10 | 15/05/2024 | 15/05/2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NB-**100284027

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 28/05/2024

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 | 13/09/2023 | 15/05/2024 |
| Predio, labores y operaciones. | | | | |
| Patronal | | | | |
| Vehiculos propios y no propios | | | | |
| Contratistas y subcontratistas | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-**100069231 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 28/05/2024

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma

Nombre: Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.8 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

De acuerdo al cronograma de obra, hemos finalizado el 100% de la proyección para el convenio en la instalación de 130 metros lineales de concreto rígido, cumpliendo con la meta física establecida

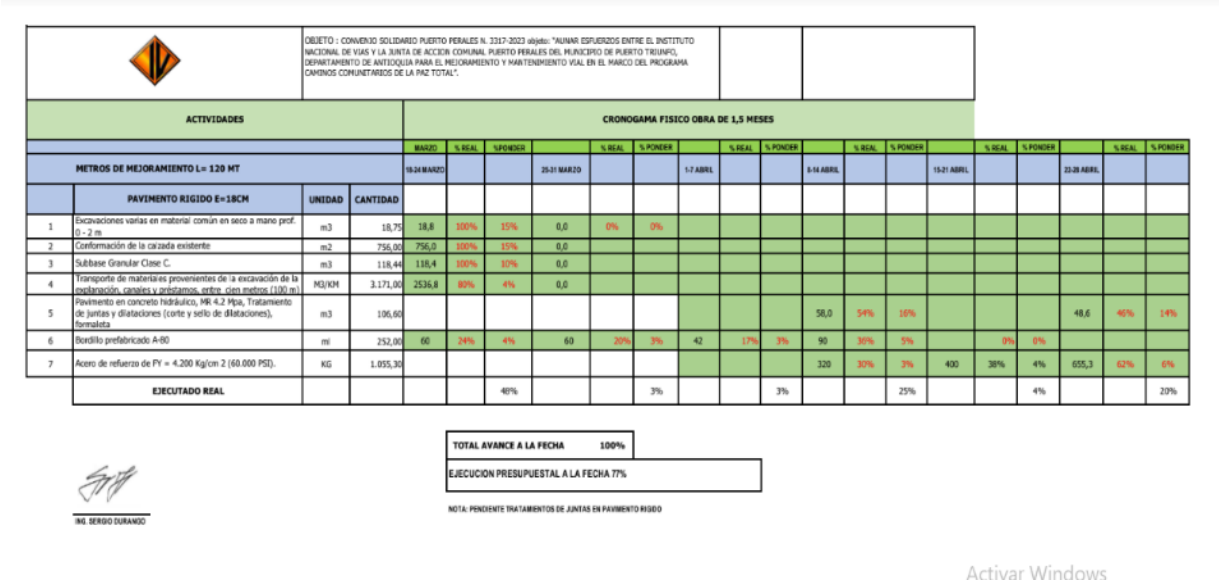

OBJETO : CONVENIO SOLIDARIO PUERTO PERALES N. 2317-2023 objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

| | ACTIVIDADES | | | CRONOGAMA FISICO OBRA DE 1,5 MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MARZO | % REAL | %PONDER | | % REAL | % PONDER | | % REAL | % PONDER | | % REAL | % PONDER | | % REAL | % PONDER | | % REAL | % PONDER | | % REAL | % PONDER |
| | METROS DE MEJORAMIENTO L= 120 MT | | | 18-24 MARZO | | | 25-31 MARZO | | | 1-7 ABRIL | | | 8-14 ABRIL | | | 15-21 ABRIL | | | 22-28 ABRIL | | | | |
| | PAVIMENTO RIGIDO E=18CM | UNIDAD | CANTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m | m3 | 18,75 | 18,8 | 100% | 15% | 0,0 | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Conformación de la calzada existente | m2 | 756,00 | 756,0 | 100% | 15% | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Subbase Granular Clase C. | m3 | 118,44 | 118,4 | 100% | 10% | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) | M3/KM | 3.171,00 | 2536,8 | 80% | 4% | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pavimento en concreto hidráulico, MR 4.2 Mpa, Tratamiento de juntas y dilataciones (corte y sello de dilataciones), formaleta | m3 | 106,60 | | | | | | | | | | 58,0 | 54% | 16% | | | | 48,6 | 46% | 14% | | |
| 6 | Bordillo prefabricado A-80 | ml | 252,00 | 60 | 24% | 4% | 60 | 20% | 3% | 42 | 17% | 3% | 90 | 36% | 5% | | 0% | 0% | | | | | |
| 7 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | KG | 1.055,30 | | | | | | | | | | 320 | 30% | 3% | 400 | 38% | 4% | 655,3 | 62% | 6% | | |
| | EJECUTADO REAL | | | | | 48% | | | 3% | | | 3% | | | 25% | | | 4% | | | 20% | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL AVANCE A LA FECHA | 100% |
| EJECUCION PRESUPUESTAL A LA FECHA 77% | |

NOTA: PENDIENTE TRATAMIENTOS DE JUNTAS EN PAVIMENTO RIGIDO

ING. SERGIO DURANGO

Activar Windows

# 5. Anexos

## 5.1 Relación de correspondencia generada entre el contratista e interventor incluyendo asunto, referencia y fecha de recibo.

Los anexos de correspondencia estarán en un archivo pdf dentro de la carpeta correspondencia con su respectivo cuadro de envío y recibido.

## 5.2 Copia de la bitácora del mes correspondiente.

## 5.3 Registro fotográfico de avance de obra




FINALIZANDO EL VACIADO DEL CONCRETO




FINALIZANDO EL VACIADO DEL CONCRETO. INTERVENTORIA PRESENTE DESDE EL INICIO HASTA EL CIERRE DE OBRA

1/04/24 Se continua con la instalacion de bordillos en el tramo 2, se realizo solicitud de transferencia para revision de interventoria.

Estado del tiempo: Seco (20h) lluvia (4h)

Maquinaria: No hay

Personal: Residente de obra, maestro, oficial, oficial de apoyo, 6 obreros

Residente obra

Gabriel Vesga

Vo.Bo

2/04/24 Se continua con la instalación de bordillos en el sector 2, la JAC realiza el pago de las cuentas de retenciones del mes de febrero, Envian solatud de transferencia nuevamente con las observaciones echas por interventoria para revisión.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Maestro, oficial, 6 obreros, Residente int.

Gabriel Vega

3/04/24 se realiza la instalación de bordillos y conformación de subbase, se envia a interventoria los resultados del ensayo de densidades y proctor modificado, se presentan lluvias finalizando la jornada.
Estado del tiempo: Seco (18h) lluvia (6h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de obra, Maestro, oficial, 6 obreros, Residente interv

Gabriel Vega

4/04/24 Amanece el dia lloviendo hasta las 9 am, Se continua con la instalación de bordillos en el tramo 2, se continuan con labores administrativos para la solicitud de transferencia #4.
Estado del tiempo: seco (13h) lluvia (11h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vega

5/04/24 Se continuan labores de instalación de bordillos, se envia ac-ceptal los pasadores y Vaulá corregida, continuan con labores administrativos para el envio de la solicitud de transferencia #4.
Estado del tiempo: seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente de interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vega

6/04/24 Se retira el posterior del bordillo para evitar su desplazamiento se recibe el acero, la madera para formaleta, se solicita el fraguado, se continua con labores administrativas para desembolso.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros

Gabriel Vesga

8/04/24 Se continua con la instalación de bordillos en el tramo 2, se realiza el figurado del acero y se recibe la madera para la formaleta, la interventoria solicita a la IAC el envio de la siguiente solicitud de transferencia, la inspectora sst de interventoria inicia sus labores.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente interventoria, inspectora sst interventoria, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vesga

9/04/24 Se recibe material de cantera, cemento y Vibrador para el concreto, Se inicia la instalación de formaleta para el inicio del vaciado en el tramo 2, se instala lona verde para evitar paso peatonal y se hace el alistamiento para fundir, la interventoria envia la solicitud de transferencia #4 al banco para su desembolso.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: No hay
Personal: Residente interventoria, inspectora sst int., Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vesga

Powered by CamScanner

10/04/24 Se inicia labores de vaciado de concreto donde se logro instalar 18 mts lineales en la primera cara del tramo 2, se le realizo el acabado superficial con el cepillo y la ratona, se le aplica antisol para evitar daños prematuros en las losas, se realiza la prueba de slump para medir el asentamiento y se toman las muestras para ensayo a compresión.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Comaix 2.5 TT, Vibro de concreto.
Personal: Residente interventoria, inspectora sst int., Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vasga

11/04/24 Se continuan con labores de vaciado de concreto en el tramo 2, instalación de formaletas e instalación de acero, se sacan las muestras para envio a laboratorio y se hace la prueba de slump para determinar el asentamiento de la mezcla.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Comaix 2.5 TT, Vibro de concreto.
Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vasga

12/04/24 Se continua con el Vaciado de concreto en el tramo 2, se sacan las muestras para envio al laboratorio, se realiza el ensayo de Slump para determinar el asentamiento de la mezcla.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Comaix 2.5 TT, Vibro concreto.
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vasga

Powered by CamScanner

13/04/24 Se realiza el figurado de acero y alistamiento de formaletas para iniciar en el tramo 1 el vaciado de concreto.
Estado del tiempo: Seco (cub)
Maquinaria: Camión 2.5 TT, Vibro Concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vega

15/04/24 Se continua con el vaciado de concreto en el tramo 1, donde se fundieron 30 mts lineales de una sección de via.
Estado del tiempo: Seco (cub)
Maquinaria: Camión 2.5 TT, Vibro concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros

Gabriel Vega

16/04/24 Se continua con la instalación de la formaleta y el acero, se continua con el vaciado y vibrado del concreto donde se logra fundir 27 mts lineales de la otra sección de via.
Estado del tiempo: Seco (cub)
Maquinaria: Camión 2.5 TT, Vibro concreto.
Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Residente obra, maestro oficial, 6 obreros.

Gabriel Vega

Powered by CamScanner

7/04/24 Se continua con el vaciado y vibrado del concreto en el sector 1 sección 2, se continua con la instalación de formaletas y acero, se toman los muestio de concreto, el equipo Cammix Presenta fallas finalizando la jornada, queda en revisión.
Estado del tiempo: Seco (24h)
Maquinaria: Cammix 2.5 m³, Vibro concreto.
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vasga

8/04/24 El equipo Cammix se encuentra en reparación de bateria y alternador, se espera a que mañana este operativo, se continua con la instalación de formaleta y acero en el sector 1, se continua con la instalación de bordillos en el sector 2. se presentan lluvias finalizando la jornada laboral.
Estado del tiempo: seco (20h) lluvioso (4h)
Maquinaria: Cammix 2.5 m³ (en Reparación), Vibro Concreto
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente de obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Gabriel Vasga

9/04/24 Se inicia la jornada con fuertes lluvias, lluvias que duraron hasta las 11am, Se continua con la instalación de formaleta y acero, se realiza el vaciado de concreto en el sector 1, se toman las muestras, se adelantan trabajos administrativos para Proximo desembolso, se continua con la instalación de bordillos en el sector 2.
Estado del tiempo: seco (13h) lluvioso (11h)
Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 6 obreros.

Powered by CamScanner

20/04/24 Se continua con el Vaciado y Vibrado del concreto, se continua con la instalación de formaleta y acero, se continua con la instalación de bordillos en el sector 2, se adelantan trabajos administrativos para el desembolso #5.
Estado del tiempo: Nublado (24h)
Maquinaria: Camión 2.5 TT, Vibrador concreto
Personal: Residente interventoría, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, 5 obreros.

Gabriel Vargas

22/04/24 Se continua con el Vaciado y Vibrado de concreto, se continua con el figurado e instalación de acero, se instala las formaletas, se toman las orientaciones, se realiza la charla con la inspectora SST y se realiza socialización con la profesional social, se adelantan labores administrativos para desembolso #5, se presentan lluvias durante la jornada laboral constantemente.
Estado del tiempo: Nublado (8h) lluvia (16h)
Maquinaria: Camión 2.5 TT, Vibrador concreto
Personal: Residente interventoría, inspectora SST, Profesional social, Residente obra, maestro, oficial, 4 obreros.

Gabriel Vargas

23/04/24 Se continua con el Vaciado y Vibrado de concreto, el figurado de acero e instalación, se realiza la instación de formaleta, se realiza inspección de EPP's, botiquín, camilla, punto ecológico, Etc por la inspectora SST int. y se realizan algunas observaciones, se realiza socialización del plande trabajo de la profesional social con el Residente de la SAC Alvaro Macias y se programa reunion con la comunidad para continuar con el proceso de socialización, se presenta lluvia durante la jornada laboral
Estado del tiempo: Seco (14h) lluvia (10h)
Maquinaria: Camión 2.5 TT, Vibrador de concreto
Personal: Residente interventoría, inspectora SST, profesional social, Residente obra,

Powered by CamScanner

maestro, oficial, 4 obreros.

Gabriel Vega

24/04/24 Se continua con el Vaciado y Vibrado de concreto, se continua con el figurado e instalacion del acero transversal y longitudinal, se continua con la instalacion de los formaletas, se adelantan labores administrativas para desembolso #5, se realiza acompañamiento en todas las actividades de vaciado por parte interventoria, Presentan lluvia.
Estado del tiempo: Seco (20h) Lluvia (4h)
Maquinaria: Camion 2:5:77 , Vibrador de concreto
Personal: Residente interventoria. Residente obra, inspectora sst, Profesional social, maestro, oficial, 4 obreros

Gabriel Vega

25/04/24 Se continua con el Vaciado y Vibrado del concreto, con esto se da por terminado el Vaciado de 111 mts de concreto rigido, queda pendiente la instalacion de las rampas en ambos sectores para asi fundir estas actividades de concretos, se continua con el corte y figurado del acero para las vigas y parrilla para la rampa, se realizan observaciones a la solicitud de transferencia enviado por la SIC a la interventoria, se presentan lluvias en la jornada laboral.
Estado del tiempo: Seco (18h) Lluvia (6h)
Maquinaria: Herramientas menores, Vibrador de concreto.
Personal: Residente interventoria, inspectora sst int., Profesional social Residente de obra, maestro, oficial, 4 obreros.

Gabriel Vega

Powered by CamScanner

26/04/24 Se realiza la instalación del acero de refuerzo para el vaciado de las rampas. Se continua con la adecuación de bordillos con el relleno en la parte posterior, se envía la solicitud de transferencia #5 al banco para su respectivo desembolso, lluvias al finalizar

Estado del tiempo: seco (19h) lluvia (5h)

Maquina: Herramienta menor, vibrador concreto.

Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro, oficial, 4 obreros.

Gabriel vega

27/04/24 No se labora por compensación de horas extras trabajadas en el vaciado de concreto.

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: Vibro concreto

Personal: Residente interventoria, inspectora sst, Residente obra, maestro oficial, 4 obreros.

Gabriel Vega

29/04/24 Se continua con la instalación del acero y vaciado de las rampas del tramo 1, se continua realizando los dilataciones en el tramo 1, se adelanta proceso administrativo para la solicitud de transferencia

Estado del tiempo: seco (24h)

Maquinaria: Trompo mezclador

Personal: Residente interventoria, inspectores ST, Residente obra, oficial, 4 obreros, maestro.

Gabriel Vega

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| olayka | Se continua con la instalación y Vaciado de rampas de acceso en el tramo 1, se realiza mejoramiento en la parte posterior de los bordillos del sector 1, yaque la lluvia esta generando socavación, se continua con las dilataciones y adelanton actividades administrativas para solicitud de transferencia. Estado del tiempo: Seco (24h) Maquinaria: Trompo mezclador Personal: Residente interventoria, inspectora SST, Residente obra, maestro, oficial, y obreros. |

Cabral Vega

Gmail Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>

# ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO DE LOS CONVENIOS DE PUERTO TRIUNFO

4 mensajes

**Maria Paulina Tabares Saldarriaga** <mtabares@invias.gov.co> 26 de octubre de 2024, 4:45 p.m.
Para: Jesus Vivas <interventoria4804.2023@gmail.com>

Cordial saludo ingeniero,

Debido a la solicitud que nos hacen desde la contraloría, solicitamos con urgencia de su acostumbrada colaboración para que se nos envíe todas las ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO de los convenios de 4398-2023 con la JAC Estación Puerto Pita y 3317-2023 con la JAC Corregimiento de Puerto Perales. El primer desembolso fue en Febrero por lo que desde este mes deben ser enviadas. Además, cada acta debe estar debidamente soportada, esto incluye las cotizaciones y facturas y debe contener las decisiones y aprobaciones realizadas en la reunión con las respectivas firmas de las 3 personas con voto. Se espera estas actas a mas tardar el **lunes 28 de octubre a las 12:00 pm.**

Quedo atenta,

**Maria Paulina Tabares S.**
Ingeniera Civil - Contratista
Dirección Territorial Antioquia
Instituto Nacional de Vias

**Exención de responsabilidad:** El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

**Jesus Vivas** <interventoria4804.2023@gmail.com> 28 de octubre de 2024, 7:42 p.m.
Para: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>

**Ingeniera**
**Maria Paulina Tabares S.**
Dirección Territorial Antioquia
Instituto Nacional de Vías

Cordial Saludo

Entrego Actas de Comité Operativo del convenio de 4398-2023 de la JAC Estación Puerto Pita

Atentamente

**JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**

Ingeniero civil – Especialista enEstructuras

Director de Interventoría
[Texto citado oculto]

---

**Jesus Vivas** <interventoria4804.2023@gmail.com> 28 de octubre de 2024, 7:45 p.m.
Para: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>

COMITES OPERATIVOS PITA.zip

**Ingeniera**
**Maria Paulina Tabares S.**
Dirección Territorial Antioquia
Instituto Nacional de Vías

Cordial Saludo

Entrego Actas de Comité Operativo del convenio de 4398-2023 de la JAC Estación Puerto Pita

Atentamente

**JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**

Ingeniero civil – Especialista enEstructuras

Director de Interventoría

El sáb, 26 oct 2024 a la(s) 4:45 p.m., Maria Paulina Tabares Saldarriaga (mtabares@invias.gov.co) escribió:
[Texto citado oculto]

---

**Jesus Vivas** <interventoria4804.2023@gmail.com> 29 de octubre de 2024, 5:31 a.m.
Para: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>

**Ingeniera**
**Maria Paulina Tabares S.**
Dirección Territorial Antioquia
Instituto Nacional de Vías

Cordial Saludo

Entrego Actas de Comité Operativo del convenio 3317-2023 con la JAC Corregimiento de Puerto Perales

COMITES OPERATIVOS PERALES.zip

Atentamente

**JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**

Ingeniero civil – Especialista enEstructuras

Director de Interventoría

El sáb, 26 oct 2024 a la(s) 4:45 p.m., Maria Paulina Tabares Saldarriaga (mtabares@invias.gov.co) escribió:
[Texto citado oculto]

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** ptXaHhx/TE2v/9zv6fFBjw==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100284027 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 71945002 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 02/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 13/09/2023 | 24:00 Horas Del | 15/05/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES | **No. DOC. IDENTIDAD** | 811.017.456-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 19 20 75 PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PERALES | **TELÉFONO** | 8322326 |
| **ASEGURADO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA | **TELÉFONO** | 7056000 |
| **BENEFICIARIO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA | **TELÉFONO** | 7056000 |

## OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 15/05/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 02
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3317-2023 DEL 13/09/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 30/04/2024 | 24:00 Horas Del 15/03/2025 | 40.266.791,40 | 20.000,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 30/04/2024 | 24:00 Horas Del 15/05/2027 | 10.066.697,85 | 10.000,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 15/05/2024 | 24:00 Horas Del 15/05/2029 | 60.400.187,10 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 110.733.676,35 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS & | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 30.000,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 30.000,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 5.700,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 35.700,00 |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/05/2024 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100284027 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 71945002 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 02/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 13/09/2023 | 24:00 Horas Del | 15/05/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES CON NIT 811017456-1

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 13/09/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3317-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** nYyzMRzr6XYoki0CpxpK/A==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100069231 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 71945006 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 02/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 13/09/2023 | 24:00 Horas Del | 15/05/2024 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES | **No. DOC. IDENTIDAD** | 811.017.456-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 19 20 75 PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PERALES | **TELÉFONO** | 8322326 |
| **ASEGURADO** | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES | **No. DOC. IDENTIDAD** | 811.017.456-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 19 20 75 PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PERALES | **TELÉFONO** | 8322326 |
| **BENEFICIARIO** | TERCEROS, AFECTADOS | **No. DOC. IDENTIDAD** | |
| **DIRECCIÓN** | . | **TELÉFONO** | |

## OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 15/05/2024 SEGÚN ACTA DE PRORROGA N. 02
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3317-2023 DEL 13/09/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 30.000,00 |
| PATRONAL | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 260.000.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS & | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 30.000,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 30.000,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 5.700,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 35.700,00 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/05/2024 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100069231 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 71945006 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 02/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 13/09/2023 | 24:00 Horas Del | 15/05/2024 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES CON NIT 811017456-1

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 13/09/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3317-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.
DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF




FINALIZANDO EL VACIADO DEL CONCRETO
