DESur
Pasión que transforma

DESur
Al Contestar cite Radicado: **2024-1300-000834-E** Id: 5531
Fecha: 2024-11-12 11:39
Destinatario: MUNICIPIO DE ENVIGADO - JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Remitente: DIRECCION DE PLANEACION
Tipología Documental: COMUNICACION ENVIADA

Alcaldía de Envigado
0071929-0000007-20241113
0900 - 2024/11/13 15:45:13

DP

Envigado, 08 noviembre de 2024

Señor
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Secretaría de Obras Públicas
Carrera 40 N°39 Sur 59
Teléfono: 604 3394064
Municipio de Envigado – Antioquía.

Asunto: Remisión cuenta de cobro del contrato interadministrativo ENV-09-09-0926-21, Acta de Ejecución # 9

Cordial saludo,

Acorde al convenio interadministrativo ENV-09-09-0926-21, Acta de Ejecución # 9, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM)." Entre el Municipio de Envigado y la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado-DESur, nos permitimos remitir cuenta de cobro correspondiente a recurso administrar honorarios fuente de financiación crédito de la siguiente manera:

1. Cuenta de cobro N° 794 por valor de $ 81.919.305 correspondientes a recurso administrar honorarios fuente de financiación crédito.
2. Certificado de aportes del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
3. Tarjeta profesional del Contador.
4. Certificado de la junta central de contadores.

Cordialmente,

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente DESur.

DESur
CONTIENE ANEXOS

Anexos: se relacionan (7) folios
Notificación Interna a: No Aplica
Elaboró: Manuela Escobar Zapata -Auxiliar Administrativo DESur Manuela E
Reviso: Alejandra Cuervo Gómez -Arquitecta DESur AC6.
Visto Bueno: Laura Quintero Gaviria -Directora de Planeación(E) DESur
Tipo de Respuesta: parcial
Archivado en: contrato interadministrativo ENV-09-09-0926-21, Acta de Ejecución # 9



DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

CODIGO.	VESIÓN.	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	APROBADO.

INFORMACION GENERAL

INFORME	OCTUBRE	FECHA DE CORTE	viernes, 25 de octubre de 2024
		FECHA DE INFORME	jueves, 31 de octubre de 2024
OBJETO.	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM).		

N.° DE CONTRATO ENV-09-09-0926-21	Acta de ejecución N°9	ENTIDAD CONTRATANTE	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "DESur"	NIT.	901.387.801 - 2
FECHA SUSCRIPCIÓN.	lunes, 8 de noviembre de 2021	FECHA DE INICIO.	miércoles, 10 de noviembre de 2021	FECHA FIN	miércoles, 10 de enero de 2024
VALOR ADMINISTRAR	$ 92,990,924,733	PLAZO INICIAL	26 Meses	TRANCURRIDO	1080 Días
APORTE DESUR	$ 14,675,701	VALOR HONORARIOS	$ 5,532,960,022	VALOR TOTAL	$ 109,899,560,456

ADICIONES Y/O PRORROGAS

VALOR ADICIÓN RECURSO ADMINISTRAR No. 01	$ 11,361,000,000	PRORROGA No. 01	172 Días	SUSCRIPCIÓN	jueves, 28 de diciembre de 2023
VALOR ADICIÓN RECURSO ADMINISTRAR No. 02	$ 194,950,000	PRORROGA No. 02	184 Días	SUSCRIPCIÓN	viernes, 12 de abril de 2024
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 1	$ 11,598,335	PRORROGA No. 03	90 Días	SUSCRIPCIÓN	miércoles, 28 de agosto de 2024
VALOR ADICIÓN RECURSO ADMINISTRAR No. 03	$ 198,206,695	PRORROGA No. 04		SUSCRIPCIÓN	jueves, 10 de octubre de 2024
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 2	$ 11,793,299	PRORROGA No. 05		SUSCRIPCIÓN	
VALOR ADICIÓN RECURSO ADMINISTRAR No. 04	$ 1,376,795,045	PRORROGA No. 06		SUSCRIPCIÓN	
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 03	$ 81,919,305	PRORROGA No. 07		SUSCRIPCIÓN	
VALOR TOTAL	$ 111,774,803,135	PLAZO TOTAL	1224 Días	VENCE	lunes, 31 de marzo de 2025

SUSPENSIÓN Y REINICIO

ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01		DURACIÓN	Días
ACTA SUSPENSIÓN No. 02		ACTA REINICIO No. 02		DURACIÓN	Días
VALOR TOTAL	$ 111,774,803,135	PLAZO TOTAL		VENCE	lunes, 31 de marzo de 2025

COMPONENTE DIAGNÓSTICO

ACTIVIDAD	Diagnostico social	ACTIVIDADES RELACIONADAS	Se elaboró y entregó a la Secretaria de Obras Públicas el diagnóstico social el cual tuvo como objetivo lo siguiente: -Conocer las principales actividades constructivas que ejecutará el proyecto. -Indagar las características de la zona impactada por el proyecto, tanto de la zona donde se desarrolla como. -Identificar los actores sociales de la zona del área de influencia directa del proyecto. -Identificar las necesidades y/o problemáticas por las cuales se requiere realizar intervenciones -posibles soluciones de acuerdo con la ejecución del proyecto.
DURACIÓN	10 días		
APORTE DESur	$ 1,984,478		
% AVANCE EJECUCIÓN	100%	FECHA DE ENTREGA	27 de enero de 2022

COMPONENTE DERIVADOS

OBRA

CONTRATO No.	DESur-IA-26-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21, ACTA DE EJECUCION N°9"				
CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVO PALACIO						
VALOR CONTRATO	$ 86,626,648,060	FECHA DE INICIO.	miércoles, 23 de marzo de 2022		FECHA FIN	miércoles, 20 de diciembre de 2023	
VALOR EJECTUADO	$ 73,336,429,336	PLAZO INICIAL	637	Días	TRANCURRIDO	947	Días
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 11,361,000,000	PRÓRROGA No. 1	102	Días	FECHA FINAL	domingo, 31 de marzo de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 02		PRÓRROGA No. 2	274	Días	FECHA FINAL	lunes, 30 de diciembre de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 03		DURACIÓN	1013	Días	% AVANCE DE OBRA	73.1%	
% PARTICIPACIÓN	67.45%						

INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	DESur-IP-36-2022	OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21, ACTA DE EJECUCION N°9.				
CONTRATISTA	CONSORCIO CAM 2022						
VALOR CONTRATO	$ 4,665,743,158	FECHA DE INICIO.	jueves, 10 de marzo de 2022		FECHA FIN	domingo, 31 de diciembre de 2023	
VALOR EJECTUADO	$ 5,467,231,294	PLAZO INICIAL	661	Días	TRANCURRIDO	960	Días
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 777,685,986	PRÓRROGA No. 1	120	Días	FECHA FINAL	lunes, 29 de abril de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ 193,000,000	PRÓRROGA No. 2	77	Días	FECHA FINAL	lunes, 15 de julio de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 03	$ 196,244,252	PRÓRROGA No. 3	47	Días	FECHA FINAL	sábado, 31 de agosto de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 04	$ 1,363,163,411	PRÓRROGA No. 4	45	Días	FECHA FINAL	martes, 15 de octubre de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 05		PRÓRROGA No. 5	109	Días	FECHA FINAL	sábado, 1 de febrero de 2025	
PRÓRROGA		DURACIÓN	1059	Días	% AVANCE DE OBRA	90.7%	
% PARTICIPACIÓN	6.15%						

Observaciones:
El 10 de octubre de 2024 se aprobó la solicitud de prórroga no. 5 por 109 días calendario y la adicion no. 4 por MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CINETO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ML ($1.363.163.411)

ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTÓNICO 2022

CONTRATO No.	DESur-CD-152-2022	OBJETO	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTÓNICO, TÉCNICO Y ASESORÍA ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCIÓN N° 9 DEL CONVENIO ENV-09-09-0926-21.				
CONTRATISTA	CONINSA RAMÓN H						
VALOR CONTRATO	$ 53,041,888	FECHA DE INICIO.	viernes, 25 de noviembre de 2022		FECHA FIN	domingo, 31 de diciembre de 2023	
VALOR EJECTUADO	$ 53,041,888	PLAZO INICIAL	401	Días	TRANCURRIDO	700	Días
VALOR ADICIÓN No. 01		PRÓRROGA No. 1		Días	FECHA FINAL		Días
PRÓRROGA		DURACIÓN		Días	% AVANCE DE OBRA	100%	
% PARTICIPACIÓN	0.05%						

COMPONENTE EVALUACIÓN

NO APLICA HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

GERENCIA

VALOR CONTRATO	$ 920,847,529	Elaboración de informes de gestión, seguimiento y control, gerencia, gestión ambiental y SST, social, de veedurías, socializaciones, gestión comunicacional, de boletines, de videos de avance de obra, notas periodísticas, eventos especiales, sensibilizaciones comunitarias y general cualquier otra actividad que requiere notificación y difusión.			
VALOR EJECUTADO	$ 735,405,558				
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 1,930,000				
VALOR ADICIÓN No. 02	$ 1,962,443				
VALOR ADICIÓN No. 03	$ 13,631,634				
% AVANCE GENERAL	94%	FECHA DE INICIO.	jueves, 10 de marzo de 2022	FINALIZA	sábado, 1 de febrero de 2025

DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

CONTROL PRESUPUESTAL

VALOR ADMINISTRAR	$	106,121,856,473
VALOR CONTRATADO	$	106,121,856,473
VALOR EJECUTADO	$	79,539,066,188
RESTANTE POR EJECUTAR	$	26,582,790,285
RECURSO DISPONIBLE	$	-

% AVANCE FINANCIERO	75.0%	% AVANCE DE OBRA	73.1%

FORMA DE PAGO RECURSO ADMINISTRADO				FACTURACIÓN				SALDO		
PAGO 1.	INICIO EN SECOP II	$	3,118,025,897	CUENTA DE COBRO N°279	2021/11/23	$	3,118,025,897	PAGO 1	$	-
PAGO 2.	NOVIEMBRE 2021	$	6,127,596,801	CUENTA DE COBRO N°280	2021/11/23	$	6,127,596,801	PAGO 2	$	-
PAGO 3.	DICIEMBRE 2021	$	12,000,000,000	CUENTA DE COBRO N°369	2022/03/10	$	8,079,706,914	PAGO 3	$	-
PAGO 4.	FEBRERO DE 2022	$	16,000,000,000	CUENTA DE COBRO N°380	2022/04/19	$	1,468,138,387	PAGO 4	$	-
PAGO 5.	JUNIO DE 2022	$	16,000,000,000	CUENTA DE COBRO N°394	2022/06/02	$	335,238,670	PAGO 5	$	-
PAGO 6.	FEBRERO DE 2023	$	19,872,651,018	CUENTA DE COBRO N°400	2022/06/21	$	670,015,256	PAGO 6	$	-
PAGO 7.	ABRIL DE 2023	$	19,872,651,018	CUENTA DE COBRO N°419	2022/08/01	$	241,247,685	PAGO 7	$	-
PAGO 8. ADICION 1	AVANCE DE OBRA	$	11,361,000,000	CUENTA DE COBRO N°433	2022/09/01	$	180,814,763	PAGO 8	$	-
PAGO 9. ADICION 2	AVANCE DE OBRA	$	194,930,000	CUENTA DE COBRO N°438	2022/09/06	$	412,057,437	PAGO 9	$	-
PAGO 10. ADICION 3	SEPTIEMBRE 2024	$	198,206,695	CUENTA DE COBRO N°448	2022/09/21	$	601,406,882	PAGO 10	$	-
PAGO 11. ADICION 4	OCTUBRE 2024	$	688,397,523	CUENTA DE COBRO N°449	2022/09/21	$	161,384,469	PAGO 11	$	688,397,523
PAGO 12. ADICION 4	DICIEMBRE 2024	$	688,397,522	CUENTA DE COBRO N°462	2022/11/02	$	130,798,850	PAGO 12	$	688,397,522
				CUENTA DE COBRO N°463	2022/11/02	$	632,329,167			
				CUENTA DE COBRO N°485	2022/11/18	$	142,822,556			
				CUENTA DE COBRO N°484	2022/11/18	$	325,479,874			
				CUENTA DE COBRO N°510	2022/12/06	$	785,091,126			
				CUENTA DE COBRO N°540	2023/02/28	$	4,676,281,125			
				CUENTA DE COBRO N°539	2023/02/13	$	724,118,490			
				CUENTA DE COBRO N°544	2023/02/21	$	165,918,645			
				CUENTA DE COBRO N°545	2023/03/01	$	738,723,353			
				CUENTA DE COBRO N°547	2023/03/06	$	132,139,648			
				CUENTA DE COBRO N°553	2023/04/10	$	717,722,432			
				CUENTA DE COBRO N°554	2023/04/10	$	135,418,420			
				CUENTA DE COBRO N°569	2023/05/11	$	679,841,844			
				CUENTA DE COBRO N°570	2023/05/11	$	159,725,841			
				CUENTA DE COBRO N°573	2023/06/01	$	972,507,282			
				CUENTA DE COBRO N°580	2023/06/15	$	152,070,683			
				CUENTA DE COBRO N°581	2023/07/04	$	185,408,700			
				CUENTA DE COBRO N°590	2023/07/11	$	611,521,046			
				CUENTA DE COBRO N°600	2023/08/04	$	1,236,426,593			
				CUENTA DE COBRO N°606	2023/09/01	$	966,398,119			
				CUENTA DE COBRO N°611	2023/09/12	$	177,639,595			
				CUENTA DE COBRO N°616	2023/06/10	$	1,160,493,658			
				CUENTA DE COBRO N°620	2023/10/20	$	178,278,463			
				CUENTA DE COBRO N°630	2023/11/01	$	179,461,898			
				CUENTA DE COBRO N°631	2023/11/01	$	4,470,183,840			
				CUENTA DE COBRO N°642	2023/12/01	$	1,795,483,542			
				CUENTA DE COBRO N°643	2023/12/01	$	1,251,394,378			
				CUENTA DE COBRO N°644	2023/12/01	$	193,021,956			
				CUENTA DE COBRO N°645	2023/12/01	$	4,676,281,124			
				CUENTA DE COBRO N°663	2023/12/12	$	3,873,759,184			
				CUENTA DE COBRO N°672	2023/12/18	$	10,041,389,543			
				CUENTA DE COBRO N°679	2023/12/20	$	198,570,773			
				CUENTA DE COBRO N°685	12-26-2023	$	29,148,609,847			
				CUENTA DE COBRO N°686	12-28-2023	$	11,361,000,000			
				CUENTA DE COBRO N°735	01-08-24	$	194,930,000			
				CUENTA DE COBRO N°750	05-09-24	$	198,206,695			
TOTAL		$	106,121,856,474	TOTAL		$	104,745,061,429	TOTAL	$	1,376,795,045

CONTROL PRESUPUESTAL HONORARIOS

FORMA DE PAGO				AVANCE FINANCIERO				AVANCE EJECUCIÓN	
PAGO 1.	Honorarios Recurso administrar		$ 5,532,960,022			$	5,074,443,865		
Autorizaciones 1	Con la entrega del diagnóstico contexto social	20%	$ 1,106,592,004	CUENTA DE COBRO N.° 288	01-12-21	$	778,582,720		
Autorizaciones 2	Con un 20% de avance de obra	30%	$ 1,659,888,007	CUENTA DE COBRO N.° 289	01-12-21	$	4,754,377,302		
Autorizaciones 3	Con avance de obra	50%	$ 2,766,480,011	AUTORIZACIÓN N°1 FE 127	09-03-22	$	1,106,592,004		
PAGO 2	Adicion No.1		$ 11,598,335	AUTORIZACIÓN N°2 FE 477	16-05-23	$	1,659,888,007		
PAGO 3	Adicion No.2		$ 11,793,299	AUTORIZACIÓN N°3 FE 670	19-12-23	$	2,213,184,009		
PAGO 4	Adicion No. 3		$ 81,919,305	CUENTA DE COBRO 736	01-08-24	$	11,598,335	% EJECUCIÓN CONVENIO	90%
				CUENTA DE COBRO 751	05-09-24	$	11,793,299		
				AUTORIZACION FE 803	17-10-24	$	11,598,335		
				AUTORIZACION FE 809	24-10-24	$	11,793,299		
TOTAL		$	5,638,270,961	SALDO CUENTAS DE COBRO		$	81,919,305		
				SALDO AUTORIZACIONES		$	635,215,307		

OBSERVACIONES

El 10 de octubre de 2024 se aprobó la solicitud de prórroga no.3 por 90 días calendario y la adicion no. 4 por MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($1.458.714.350), por parte de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de envigado.

El 10 de octubre de 2024 se aprobó la solicitud de prórroga no. 5 por 109 días calendario y la adicion no. 4 por MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CINETO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ML ($1.363.163.411, al contrato derivado de Interventoría DESur-IP-36-2022


Con la aprobación de las prórrogas al contrato derivado de interventoría y al convenio, en el presente reporte se realizá la reprogramación al cronograma de actividades del convenio interadministrativo, distribuyendo las actividades a gestionar con fecha fin hasta el 31 de marzo de 2025. Con lo anterior expuesto se observa que el porcentaje del convenio Interadministrativo presenta un avance menor con respecto a los periodos anteriores pues se dispone de mayor plazo para el cumplimiento del alcance contractual.

Las actividades ejecutadas por el contratista en el período de este informe son las siguientes:


TORRE NORTE
- Excavación para construcción muros de contención
- Construcción de viga de fundación
- Armado de losa de contrapiso S2 y S2.5
- Mampostería interna
- Ejecución de revoques en mampostería
- Instalación de la red contra incendios (RCI).
- Instalación redes hidrosanitarias. (Buitrones)
- Instalación de tubería para red eléctrica embebida en muros y colgada en cielos.
- Instalación de bandejas para las redes de telecomunicaciones.
- Red de detección RCI (DCI)
- Construcción morteros de nivelación
- Construcción de muros base para ventanería
- Instalación de equipos en subestación eléctrica
- Aplicación de estuco.
- Instalación pintura fondeo
- Instalación Revoque fachada
- Instalación ductería para aire acondicionado

TORRE SUR
- Excavación, armado y vaciado de vigas de fundación y muros de contención
- Construcción filtros detrás de muros de contención
- Instalación de placas de superboard, drywall y sonowall de los muros de cerramiento acústico del teatro.
- Mampostería
- Ejecución de revoques
- Aplicación de estuco en muros internos.
- Revoque en fachadas
- Instalación de pintura fachadas
- Instalación de la red contra incendios (RCI).
- Instalación de la red de detección contra incendios (DCI).
- Instalación redes hidrosanitarias.
- Instalación de ventanería
- Impermeabilización de morteros
- Armado e instalación de ductos para la red de aire acondicionado
- Instalación enchape de piso
- Enchape en baños
- Construcción de lagrimales
- Construcción muros livianos
- Impermeabilización Jardineras
- Instalación de cortasoles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

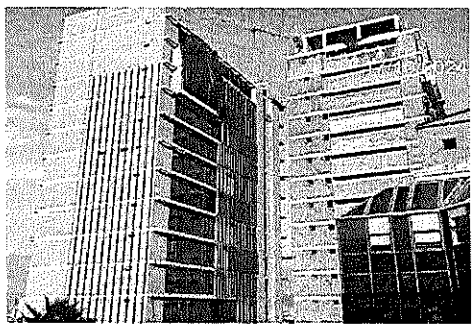


Descripción: Instalación de cortasoles
Torre Norte

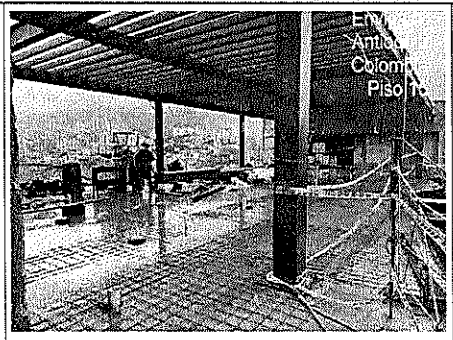


Descripción: Armado de mortero cubierta
Torre Sur




Descripción: Avance general

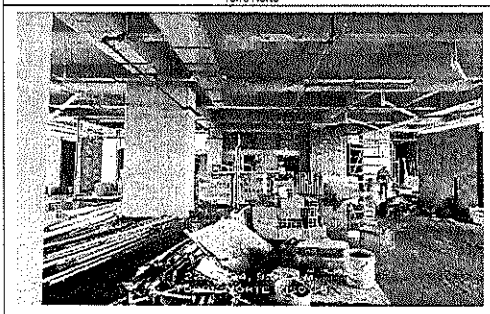

Descripción: Avance de mampostería
Torre Norte

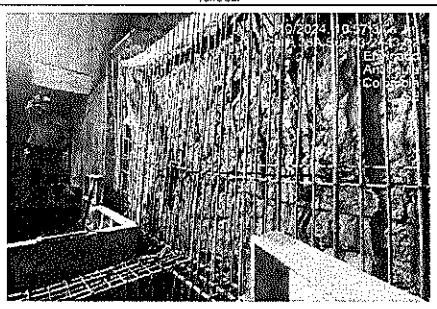

Descripción. Armado de muros de contencion
Torre Sur

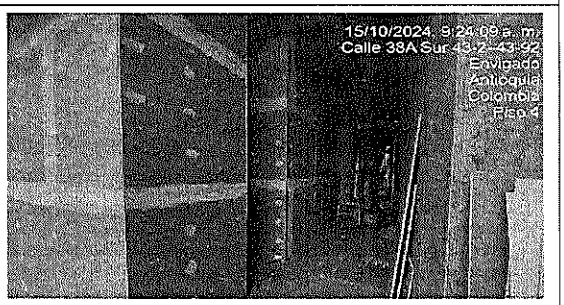

Descripción.Divisiones en muros livianos

DATOS QUIEN ELABORÓ		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA MARÍA QUINTERO GAVIRIA	
CARGO:	DIRECTORA DE EJECUCION	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESur	

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Envigado, Nov.07/2024

CUENTA DE COBRO No.794

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890.907.106-1

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
NIT 901.387.801-2

LA SUMA DE OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: $81,919,305


Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR HONORARIOS DEL CONTRATO ENV-09-09-0926-21 ACTA 9 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM). FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR N° 220-193-16140-3

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32.107.071
ALVAREZ RAMIREZ
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES

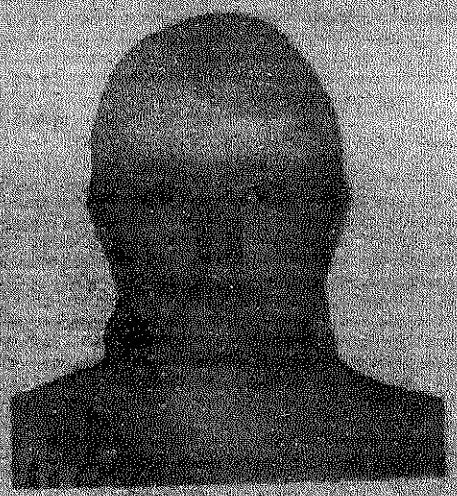



FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1979
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

AB+
G.S. RH

F
SEXO

21-AGO-1997 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0112100-01064087-F-0032107071-20190226 0064456665A 1 9907488485

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116969-T



SANDRA MILENA
ALVAREZ RAMIREZ
C.C. 32107071
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 126820

FIRMA DEL TITULAR 37228

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A4BB79EDA2428894

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32107071 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *
