RH

DESur
Pasión que transforma

Alcaldía de Envigado
0077177-0000007-20241204
0900 - 2024/12/04 10:13:09

DP

DESur
Al Contestar cite Radicado: **2024-1300-000905-E** Id: 7953
Fecha: 2024-12-03 16:42
Destinatario: MUNICIPIO DE ENVIGADO - JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Remitente: DIRECCION DE PLANEACION
Tipología Documental: COMUNICACION ENVIADA

Envigado, 03 de diciembre de 2024

Señor
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Secretaría de Obras Públicas
Carrera 40 N°39 Sur 59
Teléfono: 604 3394064
Municipio de Envigado – Antioquía.

Asunto: Remisión cuenta de cobro del contrato interadministrativo ENV-09-09-0926-21, Acta de Ejecución # 9

Cordial saludo,

Acorde al convenio interadministrativo ENV-09-09-0926-21, Acta de Ejecución # 9, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM)." Entre el Municipio de Envigado y la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado-DESur, nos permitimos remitir cuenta de cobro correspondiente a recurso administrar fuente de financiación crédito de la siguiente manera:

1. Cuenta de cobro N° 813 por valor de $ 729.357.175 correspondientes a recurso administrar fuente de financiación crédito.
2. Certificado de aportes del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
3. Tarjeta profesional del Contador.
4. Certificado de la junta central de contadores.

Cordialmente,

DESur
COPIA

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente DESur.

Anexos: se relacionan (7) folios
Notificación Interna a: No Aplica
Elaboró: Manuela Escobar Zapata -Auxiliar Administrativo DESur
Reviso: Alejandra Cuervo Gómez -Arquitecta DESur
Visto Bueno: Laura Quintero Gaviria -Directora de Planeación(E) DESur
Tipo de Respuesta: parcial
Archivado en: contrato interadministrativo ENV-09-09-0926-21, Acta de Ejecución # 9

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Envigado, Dic.02/2024

CUENTA DE COBRO No.813

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890.907.106-1

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"

NIT 901.387.801-2

LA SUMA DE SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: $729,357,175

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO ENV-09-09-0926-21 ACTA 9 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM). FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO COLPATRIA Nº 1712287465 (FUENTE DE FINANCIACION CREDITO)

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

CODIGO.	VESIÓN.	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	APROBADO.

INFORMACION GENERAL

INFORME	NOVIEMBRE	FECHA DE CORTE			lunes, 25 de noviembre de 2024
		FECHA DE INFORME			sábado, 30 de noviembre de 2024
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM).				
N.° DE CONTRATO ENV-09-09-0926-21	Acta de ejecución N°9	ENTIDAD CONTRATANTE	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "DESur"	NIT.	901.387.801 - 2
FECHA SUSCRIPCIÓN.	lunes, 8 de noviembre de 2021	FECHA DE INICIO.	miércoles, 10 de noviembre de 2021	FECHA FIN	miércoles, 10 de enero de 2024
VALOR ADMINISTRAR	$ 92,990,924,733	PLAZO INICIAL	26 Meses	TRANCURRIDO	1111 Días
APORTE DESUR	$ 14,675,701	VALOR HONORARIOS	$ 5,532,960,022	VALOR TOTAL	$ 109,899,560,456

ADICIONES Y/O PRORROGAS

VALOR ADICION RECURSO ADMINISTRAR No. 01	$ 11,361,000,000	PRORROGA No. 01	172	Días	SUSCRIPCIÓN	jueves, 28 de diciembre de 2023
VALOR ADICIÓN RECURSO ADMINISTRAR No. 02	$ 194,930,000	PRORROGA No. 02	184	Días	SUSCRIPCIÓN	viernes, 12 de abril de 2024
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 1	$ 11,598,335	PRORROGA No. 03	90	Días	SUSCRIPCIÓN	miércoles, 28 de agosto de 2024
VALOR ADICIÓN RECURSO ADMINISTRAR No. 03	$ 198,206,695	PRORROGA No. 04			SUSCRIPCIÓN	jueves, 10 de octubre de 2024
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 2	$ 11,793,299	PRORROGA No. 05			SUSCRIPCIÓN	
VALOR ADICIÓN RECURSO ADMINISTRAR No. 04	$ 1,376,795,045	PRORROGA No. 06			SUSCRIPCIÓN	
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 03	$ 81,919,305	PRORROGA No. 07			SUSCRIPCIÓN	
VALOR TOTAL	$ 111,774,803,135	PLAZO TOTAL	1224	Días	VENCE	lunes, 31 de marzo de 2025

SUSPENSIÓN Y REINICIO

ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01		DURACIÓN	Días
ACTA SUSPENSIÓN No. 02		ACTA REINICIO No. 02		DURACIÓN	Días
VALOR TOTAL	$ 111,774,803,135	PLAZO TOTAL		VENCE	lunes, 31 de marzo de 2025

COMPONENTE DIAGNÓSTICO

ACTIVIDAD	Diagnostico social	ACTIVIDADES RELACIONADAS	Se elaboró y entregó a la Secretaría de Obras Públicas el diagnóstico social el cual tuvo como objetivo lo siguiente: •Conocer las principales actividades constructivas que ejecutará el proyecto. •Indagar las características de la zona impactada por el proyecto, tanto de la zona donde se desarrolla como. •Identificar los actores sociales de la zona del área de influencia directa del proyecto. •Identificar las necesidades y/o problemáticas por las cuales se requiere realizar intervenciones •posibles soluciones de acuerdo con la ejecución del proyecto.
DURACIÓN	10 días		
APORTE DESur	$ 1,984,478		
% AVANCE EJECUCIÓN	100%	FECHA DE ENTREGA	27 de enero de 2022

COMPONENTE DERIVADOS

OBRA

CONTRATO No.	DESur-IA-26-2022	OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21, ACTA DE EJECUCION N°9"				
CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVO PALACIO						
VALOR CONTRATO	$ 86,626,648,060	FECHA DE INICIO.	miércoles, 23 de marzo de 2022		FECHA FIN	miércoles, 20 de diciembre de 2025	
VALOR EJECTUADO	$ 73,336,429,336	PLAZO INICIAL	637	Días	TRANCURRIDO	978	Días
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 11,361,000,000	PRÓRROGA No. 1	102	Días	FECHA FINAL	domingo, 31 de marzo de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 02		PRÓRROGA No. 2	274	Días	FECHA FINAL	lunes, 30 de diciembre de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 03		DURACIÓN	1013	Días	% AVANCE DE OBRA	79.8%	
% PARTICIPACIÓN	73.65%						

INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	DESur-IP-36-2022	OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21, ACTA DE EJECUCION N°9.				
CONTRATISTA	CONSORCIO CAM 2022						
VALOR CONTRATO	$ 4,665,743,158	FECHA DE INICIO.	jueves, 10 de marzo de 2022		FECHA FIN	domingo, 31 de diciembre de 2023	
VALOR EJECTUADO	$ 5,947,814,822	PLAZO INICIAL	661	Días	TRANCURRIDO	991	Días
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 777,685,986	PRÓRROGA No. 1	120	Días	FECHA FINAL	lunes, 29 de abril de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 02	$ 193,000,000	PRÓRROGA No. 2	77	Días	FECHA FINAL	lunes, 15 de julio de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 03	$ 196,244,252	PRÓRROGA No. 3	47	Días	FECHA FINAL	sábado, 31 de agosto de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 04	$ 1,363,163,411	PRÓRROGA No. 4	45	Días	FECHA FINAL	martes, 15 de octubre de 2024	
VALOR ADICIÓN No. 05		PRÓRROGA No. 5	109	Días	FECHA FINAL	sábado, 1 de febrero de 2025	
PRÓRROGA		DURACIÓN	1059	Días	% AVANCE DE OBRA	93.6%	
% PARTICIPACIÓN	6.35%						

ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTÓNICO 2022

CONTRATO No.	DESur-CD-152-2022	OBJETO	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTÓNICO, TÉCNICO Y ASESORÍA ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCIÓN N° 9 DEL CONVENIO ENV-09-09-0926-21.				
CONTRATISTA	CONINSA RAMÓN H						
VALOR CONTRATO	$ 53,041,888	FECHA DE INICIO.	viernes, 25 de noviembre de 2022		FECHA FIN	domingo, 31 de diciembre de 2023	
VALOR EJECTUADO	$ 53,041,888	PLAZO INICIAL	401	Días	TRANCURRIDO	731	Días
VALOR ADICIÓN No. 01		PRÓRROGA No. 1		Días	FECHA FINAL		Días
PRÓRROGA		DURACIÓN		Días	% AVANCE DE OBRA	100%	
% PARTICIPACIÓN	0.05%						

COMPONENTE EVALUACIÓN

NO APLICA HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

GERENCIA

VALOR CONTRATO	$ 920,847,529	Elaboración de informes de gestión, seguimiento y control, gerencia, gestión ambiental y SST, social, de veedurías, socializaciones, gestión comunicacional, de boletines, de videos de avance de obra, notas periodísticas, eventos especiales, sensibilizaciones comunitarias y general cualquier otra actividad que requiera notificación y difusión.			
VALOR EJECUTADO	$ 735,405,558				
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 1,930,000				
VALOR ADICIÓN No. 02	$ 1,962,443				
VALOR ADICIÓN No. 03	$ 13,631,634				
% AVANCE GENERAL	96%	FECHA DE INICIO.	jueves, 10 de marzo de 2022	FINALIZA	sábado, 1 de febrero de 2025

DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

CONTROL PRESUPUESTAL

VALOR ADMINISTRAR	$	106,121,856,475
VALOR CONTRATADO	$	106,121,856,473
VALOR EJECUTADO	$	80,019,649,716
RESTANTE POR EJECUTAR	$	26,102,206,757
RECURSO DISPONIBLE	$	-

% AVANCE FINANCIERO	75.4%	% AVANCE DE OBRA	79.8%

FORMA DE PAGO RECURSO ADMINISTRADO				FACTURACIÓN				SALDO		
PAGO 1.	INICIO EN SECOP II	$	3,118,025,897	CUENTA DE COBRO N°279	2021/11/25	$	3,118,025,897	PAGO 1	$	-
PAGO 2.	NOVIEMBRE 2021	$	6,127,596,801	CUENTA DE COBRO N°280	2021/11/23	$	6,127,596,801	PAGO 2	$	-
PAGO 3.	DICIEMBRE 2021	$	12,000,000,000	CUENTA DE COBRO N°369	2022/03/10	$	8,079,706,914	PAGO 3	$	-
PAGO 4.	FEBRERO DE 2022	$	16,000,000,000	CUENTA DE COBRO N°380	2022/04/19	$	1,468,138,387	PAGO 4	$	-
PAGO 5.	JUNIO DE 2022	$	16,000,000,000	CUENTA DE COBRO N°394	2022/06/02	$	335,238,670	PAGO 5	$	-
PAGO 6.	FEBRERO DE 2023	$	19,872,651,018	CUENTA DE COBRO N°400	2022/06/21	$	670,015,256	PAGO 6	$	-
PAGO 7.	ABRIL DE 2023	$	19,872,651,018	CUENTA DE COBRO N°419	2022/08/01	$	241,247,683	PAGO 7	$	-
PAGO 8. ADICION 1	AVANCE DE OBRA	$	11,361,000,000	CUENTA DE COBRO N°433	2022/09/01	$	180,814,763	PAGO 8	$	-
PAGO 9. ADICION 2	AVANCE DE OBRA	$	194,930,000	CUENTA DE COBRO N°438	2022/09/06	$	412,057,457	PAGO 9	$	-
PAGO 10. ADICION 3	SEPTIEMBRE 2024	$	198,206,695	CUENTA DE COBRO N°448	2022/09/21	$	601,406,882	PAGO 10	$	-
PAGO 11. ADICION 4	OCTUBRE 2024	$	688,397,523	CUENTA DE COBRO N°449	2022/09/21	$	161,384,469	PAGO 11	$	688,397,523
PAGO 12. ADICION 4	DICIEMBRE 2024	$	688,397,522	CUENTA DE COBRO N°462	2022/11/02	$	130,798,830	PAGO 12	$	688,397,522
				CUENTA DE COBRO N°465	2022/11/02	$	632,329,167			
				CUENTA DE COBRO N°483	2022/11/18	$	142,822,556			
				CUENTA DE COBRO N°484	2022/11/18	$	325,479,874			
				CUENTA DE COBRO N°510	2022/12/06	$	785,091,126			
				CUENTA DE COBRO N°540	2023/02/28	$	4,676,281,125			
				CUENTA DE COBRO N°539	2023/02/13	$	724,118,490			
				CUENTA DE COBRO N°544	2023/02/21	$	165,918,645			
				CUENTA DE COBRO N°545	2023/03/01	$	738,723,353			
				CUENTA DE COBRO N°547	2023/03/06	$	132,139,648			
				CUENTA DE COBRO N°553	2023/04/10	$	717,722,452			
				CUENTA DE COBRO N°554	2023/04/10	$	135,418,420			
				CUENTA DE COBRO N°569	2023/05/11	$	679,841,844			
				CUENTA DE COBRO N°570	2023/05/11	$	139,725,841			
				CUENTA DE COBRO N°573	2023/06/01	$	972,507,282			
				CUENTA DE COBRO N°580	2023/06/15	$	152,070,683			
				CUENTA DE COBRO N°581	2023/07/04	$	185,408,700			
				CUENTA DE COBRO N°590	2023/07/11	$	611,521,046			
				CUENTA DE COBRO N°600	2023/08/04	$	1,236,426,593			
				CUENTA DE COBRO N°606	2023/09/01	$	966,398,119			
				CUENTA DE COBRO N°611	2023/09/12	$	177,639,595			
				CUENTA DE COBRO N°616	2023/06/10	$	1,160,493,658			
				CUENTA DE COBRO N°620	2023/10/20	$	178,278,463			
				CUENTA DE COBRO N°630	2023/11/01	$	179,461,898			
				CUENTA DE COBRO N°631	2023/11/01	$	4,470,183,840			
				CUENTA DE COBRO N°642	2023/12/01	$	1,795,485,542			
				CUENTA DE COBRO N°643	2023/12/01	$	1,251,394,378			
				CUENTA DE COBRO N°644	2023/12/01	$	193,021,956			
				CUENTA DE COBRO N°645	2023/12/01	$	4,676,281,124			
				CUENTA DE COBRO N°663	2023/12/12	$	3,873,739,184			
				CUENTA DE COBRO N°672	2023/12/18	$	10,041,389,543			
				CUENTA DE COBRO N°679	2023/12/20	$	198,570,773			
				CUENTA DE COBRO N°685	12-26-2023	$	29,148,609,847			
				CUENTA DE COBRO N°686	12-28-2023	$	11,361,000,000			
				CUENTA DE COBRO N°735	01-08-24	$	194,930,000			
				CUENTA DE COBRO N°750	05-09-24	$	198,206,695			
TOTAL		$	106,121,856,474	TOTAL		$	104,745,061,429	TOTAL	$	1,376,795,045

CONTROL PRESUPUESTAL HONORARIOS

FORMA DE PAGO				AVANCE FINANCIERO			AVANCE EJECUCIÓN	
PAGO 1.	Honorarios Recurso administrar		$ 5,532,960,022	CUENTA DE COBRO N.° 288	01-12-21	$ 778,582,720		
Autorizaciones 1	Con la entrega del diagnóstico contexto social	20%	$ 1,106,592,004	CUENTA DE COBRO N.° 289	01-12-21	$ 4,754,377,302		
Autorizaciones 2	Con un 20% de avance de obra	30%	$ 1,659,888,007	AUTORIZACIÓN N°1 FE 127	09-05-22	$ 1,106,592,004		
Autorizaciones 3	Con avance de obra	50%	$ 2,766,480,011	AUTORIZACIÓN N°2 FE 477	16-05-23	$ 1,659,888,007		
PAGO 2	Adicion No.1		$ 11,598,335	AUTORIZACIÓN N°3 FE 670	19-12-23	$ 2,213,184,009		
PAGO 3	Adicion No.2		$ 11,793,299	CUENTA DE COBRO 736	01-08-24	$ 11,598,335		
PAGO 4	Adicion No. 3		$ 81,919,305	CUENTA DE COBRO 751	05-09-24	$ 11,793,299	% EJECUCIÓN CONVENIO	93%
				AUTORIZACION FE 803	17-10-24	$ 11,598,335		
				AUTORIZACION FE 809	24-10-24	$ 11,793,299		
				AUTORIZACION FE 812	28-10-24	$ 276,648,001		
TOTAL	$		5,658,270,961	SALDO CUENTAS DE COBRO	$	81,919,305		
				SALDO AUTORIZACIONES	$	358,567,306		

DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo de este informe son las siguientes:


TORRE NORTE
- Mampostería interna y de fachada.
- Ejecución de revoques en mampuestos.
- Ejecución de cordones para ventanería.
- Instalación de la red contra incendios (RCI).
- Instalación redes hidrosanitarias.
- Instalación de tubería para red eléctrica embebida en muros y colgada en cielos.
- Instalación de bandejas para las redes de telecomunicaciones.
- Armado e instalación de ductos para la red de aire acondicionado.
- Trabajos en el foso del ascensor 7
- Armado y vaciado de muros de contención
- Instalación de soportes para cortasoles

TORRE SUR
- Armado y vaciado de muros de contención en sótano 2.
- Instalación de filtros (geodren vial y planar), en la parte posterior de los muros de contención.
- Armado y vaciado de vigas de fundación en sótano 2.
- Armado y vaciado losas de entrepiso en sótano 1.
- Ejecución de enchapes de piso.
- Construcción de mampostería
- Instalación de ventanería en fachas occidental, norte y sur
- Instalación de muros livianos internos.
- Instalación de la red contra incendios (RCI).
- Se tienen instalados rociadores de la (RCI) entre piso 3 y piso 6.
- Ejecución de ajustes de tubería y cajas en la red eléctrica.


REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción: Armado muros livianos
Torre Sur

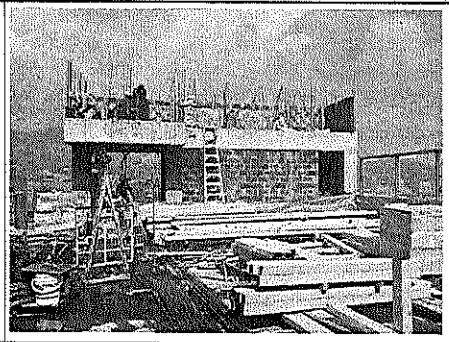


Descripción: Avance cubierta
Torre Norte

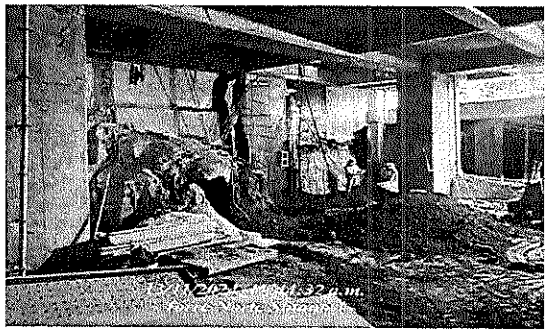


Descripción: Muro contencion S1
Torre Norte

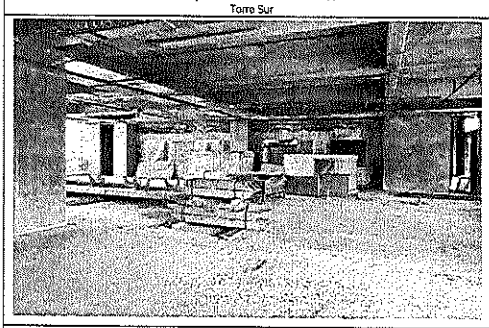

Descripción: Avance de mampostería
Torre Norte

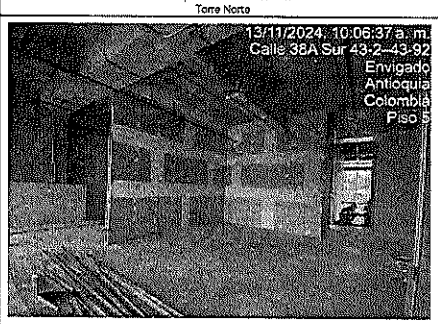

Descripción. Armado de muros livianos
Torre Sur

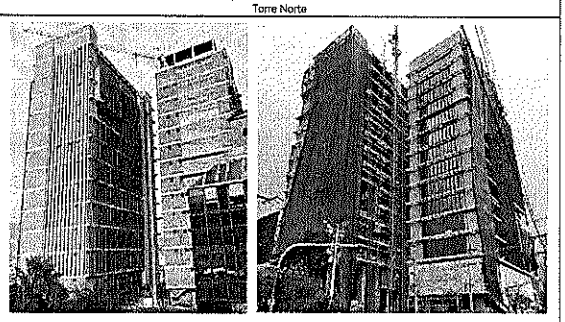

Descripción.Avance general

DATOS QUIEN ELABORÓ		FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA MARÍA QUINTERO GAVIRIA	
CARGO:	DIRECTORA DE EJECUCION	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESur	

Scotiabank | COLPATRIA

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

SCOTIABANK COLPATRIA S.A con **NIT. 860.034.594-1,** certifica que nuestro cliente **EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR,** identificado con **NIT 901.387.801-2** se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta de ahorros **N° 1712287465** aperturada el día 18 de Octubre de 2024, para el Manejo de los Recursos del Convenio Marco ENV-09-09-0926-21 CONSTRUCCIÓN CAM, bajo el nombre Recursos a Administrar Crédito.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

Se expide esta certificación a los 18 días del mes de Octubre de 2024.

Cordialmente,

SANTIAGO DUQUE MELUK
Gerente Banca Oficial

ELIZABETH GAVIRIA CORREA
Gerente Cash Management

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL

MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESUR

NIT 901387801- 2

CERTIFICA

Que la empresa se encuentra al día en los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y ha realizado el pago de los aportes correspondientes hasta la fecha. También se ha calculado adecuadamente la nómina de sus empleados y se ha pagado.

El Pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la empresa dentro de los procesos de contratación y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

La presente certificación se expide a los seis (7) días de noviembre de 2024 a solicitud de la Compañía

Sandra Milena Álvarez Ramírez.
Revisora Fiscal – TP 116969 - T
En Representación de AIGR Contadores S.A.S. TR 899

Elaborado: Sandra Milena Álvarez R.
Coordinador de Auditoria
07/11/2024

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116969-T



SANDRA MILENA
ALVAREZ RAMIREZ
C.C. 32107071
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 126820

IDEAS

FIRMA DEL TITULAR 37228

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 32.107.071

ALVAREZ RAMIREZ

NOMBRES

SANDRA MILENA

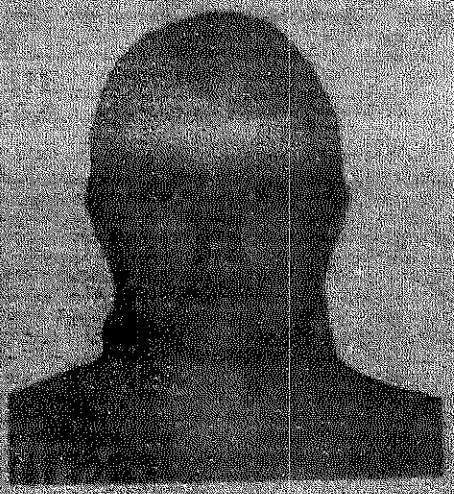



FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1979

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

AB+
G.S. RH

F
SEXO

21-AGO-1997 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0112100-01064087-F-0032107071-20190226 0064645665A 1 9907438485

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A4EE79EDA24284B94

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32107071 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
