	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01
		Fecha: 12/04/2019

FECHA	OCTUBRE	INFORME No.	5	DEL	21/09/2024	AL	22/10/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTORIA TECNICA PARA LAS OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO 20240120 EL 2024 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETO 20240124 DE 2024 DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Diferentes puntos de intervención: Muro de Contención Adelaida Correa, Talud Loma los Henao, Talud San José, Quebradas (La Sabanetica, La Doctora, La Escuela y La Cien Pesos), Parque Erato, Rieles La Bonita, Alcantarillado Las Lomitas, Derrumbes, Demoliciones.

CONTRATO DE CONSULTORIA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No.:				CONTRATO No.:			
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACIÓN:	21 de mayo de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de noviembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:			
PLAZO ACTUALIZADO:	6			PLAZO ACTUALIZADO:			
PLAZO TRANSCURRIDO:	5,0	EQUIVALE AL	83,33%	PLAZO TRANSCURRIDO:		EQUIVALE AL	
VALOR INICIAL :	$ 592.977.000,00			VALOR INICIAL :			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 592.977.000,00			VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:		EQUIVALE AL		VALOR PAGADO:		EQUIVALE AL	
VALOR POR PAGAR:		EQUIVALE AL		VALOR POR PAGAR:		EQUIVALE AL	
COORDINADOR:	Ana Milena Molina Osorio			INTERVENTOR:			

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

		ACTA 1	
contrato de OBRA	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

		ACTA 1	
contrato de INTERVENTORIA	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

1.1 AVANCE

El contratista en virtud del presente contrato realizará la asesoría técnica , económica y acompañamiento de estudios y diseños en puntos críticos que se van a intervenir bajo el decreto de calamidad del Municipio de Sabaneta
-Visita al sitio para reconocimiento de la problematica y recoleccion de información primaria
- Levantamiento topografico de detalles de vías, cauces de quebradas, taludes, entre otros.
- Investigacion de redes de alcantarillado
- Estudios geotecnicos
- Estudio Hidrologico y modelacion hidraulica
- Dlseños estructurales

Entrega informes de la visita realizada en los diferentes puntos a intervenir
Realiza visitas periodicas a solicitud del Municipio para revisar las situaciones presentadas
Participa en comites y reuniones para revisar el avance de los estudios y diseños
Envia correos respondiendo inquietudes que surgen en el avance de las obras

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

FECHA	OCTUBRE	INFORME No.	5	DEL	21/09/2024	AL	22/10/2024

• RPC EN TRAMITE

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:

- Se continuan en los diferentes frentes de obra, segun indicaciones entregadas por el ingeniero consultor Carlos Vasquez.
- Se realizan reuniones para revisar situaciones presentadas y revisar el avance de los diseños y estudios

ADMINISTRATIVOS:

PUNTO CRITICO 1. LOS HENAO:
Estudio Geotecnico 70%
Estudio Hidrologico 80%
Diseño estructural 50%

PUNTO CRITICO 2. VIA ADELAIDA CORREA
Estudio Geotecnico 100%
Estudio Hidrologico 100%
Diseño estructural 100%
Chequeo Red alcantarillado 90%
Cantidades de obras 50%

PUNTO CRITICO 3. BOXCOULVERT LA SABANETICA
Diseño de redes 60%
Capacidad hidraulica 60%

PUNTO CRITICO 4. BOXCOULVERT LA DOCTORA
Diseño estructural 100%
Estudio Geotecnico 100%
Estudio Hidrologico 100%

PUNTO CRITICO 5. RED ALCANTARILLADO CAÑAVERALEJO
Topografia 100%
Diseño alcantarillado 30%

PUNTO CRITICO 6. VIA VEHICULAR SAN JOSE ALTA PENDIENTE
Diseño estructura pavimento 70%
Diseño alcantarillado 50%
Diseño acueducto 30%

PUNTO CRITICO 7. DESGARRE EN TALUD VIA SAN JOSE

FECHA	OCTUBRE	INFORME No.	5	DEL	21/09/2024	AL	22/10/2024

PUNTO CRITICO 8. VIA VEHICULAR SAN JOSE PARTE ALTA
Diseño estructura pavimento 100%
Diseño estructural 40%

PUNTO CRITICO 9. VIA PAN DE AZUCAR SECTOR LA BONITA
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 10. LOS CHINOS
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 11. TRES ESQUINAS PAN DE AZUCAR
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 12. PARQUE ERATO
Diseño estructural 100%
Estudio Geotecnico 100%
Estudio aprovechamiento forestal 10%

PUNTO CRITICO 13. QUEBRADA LA ESCUELA
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 14. QUEBRADA LA CIEN PESOS
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 15. BAJO PUENTE VEHICULAR PAN DE AZUCAR
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 16. CARCAMO CANCHA MIRAMONTE LA DOCTORA
Topografia 100%
Diseño hidraulico carcamo y tuberia para manejo 100%

qw

FECHA	OCTUBRE	INFORME No.	5	DEL	21/09/2024	AL	22/10/2024

PUNTO CRITICO 17.PLACA SAN ISIDRO
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 18. OTROS PUNTOS
Recomendaciones demolicion vivienda Pan de azucar
Recomendaciones demolicion vivienda Callejon Nro 4
Recomendaciones en talud desgarre superficie terreno los Rodriguez

AMBIENTALES:
- N/A

SOCIALES:
- N/A

LEGALES:

- Se legaliza el contrato de consultoria por una duracion de 6 meses, quedando con fecha de terminación el 20 de noviembre

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES


4. INDICADORES

No.	Programa	Subprogramas	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Línea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto


	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	OCTUBRE	INFORME No.	5	DEL	21/09/2024	AL	22/10/2024


5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO

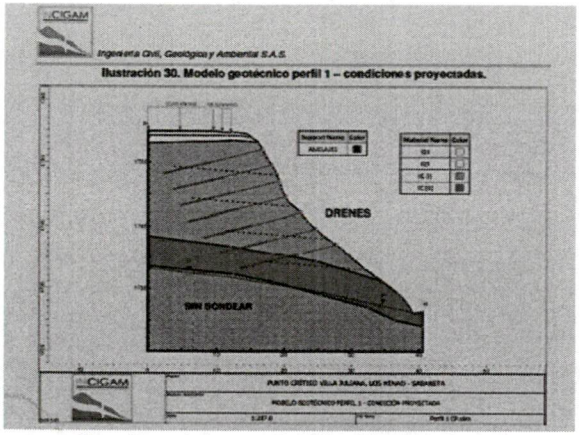


Obras Proyectadas para Estabilidad de talud - Sector Los Henao

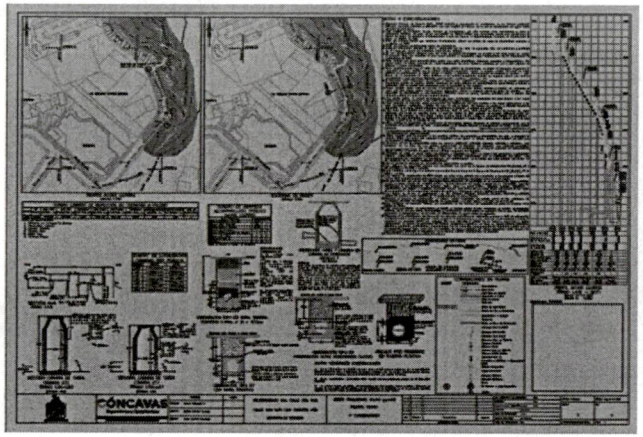


Visita quebrada Cien pesos

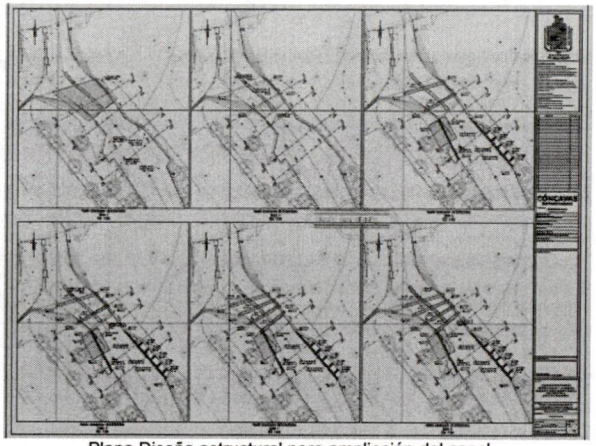


Plano Diseño estructural para ampliación del canal existente en el cruce de la carrera 48 (Avenida Las Vegas) quebrada La Doctora

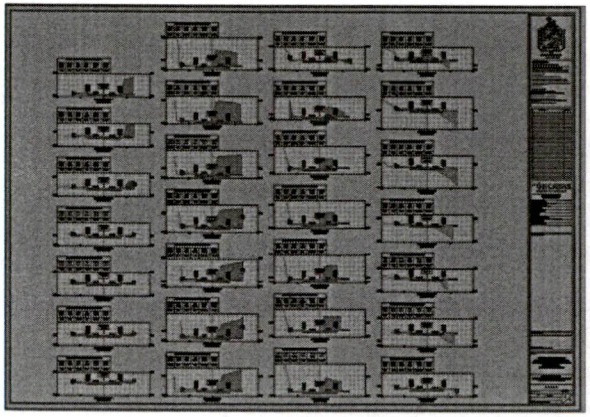

Plano Diseño Geométrico Vial Loma San José

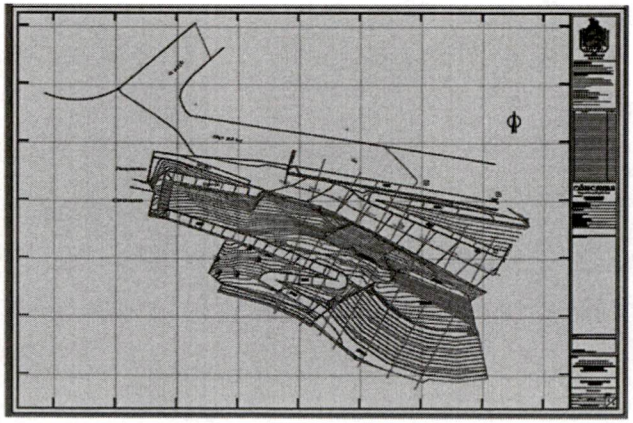

. Plano Levantamiento topográfico Parque Erato

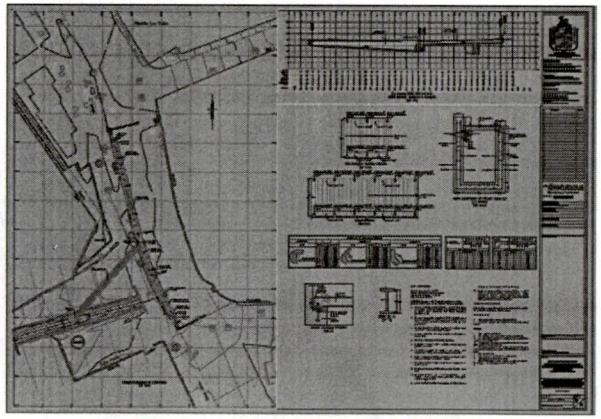

Plano diseño hidráulico Sector Miramonte

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

NOMBRE: Ana Milena Molina Osorio

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE: Isabel Cristina Diaz Correa
