	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	NOVIEMBRE	**INFORME No.**	**6**	DEL	**21/10/2024**	AL	**22/11/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTORIA TECNICA PARA LAS OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO 20240120 EL 2024 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETO 20240124 DE 2024 DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Diferentes puntos de intervención: Muro de Contención Adelaida Correa, Talud Loma los Henao, Talud San José, Quebradas (La Sabanetica, La Doctora, La Escuela y La Cien Pesos), Parque Erato, Rieles La Bonita, Alcantarillado Las Lomitas, Derrumbes, Demoliciones.

CONTRATO DE CONSULTORIA				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**			
CONTRATO No.:				CONTRATO No.:			
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:			
FECHA DE INICIACIÓN:	21 de mayo de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de noviembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:			
PLAZO ACTUALIZADO:	6			PLAZO ACTUALIZADO:			
PLAZO TRANSCURRIDO:	6,0	EQUIVALE AL	100,00%	PLAZO TRANSCURRIDO:		EQUIVALE AL	
VALOR INICIAL :	$ 592.977.000,00			VALOR INICIAL :			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 592.977.000,00			VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:		EQUIVALE AL		VALOR PAGADO:		EQUIVALE AL	
VALOR POR PAGAR:		EQUIVALE AL		VALOR POR PAGAR:		EQUIVALE AL	
COORDINADOR:	Ana Milena Molina Osorio			INTERVENTOR:			

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

contrato de OBRA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		
contrato de INTERVENTORIA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

1.1 AVANCE

FECHA	NOVIEMBRE	INFORME No.	6	DEL	21/10/2024	AL	22/11/2024

El contratista en virtud del presente contrato realizará la asesoría técnica , económica y acompañamiento de estudios y diseños en puntos críticos que se van a intervenir bajo el decreto de calamidad del Municipio de Sabaneta
-Visita al sitio para reconocimiento de la problematica y recoleccion de información primaria
- Levantamiento topografico de detalles de vías, cauces de quebradas, taludes, entre otros.
- Investigacion de redes de alcantarillado
- Estudios geotecnicos
- Estudio Hidrologico y modelacion hidraulica
- DIseños estructurales

Entrega informes de la visita realizada en los diferentes puntos a intervenir
Realiza visitas periodicas a solicitud del Municipio para revisar las situaciones presentadas
Participa en comites y reuniones para revisar el avance de los estudios y diseños
Envia correos respondiendo inquietudes que surgen en el avance de las obras

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

• RPC EN TRAMITE

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:
- Se continuan en los diferentes frentes de obra, segun indicaciones entregadas por el ingeniero consultor Carlos Vasquez.
- Se realizan reuniones para revisar situaciones presentadas y revisar el avance de los diseños y estudios

FECHA	NOVIEMBRE	INFORME No.	6	DEL	21/10/2024	AL	22/11/2024

PUNTO CRITICO 8. VIA VEHICULAR SAN JOSE PARTE ALTA
Diseño estructura pavimento 100%
Diseño estructural 100%

PUNTO CRITICO 9. VIA PAN DE AZUCAR SECTOR LA BONITA
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 10. LOS CHINOS
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 11. TRES ESQUINAS PAN DE AZUCAR
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 12. PARQUE ERATO
Diseño estructural 100%
Estudio Geotecnico 100%
Estudio aprovechamiento forestal 100%

PUNTO CRITICO 13. QUEBRADA LA ESCUELA
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 14. QUEBRADA LA CIEN PESOS
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 15. BAJO PUENTE VEHICULAR PAN DE AZUCAR
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 16. CARCAMO CANCHA MIRAMONTE LA DOCTORA
Topografia 100%
Diseño hidraulico carcamo y tuberia para manejo 100%

FECHA	NOVIEMBRE	INFORME No.	6	DEL	21/10/2024	AL	22/11/2024

ADMINISTRATIVOS:

PUNTO CRITICO 1. LOS HENAO:
Estudio Geotecnico 100%
Estudio Hidrologico 100%
Diseño estructural 100%

PUNTO CRITICO 2. VIA ADELAIDA CORREA
Estudio Geotecnico 100%
Estudio Hidrologico 100%
Diseño estructural 100%
Chequeo Red alcantarillado 90% (Queda pendiente aprobación de EPM)
Cantidades de obras 100%

PUNTO CRITICO 3. BOXCOULVERT LA SABANETICA
Diseño de redes 90% (Queda pendiente aprobación de EPM)
Capacidad hidraulica 90%

PUNTO CRITICO 4. BOXCOULVERT LA DOCTORA
Diseño estructural 100%
Estudio Geotecnico 100%
Estudio Hidrologico 100%

PUNTO CRITICO 5. RED ALCANTARILLADO CAÑAVERALEJO
Topografia 100%
Diseño alcantarillado 90% (Queda pendiente aprobación de EPM)

PUNTO CRITICO 6. VIA VEHICULAR SAN JOSE ALTA PENDIENTE
Diseño estructura pavimento 100%
Diseño alcantarillado 100%
Diseño acueducto 100%

PUNTO CRITICO 7. DESGARRE EN TALUD VIA SAN JOSE
Bosqueios y recomendaciones 100%


	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019

FECHA	NOVIEMBRE	INFORME No.	6	DEL	21/10/2024	AL	22/11/2024


5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO




Visita Adelaida Correa

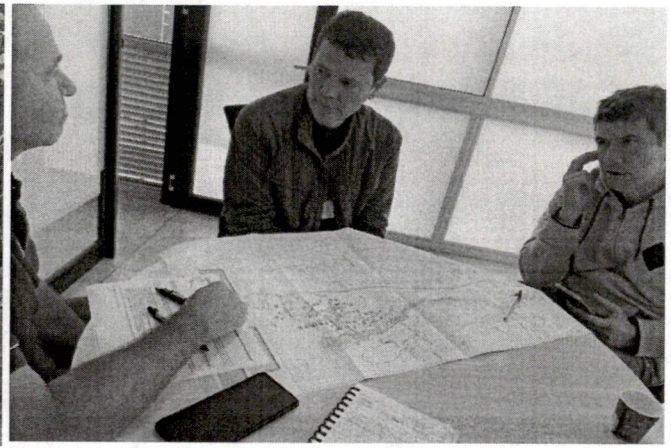


Reunión para revisión de planos y diseños

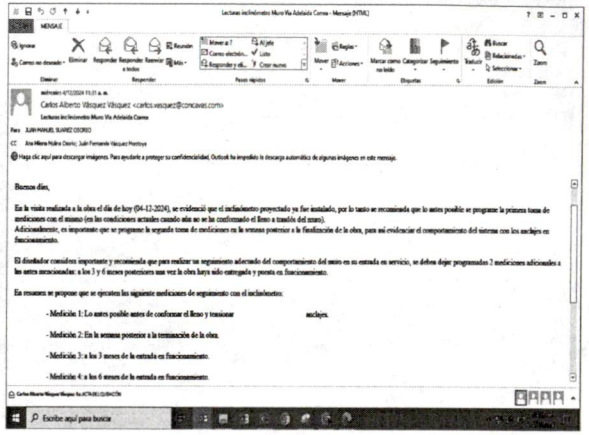


Correo respondiendo dudas e inquietudes

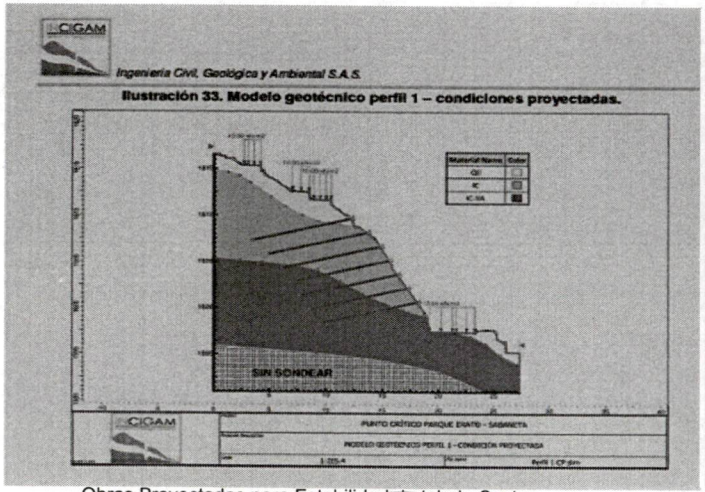

Obras Proyectadas para Estabilidad de talud - Sector Parque Erato

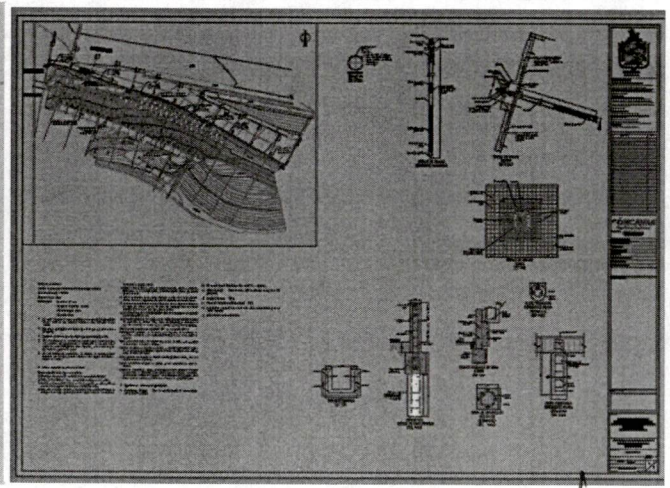

Diseño estructura Estabilización Talud Parque Erato

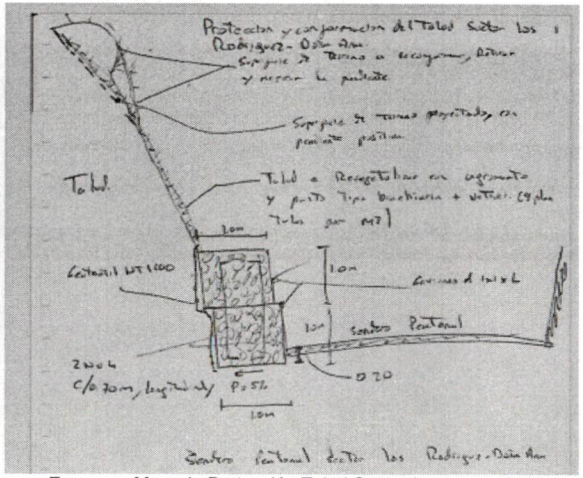

Esquema Muro de Protección Talud Sector Los Rodríguez

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

NOMBRE: Ana Milena Molina Osorio

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE: Isabel Cristina Diaz Correa

FECHA	NOVIEMBRE	INFORME No.	6	DEL	21/10/2024	AL	22/11/2024

PUNTO CRITICO 17.PLACA SAN ISIDRO
Bosquejos y recomendaciones 100%

PUNTO CRITICO 18. OTROS PUNTOS
Recomendaciones demolicion vivienda Pan de azucar
Recomendaciones demolicion vivienda Callejon Nro 4
Recomendaciones en talud desgarre superficie terreno los Rodriguez

AMBIENTALES:
- N/A

SOCIALES:
- N/A

LEGALES:

- Se da por terminado y recibido el contrato de consultoria, se inicia el tramite de liquidación del mismo

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES

4. INDICADORES

No.	Programa	Subprogramas	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Línea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto
