BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

FECHA: 29/11/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** x **(En caso de ser presencial):** **INSTALCIONES** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBJETO DE LA REUNIÓN: ACTA DE INFORME DE ACTIVIDADES – MATERIAL CONTRATO DE SUMINISTRO 494-2024

HORA DE INICIO: 1:00 PM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 2:00 PM

ASISTENTES:

NOMBRE	No de CEDULA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
		ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ	79.961.781			X						X	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	**diego.caballero@gobiernobogota.gov.co**	**3058107644**	
AHYDA ROCIO QUIROGA PIURAQUIVE	**1.076.646.357**			X						X	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	**Ahyda.quiroga@gobiernobogota.gov.co**	**3122887658**	
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS	**12.560.961**									X	PAVIOBRAS SAS	ltdapaviobras@gmail.com	**293 61 05-305 477 56 18**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Mediante la presente acta se anexa informe de actividades que corresponden al gasto de materiales suministrado durante el periodo 03 de agosto de 2024 al 2 de octubre de 2024.
El objeto del contrato es: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUBBASE GARANULAR, DISPOSICION FINAL DEL ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A MONTO AGOTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

Los elementos se relacionan a continuación:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	PORCENTAJE DE IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)	M3	$ 242.450	$ 46.066	$ 288.516	19%	14	$ 4.039.217
3	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	$ 1.865	$ 354	$ 2.219	19%	1020	$ 2.263.737
6	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 EN PLANTA	M3	$ 1.182.601	$ 224.694	$ 1.407.295	19%	196,8	$ 276.955.693
TOTAL								$ 283.258.647

Se anexan informes.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Recibo a satisfacción de los bienes	Apoyo Supervisión del Contrato	2/10/2024
2.	Radicar la totalidad de documentos (factura)	Operador/proveedor	18/10/2024
3.	Entrega la totalidad de documentos radicados al almacenista con el recibido a satisfacción	Apoyo Supervisión del Contrato	18/10/2024
4.	Legalización del Ingreso y/o Egreso previo radicado de los documentos	Almacenista	

Elaborada por: Ahyda Rocio Quiroga Piraquive

Fecha de la próxima reunión: N/A Lugar de la próxima reunión/A

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 28/11/2024	FECHA FINALIZACION: 28/10/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4005068	PK	210737
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
MORALBA	SAN CRISTOBAL	LA GLORIA	CARRERA 11 B ESTE	CALLE 43 A SUR	CALLE 43 B SUR

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
62,74	7,54	473,06	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
16,00	4,00	64,00	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallase obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Observación
1.	19/06/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	15,00	16,00	4,00	0,188	12,00000	1,2500	64,0	
					15,00							
1.	19/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	15,00	16,00	4,00	0,188	12,00000	1,2500	64,0	
					15,00							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	0			0	
Vibrocompactador	6			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM/PM) ENTRADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Andrés Felipe Torres Olarte	7:00	17:30	1077974399	Inspector	219
3	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00	17:30	1033084914	Inspector	220
4	Iván Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399253	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzales	7:00	17:30	80805486	Conductor	181
6	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Oficial	181
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	75097814	Ayudante	177
11	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
12	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023936765	Ayudante	174
13	Edwin Leguizamon Ospina	7:00	17:30	79702552	Ayudante	175
14	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51841775	Ayudante	176
16	Jorge Raul Bermudez Romero	7:00	17:30	19482247	Ayudante	168

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Carril	Temperatura Recibo	Temperatura Llegada	Temperatura Extendido	Temperatura Compactación
27/06/2024	MD-12	N/A	TTY-672	15	54320	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

PMT


CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
107,8	107,8

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES



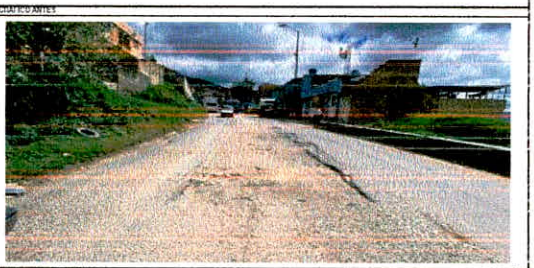


REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES





REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



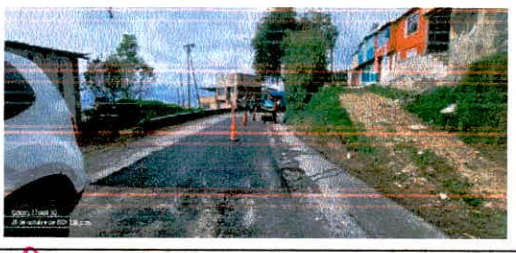

DAVID ZULETA	ROCIO QUIROGA	ROCIO QUIROGA
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 28/10/2024	FECHA FINALIZACION: 28/10/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4005160	PK	216973
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
MORALBA	SAN CRISTOBAL	LA GLORIA	CARRERA 13 B ESTE	CALLE 43 B SUR	CARRERA 13 A ESTE

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
100,74	7,66	771,67	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
6,00	3,50	21,00	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Observación
1.	15/06/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	6,00	6,00	3,50	0,229	4,80000	1,2500	21,0	
1.	15/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	6,00	6,00	3,50	0,229	4,80000	1,2500	21,0	
					0,00							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	0			0	
Vibrocompactador	6			6	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LABORAL ENTRADA	HORARIO LABORAL SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Andres Felipe Torres Olaya	7:00	17:30	1077674399	Inspector	219
3	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00	17:30	1020845815	Inspector	204
4	Iván Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015399253	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzales	7:00	17:30	80809488	Conductor	181
9	Jose Ernesto Legolzamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Oficial	181
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	75097014	Ayudante	173
11	Jefferson Poseda Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
12	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
13	Edwin Legolzamon Ospino	7:00	17:30	79702158	Ayudante	175
14	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51643715	Ayudante	176
16	Jorge Raul Barrnidez Romero	7:00	17:30	19482247	Ayudante	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Cantidad	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
28/10/2024	MD-12	N/A	EYY-230	6	54321	0:00	11:00				150°C	147°C	140°C	126°C

PAVIMENTO

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
180 lt	180 lt

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES





DAVID ZULETA	ROCIO QUIROGA	ROCIO QUIROGA
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 15/11/2024	FECHA FINALIZACION: 19/11/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4000296	PK	213396
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SAN RAFAEL OSME	SAN CRISTOBAL	LOS LIBERTADORES	CARRERA 35 ESTE	SIN ESTABLECER	CALLE 57 SUR

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
37,50	7,10	263,50	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
6,00	4,00	24,00	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de Imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallees obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Observaciones
1.	15/06/2024	Nivelación y compartación del terreno	Asfalto	m3	6,00	6,00	4,00	0,200	4,80000	1,2500	24,0	
					6,00							
1.	15/06/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	6,00	6,00	4,00	0,200	4,80000	1,2500	24,0	
					6,00							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	0			0	
Vibrocompactador	0			0	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rotodura en estado.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LABORAL PARA PRL: ENTRADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447826	Inspector	218
2	Andres Felipe Torres Olarte	7:00	17:30	1077974359	Inspector	219
3	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00	17:30	1033585914	Inspector	220
4	Iván Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1018389293	Conductor	178
5	Juan Carlos Martinez Gonzales	7:00	17:30	80085486	Conductor	181
9	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Oficial	181
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	76097014	Ayudante	173
11	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
12	Cristian Camilo Velásquez Lozada	7:00	17:30	1023936765	Ayudante	174
13	Edwin Leguizamon Ospina	7:00	17:30	79702158	Ayudante	175
14	Olga Lucia Bernal Galeano	7:00	17:30	51643715	Ayudante	176
16	Jorge Raul Bermúdez Romero	7:00	17:30	19482247	Ayudante	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
19/11/2024	MD-12	N/A	TTY-673	6	-	10:00	11:00				160°C	147°C	140°C	120°C

CANTIDAD DE EMULSIÓN: vacío

GASTO TOTAL: vacío

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES






REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES

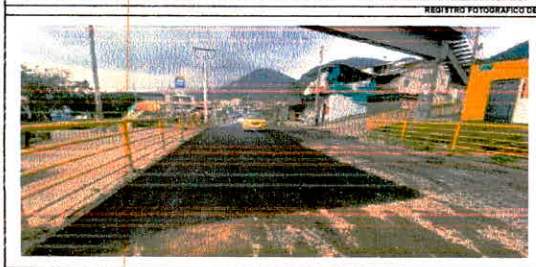



DAVID ZULETA	ROCIO QUIROGA	ROCIO QUIROGA
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 18/11/2024	FECHA FINALIZACION: 18/11/2024	NOCTURNA	DIURNA	CM	4662928	PK	266829		
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	FERMINADO			

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

(CADRIF)	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SANTA INES SUR	SAN CRISTOBAL	SAN BLAS	DIAGONAL 32 C SUR	TRANSVERSAL 6 C ESTE	CARRERA 7 ESTE

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
129,48	7,02	908,95	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
9,50	13,20	125,40	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallar las obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compartin	(%) Compartimiento	m2	Observaciones
1	18/11/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	10,80	5,00	8,00	0,200	8,00000	1,2000	40,0	
2	18/11/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	5,80	4,50	5,20	0,199	4,44600	1,3845	23,4	
					16,60							
1	18/11/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	10,80	5,00	8,00	0,200	8,00000	1,2000	40,0	
2	18/11/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	5,80	4,50	5,20	0,199	4,44600	1,3845	23,4	
					16,60							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	0			0	
Vibrocompactador	0			0	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rotulura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LABORAL ENTRADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447526	Inspector	416
2	Andrés Felipe Torres Olarte	7:00	17:30	1077974399	Inspector	316
3	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00	17:30	1273691614	Inspector	228
4	Iván Ignacio Bricaño Vargas	7:00	17:30	1016399263	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzalez	7:00	17:30	80809185	Conductor	181
8	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Oficial	161
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	76057914	Ayudante	172
11	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
12	Cristian Camilo Valbuena Lorente	7:00	17:30	1075654764	Ayudante	174
13	Edwin Leguizamon Urquina	7:00	17:30	1010[illegible]394	Ayudante	175
14	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51843715	Ayudante	176
16	Jorge Raul Bermudez Romero	7:00	17:30	19482247	Ayudante	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrado	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Cant	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactacion
18/11/2024	MD-12	N/A	TSV-058	15,8	84740	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

PMT

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
[illegible]	[illegible]

BOGOTÁ GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



DAVID ZULETA	ROCIO QUIROGA	ROCIO QUIROGA
ELABORO	REVISO	APROBÓ

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 18/11/2024	FECHA FINALIZACION: 18/11/2024	NOCTURNA	OBRA	CIV	4602975	PK	266877
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACION DEL SOPORTE VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SANTA INES SUR	SAN CRISTOBAL	SAN BLAS	TRANSVERSAL 6 ESTE	CALLE 33 SUR	CARRERA 8 ESTE

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
129,48	7,62	986,85	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
6,50	6,00	39,00	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimación en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallar las obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Observación
1	18/11/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	15,00	6,50	6,00	0,303	11,81102	1,2700	39,0	
					15,00							
1	18/11/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	Total	6,50	6,00	0,303	11,81102	1,2700	39,0	
					15,00							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	6			0	
Vibrocompactador	6			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Humectacion de rotadora en sitio.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y movilizion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LABORAL LLEGADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Andrés Felipe Torres Olarte	7:00	17:30	1077974399	Inspector	219
3	Diego Fernando Rodriguez Caballero	7:00	17:30	1233984443	Profesional	220
4	Iván Ignacio Bricaño Vargas	7:00	17:30	1015399293	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzales	7:00	17:30	80365496	Conductor	181
6	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Oficial	181
10	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	75097814	Ayudante	177
11	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
12	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
13	Edwin Leguizamon Ospino	7:00	17:30	79762158	Ayudante	175
14	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51843176	Ayudante	176
16	Jorge Raul Bermúdez Romero	7:00	17:30	15482247	Ayudante	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperatura Recibo	Temperatura Longitud	Temperatura Estandar	Temperatura Compactacion
19/11/2024	MD-12	N/A	TSV-058	15	54736	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

EPP


CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
Vacio	Vacio

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



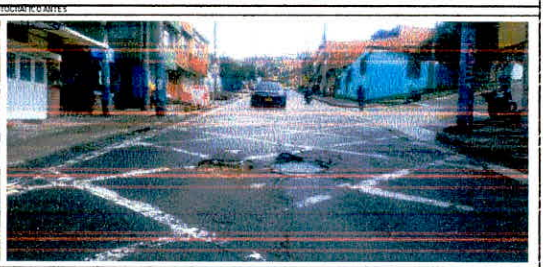

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES





DAVID ZULETA	ROCIO QUIROGA	ROCIO QUIROGA
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 23/10/2024	FECHA FINALIZACION: 23/10/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4000365	PK	201027
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACION (PK SEGMENTO VIA)

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SOCIEGO	SAN CRISTOBAL	SOCIEGO	KR 0	CL 35 S	CL 37 S

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCION
127,00	12,18	1547,42	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (Mt)	ANCHO INTERVENCIÓN (Mt)	ÁREA INTERVENCION (Mt2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
8,00	2,40	19,20	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con cinta en asfalto.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Abscisado
1.	23/10/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	4,50	8,00	2,40	0,188	3,60000	1,2500	19,2	
					4,50							
1.	23/10/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	4,50	8,00	2,40	0,188	3,60000	1,2500	19,2	
					4,50							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	9			8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

RELACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LABORAL LLEGADA	SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Usiel Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032411625	Inspector	718
2	Andres Felipe Torres Uribe	7:00	17:30	1019784289	Inspector	219
3	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00	17:30	1233651014	Inspector	380
4	Ivan Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015398253	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzalez	7:00	17:30	80805486	Conductor	121
6	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	1026572114	Ayudante	172
7	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
8	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023936795	Ayudante	174
9	Edwin Esquivamos Ospino	7:00	17:30	7575758	Ayudante	175
10	Olga Lucia Remal Salazar	7:00	17:30	51841715	Ayudante	176
11	Jorge Raul Dominguez Romero	7:00	17:30	15402247	Ayudante	102

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Final	Cantidad	Temperatura Recibo	Llegada	Estandido	Compactación
23/10/2024	MD-12	N/A	SZO-561	4,5	54796	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

Nan

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
102,0	102,0

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFIOCO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



DIEGO SEPULVEDA	ROCIO QUIROGA	DIEGO CABALLERO
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 06/11/2024	FECHA FINALIZACIÓN: 07/11/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4006584	PK	214381
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
JUAN REY (LA PAZ)	SAN CRISTOBAL	LOS LIBERTADORES	KR 15 E	CL 70 S	CL 70A S

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
39,81	8,10	320,52	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR:

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
39,00	8,10	315,90	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Abscisado
1.	6/11/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	46,00	39,00	8,10	0,116	36,80000	1,2500	315,9	
					46,00							
1.	6/11/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	46,00	39,00	8,10	0,116	36,80000	1,2500	315,9	
					46,00							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	18			18	
Vibrocompactador	18			18	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM/PM) LLEGADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447926	Inspector	216
2	Andres Felipe Torres Olarte	7:00	17:30	1077672366	Inspector	215
3	Diego Fernando Izquivada Castellanos	7:00	17:30	1234891014	Inspector	727
4	Ivan Ignacio Bocelle Vargas	7:00	17:30	1015395293	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzales	7:00	17:30	80805426	Conductor	181
6	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	76257014	Ayudante	172
7	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1022512127	Ayudante	173
8	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
9	Edwin Leguizamon Ospino	7:00	17:30	79792358	Ayudante	175
10	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51843715	Ayudante	176
11	Jorge Raul Bermudez Romero	7:00	17:30	19482247	Ayudante	166

CONTROL Y DESPACHO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Cantidad	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
6/11/2024	MD-12	N/A	TRV-068	15	54548	0:00	11:00				150°C	143°C	140°C	120°C
6/11/2024	MD-12	N/A	TRV-068	15	54553	0:00								
7/11/2024	MD-12	N/A	VEH-839	15	54563	0:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
								TOT						

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
102,0	102,0

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



DIEGO SEPULVEDA	RIGOBERTO QUIROGA	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBO

BOGOTÁ GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 5/11/2024	FECHA FINALIZACIÓN: 6/11/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4006887	PK	214310
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Pto Vial	Desde	Hasta
JUAN REY (LA PAZ)	SAN CRISTOBAL	LOS LIBERTADORES	Gr 15 E	CL 70 A S	CL 71 S

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
60,32	8,26	502,80	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
23,00	5,00	115,00	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallene obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) Y (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Metrados
1.	6/11/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	53,00	45,00	5,00	0,188	42,40000	1,2500	225,0	
					53,00							
1.	6/11/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	53,00	45,00	5,00	0,188	42,40000	1,2500	225,0	
					53,00							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	16			16	
Vibrocompactador	16			16	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolición de calzadura en asfalto.
- Acopio de material de demolición.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447926	Inspector	218
2	Andrés Felipe Torres Giarle	7:00	17:30	1077974389	Inspector	749
3	Diego Fernando Sesalvieda Caballero	7:00	17:30	1233881014	Inspector	727
4	Iván Ignacio Díaz Vargas	7:00	17:30	1010200202	Conductor	175
5	Juan Carlos Martínez Gonzales	7:00	17:30	80805486	Conductor	181
6	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	76097614	Ayudante	172
7	Jefferson Poveda Cruz	7:00	17:30	1023512127	Ayudante	173
8	Cristian Camilo Velbuena Lozada	7:00	17:30	1023956705	Ayudante	174
9	Edwin Leguizamon Ospina	7:00	17:30	79702358	Ayudante	175
10	Olga Lucia Bernal Salazar	7:00	17:30	51843715	Ayudante	176
11	Jorge Raul Bermudez Romero	7:00	17:30	19482247	Ayudante	180

CONTROL Y ENTREGA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Cantt	Temperatura Recibo	Temperatura Llegada	Temperatura Extendido	Temperatura Compactación
5/11/2024	MD-12	N/A	TTV-972	15	54320	8:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
5/11/2024	MD-12	N/A	EYY-230	13	54321	8:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
14/11/2024	MD-12	N/A	VEG-659	15	54712	8:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C
15/11/2024	MD-12	N/A	EYY230	10	54727	8:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C


PMT

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
204,0	204,0

BOGOTÁ GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

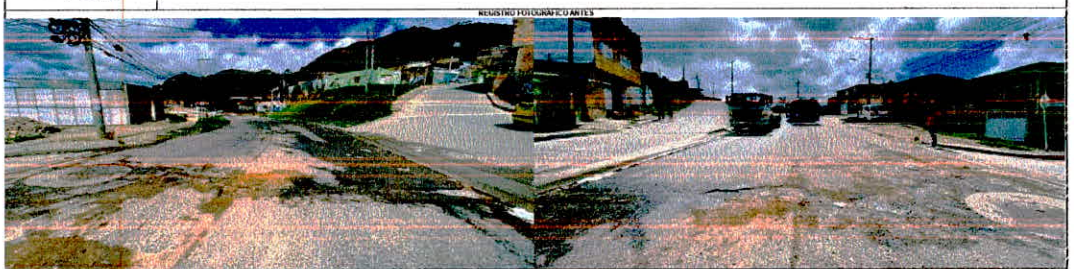

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



DIEGO NEIRA VERA
ELABORO

RICDO QUIROGA
APROBÓ

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 24/10/2024	FECHA FINALIZACION: 24/10/2024	NOCTURNA	DIURNA	CM	4600016	PK	2600-00		
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO		

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL					
BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
MODELO SUR	SAN CRISTOBAL	SOCIEGO	Cll 8	CL 1A S	

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
182,06	8,45	1537,95	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
17,80	4,20	71,40	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Observ
1.	24/10/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	31,50	25,00	4,20	0,240	25,20000	1,2500	105,0	
					31,50							
1.	24/10/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	31,50	25,00	4,20	0,240	25,20000	1,2500	105,0	
					31,50							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	6			6	
	-				

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rotadora en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO (AM/PM) ENTRADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032447826	Inspector	218
2	Andrés Felipe Torres Clarta	7:00	17:30	1077974399	Inspector	219
3	Diego Fernando Arguelles Caballero	7:00	17:30	1233691814	Inspector	282
4	Iván Ignacio Bitonto Vargas	7:00	17:30	1015395253	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzales	7:00	17:30	80809486	Conductor	181
6	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	75097614	Ayudante	172
7	Jeffersin Posada Cruz	7:00	17:30	1075817127	Ayudante	173
8	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023936706	Ayudante	174
9	Edwin Leguizamon Ospino	7:00	17:30	79702358	Ayudante	175
10	Olga Lucia Beltal Salazar	7:00	17:30	51647715	Ayudante	176
11	Jorge Kael Hernandez Romero	7:00	17:30	79482247	Ayudante	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Entrada	H. Salida	Aditivo Inicio	Aditivo Final	Aditivo Canti	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
24/10/2024	MD-12	VEO-835	VEO-835	16,2	54358	0:00	11:00				120°C	147°C	140°C	120°C
24/10/2024	MD-12	TTY972	TTY972	16,5	54360	0:00	11:00				120°C	147°C	140°C	120°C

PMT

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
104,0	104,0

BOGOTÁ | GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



DIEGO SEPULVEDA	ROCIO QUIROGA	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBÓ

BOGOTÁ GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 23/10/2024	FECHA FINALIZACION: 23/10/2024	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4000103	PK	200519
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCION	TERMINADO	

TIPO ALPACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
MARIÑO SUR	SAN CRISTOBAL	SAN BLAS	CALLE 10 SUR	CARRERA 8	CALLE 10 SUR

LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
52,71	13,77	725,71	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (M)	ANCHO INTERVENCIÓN (M)	ÁREA INTERVENCION (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
4,50	3,50	15,75	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compactación	m2	Maquinaria
1.	23/10/2024	Nivelación y compactación del terreno	Asfalto	m3	4,00	4,50	3,50	0,203	3,20000	1,2500	15,8	
					4,00							
1.	23/10/2024	Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).	Asfalto	m3	4,00	4,50	3,50	0,203	3,20000	1,2500	15,8	
					4,00							

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Movil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador	8			8	
Vibrocompactador	9			9	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LABORAL ENTRADA	SALIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	David Miguel Zuleta Goyeneche	7:00	17:30	1032417826	Inspector	218
2	Andres Felipe Torres Uribe	7:00	17:30	1014164289	Inspector	219
3	Diego Fernando Sepulveda Caballero	7:00	17:30	1233691014	Inspector	380
4	Iván Ignacio Briceño Vargas	7:00	17:30	1015396293	Conductor	179
5	Juan Carlos Martinez Gonzalez	7:00	17:30	80889488	Conductor	181
6	Juan Pablo Cruz Cruz	7:00	17:30	1014877513	Ayudante	172
7	Jefferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	173
8	Cristian Camilo Valbuena Lozada	7:00	17:30	1023936705	Ayudante	174
9	Paulin Legaramos Espino	7:00	17:30	7670358	Ayudante	175
10	Olga Lucia Ramal Salazar	7:00	17:30	51847195	Ayudante	176
11	Jorge Raul Dominguez Romero	7:00	17:30	1045822147	Ayudante	180

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de metro	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Final	Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
23/10/2024	MD-12	N/A	KZO-501	4	54796	10:00	11:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CANTIDAD DE EMULSION	GASTO TOTAL
182,8	182,8

BOGOTÁ GOBIERNO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



DIEGO SEPULVEDA	ROCIO QUIROGA	DIEGO CABALLERO
ELABORO	REVISO	APROBO
