Alcaldía de Calarcá	ACTA Nº 1	CODIGO: FO-MIPG-02 VERSION:03 FECHA:30/07/2024

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: INSPECCIÓN VISUAL PUENTE VEHICULAR LA PITALA , PROXIMO AL PUENTE EL DANUBIO , CORREDOR VIAL LA BELLA-QUEBRADA NEGRA

CIUDAD Y FECHA:	HORA INICIO:	HORA FIN:
Calarcá 18 de noviembre de 2024		

LUGAR:
Puente La Pitala , corredor vial la Bella - Centro poblado de Quebrada negra -

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1.Realizar inspección visual del estado del Puente vehicular La Pitala próximo al Puente principal El Danubio

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Revisar el estado del puente vehicular La Pitala próximo al Puente principal El Danubio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza la visita técnica al puente con el fin de evaluar el estado de la estructura, se realiza una inspección visual del puente encontrando las siguientes situaciones :

El puente tiene una luz de aproximadamente 10 metros de largo y un ancho de 6.50 metros.

Son dos puentes construidos con estructura independiente. Las dos placas de los tableros de los puentes tienen espesores diferentes.
Uno de los puentes ya había sido reforzado y ahora presenta falla en el tablero.
Las dos estructuras requieren de estudios de patología para establecer la capacidad de carga y las obras de reparación si es del caso.


En la visita nos acompañó el ing estructural de la secretaria de Planeación Juan Sebastian Ramirez.
La secretaria de infraestructura está a la espera de la respuesta por parte de la Secretaria de Transito y movilidad del Departamento del Quindío para proceder a la restricción de circulación de vehículos con sobrecargas para este tipo de estructuras.
Se recomienda enviar oficio a la secretaria de infraestructura del departamento para que señalicen mejor el sector mientras se definen las acciones a seguir.



La placa del lado izquierdo (sentido la Bella-Quebradanegra) presenta pérdida parcial del concreto, dejando expuesto el refuerzo de la misma.
La estructura que soporta esta placa tiene reforzamiento consistente en vigas de concreto.





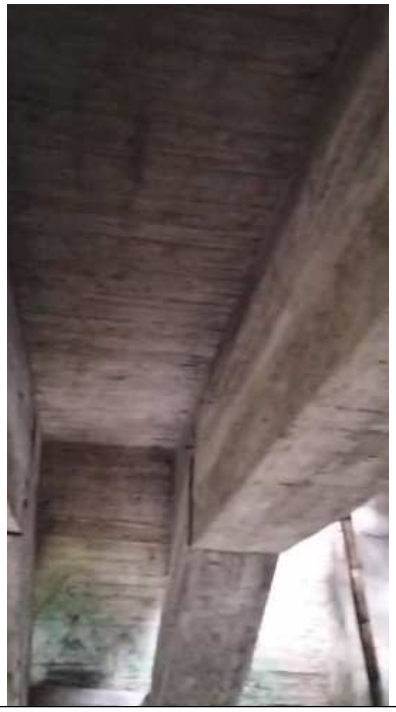

La placa del lado derecho ((sentido la Bella-Quebradanegra) no presenta falla, aunque si desgaste de la capa de rodadura.
Esta placa está apoyada sobre estribos en concreto en sus extremos y tiene una viga estructural longitudinal

El puente no tiene barandas.









La recomendación inmediata es restringir el paso de vehículos pesados, mientras se evalúa estructuralmente el estado del puente.

Conclusiones
La recomendación inmediata es restringir el paso de vehículos pesados, mientras se evalúa estructuralmente el estado del puente.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Pasar informe a la Secretaria de infraestructura departamental para evaluación técnica y enviar oficios a Secretaria de Infraestructura del Departamento	Ing César Alberto Martínez R	19-nov -2024

ASISTENTES:			
Carlos Felipe Sabogal	Departamento del Quindio		
Maria del Pilar Herrera	Secretaria de Infraestructura Calarcá		
Juan Sebastián Ramírez	Secretaria de Planeación Calarcá		
César A Martínez R	Secretaria de Infraestructura Calarcá		

Alcaldía de Calarcá	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PROBACIÓN DEL ACTA No_____ DEL DÍA_____ DEL MES DE_____ DEL AÑO 20___	c CODIGO: FO-MIPG-02 VERSION:03 FECHA:30/07/2024

OBJETIVO (S)	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA Y/OEMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
