
Contrato N° 00004870 de 2024 de 20 de noviembre de 2024	**Periodo del reporte:** Noviembre-diciembre de 2024	**Fecha: diciembre de 2024**
Nombre del contratista: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO		**CC: 60.373.700 de Cúcuta**

Objeto del contrato: 2024K-103 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR EN LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DERECHO A LA CIUDAD" DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

Obligaciones del contrato	Actividades realizadas por el contratista
1.IMPLEMENTAR EL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO Y RURAL, Y/O DE LOS DEMÁS BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO Y/O SEGUIMIENTO A OBRAS PÚBLICAS CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD VIGENTE QUE ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	SE BRINDÓ APOYO EN LA RECOPILACION DE LA INFORMACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENTES FUENTES DE DATOS QUE EXISTEN A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FASE 3 DE CARACTERIZACION. 

	
2.ELABORAR Y ENTREGAR EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR LOS INFORMES DETALLADOS EN LOS FORMATOS QUE SUMINISTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO DE Y/O PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO Y RURAL, Y/O DE LOS DEMÁS BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO Y/O SEGUIMIENTO A OBRAS PÚBLICAS CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD VIGENTE QUE ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	SE REALIZARON LOS INFORMES PERTINENTES DE LA CARACTERIZACION DE LAS VIA ASIGNADA POR EL SUPERVISOR FACE 3: • **TRAMO 54001-61 (ANEXO 1, INFORME VIAL).**  PR 0+200 material de afirmado, buen estado, pendiente mayor a 15%, ancho de vía 11.20ml

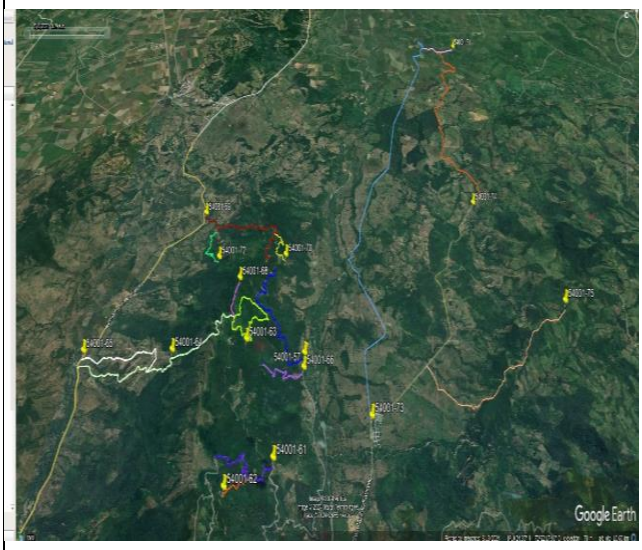

PR 1+200 terreno natural escarpado, ancho de vía 3.40ml



PR 1+483 OBRA DRENAJE ALCANTARILLA CCTO 36”



PR 2+998,70 FIN DE LA VIA, MINA COAL TESAJERO SAS.

- **TRAMO 54001-62- (ANEXO 2, INFORME VIAL).**



PR 0+000 material de afirmado, buen estado, ancho de vía 7.00ml




PR 0+400



PR 0+864 FIN VIA, MINA PALMIRA

- **TRAMO 54001-63 (ANEXO 3, INFORME VIAL).**

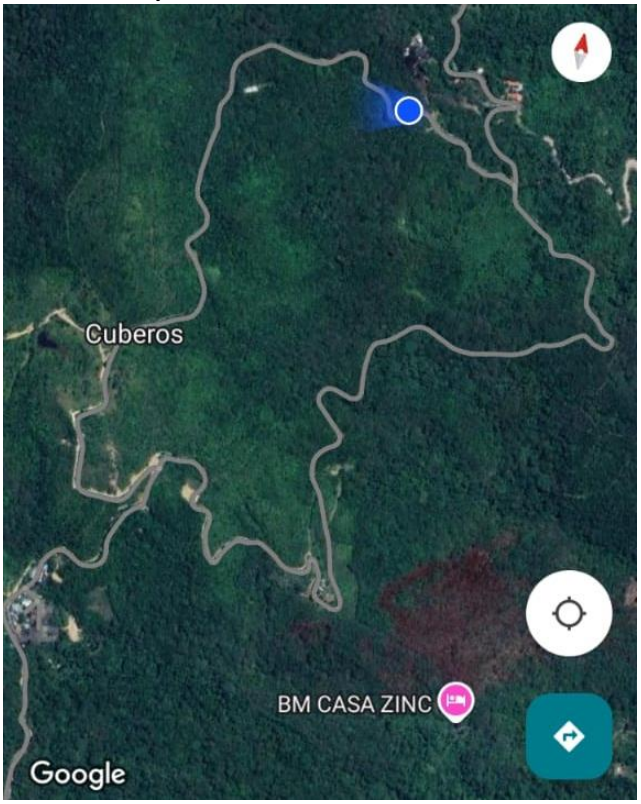



PR 0+000 BM Casa de Zinc escarpado estado regular mayor 15% vía 6.40m



PR 0+200 escarpado estado regular, ancho vía 4.20ml



PR 0+282 FIN VIA, mina de carbón, ancho de vía 6.10m

- **TRAMO 54001-64**



PR 0+000 VIA PRIVADA

- **54001-65 -PRIVADA**



PR 0+ 000 FINCA LOS RECUERDOS

- **54001-66 -PRIVADA**



PR 0+ 000 MINA LA CONTENTA

- **54001-57 -(ANEXO 4, INFORME VIAL).**



PR 0+000



PR 0+400 afirmado buen estado, ancho vía 6.50ml



PR 0+469,70 batea concreto, 5.00ml ancho. Y Largo 8.00m



PR 0+478 CAMBIO CARACTERISTICA



PR 0+709 CAMBIO CARACTERISTICA



PR 3+175 FIN VIA.



PR 0+469,70 BATEA CONCRETO REGULAR ESTADO.



PR 0+955 ALCANT CONCRETO D=24”

- **54001-69 -(ANEXO 5, INFORME VIAL).**



PR 0+000-Mina la Fiera



PR 0+200 Mal estado escarpado Ancho de vía 5.20 m



PR 0+235 Batea concreto mal estado ancho 5.20m



PR 0+524.40 Batea natural mal estado, ancho 6ml



PR 0+633 ALCANT D= 24” buen estado ancho 6ml



PR 0+903.80 Batea natural mal estado, ancho 5 ml



PR 1+000 ancho 6,58 ml afirmado



PR 2+600



PR 3+061,7 alcant 24” tubería metálica ancho 8,4



PR 4+600 ancho 4,20 ml escarpado



PR 5+400 Mina la fiera ancho 7,40 afirmado

- **54001-70 -PRIVADA**



PR 0+000 FINCA SAN JUAN

- **54001-72 -(ANEXO 6, INFORME VIAL).**





PR 0+000 T. Natural arcilloso, ancho Vía 5.60ml



PR 0+400 T. natural arcilloso, 4.70ml ondulado

	 PR 0+600 terreno natural descarpado inclinado 4.70ml  PR 0+798 FIN VIA
3.ARTICULAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CORRESPONDIENTE Y HACER EL DEBIDO CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y ACTUALIZANDO TODO LO RELACIONADO DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO Y RURAL, Y/O DE LOS DEMÁS BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO Y/O SEGUIMIENTO A OBRAS PÚBLICAS CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD VIGENTE.	SE BRINDÓ TODA LA INFORMACIÒN CON RESPECTO A LA CARACTERIZACIÒN DE LA VÍA REALIZADA EL DÍA ENTRE EL 22 NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE. 54001-57 54001-61 54001-62 54001-63 54001-64- PRIVADA 54001-65- FINCA LOS RECUERDOS - PRIVADA 54001-66 54001_66 via privada Mina la Contenta 54001-69 54001-70-PRIVADA 54001-72

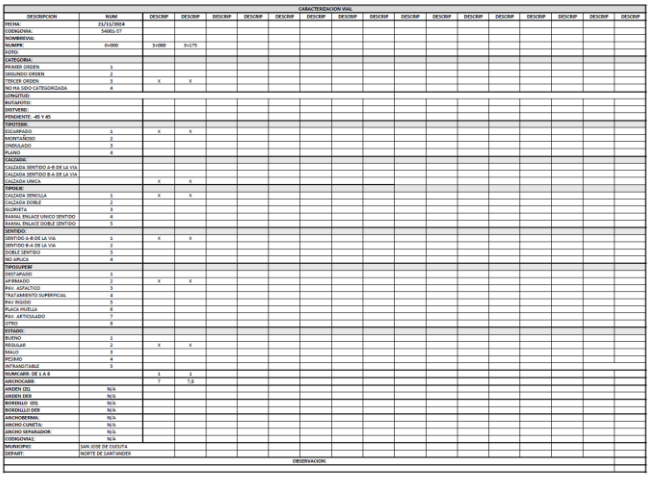	
4.REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN EN CAMPO QUE SURJAN DE LAS REUNIONES DEL SECRETARIO DE DESPACHO Y LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD, POR ASIGNACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, REALIZANDO SUS RESPECTIVOS INFORMES DETALLADO EN LOS FORMATOS QUE SUMINISTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTEAR SOLUCIONES CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO PRELIMINAR.	EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ÍTEM No. 4.
5.PROYECTAR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O REQUERIMIENTOS SEGÚN LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS, DE LAS COMUNIDADES Y ENTES DE CONTROL, EN LO RELACIONADO CON EL INVENTARIO Y LA CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO Y RURAL, Y DE LOS DEMÁS BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO QUE ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ÍTEM No. 5
6.ASISTIR A LAS REUNIONES DELEGADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAR LOS ASUNTOS QUE LE HAYAN SIDO ENCARGADOS O PUESTOS EN SU CONOCIMIENTO PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL O CONCEPTO TÉCNICO Y EN LO RELACIONADO CON EL INVENTARIO Y LA CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO Y RURAL, Y DE LOS DEMÁS BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO QUE ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ÍTEM No. 6

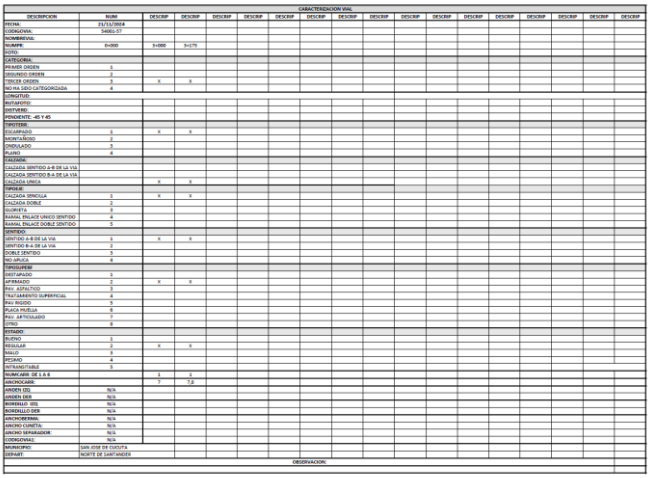7.REALIZAR INFORMES EN PERIODOS MENSUALES O EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR, QUE CONTENGAN EL AVANCE EN EL PROCESO CONTRACTUAL.	SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS FORMATOS PARA REGISTRAR TODA LA INFORMACIÒN GENERADA EN LA CARACTERIZACIÓN Y AFOROS DE LAS VIAS: 
8.LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO.	EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ÍTEM No. 8
Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)	
Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas	
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	

Nombre y Firma del contratista
ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
C.C. 60.373.700 de Cúcuta

Firmado digitalmente por Fabian Orlando Florez

Nombre y Firma del Supervisor
FABIAN ORLANDO FLOREZ GUARIN
C.C. 88.212.636 de Cúcuta
