CONTRATO 779 DE 2022

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

NIT: 901.667.284-6

ACTA PAGO DE OBRA

AGOSTO DE 2024

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

CONTRATO N°	778 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022005500031
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	2	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1/07/2024 a 31/08/2024
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 241.542.000.090,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 241.542.000.090,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	1068
NIT:	901-567-264-8	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO CONEXION PACIFICO
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	correoejecutivoconexionorinoquia@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	interventoriaconexionpacifico@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	Carlos German Corzo Upegui	**APOYO A LA SUPERVISION:**	N/A
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	interventoriaconexionpacifico@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	N/A
FECHA DE INICIACION:	19/04/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	2/09/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	**EXPLANACIONES Y REPLANTEO**													
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS.	KM	15,50	$ 7.818.144,00	$ 121.181.232,00			3,00	$ 23.454.432,00	0,00	$ -	3,00	$ 23.454.432,00	19,35%
1,2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	8,00	$ 7.783.979,00	$ 62.271.832,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
1,3	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HA	8,00	$ 831.216,00	$ 6.649.744,00			0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 190.102.808,00**				**$ 23.454.432,00**		**$ -**		**$ 23.454.432,00**	
2	**EXCAVACIONES**													
2,1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	132.584,00	$ 52.529,00	$ 6.963.454.356,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	309.316,00	$ 17.667,00	$ 5.464.685.772,00			11.482,50	$ 203.037.997,50	28.186,90	$ 497.977.962,30	39.679,40	$ 701.015.959,80	12,83%
2,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	7.710.806,00	$ 1.879,00	$ 14.488.604.474,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
2,4	TERRAPLENES CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR T MAX 3" (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)	M3	93.192,00	$ 122.638,00	$ 11.428.880.496,00			7.279,30	$ 892.718.783,40	6.546,10	$ 802.800.611,80	13.825,40	$ 1.695.519.405,20	14,84%
2,5	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES	M3/KM	4.726.484,00	$ 1.879,00	$ 8.886.719.226,00			58.609,60	$ 110.127.438,40	51.731,60	$ 97.203.676,40	110.341,20	$ 207.331.114,80	2,33%
	SUBTOTAL				**$ 47.232.344.324,00**				**$ 1.205.884.229,30**		**$ 1.397.982.250,50**		**$ 2.603.866.479,80**	
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**													
3,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	m3	54.367,00	$ 168.751,00	$ 9.174.485.617,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	m3	38.057,00	$ 182.857,00	$ 6.958.988.849,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3/Km	4.690.518,00	$ 1.879,00	$ 8.813.483.322,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,4	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	m2	248.536,88	$ 6.352,00	$ 1.578.668.150,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	m3	17.398,00	$ 1.193.316,00	$ 20.761.311.768,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
3,6	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	m3/Km	882.948,50	$ 2.155,00	$ 1.902.754.018,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 49.189.691.724,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4	**SEÑALIZACIÓN**													
4,1	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	15.533,18	$ 6.794,00	$ 105.532.425,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,2	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	66.484,00	$ 18.359,00	$ 1.220.579.756,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	26,00	$ 505.521,00	$ 13.143.546,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
4,4	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	45,00	$ 495.731,00	$ 22.307.895,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.361.563.622,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
5	**TERRAPLENES**													
5,1	RELLENO TIPO BASE GRANULAR PARA TERRAPLENES REFORZADOS CON GEOSINTETICOS	M3	62.128,00	$ 167.868,00	$ 10.429.303.104,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
5,2	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	M2	72.502,00	$ 35.919,00	$ 2.604.199.338,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
5,3	GEOTEXTIL NT 2500 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	22.159,00	$ 19.868,00	$ 440.255.012,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 13.473.757.454,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
6	**TALUDES**													
6,1	BIOMANTO PARA PROTECCION DE TALUDES CON ALTURA DE 8 A 12 M	M2	24.855,00	$ 48.183,00	$ 1.197.586.465,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,2	CONCRETO NEUMATICO PARA TALUDES (28 Mpa)	M3	8.668,00	$ 1.003.983,00	$ 8.732.644.134,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,3	MALLA TRIPLE TORSIÓN	M2	24.855,00	$ 71.029,00	$ 1.765.425.795,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,4	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	M2	84.107,00	$ 35.919,00	$ 3.021.039.333,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,5	PERNOS DIAMETRO 1" (25 mm)	ML	98.711,00	$ 26.553,00	$ 2.621.073.183,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	172.874,00	$ 19.664,00	$ 3.399.394.336,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	27.538,00	$ 58.299,00	$ 1.605.496.161,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
6,8	ANCLAJES ACTIVOS DE 25 TON (250 KN) LONGITUD 30 M Y BULBO DE 12 M	ML	103.544,00	$ 329.468,00	$ 34.114.434.592,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 56.457.095.999,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
7	**PUENTE Y VIADUCTO**													
7,1	PILOTE DE CONCRETO FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO 1.30M	ML	448,00	$ 6.210.699,90	$ 2.782.482.752,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
7,2	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	130,00	$ 47.523,00	$ 6.177.990,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
7,3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL SELECCIONADO	M3	101,00	$ 228.807,00	$ 23.109.507,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	779 DE 2022			PROYECTO N°				2022005500031								
7.4	CONCRETO CLASE A (35 Mpa-5000 PSI)	M3	1.102,60	$ 3.758.105,00	$ 4.132.615.710,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
7.5	CONCRETO CLASE C (28 Mpa-4060 PSI)	M3	1.921,00	$ 2.533.849,00	$ 4.865.987.129,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
7.6	CONCRETO CLASE D (21 Mpa-3000 PSI)	M3	985,00	$ 2.151.682,00	$ 2.078.373.130,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
7.7	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200 KG/CM2 DEE) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	591.376,00	$ 12.367,00	$ 7.278.064.432,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
7.8	TIRANTES DE TORONES DE 5/8 PARA PUENTES	TONM	1.129.132,00	$ 26.101,00	$ 29.236.985.332,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
7.9	APOYO ELASTOMERICO EN NEOPRENO 20X20X5 CM DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	622,00	$ 278.189,00	$ 173.033.558,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
7.10	SELLO PARA JUNTAS DE PUENTES. JUNTA ELASTOMÉRICA JEENE (J80/7VV) (50MM)	ML	24,00	$ 3.713.724,00	$ 89.129.376,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
7.11	SELLO PARA JUNTAS DE PUENTES. JUNTA ELASTOMÉRICA JEENE (J80/7VV) (100MM)	ML	246,00	$ 5.676.460,00	$ 1.407.762.080,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL				$ 52.071.300.996,00				$ -		$ -		$ -			
8	MUROS DE CONTENCION															
8.1	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	545,00	$ 2.037.087,00	$ 1.110.212.415,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL				$ 1.110.212.415,00				$ -		$ -		$ -			
9	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS															
9.1	TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	830,66	$ 1.510.833,00	$ 1.253.327.360,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
9.2	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACERO DE REFUERZO (CAJÓN 2.00X2.00M)	ML	60,00	$ 4.653.993,00	$ 279.239.580,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
9.3	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACERO DE REFUERZO (CAJÓN 2.50X2.50M)	ML	10,00	$ 5.442.262,00	$ 54.422.620,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
9.4	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACERO DE REFUERZO (CABEZAL ALCANTARILLA 900MM)	UN	83,00	$ 1.440.188,00	$ 119.536.434,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
9.5	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACERO DE REFUERZO (POCETA ALCANTARILLA 900MM)	UN	83,00	$ 4.366.880,00	$ 362.435.270,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
9.6	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACERO DE REFUERZO (CABEZAL CAJÓN 2.00X2.00M)	UN	12,00	$ 7.989.238,00	$ 95.870.856,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
9.7	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACERO DE REFUERZO (CABEZAL CAJÓN 2.50X2.50M)	UN	2,00	$ 12.446.035,00	$ 24.892.070,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
9.8	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	440,00	$ 983.546,00	$ 432.760.240,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
9.9	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	2.257,50	$ 1.022.667,00	$ 2.308.870.753,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
9.10	ZANJA DE CORONACIÓN CON GEOMEMBRANA (NO INCLUYE CONCRETO)	ML	2.762,00	$ 110.965,00	$ 306.319.610,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
9.11	CANAL TERRAZA CON GEOMEMBRANA (NO INCLUYE CONCRETO)	ML	2.783,00	$ 86.965,00	$ 240.100.245,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL				$ 5.477.575.068,00				$ -		$ -		$ -			
	PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL	UND	1,00	$ 1.381.988.683,00	$ 1.381.988.683,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
	AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CORREDOR SOSTENIBLE CONEXIÓN COLOMBIA-LA URIBE, DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y META	GLB	1,00	$ 9.857.711.265,00	$ 9.857.711.265,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%		
	RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE ACELERACIÓN DE OBRAS	GLB	1,00	$ 3.738.655.731,52	$ 3.738.655.732,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
	SUBTOTAL				$ 14.978.355.680,00											
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 184.383.206.176,00		$ -		$ 938.426.459,01		$ 1.067.162.823,29		$ 2.005.589.482,00			
	ADMINISTRACIÓN (26%)				$ 47.939.633.606,00		$ -		$ 243.990.879,34		$ 277.462.126,06		$ 521.453.005,00			
	IMPREVISTOS (1%)				$ 1.843.832.042,00		$ -		$ 9.384.264,59		$ 10.671.620,23		$ 20.055.885,00			
	UTILIDAD (4%)				$ 7.375.328.247,00		$ -		$ 37.537.058,36		$ 42.685.480,93		$ 80.223.539,00			
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 57.158.793.915,00		$ -		$ 290.912.202,29		$ 330.820.227,22		$ 621.732.429,00			
	VALOR TOTAL OBRA				$ 241.542.000.090,00		$ -		$ 1.229.338.661,30		$ 1.397.982.250,50		$ 2.627.320.911,80			

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		241.542.000.090,00
VALOR ADICIONAL		
VALOR TOTAL		241.542.000.090,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ANTICIPO		50.000.000.000,00
VALOR ANTICIPO: Etapa preconstructiva		5.619.849.874,00
VALOR ANTICIPO: Etapa constructiva		44.380.150.026,00
PRESENTE ACTA		1.397.982.250,50
ACUMULADO		2.627.320.911,80

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	1.229.338.661,30	504.028.851,13	725.309.810,17
ACTA 2	1.397.982.250,50	573.172.722,71	824.809.527,80
ACTA 3		-	-
PRESENTE ACTA	1.397.982.250,50	573.172.722,71	824.809.527,80
TOTALES	2.627.320.911,80	1.077.201.573,84	1.550.119.337,96

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	2.627.320.912	1,09
POR EJECUTAR	$	238.914.679.178	98,91
POR AMORTIZAR	$	46.922.798.426	97,85
TOTALES	$	241.542.000.090	100

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2022005500031 (Registro Presupuestal No. 1244)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	50.000.000.000,00			50.000.000.000,00
2	PAGO PARCIAL N°1	1.229.338.661,30	504.028.851,13	725.309.810,17	50.725.309.810,17
3	PRESENTE ACTA	1.397.982.250,50	573.172.722,71	824.809.527,80	51.550.119.337,96
4	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	189.991.880.752,04			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 50/100

NOTAS
1. El contador del contratista e interventor. Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3. Que la interventoria certifica que el contratista Consorcio Vial Conexión Orinoquia identificado con el NIT 901.667.284-6 cumplió con la clausula 08 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N° 779 de 2022 representado legalmente por el Consorcio Consorcio Vial Conexión Orinoquia, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____, NO X.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: lunes, 2 de septiembre de 2024

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

Firma:
Nombre: JUAN GONZALO ÁNGEL JIMÉNEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: FERNANDO VERA BARBERA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202087420CND

Firma:
Nombre: JESÚS ANTONIO GIRALDO CARMONA
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 128960-T

Firma:
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: DAGOBERTO FABRA ES CONTRERAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 54202240053 NTG

Firma:
Nombre: ANA JACQUELINE RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 276372-T

Nota: en la presente acta se deberá adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO 779 DE 2022

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

NIT: 901.667.284-6

MEMORIA DE CALCULO OBRA

AGOSTO DE 2024

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META


CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
FECHA DE INICIÓ:	19/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/12/2028
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	Consorcio Vial Conexión Orinoquia		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 de 2022		
INTERVENTORÍA:	Consorcio Conexión Pacífico		

ACTA:	Parcial N° 02
CAPITULO:	EXCAVACIONES

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CORTE EN VÍA CARRIL DE DESACELERACIÓN K0+000 AL K0+278 (VER ANEXOS)				1463,44	1463,4
CORTE EN VÍA DEL K 0+070 AL K 0+550 (VER ANEXOS)				29843,47	29843,5
DESCAPOTE K0+700 AL K0+810 (VER ANEXOS)				127,7	127,7
DESCAPOTE K0+940 AL K1+090 (VER ANEXOS)				598,33	598,3
CORTE EN VÍA K1+590 AL K1+720 (VER ANEXOS)				1145,22	1145,2
CORTE EN VÍA K1+720 AL K1+940 (VER ANEXOS)				4574,29	4574,3
CORTE EN VÍA DEL K 0+190 AL K 0+349.7 (ACTA No. 1)				9.565,50	-9565,5
PASAN:				SUBTOTAL	28186,90
				TOTAL	28186,90

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





Firma
Nombre: Fernando Vera Barrera
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202087420CND

Firma
Nombre: Dagoberto Cabrales Contreras
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 54202240053 NTS

Firma
Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2520255760CND

Firma
Nombre: Julián Ricardo Bautista Quiroga
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 0111510795

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CV	**CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION**
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION

SECTOR K 0 + 130 AL K 0 + 278.22 CARRIL DE DESACELERACION

Alienación: LINEA CARRIL DE ACELERACION

Grupo de líneas de muestreo: LINEA CARRIL ACELERACION

P.K. inicial: 0+130.00

P.K. final: 0+278.22

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
0+130.00	19,94	0	0
0+135.00	20,29	100,58	100,58
0+140.00	21,68	97,15	197,74
0+145.00	22,64	110,8	308,54
0+150.00	24,3	110,7	419,24
0+155.00	25,08	123,44	542,68
0+160.00	19,73	107,16	649,84
0+165.00	16,19	89,79	739,62
0+170.00	12,92	66,44	806,07
0+175.00	10,68	59	865,07
0+180.00	7,49	41,37	906,43
0+185.00	6,02	33,78	940,22
0+190.00	6,7	31,29	971,51
0+195.00	6,59	33,21	1004,72
0+200.00	6,87	33,22	1037,94
0+205.00	6,4	33,17	1071,1
0+210.00	6,27	31,67	1102,78
0+215.00	6,25	31,3	1134,08
0+220.00	6,63	32,2	1166,28
0+225.00	5,98	31,51	1197,79
0+230.00	4,72	26,74	1224,53
0+235.00	5,56	25,68	1250,21
0+240.00	5,95	28,76	1278,97
0+245.00	3,34	23,21	1302,18
0+250.00	4,74	20,18	1322,36
0+255.00	6,66	28,49	1350,85
0+260.00	7,34	35	1385,85
0+265.00	6,06	33,49	1419,34
0+270.00	4,07	25,33	1444,67
0+275.00	2,09	15,4	1460,08
0+278.22	0	3,36	**1463,44**

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma


Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de Interventoría
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13179

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de interventoría
Licencia profecional N°: 01-21556

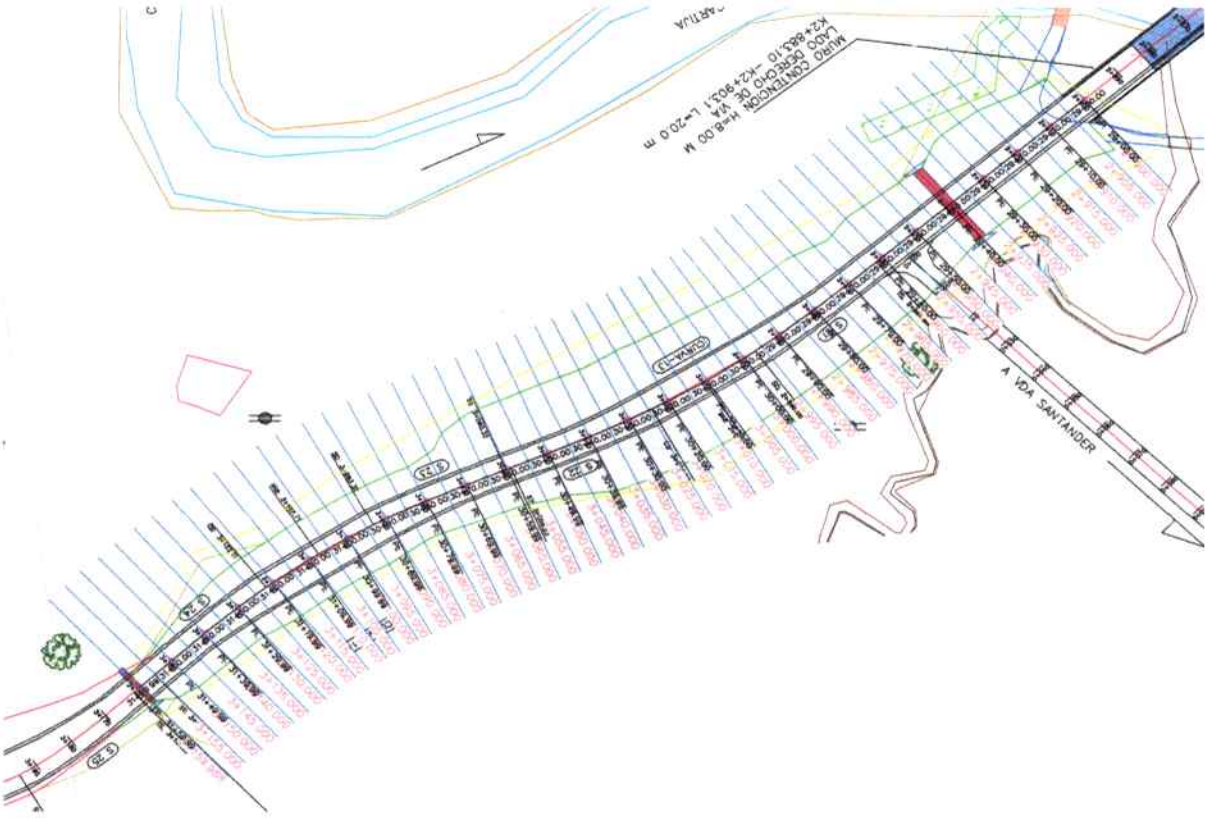
MURO CONTENCIÓN H=8,00 M
LADO DERECHO DE VIA
K2+883,10 - K2+903,11 L=20,0 m
A VDA SANTANDER

CV	**CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION**
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION

SECTOR K 0 + 070 AL K 0 + 550

Alienación: EXCAV K0 AL K0+400

Grupo de líneas de muestreo: LINEA EXCV K0 AL 400

P.K. inicial: 0+070.00

P.K. final: 0+220

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
0+070.00	**4,08**	**0**	**0**
0+075.00	4,17	20,6	20,6
0+080.00	8,4	30,84	51,44
0+085.00	11,65	50,11	101,55
0+090.00	11,87	67,44	168,99
0+095.00	6,53	45,99	214,99
0+100.00	4,67	27,24	242,23
0+105.00	5,96	26,58	268,81
0+110.00	7,93	33,39	302,2
0+115.00	17,22	62,86	365,06
0+120.00	22,14	98,39	463,44
0+125.00	13,87	90,03	553,47
0+130.00	13,84	69,28	622,75
0+135.00	14,08	69,8	692,55
0+140.00	15,63	74,29	766,84
0+145.00	20,68	90,78	857,62
0+150.00	27	119,18	976,8
0+155.00	34,84	154,59	1131,39
0+160.00	42,34	192,95	1324,33
0+165.00	52,1	236,11	1560,44

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de interventoría
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13179

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de interventoría
Licencia profecional N° 01-21556

CV	**CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION**
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION

SECTOR K 0 + 070 AL K 0 + 550

Alienación: EXCAV K0 AL K0+400

Grupo de líneas de muestreo: LINEA EXCV K0 AL 400

P.K. inicial: 0+070.00

P.K. final: 0+550

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
0+170.00	**61,64**	**284,36**	**1844,8**
0+175.00	73,6	338,1	2182,9
0+180.00	86,35	399,86	2582,75
0+185.00	99,88	465,56	3048,32
0+190.00	115,55	538,57	3586,89
0+195.00	138,59	635,35	4222,25
0+200.00	153,65	730,6	4952,85
0+205.00	151,43	762,7	5715,55
0+210.00	164,01	788,6	6504,15
0+215.00	181,26	863,18	7367,32
0+220.00	198,28	948,85	8316,17
0+230.00	214,08	2052,11	10368,28
0+240.00	199,99	2070,39	12438,67
0+250.00	198,96	1994,76	14433,43
0+260.00	189,99	1944,77	16378,2
0+270.00	148,07	1690,34	18068,54
0+280.00	155,51	1517,94	19586,48
0+290.00	119,25	1373,81	20960,29

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de Interventoria
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13179

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de Interventoria
Licencia profecional N° 01-21556

22/06

CV	CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION

SECTOR K 0 + 070 AL K 0 + 550

Alienación: EXCAV K0 AL K0+400

Grupo de líneas de muestreo: LINEA EXCV K0 AL 400

P.K. inicial: 0+070.00

P.K. final: 0+550

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
0+293.30	111,85	381,6	21341,89
0+295.72	107,55	265,1	21606,99
0+300.00	100,58	445,48	22052,47
0+303.72	101,25	375,32	22427,79
0+310.00	106,77	654,57	23082,36
0+314.14	107,2	443,31	23525,67
0+320.00	104,68	622,18	24147,85
0+328.72	94,89	865,89	25013,74
0+330.00	94,25	121,12	25134,86
0+340.00	82,55	863,85	25998,71
0+343.83	77,51	296,42	26295,13
0+350.00	70,04	438,14	26733,27
0+358.94	59,79	555,88	27289,15
0+360.00	59,2	62,82	27351,97
0+370.00	52,91	540,05	27892,02
0+373.53	49,3	175,69	28067,71
0+380.00	43,87	296,3	28364,01
0+383.94	40,89	167,15	28531,16
0+390.00	34,86	229,37	28760,53
0+391.94	32,67	65,65	28826,18

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de interventoría
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13179

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de interventoría
Licencia profecional N° 01-21556

CV	**CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION**
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION

SECTOR K 0 + 070 AL K 0 + 400

Alienación: EXCAV K0 AL K0+400

Grupo de líneas de muestreo: LINEA EXCV K0 AL 400

P.K. inicial: 0+070.00

P.K. final: 0+550

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
0+394.36	30,05	75,8	28901,98
0+400.00	24,49	153,78	29055,76
0+410.00	15,13	198,08	29253,84
0+420.00	12,07	136	29389,84
0+430.00	12,21	121,39	29511,23
0+440.00	12,39	122,97	29634,2
0+450.00	14,73	135,6	29769,8
0+460.00	0	73,67	29843,47
0+470.00	0	0	29843,47
0+480.00	0	0	29843,47
0+490.00	0	0	29843,47
0+500.00	0	0	29843,47
0+510.00	0	0	29843,47
0+520.00	0	0	29843,47
0+525.15	0	0	29843,47
0+530.00	0	0	29843,47
0+536.15	0	0	29843,47
0+540.00	0	0	29843,47
0+546.15	0	0	29843,47
0+550.00	0	0	29843,47

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de Interventoría
MP: 0111510795


Firma

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13179

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de interventoría
Licencia profecional N° 01-21556

324095

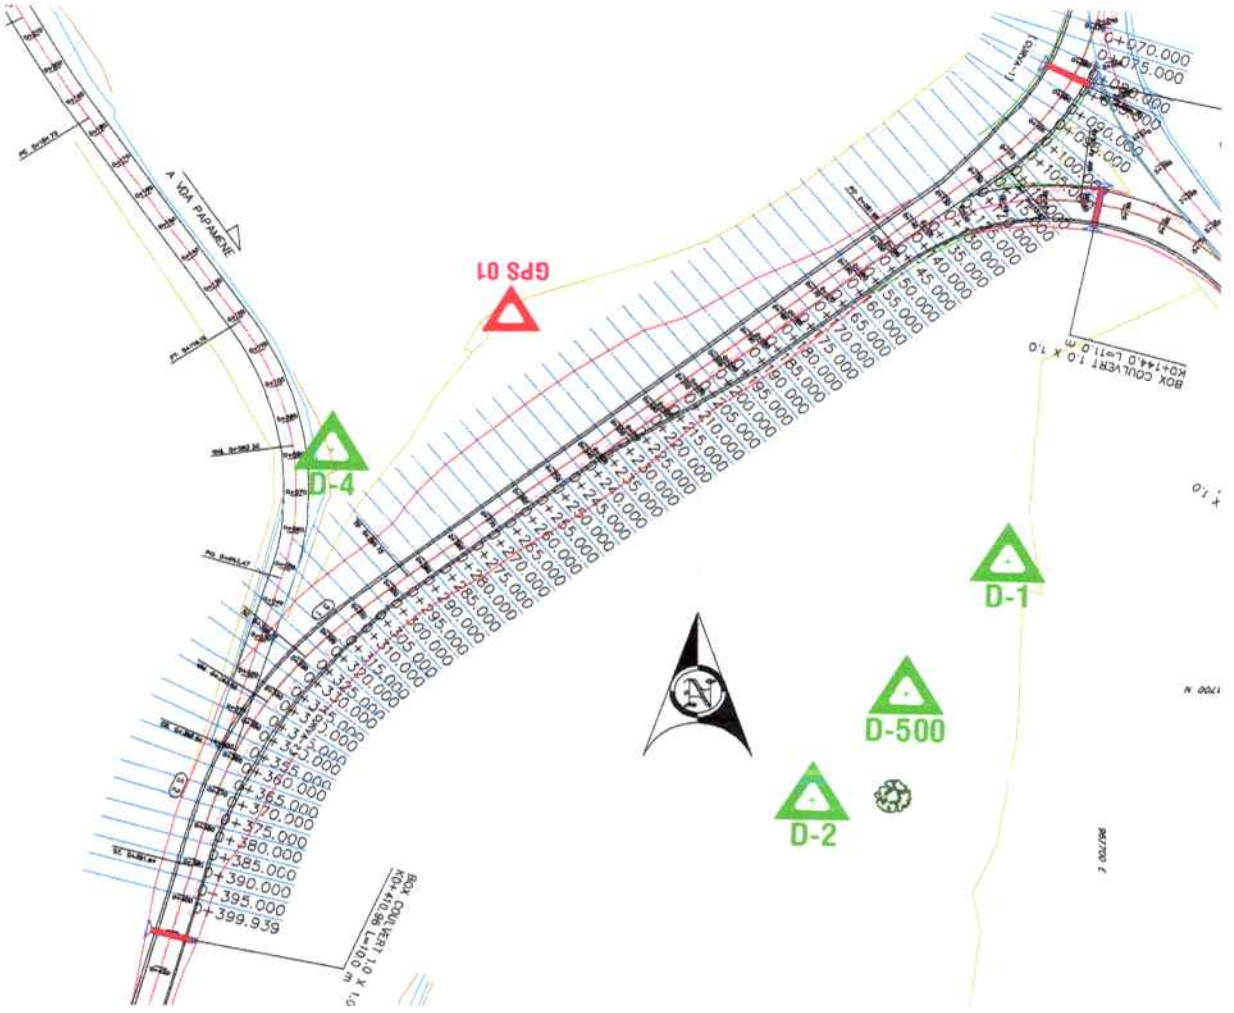
GPS 01
D-4
D-1
D-500
D-2
A VDA PAPAMENE
BOX CULVERT 1.0 x 1.0
BOX CULVERT 1.0 x 1.0

	CARTERA DE VOLUMEN DE TERRAPLEN
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION

SECTOR K 0 + 700 AL K 0 + 810

Alienación: 700 a 810

Grupo de líneas de muestreo: 700 A 810

P.K. inicial: 0+700.00

P.K. final: 0+810.00

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
0+700.00	0	0	0
0+710.00	0	0	0
0+720.00	0	0	0
0+730.00	1,36	6,79	6,79
0+740.00	3,74	25,5	32,29
0+750.00	4,76	42,51	74,79
0+760.00	2,8	37,78	112,57
0+770.00	0,11	14,56	127,13
0+780.00	0	0,57	127,7
0+790.00	0	0	127,7
0+800.00	0	0	127,7
0+810.00	0	0	127,7

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de interventoría
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13799

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de interventoría
Licencia profecional N° 01-21556

CV	**CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION**
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION

SECTOR K 0 + 940 AL K 1 + 1090

Alienación: 940 a 1090

Grupo de líneas de muestreo: 940 al 1090

P.K. inicial: 0+940.00

P.K. final: 1+089.99

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
0+940.00	0	0	0
0+945.00	0	0	0
0+950.00	3,5	8,75	8,75
0+950.00	3,47	0,01	8,76
0+955.00	4,81	20,7	29,45
0+960.00	5,16	24,92	54,37
0+960.00	5,21	-0,38	53,99
0+965.00	4,11	23,28	77,28
0+966.51	3,8	5,97	83,25
0+970.00	2,99	11,6	94,85
0+970.00	3,1	-0,38	94,47
0+975.00	3,44	16,36	110,83
0+980.00	3,88	18,3	129,13
0+980.00	3,85	-0,82	128,3
0+985.00	4,69	21,33	149,64
0+990.00	4,49	22,94	172,58
0+990.00	4,58	-0,61	171,96
0+995.00	4,09	21,69	193,65
0+999.99	4,47	21,38	215,03
1+000.00	4,37	-0,98	214,06

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de interventoría
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13799

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de interventoría
Licencia profecional N° 01-21556

CV	**CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION**
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION

SECTOR K 0 + 940 AL K 1 + 1090

Allenación: 940 a 1090

Grupo de líneas de muestreo: 940 al 1090

P.K. inicial: 0+940.00

P.K. final: 1+089.99

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
1+005.00	5,98	25,87	239,93
1+009.99	7,62	33,93	273,85
1+010.00	7,04	-2,33	271,52
1+015.00	7,71	36,88	308,4
1+019.99	6,03	34,3	342,7
1+020.00	6,07	-1,59	341,11
1+025.00	5,51	28,95	370,06
1+029.99	5,51	27,47	397,53
1+030.00	5,35	-0,67	396,86
1+035.00	5,35	26,75	423,61
1+039.99	5,6	27,35	450,96
1+040.00	5,6	0,04	451
1+045.00	4,5	25,25	476,25
1+049.99	3,2	19,21	495,46
1+050.00	3,2	0,03	495,49
1+055.00	5,24	21,08	516,57
1+059.99	5,3	26,28	542,85
1+060.00	5,29	0,06	542,91
1+065.00	3,56	22,14	565,05
1+069.99	1,98	13,81	578,86
1+070.00	1,97	0,02	578,88
1+075.00	1,67	9,11	587,99
1+079.99	1,25	7,28	595,27
1+080.00	1,22	0,01	595,28
1+085.00	0	3,05	598,33
1+089.99	0	0	598,33

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de interventoría
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13799

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de interventoría
Licencia profecional N° 01-21556

	CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION

SECTOR K 1 + 590 AL K 1 + 720

Alienación: 1590 al 1720

Grupo de líneas de muestreo: 1590 A 1720

P.K. inicial: 1+590.00

P.K. final: 1+719.99

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
1+590.00	0	0	0
1+600.00	7,01	34,66	34,66
1+610.00	9,74	83,06	117,72
1+620.00	11,57	106,09	223,81
1+630.00	12,19	118,83	342,64
1+640.00	14,28	132,37	475,01
1+650.00	14,62	145,12	620,13
1+660.00	12,68	137,77	757,9
1+670.00	11,2	121,03	878,94
1+680.00	7,8	96,42	975,35
1+690.00	6,48	72,5	1047,86
1+700.00	4,41	55,42	1103,27
1+710.00	1,93	32,32	1135,59
1+719.99	0	9,63	**1145,22**

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón

Residente de obra

MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga

Residente de interventoría

MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago

Topógrafo de obra

Licencia profecional N°: 01-13799

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve

Topógrafo de interventoría

Licencia profecional N° 01-21556

	CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE EXCAVACION

SECTOR K 1 + 720 AL K 1 + 940

Alienación: 1720 al 1940

Grupo de líneas de muestreo: 1720 A 1940

P.K. inicial: 1+720.00

P.K. final: 1+939.92

P.K.	Área de desmonte (Metros cuadrados)	Volumen de desmonte (Metros cúbicos)	Vol. desmonte acumul. (Metros cúbicos)
1+720.00	0	0	0
1+730.00	7,58	38,69	38,69
1+740.00	10,8	93,67	132,36
1+750.00	18,58	148,9	281,26
1+760.00	17,92	184,65	465,91
1+770.00	10,8	146,23	612,13
1+780.00	5,58	84,56	696,7
1+790.00	6,72	64,14	760,84
1+800.00	8,19	77,17	838,01
1+810.00	7,63	80,82	918,83
1+820.00	10,74	91,86	1010,69
1+830.00	10,49	106,15	1116,84
1+840.00	20,22	147,63	1264,47
1+850.00	28,61	224,13	1488,61
1+860.00	45,86	324	1812,6
1+870.00	59,24	446,95	2259,55
1+880.00	55,8	484,9	2744,45
1+890.00	31,46	358,62	3103,06
1+900.00	20,77	207,69	3310,75
1+910.00	21,67	176,74	3487,49
1+920.00	54,13	353,95	3841,44
1+930.00	47,29	498,34	4339,79
1+939.92	**0**	**234,5**	**4574,29**

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de interventoria
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13799

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de interventoría
Licencia profecional N° 01-21556

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
FECHA DE INICIÓ:	19/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/12/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	Consorcio Vial Conexión Orinoquia		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 de 2022		
INTERVENTORÍA:	Consorcio Conexión Pacífico		

ACTA:	Parcial N° 02
CAPITULO:	EXCAVACIONES

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4	TERRAPLENES CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR T MAX 3" (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TERRAPLÉN K 2+720 AL K 2+820 (VER ANEXOS)				3367,47	3367,5
TERRAPLÉN K 2+890 AL K 3+160 (VER ANEXOS)				9642,66	9642,7
TERRAPLÉN K 0+940 AL K 1+090 (VER ANEXOS)				815,15	815,2
TERRAPLÉN K 2+710 AL K 2+835 (ACTA No. 1)				1791,8	-1.791,80
TERRAPLÉN K 2+900 AL K 3+169.97 (ACTA No. 1)				5487,5	-5.487,50
PASAN:				SUBTOTAL	6546,10
				TOTAL	6546,10

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: Fernando Vera Barrera
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202087420CND

Firma
Nombre: Dagoberto Cabrales Contreras
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 54202240053 NTS

Firma
Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2520255760CND

Firma
Nombre: Julián Ricardo Bautista Quiroga
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 0111510795

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CV	**CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION**
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE MATERIAL

SECTOR K 2 + 720 AL K 2 + 819.98

Alienación: 2700 al 2820

Grupo de líneas de muestreo: 2700 A 2820

P.K. inicial: 2+700.00

P.K. final: 2+819.98

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
2+700.00	0	0	0
2+710.00	0	0	0
2+720.00	12,22	59,85	59,85
2+730.00	44,9	281,45	341,3
2+740.00	50,27	470,09	811,39
2+750.00	49,31	492,89	1304,28
2+760.00	47,2	479,93	1784,21
2+770.00	44,96	461,56	2245,76
2+780.00	38,23	419,31	2665,07
2+790.00	29,16	341,64	3006,72
2+800.00	16,66	233,25	3239,96
2+810.00	4,29	106,12	3346,09
2+819.98	0	21,38	3367,47

TOTAL **3367,47**

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma


Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de Interventoría
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13799

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de Interventoría
Licencia profecional N° 01-21556

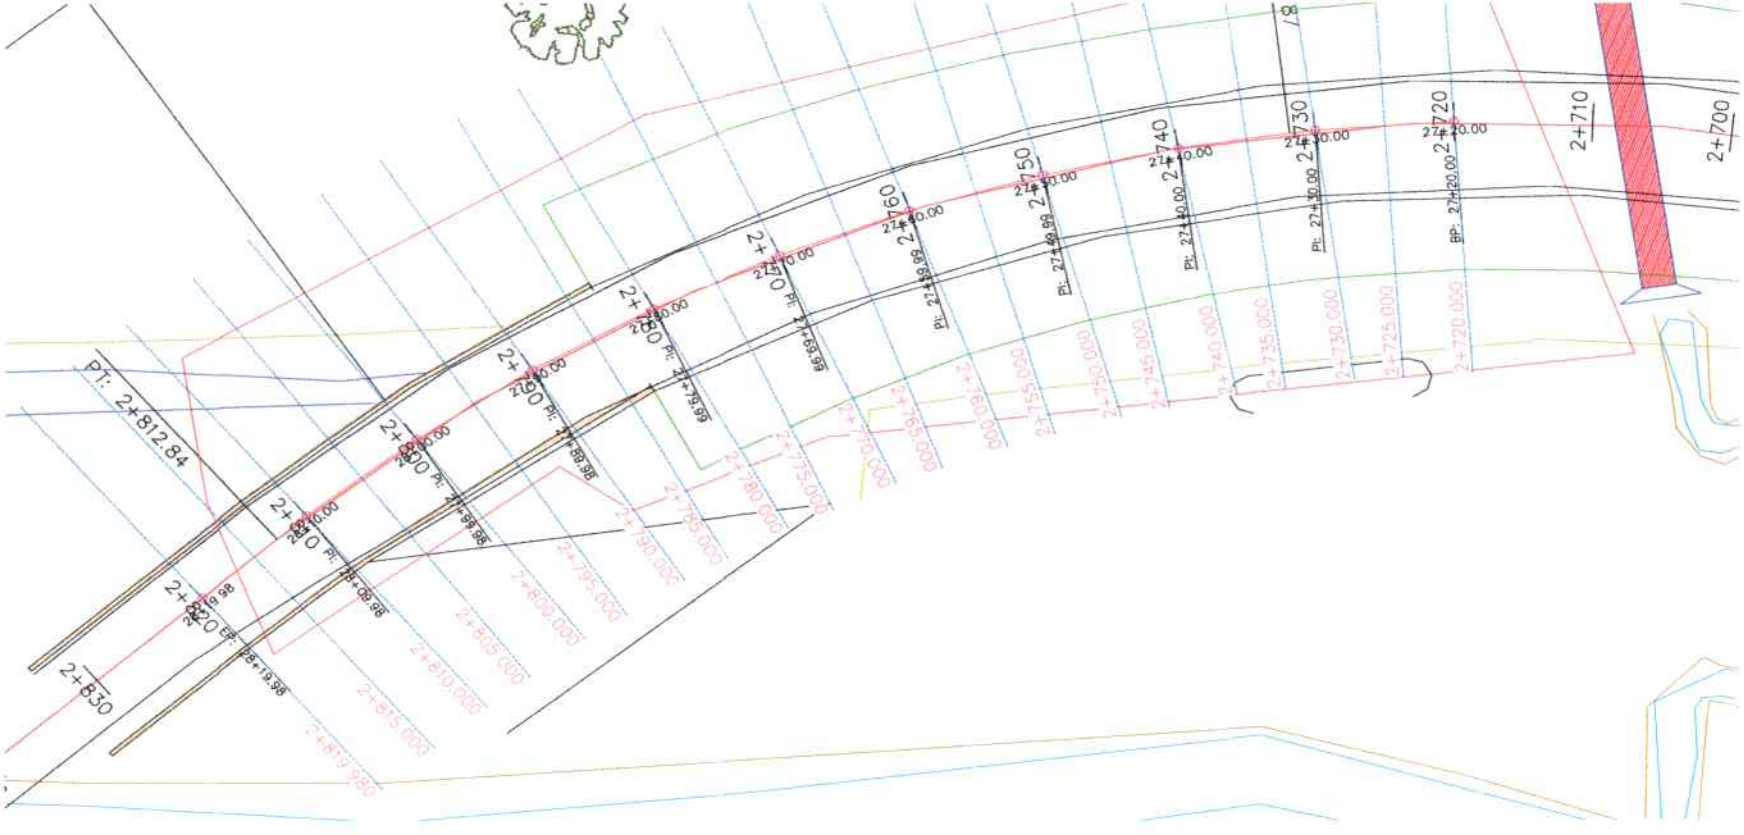
PT: 2+812.84
2+830
2+810
2+800
2+790
2+780
2+770
2+760
2+750
2+740
2+730
2+720
2+710
2+700
PI: 27+59.98
PI: 27+40.00
BP: 27+20.00

33417

CV	**CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION**
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE MATERIAL

SECTOR K 2 + 900 AL K 3 + 159.99

Alienación: 2890 al 3160

Grupo de líneas de muestreo: 2890 A 3170

P.K. inicial: 2+890.00

P.K. final: 3+159.99

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
2+890.00	2,73	0	0
2+900.00	8,83	57,81	57,81
2+910.00	34,17	215,02	272,84
2+920.00	37,82	359,98	632,82
2+930.00	42,08	399,51	1032,33
2+940.00	46,05	440,65	1472,98
2+950.00	36,62	413,37	1886,35
2+960.00	36,65	366,37	2252,72
2+970.00	36,91	367,8	2620,52
2+980.00	37,5	373,85	2994,37
2+990.00	39,14	385,41	3379,78
3+000.00	42,86	411,79	3791,57
3+010.00	50,1	465,56	4257,12
3+020.00	53,86	519,38	4776,5
3+030.00	59,07	563,04	5339,55
3+040.00	61,85	601,6	5941,15
3+050.00	58,36	601,05	6542,2
3+060.00	59,16	587,6	7129,81
3+070.00	37,15	481,58	7611,39
3+080.00	20,59	291,26	7902,65

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de interventoría
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander Lopéz Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13799

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de interventoría
Licencia profecional N° 01-21556

324/19

CV	**CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION**
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE MATERIAL

SECTOR K 2 + 900 AL K 3 + 159.99

Alienación: 2890 al 3160

Grupo de líneas de muestreo: 2890 A 3170

P.K. inicial: 2+890.00

P.K. final: 3+159.99

P.K.	Área de terraplén (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
3+090.00	22,26	214,8	8117,45
3+100.00	26,56	244,37	8361,82
3+110.00	28,77	276,49	8638,31
3+120.00	28,83	287,04	8925,35
3+130.00	26,3	273,93	9199,28
3+140.00	21,51	237,29	9436,57
3+150.00	9,86	156,85	9593,42
3+159.99	**0**	**49,24**	**9642,66**

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
Residente de obra
MP: 2520255760CND

Firma


Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga
Residente de interventoría
MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B.

Nombre: Fredy Alexander López Buitrago
Topógrafo de obra
Licencia profecional N°: 01-13799

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve
Topógrafo de interventoría
Licencia profecional N° 01-21556

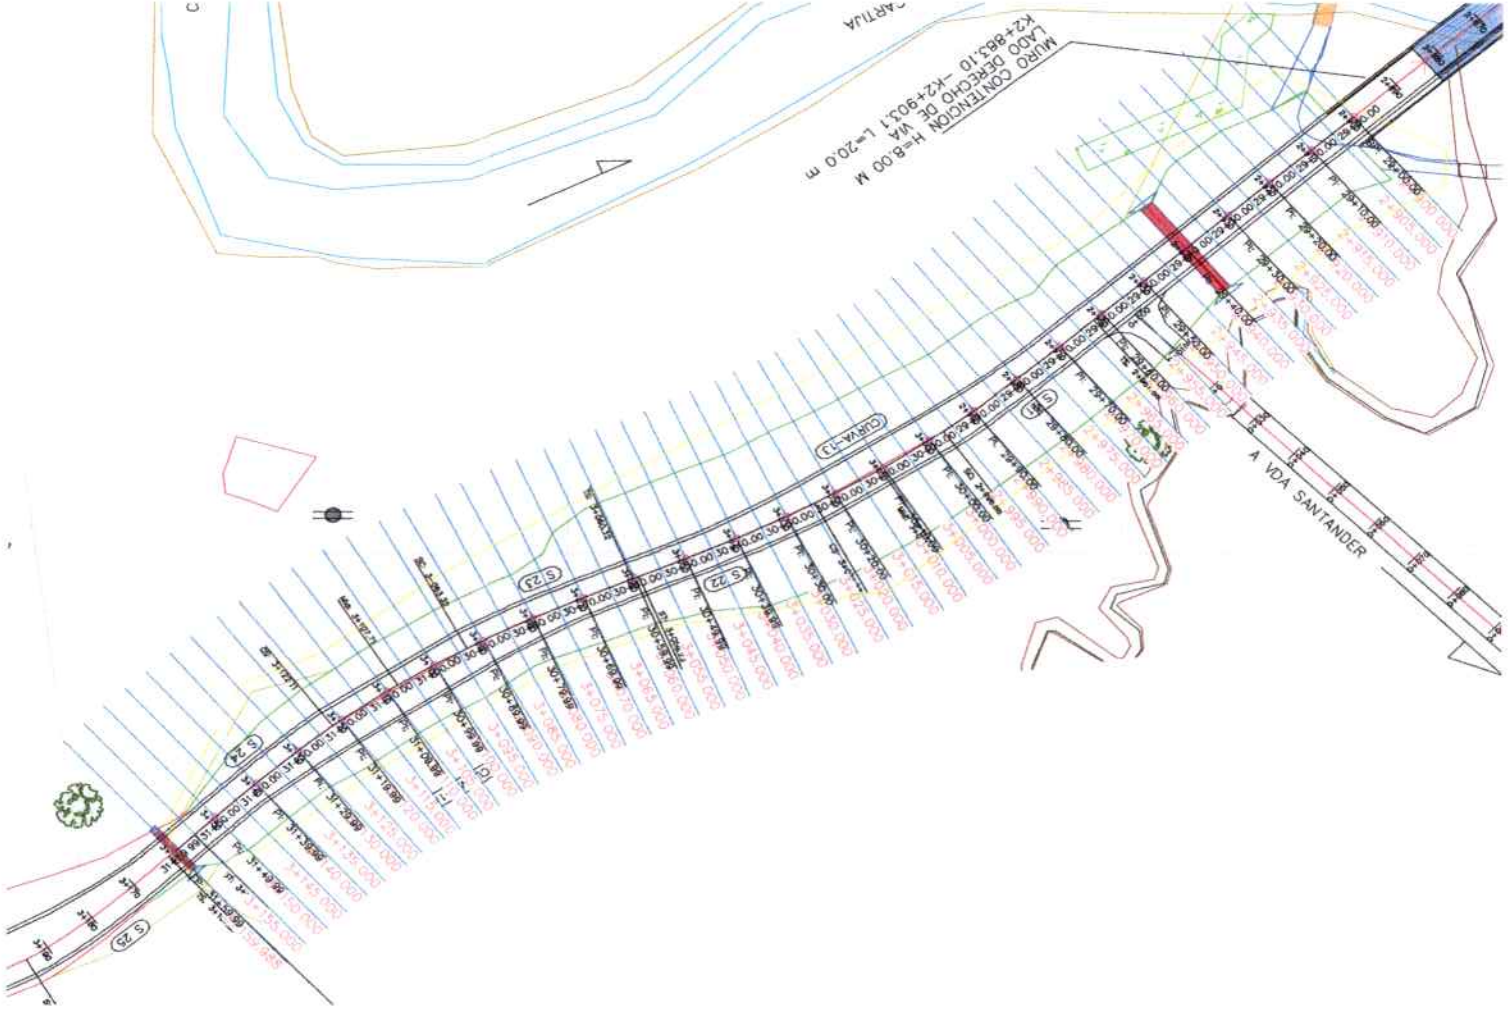
MURO CONTENCION H=8.00 M
LADO DERECHO DE VIA
K2+883.10 -K2+903.1 L=20.0 m
A VDA SANTANDER

33420

	CARTERA DE VOLUMEN DE EXCAVACION
	MES AGOSTO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

CALCULO DE VOLUMEN DE MATERIAL

SECTOR K 0 + 940 AL K 1 + 090

Alienación: 940 a 1090

Grupo de líneas de muestreo: 940 A 1090

P.K. inicial: 0+940.00

P.K. final: 1+089.99

P.K.	Área de terrapién (Metros cuadrados)	Volumen de terraplén (Metros cúbicos)	Vol. terraplén acumul. (Metros cúbicos)
0+940.00	0	0	0
0+950.00	0	0	0
0+960.00	6,03	29,87	29,87
0+970.00	5,37	56,05	85,92
0+980.00	6,99	60,48	146,4
0+990.00	10,16	83,53	229,92
1+000.00	13,81	115,81	345,73
1+010.00	17,71	151,74	497,47
1+020.00	14,06	155,19	652,66
1+030.00	9,3	116,05	768,71
1+040.00	0	46,48	815,18
1+050.00	0	0	815,18
1+060.00	0	0	815,18
1+070.00	0	0	815,18
1+080.00	0	0	815,18
1+089.99	**0**	**0**	**815,18**

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón

Residente de obra

MP: 2520255760CND

Firma

Nombre: Julian Ricardo Bautista Quiroga

Residente de interventoría

MP: 0111510795

Firma Fredy Lopez B

Nombre: Fredy Alexander Lopez Buitrago

Topógrafo de obra

Licencia profecional N°: 01-13799

Firma

Nombre: Angel Jonathan Cárdenas Monsalve

Topógrafo de interventoría

Licencia profecional N° 01-21556

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
FECHA DE INICIÓ:	19/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/12/2028
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	Consorcio Vial Conexión Orinoquia		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 de 2022		
INTERVENTORÍA:	Consorcio Conexión Pacífico		
ACTA:	Parcial N° 02		

CAPITULO:	EXCAVACIONES	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,5	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	FACTOR DE EXPANSIÓN	DISTANCIA	CANTIDAD	TOTAL
TERRAPLÉN K 2+720 AL K 2+820		0,2	8,00	1575,67	12.605,40
TERRAPLÉN K 2+890 AL K 3+160		0,2	8,20	4155,16	34.072,30
TERRAPLÉN K 0+940 AL K 1+090		0,2	6,20	815,15	5.053,90
PASAN:				SUBTOTAL	51731,60
				TOTAL	51731,60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: Fernando Vera Barrera
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202087420CND

Firma
Nombre: Dagoberto Cabrales Contreras
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 54202240053 NTS

Firma
Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2520255760CND

Firma
Nombre: Julián Ricardo Bautista Quiroga
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 0111510795

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO 779 DE 2022

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

NIT: 901.667.284-6

INFORME DE OBRA

AGOSTO DE 2024

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

	INFORME ACTA PARCIAL	
	ACTA PARCIAL No. 2	

INFORME COMPONENTE TÉCNICO

32 4/25

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

INFORME ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2

Periodo de 01, 07, 2024 a 31, 08, 2024

Fecha de Presentación: 04, 09, 2024

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 241.542.000.090
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE, DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL PROYECTO:	$ 241.542.000.090
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO ETAPA-PRECONSTRUCTIVA	$5.619.849.974,00
ANTICIPO ETAPA-CONSTRUCTIVA	$44.380.150.026,00
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA
CORREO ELECTRÓNICO:	correspondenciacvialorinoquia@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022
INTERVENTORÍA:	Consorcio Conexión Pacífico
CORREO ELECTRÓNICO:	intervconexionpacifico@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO			
FECHA DE INICIACIÓN:			19,04,2023
PRORROGA:			
SUSPENSIÓN:			
TIEMPO:			
REINICIO:			
FECHA DE TERMINACIÓN			30,12,2028
69	Meses	12	Días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3426

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	**URIBE**		**VEREDA:**	- Versalles - Yavía - Papamene - Santander	
CORREGIMIENTO:	N/A		**BARRIO:**	N/A	
COMUNA:	N/A		N/A	N/A	
COORDENADAS:	**PUNTO**	**DESCRICIÓN**		**COORD. NORTE**	**COORD. ESTE**
	1	K0+000.00		848,948.9482m	967,700.8273m

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO



Figura 1. Ubicación espacial del Municipio de Uribe en el Departamento del Meta y en Colombia.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**

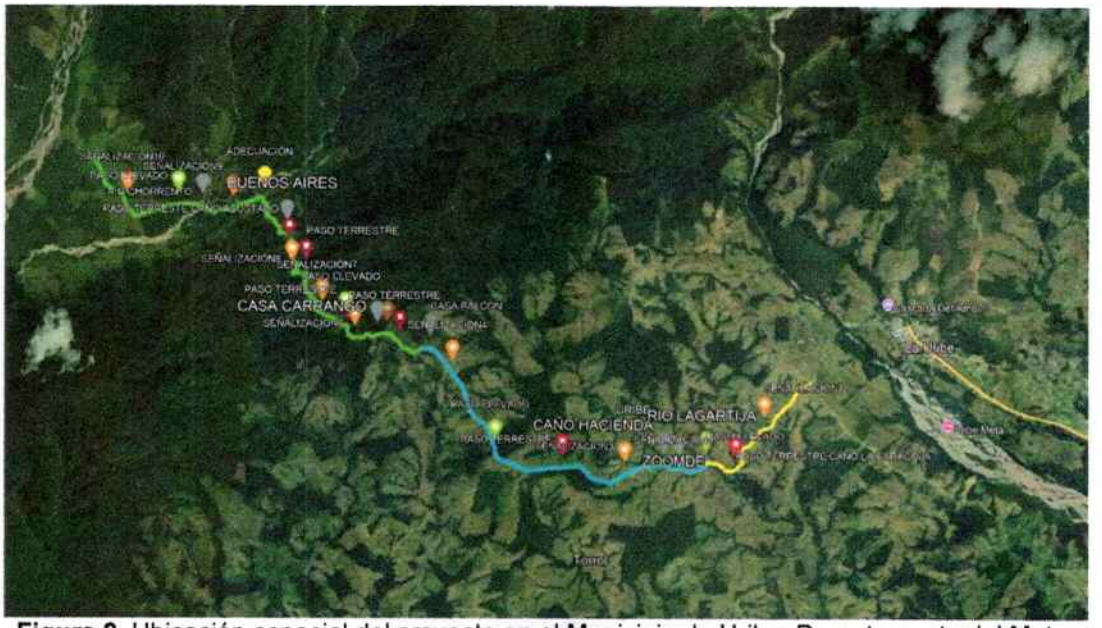


Figura 2. Ubicación espacial del proyecto en el Municipio de Uribe, Departamento del Meta.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

224/28

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

A. INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Durante el transcurso del mes de julio, en cuanto al componente de estudios y diseños se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza la aprobación de:
  - ✓ Volumen I. Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles De Servicio – Tramo No. 2 (K3+000 al K10+000).
  - ✓ Volumen IV. estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención Tramo 2 (km 3 – km 10).
  - ✓ Volumen V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes – Tramo 2 (k03+150 -k09+450) v 1.
  - ✓ Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería - Tramo II del K3+000 - K10+000.
  - ✓ Volumen XI predial del tramo 2.
- Se realiza la subsanación de las observaciones de:
  - ✓ Componente de pavimentos tramo 2.
  - ✓ Carteras de rasante tramo 1 y 2.
  - ✓ Observaciones componente de Geología Tramo No. 2 e Informe de interventoría – Geología Tramo 2 K3+000 - K10+000.
  - ✓ Análisis de precios unitarios de ítems no previstos.
  - ✓ Alternativa de procedimiento para empradización de taludes.
  - ✓ Volumen III. Estudio de Geología Tramo No. 2 el informe de interventoría – Geología Tramo 2 K3+000-K10+000.
- Entrega del diseño geométrico del tramo 3 a interventoría para aprobación.
- Modificaci6n Diseño Geométrico en Perfil desde el K0+070 - K0+940. Tramo 1

Durante el transcurso del mes de agosto, en cuanto al componente de estudios y diseños se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza la subsanación de las observaciones de:
  - ✓ Componente de pavimentos tramo 2.
  - ✓ Modificación Diseño Geométrico en Perfil desde el K0+070 -K00+940. Tramo 1 V2.
  - ✓ Precios Unitarios No Previstos.
  - ✓ Ajuste a las zanjas de coronación.
  - ✓ Hidráulica e Hidrológica Terreno de Renivelación.
  - ✓ Estudio Hidráulico e Hidrológico Tramo 2
- Concepto Estructural Observaciones Box Coulvert sección 1,0 x 1.0 m.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3429

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

Avance físico

Durante el presente periodo las actividades realizadas en campo fueron:

- Se hacen recorridos de inspección por el corredor vial, con el fin de mantener la transitabilidad de forma segura para los usuarios.
- Se utiliza el material acopiado en el sector conocido como la báscula en el K1+800 en la vía que conduce del casco urbano de Uribe a la Julia.
- Continúa el traslado de cercos en los predios contiguos al corredor vial, dejando hasta la fecha:
    - Se realiza cercado en la zona de donación de material, predio La Gran Vía 261 m, se utilizaron con tes cuerdas de alambre de púa y 30 postes nuevos.
    - Por el costado derecho desde el K0+ 370 AL K0+ 405 y desde el K2+200 al K2+250, para estos tramos se utilizaron los mismos postes y alambre existentes, sin embargo, donde se requirió postes nuevos se suministraron.
    - Por el costado izquierdo desde el K0+280 al K0+340, K0+340 al K0+380, K0+600 al K0+635, K0+380 al K0+405, K0+635 K0+690, K1+840 al K1+940, para este tramo se utilizaron los mismos postes y alambre existentes, sin embargo, donde se requirió postes nuevos se suministraron, se realiza la reubicación debido al cambio en la rasante
- Adecuación del terreno del predio La Gran Vía (zona de donación de material) con material de excavación.
- Adecuación del terreno del predio el paraíso (zona de nivelación) con material de excavación.
- Excavación en material común de la explanación y canales K1+540 AL K1+700, K1+700 AL PR1+950, K0+900 AL K1+980 y K0 + 000 al K0 + 680.
- Excavación en roca de la explanación y canales K0+210 K0+400.
- Terraplenes con material mixto de rio sin procesar en el K2+710 AL K2+829.94, K2+890 AL K3+162.09 y K0+940 al K1+090.
- Transporte disposición final de escombros y sobrantes hasta la zona de donación de material y la zona de nivelación.
- Transporte de materiales granulares desde Triturados San José (proveedor) hasta K2+710 AL K2+829.94, K2+890 AL K3+162.09 y K0+940 al K1+090.
- Empradización tramo de prueba K0+135 al K0+190 costado derecho.

El día 24 de mayo de 2023, la junta de acción comunal de Papamene, allegó al Consorcio Vías Regionales 193 (Interventoría) y al Consorcio Vial Conexión Orinoquia (Contratista de Obra), la solicitud de la realización de mantenimiento del corredor vial, haciendo énfasis en el mal estado en el que se encontraba la vía y en la contingencia presentada por la ola invernal que ocasionó algunos derrumbes que impedían el tránsito y ponían en riesgo seguridad de los transeúntes.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

Por lo cual fue necesario realizar una visita de obra para detallar las necesidades del corredor y establecer parámetros que permitan construir un presupuesto para la ejecución del mantenimiento.
Por lo cual mediante el oficio CCV-INT-048-779-2023, enviado el día 5 de junio del 2023 fue radicado a interventoría el primer presupuesto, el cual fue realizado con ítems contractuales, sin embargo, mediante el oficio 01-042-0051-2023 se reciben observaciones referentes al presupuesto y se solicita el ajuste del mismo para las necesidades del corredor.

Por lo cual el día 25 de julio se realizó visita al corredor en conjunto con interventoría y se determinaron los parámetros que requería el mantenimiento, se realizó mesa de trabajo para definir los APUs nuevos que debían integrarse al contrato, los cuales fueron tomado de la resolución No. 100-37 – 088 de 2023 *"Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de las actividades de obras civiles en la Agencia para la Infraestructura del Meta";* se toman de la misma los análisis de precios unitarios de los ítems:

- Remoción mecánica de derrumbes.
- Conformación de la calzada existente.
- Material crudo de arrastre.

Mediante el oficio CCV-INT-117-779-2023 se radica el presupuesto ajustado con los ítems no previstos que serán utilizados para la ejecución del mantenimiento, mediante el oficio 01-042-0122-2023, se aprueba el presupuesto limitando el alcance a Yavía (Casa Balcón) y Papamene (Aguas Claras), hasta tanto, interventoría no apruebe el PAGA el cual fue aprobado mediante el oficio 01-042-0165-2023, dando lugar a la extensión del mantenimiento en todo el corredor.

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante la etapa de mantenimiento:

	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Localización, trazado y replanteo topográfico vías incluye equipo automático de precisión, cartera y planos.	0%	$ 0	100,0%	$ 7.818.144	0,00%	$ 0	0,0%	$ 0
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	0%	$ 0	100,0%	$ 831.218	0,00%	$ 0	0,0%	$ 0
Excavación en roca de la explanación y canales	0%	$ 0	100,0%	$ 18.910.440	0,00%	$ 0	0,0%	$ 0
Excavación en material común de la explanación y canales	0%	$ 0	100,0%	$ 63.601.200	14.86%	$9.448.312	52.57%	$33.432.324

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

324/21

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Transporte disposición final de escombros y sobrantes	0%	$ 0	100,0%	$ 8.944.040	0,00%	$ 0	2,7%	$ 239.723
Transporte de materiales granulares	0%	$0	100,0%	$ 374.522.280,0	0.26%	$957.012	83.66%	$ 313.343.374
Tubería concreto reforzado 36" clase III NTC 401. suministro e instalación	0%	$ 0	100%	$ 7.550.165	0%	$ 0	100%	$ 7.550.165
Material de arrastre crudo incluye explote, cargue, conformación y compactación	0%	$0	100,0%	$1.560.358.800,0	0.22%	$ 3.417.422	99.56%	$1.553.488.493
Conformación de la calzada existente (incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	0%	$ 0	100,0%	$141.290.000,00	0%	$0	94.84%	$133.756.133
Remoción mecánica de derrumbes (incluye trasiego y cargue	0%	$ 0	100,0%	$ 20.319.200	22.57%	$ 4.585.535	81.03%	$ 16.463.886

Las actividades de mantenimiento fueron terminadas el día 22 de diciembre del 2023, sin embargo, debido a las fuertes precipitaciones presentadas en los últimos días del mes de diciembre fue necesario realizar una intervención en sitios puntuales del corredor donde se presentaron afectaciones que no permitían el tránsito seguro de los usuarios del corredor, tal intervención se realizó durante el mes de enero, a partir de la finalización de la ejecución de las actividades del mantenimiento el Consorcio Vial Conexión Orinoquía realiza recorridos de inspección al corredor constantes para garantizar la transitabilidad segura por la vía.

Grafica Avance Físico del mantenimiento

La siguiente gráfica representa el avance programado versus el ejecutado durante la etapa del mantenimiento.

Es necesario aclarar que dando por terminada la etapa de mantenimiento se aclara que:

- No se realizó la ejecución del presupuesto total aprobado por interventoría, esto debido a que algunas actividades no requirieron la ejecución total durante esta etapa por lo cual:

  - ✓ Meta física programada para el mantenimiento periódico (alcance): 15.503Km (100%) (intervención realizada entre elPR0+000 al K15+0503).
  - ✓ Meta física ejecutada para mantenimiento periódico: (intervención realizada entre el K0+000 AL K15+583.65.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3248 2

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

- ✓ Inversión programada a 31 de enero de 2024 para el mantenimiento periódico: $2.204.145.487,00.
- ✓ InXversión ejecutada a 31 de enero de 2024 para el mantenimiento periódico: $2.058.522.493,71.
- ✓ % Programado para el mantenimiento periódico: 100%.
- ✓ % Ejecutado para el mantenimiento periódico: 93,39%.

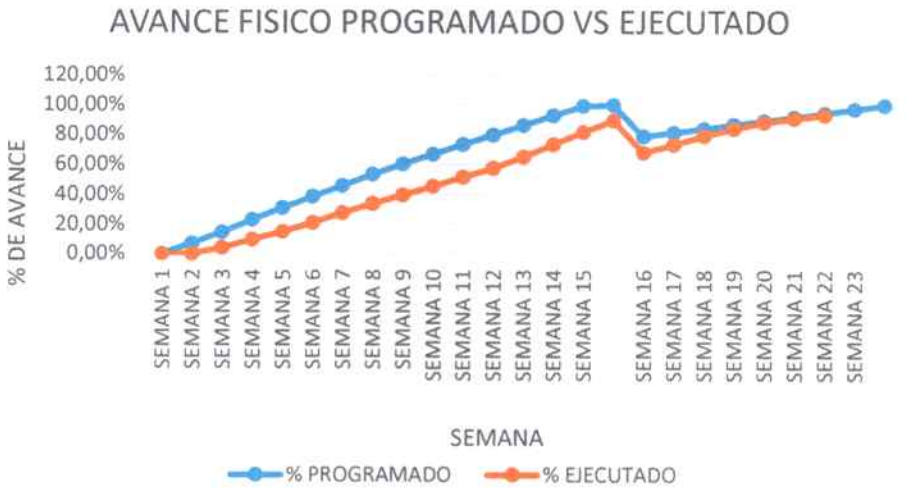

Avance físico

AVANCE FÍSICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 01/07/2024 A 31/08/2024		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
2,2	Excavación en material común de la explanación y canales	28186,95	$ 497.977.962	0.21
2,4	Terraplenes con material mixto de rio sin procesar t máx. 3" (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	6.546,10	$ 802.800.612	0.33
2,5	Transporte de material granular	51.731,60	$ 97.203.676	0.04
		VALOR TOTAL	$ 1.397.982.251	0.58

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

32932

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PERIODO	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
01/05/2024 al 30/06/2024	0.06%	$ 142.219.855,50	0.08%	$ 172.515.163,50	0.54%	$ 1.299.193.869	0.54%	$ 1.299.193.869
01/07/2024 al 31/08/2024	0.36%	$ 825.386.690,50	0.63%	$ 1.425.714.059,00	0.62%	$ 1.397.982.251	1.12%	$ 2.800.011.346

Grafica Avance Físico



Para el presente informe se reporta un avance general del proyecto del 3.4% discriminado de la siguiente forma:

- Ajuste a los estudios y diseños para el corredor sostenible conexión Colombia-Uribe, departamentos del Huila Y Meta: Se reporta un avance del 48.39%, lo que representa un 1.97% en el avance total del proyecto
- Mantenimiento del corredor: finalizando la actividad en el mes de enero se reporta un avance del 93.39%, lo que representa un 0.91% en el avance total del proyecto.
- Para el presente periodo comprendido entre el 01 julio de hasta el 31 de agosto se reporta un porcentaje de avance de obra del 1.29 %.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

32/34

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO Nº	779 DE 2022	PROYECTO Nº	2022005500031

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

- **Periodo del 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2024**

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
4/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0140	Aprobación informe mensual SST enero 2024 – rta comunicación CCV-INT-512-779-2023	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
4/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0141	Respuesta a oficio CCV-INT-488-779-2023. Documentación de personal de ingreso de la fecha del cinco (5) de junio del 2024.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
4/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0142	Respuesta a oficio CCV-INT-508-779-2023. Aprobación Volumen I. Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles De Servicio – Tramo No. 2 (K3+000 al K10+000)	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
4/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0143	Aclaración reconocimiento de costos derivados de los Trámites Ambientales Contrato de Obra 779 de 2022	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
4/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0145	Aprobación Volumen IV. estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención Tramo 2 (km 3 – km 10) v_1 - contrato de obra no. 779 de 2022.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
4/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0146	Respuesta oficio CCV-INT-530-779-2023 cuyo asunto es: "Respuesta oficio CCP-OP-1060-2022-0132 CRONOGRAMA Y PROGRAMACION DE OBRA FASE DE CONSTRUCCION".	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
4/07/2024	CO-779-CAD-27-ORINOQUIA-2024	Respuesta a Oficio CCV – CON – 521 – 779 – 2023	INFRAVIAL	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
5/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0153	Respuesta a oficio CCV-INT-528-779-2023. Aprobación Sitios Donación de Material Sobrante.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
5/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0152	Aprobación Volumen V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes – Tramo 2 (k03+150 - k09+450) v 1	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
5/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0158	Solicitud informe mensual de calidad Contrato de Obra 779 de 2022	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
5/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0156	Convocatoria a comité técnico de obra semanal: jueves 11 de julio 2024.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

32437

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO Nº	779 DE 2022	PROYECTO Nº	2022005500031

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
9/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0157	Realizar actividades de limpieza y lavado de material disperso sobre la superficie del corredor vial en los frentes de obra.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0167	Respuesta oficio CCV-INT-549-779-2023. Aprobación Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería - Tramo II del K3+000 - K10+000 Contrato de Obra 799 de 2022.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0168	Respuesta al oficio CCV-INT-541-779-2023. Esquema de señalización completo para los frentes de obra.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0170	Reiteración oficio CCP-OP-1060-2022-0157 de limpieza y lavado de material regado por el corredor vial en el PR0+000.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0171	Respuesta a oficio CCV-INT-538-779-2023. Alternativa de procedimiento para empradización de taludes.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
16/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0169	Documentación de los operadores y vehículos de obra.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
16/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0172	Alcance oficio CCP-OP-1060-2022-0158 - Solicitud informe mensual de calidad Contrato de Obra 779 de 2022	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
18/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0175	Remisión observaciones informe mensual junio 2024 - respuesta CCV-INT-537-779-2023	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
19/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0176	Reiteración comunicado CCP-OC-1060-2022-0106 – solicitud de carteras de diseño geométrico tramo 1	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
19/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0148	Aprobación informe mensual ambiental abril 2024 – rta comunicación CCV-INT-511-779-2023	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
24/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0181	Intervención de áreas no liberadas PR 0+380 – P 0+390 – Tramo 1. – Respuesta a comunicado CCV-INT1557-779-2023 cuyo asunto corresponde a Modificación Diseño Geométrico en Perfil desde el K0+070 - K00+940. Tramo 1	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
24/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0173	Respuesta a oficio CCV-INT-519-779-2023 Asunto: Remisión oficio CO-779-CAD-ORINOQUIA-2024	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		cuyo asunto corresponde a Respuesta a oficio de Interventoría No CCP-OP-1060 2022-099 Subsanación Observaciones VOLUMEN XI PREDIAL Tramo 2, de fecha 21 de junio de 2024; Aprobación del Volumen XI Predial Tramo 2.		
25/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0185	Llamado de atención por incumplimiento del contrato de obra a la no entrega de las planillas de seguridad social y parafiscales correspondientes a los especialistas contractuales de obra del periodo de marzo, abril, mayo y junio de 2024 respectivamente.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
26/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0179	Solicitud de verificación de los predios la Caracola y Asociación ACUME, y ampliación de área del predio Finca la Gran Vía para zona de donación.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
27/07/2024	CCV-INT-571-779-2023	Respuesta a oficio CCP-OP-1060-2022-0137, que tiene como asunto "documentación de personal operativo y previamente contratado de obra"	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
31/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0198	Respuesta a las comunicaciones CCV-Int-560-779-2023 Y CCV-Int-560-779-2023– Remisión Hoja De Vida para Aprobación – Inspector SISO Aprobado.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
31/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0197	Respuesta a oficio CCV-INT-553-779-2023 - Alternativa de procedimiento para empradización de taludes	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
31/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0196	Respuesta a oficio CCV-INT-500-779-2023 – Observaciones Precios Unitarios No Previstos.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
1/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0199	Respuesta a oficio CCV-INT-552-779-2023. Documentación de personal de ingreso de la fecha del dieciocho (18) de julio del 2024.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
1/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0202	Respuesta a oficio CCV-INT-561-779-2023. Documentación de personal de ingreso de la fecha del veintitrés (23) de julio del 2024.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
1/08/2024	0001	Solicitud ampliación de la donación de material de excavación	Daniel Felipe Quiroga Ávila	Consorcio Vial Conexión Orinoquía

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

33437

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
1/08/2024	0002	Solicitud donación de material de excavación	Leidy Johanna Penagos López	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
2/08/2024	CORREO ELECTRÓNICO	Invitación actualizada: comité técnico virtual - CTO obra 779 DE 2022 vie 2 de ago de 2024 2pm - 4pm	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
1/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0200	Respuesta al comunicado CCV-INT-554-779-2023. Actividades de limpieza y lavado de material regado por el corredor vial.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
2/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0180	Aprobación informes mensuales técnico y social mayo 2024 – rta comunicación CCV-INT-551-779-2023.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
2/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0206	Convocatoria a comité técnico de obra semanal: viernes 02 de agosto 2024.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
2/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0201	Respuesta al oficio CCV-INT-559-779-2023. Documentación de los operadores y vehículos de obra.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
2/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0207	Respuesta a oficio CCV-INT-571-779-2023. Observaciones a la documentación de personal operativo y previamente contratado de obra.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
2/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0208	Respuesta oficio CCV-INT-574-779-2023 - Resolución 726 de 2024 CORMACARENA por la cual se otorga los permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal único.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
6/08/2024	0003	Invitación a la feria empresarial de los estudiantes del diplomado en turismo rural sostenible, un espacio de encuentro y comercialización.	FUNDACIÓN PANACA	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
8/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0212	Solicitud de concepto especialista Pavimentos – Estructura de pavimentos.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
9/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0177	Solicitud de ajuste a diseño de Zanjas de Coronación.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
9/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0213	Convocatoria a comité técnico de obra semanal: viernes 09 de agosto 2024.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
13/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0215	Respuesta a comunicado CCV-INT-577-779-2023 radicación informe diseño geométrico tramo 1 con asunto Subsanación Modificación Diseño Geométrico	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

324/32

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		en Perfil desde el K0+070 - K0+940. Tramo 1 V2.		
13/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0214	Liberaciones en campo y control de topografía.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0216	Respuesta a oficio CCV-INT-572-779-2023. Entrega de documentación de personal de ingreso y equipo.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0217	Respuesta a oficio CCV-INT-578-779-2023. Entrega de documentación de personal de ingreso y equipo.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0218	Respuesta a oficio CCV-INT-580-779-2023. Documentación de personal de ingreso.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0219	Respuesta a oficio CCV-INT-583-779-2023. Documentación de personal de ingreso.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0220	Respuesta a oficio CCV-INT-590-779-2023. Documentación de personal de ingreso.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0222	Respuesta al oficio CCV-INT-581-779-2023. Documentación de los operadores y vehículos de obra.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
15/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0221	Concepto revisión Box Coulvert 2.0X2.0, 3.0X3.0, 1.0X1.0.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
16/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0223	Convocatoria a comité técnico de obra semanal: martes 20 de agosto 2024.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
21/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0231	Respuesta a oficio CCV-INT-595-779-2023. Entrega de documentación de personal de ingreso y equipo.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
22/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0232	Aprobación informe mensual SST correspondiente al mes de marzo de 2024– rta comunicación CCV-INT-592-779-2023	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
22/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0233	Aprobación informe mensual SST correspondiente al mes de abril de 2024– rta comunicación oficio CCV-INT-593-779-2023	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
22/08/2024	0004	Manifestación mal uso caseta asociación MACAU	Yenny Paola Pérez	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
23/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0236	Convocatoria a comité técnico de obra semanal: viernes 23 de agosto 2024.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
26/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0234	Aprobación informe mensual SST y ambiental correspondiente al	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

334

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		mes de mayo de 2024– RTA comunicación oficio CCV-INT-597-779-2023.		
27/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0237	Documentación de los operadores y vehículos de ingreso.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
27/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0242	Convocatoria a Comité de Seguimiento Mensual Contrato de obra No. 779 de 2022: jueves 29 de agosto 2024 en las instalaciones AIM – Villavicencio y recorrido de obra viernes 30 de agosto 2024.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
27/08/2024	0005	Solicitud	Lilia Sarmiento	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
28/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0250	Observaciones a segunda versión de informe mensual correspondiente al mes de junio de 2024- respuesta a comunicaciones CCV-INT-584-779-2023 (componentes técnico y social), CCV-INT-598-779-2023 (componente SST), CCV-INT-588-779-2023 (componente ambiental)	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
28/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0252	Respuesta a oficio CCV-INT-610-779-2023. Entrega de documentación de personal de ingreso.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
28/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0243	Respuesta a oficio CCV-INT-608-779-2023. Entrega de documentación de personal de ingreso de la empresa Construcciones Bejarano S.A.S.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
28/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0244	Respuesta a comunicado CCV-INT-609-779-2023. Concepto revisión box culvert - Aprobación Parcial.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
30/08/2024	CCP-OC-1060-2022-0238	Respuesta a oficio CCV-INT-596-779-2023. Documentación de personal de ingreso del periodo de agosto del 2024.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
30/08/2024	CCP-OP-1060-2022-0241	Respuesta a oficio CCV-INT-607-779-2023. Entrega de documentación de personal de ingreso y equipo.	Consorcio Conexión Pacífico	Consorcio Vial Conexión Orinoquía
31/08/2024	0006	Solicitud de donación de material vegetal o madera para aprovechamiento en la asociación de paneleros ASOAVILES	Jaime Avilés Herrera	Consorcio Vial Conexión Orinoquía

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

CORRESPONDENCIA ENVIADA

- **Periodo del 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2024**

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
2/07/2024	CCV-INT-534-779-2023	Remisión oficio CO-779-CAD-24-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a Observaciones componente de Pavimentos Tramo No. 2	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
4/07/2024	CCV-INT-537-779-2023	Radicación informe mensual junio	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
4/07/2024	CCV-INT-538-779-2023	Alternativa de procedimiento para empradización de taludes	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
9/07/2024	CCV-IN+541.779-2023	Respuesta oficio CCP-OP-1060-2022-0122, que tiene como asunto "Respuesta a oficio CCV-INT-502-779-2023. Solicitud de esquema de sefializaci6n vial complete para cada frente de obra del proyecto".	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
10/07/2024	CCV-INT-545-779-2023	Remisión oficio CO-779-CAD-28-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a observaciones zona de nivelación	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
11/07/2024	CCV-AIM-542-779-2023	Reiteración sobre la aclaración sobre el pago de servicios de evaluaci6n y seguimiento a permisos ambientales.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Agencia Para La Infraestructura Del Meta
12/07/2024	CCV-INT-549-779.2023	Remisi6n oficio CO-779-CAD-29-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a Observaciones componente de Geología Tramo No.2 el Informe de interventoría Geología Tramo 2 K3+000 - K10+000.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
12/07/2024	CCV-INT-548-779.2023	Alcance oficio CCV-INT-500-779-2023 - precios unitarios no previstos	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
15/07/2024	CCV-INT-547-779-2023	Ensayo factor de expansión material de excavación	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
17/07/2024	CCV-INT-551-779.2023	Respuesta a comunicación CCP-OP-1060-2022-0128 - remisión observaciones informe mensual mayo 2024	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
18/07/2024	CCV-INT-552-779.2023	Entrega documentación ingreso de personal y equipo	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
18/07/2024	CCV-INT-553-779.2023	Respuesta a oficio CCP-OP-1060-2022-0171 - alternativa de procedimiento para empradización de taludes	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico

324(41)

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
19/07/2024	CCV-INT-535-779.2023	Respuesta oficio CCP-OP-1060-2022-0146 – cronograma y programación de obra fase de construcción.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
19/07/2024	CCV-INT-556-779.2023	Presupuesto plan de manejo de tránsito (PMT)	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
19/07/2024	CCV-MIN-550-779-2023	: Determinación de procedencia o no procedencia de consulta previa para el proyecto 779 del 2022.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
22/07/2024	CCV-INT-555-779-2023	Respuesta comunicación CCP-OP-1060-2022-0106 - Solicitud cartera de diseño tramo 1.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
22/07/2024	CCV-INT-557-779-2023	Remisión oficio CO-779-CAD-30-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a Modificación Diseño Geométrico en Perfil desde el K0+070 - K00+940. Tramo 1	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
23/07/2024	CCV-INT-559-779-2023	Respuesta al oficio CCP-OP-1060-2022-0169 que tiene como asunto, "documentación de los operadores y vehículos de obra."	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
23/07/2024	CCV-INT-561-779-2023	Entrega documentación ingreso de personal	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
24/07/2024	CCV-INT-562-779-2023	Alcance a comunicación CCV-INT-562-779-2023 - respuesta comunicación CCP-OP-1060-2022-0106 - Solicitud cartera de diseño tramo 1.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
24/07/2024	CCV-INT-563-779-2023	PUNTOS DE MONITOREO	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
25/07/2024	CCV-CON-564-779-2023	Remisión de oficio con Observaciones Volumen VI Volumen VI -Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Tramo 2.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	INFRAVIAL
26/07/2024	CCV-INT-560-779-2023	Hoja de vida para aprobación	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
26/07/2024	CCV-INT-570-779-2023	Alcance a oficio CCV-INT-560-779-2023 hoja de vida para aprobación	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
26/07/2024	CCV-INT-569-779-2023	Entrega documentación vehículos y maquinaria	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
26/07/2024	CCP-OP-1060-2022-0174	Respuesta a oficio CCV-INT-520-779-2023 – Puntos de monitoreo de estabilidad en la zona del PR00+620 al PR00+680 – Tramo 1.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
30/07/2024	CCV-INT-573-779-2023	Respuesta a comunicación CCP-OP-1060-2022-0174 - Respuesta a oficio CCV-INT-520-779-2023 – Puntos de monitoreo de estabilidad	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		en la zona del PR00+620 al PR00+680 – Tramo 1.		
30/07/2024	CCV-INT-572-779-2023	Entrega documentación ingreso de personal y equipo	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
1/08/2024	CCV-INT-574-779-2023	Notificación y entrega de Resolución No. PS-GJ.1.2,6.24 0726 EXP. No. 3.37.3.024.007 por la cual se otorga los permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal único	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
2/08/2024	CCV-INT-575-779-2023	Respuesta a oficio CCP-OP-1060-2022-0179, Solicitud de verificación de los predios la Caracola y Asociación ACUME, y ampliación de área del predio Finca la Gran Vía para zona de donación.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
5/08/2024	CCV-INT-576-779-2023	Puntos de monitoreo	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
5/08/2024	CCV-INT-578-779-2023	Entrega documentación ingreso de personal y equipo	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
6/08/2024	COV-INT-579-779-2023	Remisión oficio CO-779-CAD-32-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a respuesta a observaciones según oficio de interventoría No COP-OP-1060-2022-0184, Volumen de Pavimento Tramo 2	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
6/08/2024	CCV-INT-577-779-2023	Remisión oficio CO-779-CAD-31-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a Subsanación Modificación Diseño Geométrico en Perfil desde el KO+070 -K00+940. Tramo 1 V2	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
8/08/2024	CCV-INT-580-779-2023	En respuesta oficio CCP-OP-1060-2022-0202 "Documentación de personal de ingreso"	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
9/08/2024	CCV-INT-584-779-2023	Respuesta oficio CCP-OP-1060-2022-0175 - remisión de observaciones informe mensual de junio 2024 - respuesta CCV-INT-537-779-2023	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
9/08/2024	CCV-INT-583-779-2023	En respuesta oficio CCP-OP-1060-2022-0202 "Documentaci6n de personal de ingreso"	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
9/08/2024	CCV-INT-581-779-2023	En alcance al oficio CCV-INT-559-779 "Documentaci6n de los operadores y vehículos de obra"	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
9/08/2024	CCV-INT-582-779-2023	Respuesta a comunicación CCP-OC-1060-2022-0196 - APUs NP.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico

8948

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
9/08/2024	CCV-INT-585-779-2023	Radicación informe mensual julio.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
12/08/2024	CCV-INT-587-779-2023	Respuesta a oficio CCP-OP-1060-2022-0128 -Ajuste informe mayo 2024, componente ambiental.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
12/08/2024	CCV-INT-588-779-2023	Respuesta a oficio CCP-OP-1060-2022-0175 -Ajuste informe junio 2024, componente ambiental.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
12/08/2024	CCV-INT-590-779-2023	Documentaci6n de personal de ingreso	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
12/08/2024	CCV-INT-589-779-2023	Remisión de oficio radicado a CORMACARENA, recurso de reposición Art, 74 del CPACA - Al permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal único artículos 14 y 15 de la resolución No. PS-GJ.1.2.6.24 0726 del 31 de julio de 2024. Expediente No. 3.37.3,024.007	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
13/08/2024	CCV-INT-591-779-2023	Respuesta a comunicación CCP-OP-1060-2022-0181 - modificación de diseño geométrico K0+070 a K0+940.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
13/08/2024	CCV-INT-592-779-2023	Respuesta a oficio COP-OC-1060-2022-025, Remisión informe componente SST mes de marzo Versión 2 para revisión y aprobación	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
15/08/2024	CCV-INT-595-779-2023	Entrega documentación ingreso de personal y equipo	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
16/08/2024	CCV-INT-593-779-2023	Respuesta a Oficio CCP-OP-1060-2022-065, Remisión informe componente SST mes de abril Versión 2 para revisión y aprobación	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
16/08/2024	CCV-INT-596-779-2023	Entrega documentación ingreso de personal	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
17/08/2024	CCV-INT-597-779-2023	Respuesta a oficio CCP-OP-1060-2022-0128, Remisión informe componente SST mes de mayo Versión 2 para revisión y aprobación	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
17/08/2024	CCV-INT-598-779-2023	Respuesta a oficio CCP-OP-1060-2022-0175, Remisión informe componente SST mes de junio Versión 2 para revisión y aprobación	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
20/08/2024	CCV-INT-600-779-2023	Remisión oficio CO-779-CAD-33-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		corresponde a Respuesta a Solicitud de Ajuste a Diseño de Zanjas de Coronación según oficio de interventoría No CCP-OP-1060-2022-0177.		
20/08/2024	CCV-INT-601-779-2023	Remisión oficio CO-779-CAD-34-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a Subsanaciones Hidráulica e Hidrológica Terreno de Renivelación	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
20/08/2024	CCV-INT-599-779-2023	Certificados altura personal	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
20/08/2024	CCV-INT-603-779-2023	Puntos de monitoreo.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
21/08/2024	CCV-INT-604-779-2023	Remisión oficio CO-779-CAD-35-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a Segunda respuesta a observaciones según oficio de interventoría No CCP-OP-1060-2022-0184, Volumen de Pavimento Tramo 2	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
21/08/2024	CCV-INT-602-779-2023	Respuesta a comunicación CCP-OP-1060-2022-0214 - liberaciones en campo y control de topografía	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
22/08/2024	CCV-INT-605-779-2023	Remisión de oficio radicado a CORMACARENA, que tiene como asunto: "Atención y respuesta a los artículos 7,10,11 y 17 de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.24.0726 del 31 de julio de 2024 -EXPEDIENTE 3.37.3.024,007, para remisión a CORMACARENA"	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
22/08/2024	CCV-AIM-594-779-2023	Solicitud de remisión a CORMACARENA el presente oficio. - Resolución No. PS-GJ.1.2.6,24.0726 del 31 de julio de 2024 -EXPEDIENTE 3.37,3,024,007, solicitud mesa técnica	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
23/08/2024	CCV-INT-607-779-2023	Documentos vehículos	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
26/08/2024	CCV-INT-609-779-2023	Remisi6n Oficio CO-779-CAD-36-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a Concepto Estructural Observaciones Box Coulverts sección 1,0 x 1.0 in	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
26/08/2024	CCV-INT-610-779-2023	Documentos vehículos	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
27/08/2024	CCV-INT-611-779-2023	Trámites permisos ambientales para inicio trabajos relacionados	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
27/08/2024	CCV-INT-612-779-2023	Informes mensuales aprobados enero, febrero y marzo 2024	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
26/08/2024	CCV-INT-608-779-2023	Documentos vehículos	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
28/08/2024	CCV-INT-608-779-2023	Documentos vehículos	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
28/08/2024	CCV-INT-608-779-2023	Informes mensuales aprobados abril, mayo 2024	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
29/08/2024	CCV-INT-617-779-2023	Remisión oficio CO-779-CAD-37-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a Subsanaciones Volumen de Pavimento Tramo 2	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
29/08/2024	CCV-INT-614-779-2023	Respuesta a oficio CCP-OP-1060-2022-0175, Remisión informe componente SST mes de junio Versión 3 para revisión y aprobación	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
29/08/2024	CCV-INT-615-779-2023	Respuesta oficio CCP-OP-1060-2022-0252	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
29/08/2024	CCV-INT-616-779-2023	Respuesta oficio CCP-OP-1060-2022-0243	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
30/08/2024	CCV-INT-621-779-2023	Caracterización material granular drenante para filtro.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
30/08/2024	CCV-AIM-619-779-2023	Solicitud de remisión a CORMACARENA el presente oficio. - Resolución No. PS-GJ.1.2.6.24.0726 del 31 de julio de 2024 – EXPEDIENTE 3.37.3.024.007, Notificación inicio de actividades de aprovechamiento forestal	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
31/08/2024	CCV-INT-620-779-2023	Informes mensuales aprobados junio 2024.	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico
31/08/2024	CCV-INT-622-779-2023	Remisión oficio CO-779-CAD-38-ORINOQUIA-2024 cuyo asunto corresponde a Subsanaciones Estudio Hidráulico e Hidrológico Tramo 2	Consorcio Vial Conexión Orinoquía	Consorcio Conexión Pacífico

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2446

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

- **Constantes lluvias**

Se presentan fuertes precipitaciones que generan deterioro en la vía existente, adicionalmente se genera disminución en los rendimientos debido a las constantes detenciones de actividades.
Se realizan cajeos con material mixto de río sin procesar en los lugares donde se requiera.

- **Sedimentación de las cunetas**

Se realiza mantenimiento a las cunetas existentes, con el fin de direccionar el agua a las obras hidráulicas presentes en el corredor.

- **Falta de aprobación de permisos ambientales**

Debido a los tiempos que se tomó Cormacarena para la aprobación y la implementación de los permisos ambientales no se ha podido ejecutar actividades que a la fecha ya se podrían ejecutar.

4. ESTADO DEL TIEMPO
Frecuencia.

Periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	23
TORMENTA	4
LLUVIOSO	2
SOLEADO	1

Periodo del 1/08/2024 al 31/08/2024

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	6
TORMENTA	5
LLUVIOSO	5
SOLEADO	15

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

Levantamiento topográfico

- Se realiza inspección del sitio de trabajo, con el fin de identificar algún tipo de riesgo biológico (serpiente, avispa, abeja, etc.,).
- Se arma el equipo (estación, RTK o nivel) en un punto determinado.
- Se realiza la toma de línea (amarre) del punto de referencia.
- Se inicia con las labores de toma de puntos dependiendo la necesidad del levantamiento (puntos, replanteo, secciones, etc.).
- Para la toma de puntos se cuenta con el apoyo de un cadenero y un ayudante.

Excavación en roca de la explanación y canales

- Luego de la localización y replanteo realizado por la comisión topográfica se procede a iniciar la excavación.
- Se realiza adecuación de área de trabajo, se realiza delimitación del acceso a terceros.
- Se ubica la maquinaria (martillo compresor) en forma tal que el operador pueda ejecutar su labor de la forma más segura.
- Cargue y disposición de material de excavación sobrante que no será utilizado como relleno.

Excavación en material común de la explanación y canales

- Luego de la localización y replanteo realizado por la comisión topográfica se procede a iniciar la excavación.
- Se realiza adecuación de área de trabajo, se realiza delimitación del acceso a terceros.
- Se ubica la maquinaria (excavadora) en forma tal que quede a mayor altura que las volquetas, con el fin de realizar el cargue de material.
- Verificar cotas finales de excavación, revisión de niveles.
- Comienza el desprendimiento de material, debe ejecutarse de forma controlada para garantizar la seguridad de todo el personal involucrado.

Transporte disposición final de escombros y sobrantes

El material sobrante producido hasta el momento proviene de la excavación, por lo cual se transporta al predio el Paraíso, el cual es la zona de nivelación, por medio de volquetas

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

previamente cargadas con la excavadora, y una vez descargan el material se dispersa y se compacta.

Terraplenes con material mixto de rio sin procesar t máx. 3" (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)

- Se realiza descapote, limpieza y excavación de cajas.
- Se coloca y compacta una capa que separe el terraplén artificial del terreno natural, en caso de ser necesario.
- Se realiza la extensión y compactación del material granular transportado por las volquetas.

Empradización tramo de prueba K0+135 al K0+190 costado derecho

- Liberado por interventoría y localizado el tramo de prueba se procede a utilizar la técnica de semilla y estolón.
- Se realizan agujeros de aproximadamente 7cm de radio con inclinación de 30 grados en el perfil del suelo cada 30 centímetros y se utiliza un método de siembra llamado tres bolillos. Se utilizan 70 gramos de materia orgánica y 5 semillas de pasto dictyoneura, humidicola y decumbens por hueco.
- Para los protocolos de manejo se establece:
  - ✓ Riego con agua en una dosis de un litro por metro cuadrado semanalmente.
  - ✓ Fertirriego compuesto por agua y fertilizante soluble, con una dosis de 1 kilo o litro por cada 200 litros de agua con una frecuencia semanal.
  - ✓ Enmienda con cal líquida con una dosis de 10 litros por cada 10000 metros cuadrados aplicándolo únicamente al inicio de la siembra.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

En el laboratorio NHSQ INGENIERÍA S.A.S, se realizaron pruebas con el objetivo de evaluar la calidad de los materiales procedentes del río Duda en comparación con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituta Nacional de Vías – INVIAS. El propósito de la realización de los ensayos es verificar si cumplen con los requisitos mínimos especificados para su aplicación en la construcción de la capa de relleno.

- **Periodo del 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2024**

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Densidades en el terreno – corrección por fracción gruesa	31/07/2024	INV E-161 - INV E-143
Densidades en el terreno – corrección por fracción gruesa	13/08/2024 22/08/2024 31/08/2024	INV E-161 - INV E-143
Análisis granulométrico de suelo por tamizado	29/08/2024	INV-E 123-13

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3249

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la degradación de los agregados gruesos de tamaños mayores a 19mm (3/4' por abrasión e impacto en la máquina de los ángeles (500 revoluciones)	29/08/2024	INV-E 219-13
Sanidad de os agregados frente a la acción de las soluciones (magnesio)	29/08/2024	INV-E 220-13
Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados	29/08/2024	INV-E 211-13
Cantidad de partículas livianas en los agregados pétreos	29/08/2024	INV-E 221-13
Contenido de materia orgánica por ignición	29/08/2024	INV-E 121-13
Cantidad de partículas livianas en los agregados pétreos	29/08/2024	INV-E 221-13

2.1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

En seguimiento a él plan de calidad se desarrollan los siguientes indicadores: Estos indicadores están en proceso de implementación en nuestro proyecto.

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA		META	FRECUENCIA	RESPONSABLE	DOCUMENTO SOPORTE
GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES	Cumplir con las condiciones y Especificaciones del Cliente	Cumplimiento del Programa de Inversiones	% Obra Ejecutada / % Obra Programada	x 100	Superior al 90%	Mensual	Director Obra	Se verifica en el presente informe
		Cumplimiento del PAGA	No. de obligaciones cumplidas / No. de obligaciones exigidas	x 100	100%	Mensual	Ingeniero Ambiental Ingeniero Residente	Informe ambiental
		Cumplimiento del Plazo	Plazo de ejecución contractual del proyecto / Plazo de ejecución real del proyecto	x 100	Superior al 95%	Al finalizar el proyecto	Director Obra	Acta de Recibo de Obra
	Garantizar la calidad de los materiales empleando Proveedores calificados	Nivel de Cumplimiento de los Proveedores	No. de Proveedores y Subcontratistas en el rango ACEPTABLE de Calificación / No. de Proveedores y Subcontratistas Calificados	x 100	Superior al 90%	Semestral	Auxiliar Compras	Formatos FOR-CP-01, FOR-CP-03, FOR-CP-04 Calificación Desempeño de Proveedores

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

PROGRAMA DE AUDITORIAS

CÓDIGO	FOR-GI-69
REVISIÓN	7
FECHA	20/10/2015
PAGINA	1 DE 1

OBJETIVO	Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado - REQUISITOS DE LOS LEGALES CLIENTES - REQUISITOS DEL PESV
ALCANCE	Todo el proyecto
DOCUMENTO	Los documentos del Sistema de Gestión Integrado, las normas NTC ISO 9001, 14001, 45001, LA GUÍA RUC, DECRETO 1072, RSOLUCION 0312, RESOLUCIÒN 5178 DE 2023 (PESV), RESOLUCIÓN 40595 DE 2022 (PESV) y los demás requisitos reglamentarios legales aplicables de nuestros clientes.

No. AUDITORIA	PROCESO, AREA, ACTIVIDAD / O TAREA	AUDITOR(ES)	RECURSOS	OBJETIVO AUDITORIA	ANÁLISIS DE RIESGOS	ALCANCE AUDITORIA	PROGRAMA	AÑO: 2024 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	AUDITORIA INTERNA Todos los Procesos SGI - (SST-AMBIENTAL-CALIDAD)	Externo	Económicos, Humanos y Software	Verificar la implementación del SGI, bajo las directrices de los requisitos legales aplicables, las Normas ISO 9001, 14001, 45001, RUC, DECRETO 1072, RES 0312	Caidas del Sistema, No contar con la información a tiempo	A todos los Procesos de Meyan S.A	P				P								
							E												
2	PRE AUDITORIA DEL RUC	Consejo Colombiano Seguridad		Verificar el cumplimiento e implementación del SST y Ambiente de la Guia RUC			P						P						
							E												
3	AUDITORIA SGI (NORMAS NTC - ISO 9001 - 14001 - 45001)	BVQI		Verificar la implementación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en las Normas ISO 9001, 14001 y 45001	Riesgo Público Fallas en el Sistema Riesgo Aéreo Transporte Información a destiempo		P			P									P
							E												
4	PESV Resolución 5178 de 2023 - Resolución 40595 de 2022)	EXTERNO		Verificar el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables Ley 2050 de 2020, Ley 1503 de 2011, Resolución 7495 de 2030, Decreto 2106 de 20019, Ley 1972 de 2019			P											P	
							E												
6	AUDITORIA A LA OBRA	PROPIO		Requisitos de calidad			P			P							E		P
							E												

REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:	0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	0

3345

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- **Periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024**

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
	Charlas diarias preoperacionales	Se realiza charla todas las mañanas antes del inicio de jornada
17/07/2024 19/07/2024 23/07/2024 26/07/2024 29/07/2024	Inducción	Se realiza inducción al personal de nuevo ingreso
	Mantenimiento de la señalización	Cada semana
31/07/2024	Inspecciones	- Instalaciones - Maquinaria y equipo - EPI - Botiquines - Extintores - Herramientas - Vehículos - Kit ambiental
	Entrega de EPP	- Se realiza la entrega cuando el personal lo requiera.
	Aseguramientos de áreas de trabajo	- Semanal o cada vez que se realiza cambio de actividades
	Diligenciamiento del permiso de trabajo AST y socialización	- Semanalmente o cuando se realizan cambios de actividad
	Inspecciones de área de trabajo	- Diariamente
	Reporte de actos y condiciones inseguras	- Cada vez que se presenten
05/07/2024	Reglamento Higiene y seguridad industrial	- Mensualmente

- **Periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024**

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
FOR-RH-30 Cronograma De Capacitación, Campañas, Talleres Y Charlas, 01 Al 31 agosto	Charlas diarias preoperacionales	Se realiza charla todas las mañanas antes del inicio de jornada
04,06,14,15,21,22,26,28,31 de agosto	Inducción	Se realiza inducción al personal sub-contratista y personal nuevo del consorcio, en total se realizaron 25 inducciones
	Mantenimiento de la señalización	Cada semana
08,17,21,26 de agosto - FOR-GI-85	Inspecciones	- Instalaciones - Maquinaria y equipo

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS AGOSTO		- EPI - Botiquines - Extintores - Herramientas - Vehículos - Kit ambiental
FOR-GI-50 Registro De Entrega Y Reposición De Elementos De Protección Individual – 01 AL 31 de agosto	Entrega de EPP	- Se realiza la entrega cuando el personal lo requiera.
01 AL 31 de agosto	Aseguramientos de áreas de trabajo	- Semanal o cada vez que se realiza cambio de actividades
01 AL 31 de agosto	Diligenciamiento del permiso de trabajo AST y socialización	- Semanalmente o cuando re realizan cambios de actividad
08,17,21,26 de agosto - FOR-GI-85 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS AGOSTO	Inspecciones de área de trabajo	- Diariamente
05,16,20,26,29 de agosto	Reporte de actos y condiciones inseguras	- Se realizaron 5 reportes del cual se realizó seguimiento a cada uno de ellas

Anexo: Formato 112-ECP-FR-015-FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL

4. MANEJO AMBIENTAL

- **Periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024**

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Conformación del grupo de gestión ambiental y social.	Vinculación= (profesionales vinculados/equipo mínimo requerido) *100	Vinculados al Grupo de Gestión Ambiental la especialista ambiental, Residente Ambiental, profesional social y supervisor SST por parte del contratista. **De acuerdo con el pliego de condiciones y el anexo técnico 1, el cual hace parte integral del contrato, a la fecha se cumple con el personal mínimo requerido.**

32453

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	N° de obligaciones cumplidas durante el periodo/N° de obligaciones debe cumplir en el periodo	Durante el periodo se da respuesta al oficio CCP-OP-1060-2022-062 de interventoría. Pendiente por respuesta los oficios CCP-OP-1060-2022-0128, CCP-OP-1060-2022-0143, CCP-OP-1060-2022-0154, CCP-OP-1060-2022-0171.
	N° de informes requeridos/ N° de informes con soportes presentados	Se hace entrega a interventoría el informe No 13 componente ambiental, para revisión y aprobación/ Se entrega soporte de la gestión realizada durante el periodo. Se atienden observaciones de los informes 11 y 12, correspondientes a los meses de mayo y junio.
	No. de inspecciones programadas con interventoría/visitas realizadas en compañía de interventoría	Durante el periodo no se realizó visita o inspección a obra, en conjunto con interventoría.
Capacitación y concienciación del personal de obra	N° de personas ingresadas/N° personas con inducción	Durante el periodo, se realiza la vinculación de doce (12) personas, contando cada una de ellas con inducción en los diferentes componentes (Ambiental, social y SST). Ver Anexo No. 2 – Registro de inducción.
	No. de capacitaciones programadas/ No. de capacitaciones realizadas	Durante el periodo no se realiza capacitaciones.
	No. de charlas ejecutadas/ No. de charlas programadas	Durante el periodo se dio cumplimiento al cronograma, dictando en total tres (3) charlas del componente ambiental. (Ver Anexo 3)
	N° de personas vinculadas/N° de personas capacitadas	Durante el periodo reportado se cuenta con la vinculación de sesenta (60) personas entre mano de obra calificada y no calificada de las cuales todas son asistentes a charlas y demás actividades que se programen.
Cumplimiento requerimientos legales	No. de permisos obtenidos / No. de permisos requeridos	A la fecha de corte del presente informe no hay actualización del estado de los permisos ambientales.
	N° de obligaciones cumplidas de acuerdo con los permisos/N° de obligaciones que debe cumplir en el periodo respecto a los permisos.	De acuerdo con el permiso otorgado en el permiso para nivelación del terreno en predio el Paraíso se cuentan con las siguientes obligaciones: 1. No intervenir árbol alguno, ni que llegue afectar algún individuo arbóreo como consecuencia de la actividad relleno. 2. Compactar el relleno a fin de que, por causa de la lluvia, se desplace este diluido en agua.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

334 54

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
		3. Una vez terminada la labor de relleno, sembrar al menos 10 árboles dispersos en el terreno intervenido. 4. Respetar las áreas forestales protectoras (fuentes de agua, nacimientos, terrenos con pendientes superiores a 45°). 5. Conservar zonas de reservas de la sociedad civil. 6. Conservar zonas de humedales. 7. Conservar zonas para recarga de acuíferos. 8. Conservar zonas para la conservación de suelos, la cobertura vegetal y el recurso hídrico. 9. Preservar zona de ronda hídrica. 10. Contar con el programa de manejo ambiental RCD, de acuerdo con el artículo 12, 13 y 14 de la Res. 0472 del 2017 (Radicar ante la secretaria de planeación y ambiente municipal)
Manejo integral de materiales de construcción	Volumen de material de fuentes autorizadas/volumen total de materiales usados	Durante el periodo Triturados San José SAS, suministro 1.788 m3 de material de crudo de rio. Adicional se suministra 1.122 m3 de crudo seleccionado de 4". La empresa cuenta con los permisos ambientales requeridos para explotación y comercialización de materiales fluviales.
	Cantidad de acopios temporales autorizados/cantidad de acopios en frente de obra	Se cuenta con acopio aprobado en campamento la lagartija ubicada en el Km 2+850
	Mezcla de concreto en zona aislada/mezclas realizadas en el periodo	Durante el periodo no se realizaron actividades con mezcla de concreto.
Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	No. de frentes de obra señalizados/número de frentes de obra	Durante el periodo se mantiene la señalización instalada y se realiza mantenimiento de esta continuamente
	Número de accidentes de tránsito en la vía	Durante el periodo no hubo reporte de accidentes del personal involucrado con la empresa, ni usuarios de la vía.
Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	Autorizaciones RCD tramitados en el periodo/autorizaciones RCD requeridos en el periodo	El predio La Floresta, cuenta con permiso voluntario y todo lo correspondiente para su uso. El acta de compromiso se relaciona de cómo se debe hacer entrega del predio una vez finalicen las actividades allí. Hay que mencionar que a petición del propietario se solicitó material de excavación para relleno y nivelación en el predio llamado la gran vía, ubicado Km0+000, el cual a la fecha se ha realizado donación de 6.127 m3.
Manejo integral de residuos	AE RESPEL= Generación RESPEL en periodo/empresas	***Empresas autorizadas***

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

324 55

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
sólidos convencionales y especiales.	autorizadas RESPEL en el periodo	- Ecobrent SAS - soluciones ecológicas globales SAS - Soluciones Integrales del Tillava SAS - Servicios ambientales del Meta SAS - ECOLCIN SAS
	PRRR= Personas que asisten a capacitación/total de personas x 100	Se realizan constantes charlas sobre manejo, separación y disposición final de residuos, de los cuales asisten las 52 personas vinculadas al proyecto.
	Volumen de residuos sólidos separados/volumen de residuos generados	Se realiza jornadas de aseo y limpieza en los diferentes frentes de obra y oficinas. Durante el periodo los residuos generados de las jornadas de limpieza en frentes de obra y oficina se transportaron y se dispusieron al relleno sanitario La Guaratara en el municipio de Granada. En total de acuerdo con el peso, se dispusieron 110 kg
Manejo de aguas superficiales	N° de permisos necesarios para el desarrollo del proyecto/N° de permisos obtenidos para el desarrollo del proyecto	La solicitud del permiso ocupación de cauce y concesión de aguas se encuentran en trámite. Al corte del presente informe no hay novedad o actualización de los permisos ambientales.
	No. de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas	Durante el periodo no se realizaron actividades representativas para el consumo en obra, sin embargo, se capacita al personal diariamente para no afectar fuentes de aguas superficiales.
Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	No de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas	De acuerdo con la Res. 2400 del 1979, se hace instalación de dos (2) unidades sanitarias portátiles y un (1) pozo séptico de 4000 L. Durante el periodo se generaron 4.210 litros de agua residual, estos corresponden a la limpieza y tratamiento de pozo séptico del área administrativa, los cuales la misma cantidad fue tratada por gestor autorizado Bamacol
Manejo del descapote y cobertura vegetal.	(No de actividades ejecutadas/No de actividades programas) *100	Con ayuda de una retroexcavadora se realizan cortes de descapote de máximo 30 cm de profundidad, garantizando no tener alteración y poder realizar actividades de recuperación y restauración al final. Esta actividad se realizó en el predio la gran vía donde actualmente se está disponiendo material de excavación.

32 456

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	(N° de árboles con permiso de tala/ No de árboles a talar) *100	Aun no se cuenta con permiso de aprovechamiento forestal, por tanto, no se ha hecho aprovechamiento de especies arbóreas.
	(Vol. De material proveniente del descapote/Vol. de material dispuesto o utilizado) *100	El volumen proveniente de descapote se encuentra acopiado a los laterales del predio el paraíso señalizado con el fin de preservarlo y restaurar el área al final o entrega del predio.
Recuperación de áreas afectadas	Empradización= (áreas empradizadas sobreviviente/áreas empradizadas realizada) * 100	Durante el periodo no se reportan actividades referentes al presente subprograma
	Restauración= (Áreas restauradas/áreas afectadas) *100	Durante el periodo no se reportan actividades referentes al presente subprograma
	Restauración= (áreas restauradas/áreas ocupadas) *100	Durante el periodo no se reportan actividades referentes al presente subprograma
Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	CSA = (Trabajadores que asisten a capacitación/Total de trabajadores) *100	Durante el periodo no se programa capacitación referente al tema de ecosistemas estratégicos o sensibles
	Área sensible= (área sensible delimitada/ área sensible identificada) *100	No hubo reporte durante el periodo
	Ecosistemas= (Ecosistemas afectados/ecosistemas identificados) *100	No hubo reporte durante el periodo
	CEE= (Área de ecosistemas estratégicos conectados /Áreas de ecosistemas estratégicos afectados) *100	No hubo reporte durante el periodo
Protocolos de fauna en obra	(Fadultos) = Fauna adulta liberada/ fauna adulta rescatado) *100	Durante el periodo no se presentó evento fortuito para activar el indicador
	(Polluelos) = (Polluelos juveniles liberados/ polluelos o juveniles rescatados) *100	Durante el periodo no se presentó evento fortuito para activar el indicador
	A Enfermos= (Animales entregados/Animales heridos rescatados) *100	Durante el periodo no se presentó evento fortuito para activar el indicador
Protección de la fauna en vías.	Atropellamientos de fauna al mes = Numero de atropellamientos registrados	Durante el periodo no se presentan estos eventos
	SAI= (Atropellamientos repetitivos en un	Durante el periodo no se presentan estos eventos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

R2457

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	sitio/atropellamientos totales en la vía) *100	
	BFI= (Área de barrera implementada en el sitio/Área priorizada para el paso de fauna) * 100	Durante el periodo no se presentan estos eventos
Compensación ambiental	PC = (Plan de compensación autorizado/ plan de compensación requerido)	No hay autorización para corte de árboles, por tanto, la presente ficha no se ha activado.
	Restauración = (Área restaurada/ área total compensación) *100	No hay autorización para corte de árboles, por tanto, la presente ficha no se ha activado.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	Resdomest= (Generación de residuo domestico e industrial/ empresas autorizadas recolección en el periodo) *100	Se construye caseta para acopio de residuos convencionales, RESPEL y líquidos. Se realiza instalación de señalización y demás actividades correspondientes al campamento y que fueron propuestas dentro del PAGA
	PuntosEco = Puntos ecológicos operativos/ puntos ecológicos instalados) *100	Se cuenta con tres (3) puntos ecológicos instalados.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	Mantenimientos = (No. de mantenimientos realizados/ No. de mantenimientos requeridos) *100	Los operadores de la maquinaria y equipo realizaron el diligenciamiento de listas de chequeo, previniendo a tiempo las fallas me canecas. De esta manera se previno eficazmente accidentes de trabajo, accidentes de tránsito y daños a la propiedad.
	Traslados = (No. de traslados cumplimiento de requisitos/ No. de traslados realizados) *100	Durante el periodo no se realizaron traslados

Periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Conformación del grupo de gestión ambiental y social.	Vinculación= (profesionales vinculados/equipo mínimo requerido) *100	Vinculados al Grupo de Gestión Ambiental la especialista ambiental, Residente Ambiental, profesional social y supervisor SST por parte del contratista. De acuerdo con el pliego de condiciones y el anexo técnico 1, el cual hace parte integral del contrato, a la fecha se cumple con el personal mínimo requerido.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	N° de obligaciones cumplidas durante el periodo/N° de obligaciones debe cumplir en el periodo	Durante el periodo se recibieron los siguientes oficios CCP-OP-1060-2022-0208, CCP-OP-1060-2022-0234, CCP-OP-1060-2022-0250.
	N° de informes requeridos/ N° de informes con soportes presentados	Se hace entrega a interventoría el informe No 14 componente ambiental, para revisión y aprobación/ Se entrega soporte de la gestión realizada durante el periodo. Se atienden observaciones de los informes 13, correspondiente al periodo de julio.
	No. de inspecciones programadas con interventoría/visitas realizadas en compañía de interventoría	Durante el periodo no se realizó visita o inspección a obra, en conjunto con interventoría.
Capacitación y concienciación del personal de obra	N° de personas ingresadas/N° personas con inducción	Durante el periodo, se realiza la vinculación de VEINTICINCO (25) personas, contando cada una de ellas con inducción en los diferentes componentes (Ambiental, social y SST).
	No. de capacitaciones programadas/ No. de capacitaciones realizadas	El día 08 de agosto de 2024, se realiza capacitación sobre monóxido de carbono. Se cuenta con registro de la capacitación y su respectivo informe.
	No. de charlas ejecutadas/ No. de charlas programadas	Durante el periodo se dio cumplimiento al cronograma, dictando en total dos (2) charlas del componente ambiental. (Ver Anexo 3)
	N° de personas vinculadas/N° de personas capacitadas	Durante el periodo reportado se cuenta con la vinculación de OCHENTA Y TRES (83) personas entre mano de obra calificada y no calificada de las cuales todas son asistentes a charlas y demás actividades que se programen.
Cumplimiento requerimientos legales	No. de permisos obtenidos / No. de permisos requeridos	APROVECHAMIENTO FORESTAL Y OCA - El día 31 de julio del 2024 se notificó la resolución no. PS-GJ.1.2.6.24 0726 por medio del cual CORMACARENA otorgan los permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal único y se dictan otras disposiciones. RCD- Se cuenta con permiso para almacenamiento, relleno y nivelación de terreno del predio el paraíso desde el 09 de mayo del 2024, por parte de planeación municipal.
	N° de obligaciones cumplidas de acuerdo con los permisos/N° de obligaciones que debe cumplir en el periodo respecto a los permisos.	RCD – No de obligaciones 10- cumplidas 10 APROVECHAMIENTO FORESTAL Y OCUPACIÓN DE CAUCE – 21 obligaciones de las cuales se han dado respuesta a 11

2459

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
		CONCESION DE AGUAS – 1 requerimiento, pendiente por respuesta
Manejo integral de materiales de construcción	Volumen de material de fuentes autorizadas/volumen total de materiales usados	Durante el periodo Triturados San José SAS, suministro 1.048 m3 de material de crudo de rio. Adicional se suministra 5.248 m3 de crudo seleccionado de 4", seleccionado 3" 28m3, seleccionado 2" 222m3. La empresa cuenta con los permisos ambientales requeridos para explotación y comercialización de materiales fluviales.
	Cantidad de acopios temporales autorizados/cantidad de acopios en frente de obra	Se cuenta con acopio aprobado en campamento la lagartija ubicada en el Km 2+850
	Mezcla de concreto en zona aislada/mezclas realizadas en el periodo	Durante el periodo no se realizaron actividades con mezcla de concreto.
Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	No. de frentes de obra señalizados/número de frentes de obra	Durante el periodo se mantiene la señalización instalada y se realiza mantenimiento de esta continuamente
	Número de accidentes de tránsito en la vía	Durante el periodo no hubo reporte de accidentes del personal involucrado con la empresa, ni usuarios de la vía.
Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	Autorizaciones RCD tramitados en el periodo/autorizaciones RCD requeridos en el periodo	El predio El paraíso, cuenta con permiso voluntario y todo lo correspondiente para su uso. El acta de compromiso se relaciona de cómo se debe hacer entrega del predio una vez finalicen las actividades allí. Acumulado se cuenta con 13.780 m3 dispuestos en el predio. La alcaldía municipal por medio de la secretaria de planeación autoriza al consorcio para realizar la donación de material a predios denominados La gran vía y asociación ASOCUME. Estos representantes se dirigen a planeación con el fin de solicitar esta donación para nivelación de terreno y siembra de pasto para pastoreo. A la fecha en el predio la gran vía se ha depositado 7497 m3 y en predio ASOCUME se han depositado 5580 m3.
Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.	AE RESPEL= Generación RESPEL en periodo/empresas autorizadas RESPEL en el periodo	La empresa FACIL SOLUCIONES AMBIENTALES, programa recolección de RESPEL, incluyendo aceites usados y demás residuos como bolsas de

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
		cemento, filtros, estopas contaminadas para su disposición final.
	PRRR= Personas que asisten a capacitación/total de personas x 100	Se realizan constantes charlas sobre manejo, separación y disposición final de residuos, de los cuales asisten las 83 personas vinculadas al proyecto.
	Volumen de residuos sólidos separados/volumen de residuos generados	Se realiza jornadas de aseo y limpieza en los diferentes frentes de obra y oficinas. Durante el periodo los residuos generados de las jornadas de limpieza en frentes de obra y oficina se transportaron y se dispusieron al relleno sanitario La Guaratara en el municipio de Granada.
Manejo de aguas superficiales	N° de permisos necesarios para el desarrollo del proyecto/N° de permisos obtenidos para el desarrollo del proyecto	Los permisos necesarios para la ejecución del proyecto son: - Ocupación de cauce - Aprovechamiento forestal - Concesión de aguas superficiales - Deposito y almacenamiento de residuos de construcción y demolición - RCD A la fecha de corte del presente informe se cuenta con el permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, a través de la Res. No. PS-GJ 1.2.6.24 0726 del 31 de julio del 2024 A espera de respuesta de la solicitud de concesión de aguas superficiales.
	No. de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas	Durante el periodo no se realizaron actividades que implique captación o uso de recurso hídrico, para el consumo en obra, sin embargo, se capacita al personal diariamente para no afectar fuentes de aguas superficiales.
Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	No de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas	De acuerdo con la Res. 2400 del 1979, se tiene instaladas hace tres (3) unidades sanitarias portátiles y un (1) pozo séptico de 4000 L. Durante el periodo se instaló una (1) USP adicional, de acuerdo al número de personal que se cuenta a la fecha. Durante el periodo se generaron 240 litros de agua residual, estos corresponden a la limpieza y tratamiento de unidades sanitarias portátiles ubicados sobre el corredor vial, los cuales la misma cantidad fue tratada por gestor autorizado Bamacol.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO Nº	779 DE 2022	PROYECTO Nº	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Manejo del descapote y cobertura vegetal.	(No de actividades ejecutadas/No de actividades programas) *100	Con ayuda de una retroexcavadora se realizan cortes de descapote de máximo 30 cm de profundidad, garantizando no tener alteración y poder realizar actividades de recuperación y restauración al final. Esta actividad se realizó en el predio la gran vía donde actualmente se está disponiendo material de excavación.
	(Nº de árboles con permiso de tala/ No de árboles a talar) *100	Se cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por medio de la Res. No. PS-GJ.1.2.6.24 0726 Exp. 3.37.3.024.007 del 31-07-2024. Se iniciará actividades de tala el día 16 de septiembre del 2024, de acuerdo a comunicación radicada a CORMACARENA, el día 29 de agosto de 2024 con No de radicado interno E-000020925 del 30 de agosto 2024
	(Vol. De material proveniente del descapote/Vol. de material dispuesto o utilizado) *100	El volumen proveniente de descapote se encuentra acopiado a los laterales del predio el paraíso señalizado con el fin de preservarlo y restaurar el área al final o entrega del predio.
Recuperación de áreas afectadas	Empradización= (áreas empradizadas sobreviviente/áreas empradizadas realizada) * 100	Se realiza prueba de empradización con pasto llanero en el KM 0+135 AL KM0+190 margen derecha. La técnica usada y más segura a establecer la empradización fue la repoblación de semillas y estolones de pasto llanero en agujeros realizados en el perfil dl suelo cada 30 cm más conocido como tres bolillos ya que es usada en ladras reduciendo la perdida de nutrientes y del suelo por erosión generados por escorrentía de aguas lluvias
	Restauración= (Áreas restauradas/áreas afectadas) *100	Durante el periodo no se reportan actividades referentes al presente subprograma
	Restauración= (áreas restauradas/áreas ocupadas) *100	Durante el periodo no se reportan actividades referentes al presente subprograma
Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	CSA = (Trabajadores que asisten a capacitación/Total de trabajadores) *100	Durante el periodo no se programa capacitación referente al tema de ecosistemas estratégicos o sensibles
	Área sensible= (área sensible delimitada/ área sensible identificada) *100	No hubo reporte durante el periodo
	Ecosistemas=	No hubo reporte durante el periodo

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	(Ecosistemas afectados/ecosistemas identificados) *100	
	CEE= (Área de ecosistemas estratégicos conectados /Áreas de ecosistemas estratégicos afectados) *100	No hubo reporte durante el periodo
Protocolos de fauna en obra	(Fadultos) = Fauna adulta liberada/ fauna adulta rescatado) *100	Durante el periodo no se presentó evento fortuito para activar el indicador
	(Polluelos) = (Polluelos juveniles liberados/ polluelos o juveniles rescatados) *100	Durante el periodo no se presentó evento fortuito para activar el indicador
	A Enfermos= (Animales entregados/Animales heridos rescatados) *100	Durante el periodo no se presentó evento fortuito para activar el indicador
Protección de la fauna en vías.	Atropellamientos de fauna al mes = Numero de atropellamientos registrados	Durante el periodo no se presentan estos eventos
	SAI= (Atropellamientos repetitivos en un sitio/atropellamientos totales en la vía) *100	Durante el periodo no se presentan estos eventos
	BFI= (Área de barrera implementada en el sitio/Área priorizada para el paso de fauna) * 100	Durante el periodo no se presentan estos eventos
Compensación ambiental	PC = (Plan de compensación autorizado/ plan de compensación requerido)	No hay autorización para corte de árboles, por tanto, la presente ficha no se ha activado.
	Restauración = (Área restaurada/ área total compensación) *100	No hay autorización para corte de árboles, por tanto, la presente ficha no se ha activado.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	Resdomest= (Generación de residuo domestico e industrial/ empresas autorizadas recolección en el periodo) *100	Se cuenta con caseta para acopio de residuos convencionales, RESPEL y líquidos. Se realiza instalación de señalización y demás actividades correspondientes al campamento y que fueron propuestas dentro del PAGA
	PuntosEco = Puntos ecológicos operativos/ puntos ecológicos instalados) *100	Se cuenta con cuatro (4) puntos ecológicos instalados.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	Mantenimientos = (No. de mantenimientos realizados/ No. de mantenimientos requeridos) *100	Los operadores de la maquinaria y equipo realizaron el diligenciamiento de listas de chequeo, previniendo a tiempo las fallas o anomalías.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

32463

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
		De esta manera se previno eficazmente accidentes de trabajo, accidentes de tránsito y daños a la propiedad.
	Traslados = (No. de traslados cumplimiento de requisitos/ No. de traslados realizados) *100	Durante el periodo no se realizaron traslados

Anexo: Formato 112-ECP-FR-016-INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Fernando Vera Barrera	Director de obra	100%
Juan Carlos Isaza Calderón	Residente	100%
Uriel Javier Arias Campos	Residente	100%
Andrea Camila Vera Hernández	Residente auxiliar	100%
Andrea Catalina Granados Numpaque	Residente auxiliar	100%
Erika Tatiana Méndez Ramos	Profesional ambiental	100%
Editson Ricardo Reyes Ospina	Supervisor SST	100%
Nayarith Rengifo Murillo	Profesional social	100%
Yuly Yadbrehily Zarate Encinalez	Supervisor HSE	100%

PERSONAL PRESENTE EN OBRA

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Juan Carlos Isaza	Residente de obra	100%
José Otoniel Osorio Ramírez	Topógrafo	100%
Fredy Alexander López Buitrago	Topógrafo	100%
Miguel Antonio Chiquillo Rincón	Topógrafo	100%
Edgar Mauricio Arias	Laboratorista	100%
María Claudia Jiménez López	Auxiliar administrativa	100%
Macedonio Manrique	Mecánico	100%
Diego Armando Macias Diaz	Mecánico	100%
Arialdo González Ascencio	inspector de obra	100%
José Miguel Polo	Jefe de maquinaria	100%

32464

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Idelfonso Vargas	Operador. motoniveladora	100%
Oscar Fabian Polo	Operador. motoniveladora	100%
Carlos Fernando Echeverry	Operador de vibro	100%
Luis Jesús Maldonado Gualdron	Operador de vibrocompactador	100%
Alex David Rojas Beltrán	Operador de vibrocompactador	100%
Ernesto Medina Duran	Operador de vibrocompactador	100%
Fernando Poloche	Conductor volqueta	100%
Luis Rodríguez	Conductor volqueta	100%
Marco Tulio Gámez Barreto	Conductor volqueta	100%
Jaime Alexander Rincón	Conductor volqueta	100%
Jaime Rincón	Conductor volqueta	100%
Pascual Galindo	Conductor volqueta	100%
David Santiago Ruiz	Conductor volqueta	100%
Custodio Tovar	Conductor volqueta	100%
Jefferson Leandro Guiza Fuertes	Conductor volqueta	100%
Luis Alfredo Montejo	Conductor volqueta	100%
Kevin Duván Vargas Pérez	Conductor volqueta	100%
Harold Alexis Vargas Pérez	Conductor volqueta	100%
Carlos Eduardo Gómez Fernández	Conductor volqueta	100%
Kevin Duván Vargas Pérez	Conductor volqueta	100%
Julián Ricardo Amador Camargo	Conductor volqueta	100%
Jairo Antonio Cely Rodríguez	Conductor volqueta	100%
Edwin Ferney Beltrán Piñeros	Conductor volqueta	100%
Brayan Muete Garzón	Conductor volqueta	100%
Fredy Alberto Giménez	Conductor volqueta	100%
Harrison Urrego	Conductor volqueta	100%
Oswaldo Martínez	Conductor volqueta	100%
Guillermo Escobar	Operador Dumper	100%
Esneider Bedoya Beltrán	Conductor	100%
Edwin Conde	Conductor	100%
Eduardo Mendoza	Conductor	100%
Luis Alberto Vallejo	Conductor de camioneta	100%
Daniel Antonio Barrera Molina	Conductor de camioneta	100%
Elver Sanabria	Operador de bulldozer	100%
Arciiti Basilio Salas	Operador de retrocargador	100%
José Alexander Aguiar	Operador retro cargador	100%
Cristian Camilo García Rivera	Operador de excavadora	100%
Víctor Beltrán	Operador de excavadora	100%
Robinson Aley Cuchimba	Cadenero 1	100%
Gelmeider José García Valencia	Cadenero	100%
Yolianny Cristina Carrillo Duran	Controladora vial	100%
Elicenia Mesa Triana	Controladora vial	100%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3246

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Stefanía Cardoso Vargas	Controladora vial	100%
Sandra Milena Olaya	Controladora vial	100%
Kerly Julisa Castro Andrade	Controladora vial	100%
Adriana Lucia Diaz Amaya	Controladora vial	100%
Astrid Carolina Robayo Ulcue	Controladora vial	100%
Marleny Rodríguez	Controladora vial	100%
Angelica Asencio Pineda	Controladora vial	100%
Diana Paola Urrego	Controladora vial	100%
Miguel Bejarano	Maestro de obra	100%
Guadalupe Hunda	Oficial	100%
Fabian Segura Moya	Ayudante de obra	100%
José Manuel Ricardo	Ayudante de obra	100%
Brayan Stiven Castañeda	Ayudante de obra	100%
Jhon Jairo Torres Regalado	Ayudante de obra	100%
Yeison López Figueroa	Ayudante de obra	100%
Luis Alfonso Forero Vanegas	Ayudante de obra	100%
Ismael Velásquez López	Ayudante de obra	100%
Jhon Faber Mahecha	Ayudante de obra	100%
Kevin Robert Fonseca Carrero	Ayudante de obra	100%
Fabio Ricardo López Bejarano	Ayudante de obra	100%
Luis Mahecha	Ayudante de obra	100%
Yury Tatiana González Valencia	Despachadora	100%
Joaquín Triana García	Conserje	100%
Hilmer Bonilla González	Conserje	100%
Sandra Milena Rincón	Servicios generales	100%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACIÓN DE PERSONAL OBRA

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024
Se presenta planilla de pago N°:
- 9469743465 – Consorcio Vial Conexión Orinoquía
- 9470221143 – Meyan S.A
- 9469676541 - Triturados San José SAS
- 9469751436 – Constructora la Porciúncula

Periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024
Se presenta planilla de pago N°:
- 9471045121 – Consorcio Vial Conexión Orinoquía
- 9471658393 – Meyan S.A
- 9471111668 - Triturados San José SAS
- 9471188010 – Constructora la Porciúncula

33466

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

Anexo: Formato 112-ECP-FR-021-V01-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	84
Empleos directos generados:	42
Empleos indirectos generados:	42

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	84
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	66
Género	Femenino	18
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	1
Población Vulnerable	Víctimas	20
Total		84

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DÍAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

32467

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
Acta 1 – 12/07/2023	0	División del corredor en tres tramos para realizar entrega de estudios y diseños de forma parcial e iniciar la etapa de mejoramiento.	
Acta 2 – 09/04/2024	0	Modificación de la amortización del anticipo	

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	400054560
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	400054559
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20/01/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nacional de seguros

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	15/03/2024	30/04/2029	23.702.164.432
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/03/2024	30/12/2031	23.702.164.432
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15/03/2024	30/04/2029	44.380.150.026
Calidad de los estudios	30/12/2028	30/12/2033	23.702.164.432

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	400046003
ANEXO N°	1
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	400046004
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	28/02/2023

324168

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nacional de seguros

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/04/2023	15/04/2024	1.123.966.994,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/04/2023	15/04/2026	1.123.966.994,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	19/04/2023	15/04/2024	5.619.834.974,00
Calidad de los estudios	15/12/2023	15/02/2028	3.371.900.984,40

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	400046003
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	400046004
ANEXO N°	2
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20/06/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nacional de seguros

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/04/2023	15/04/2024	1.123.966.994,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/04/2023	15/12/2026	1.123.966.994,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	19/04/2023	15/04/2024	5.619.849.974,00
Calidad de los estudios	15/12/2023	15/12/2028	3.371.900.984,40
Predios labores y operaciones -PLO	19/04/2023	15/12/2023	561.983.498,00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	400046003
ANEXO N°	3
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	400046004
ANEXO N°	3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	22/03/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nacional de seguros

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	27/12/2022	15/07/2024	1.123.966.994,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/12/2022	15/03/2027	1.123.966.994,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2022	15/07/2024	5.619.849.974,00
Calidad de los estudios	24/08/2023	15/03/2029	3.371.900.984,40

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

32469

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PÓLIZAS ACTUALIZADAS ETAPA CONSTRUCTIVA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	400054560
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	400054559
ANEXO N°	2
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	28/05/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nacional de seguros

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14/03/2024	29/04/2029	23.702.164.432,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/03/2024	29/12/2031	23.702.164.432,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14/03/2024	29/04/2029	44.380.150.026,00
Estabilidad de la obra	15/12/2023	15/12/2028	23.702.164.432,00
Predios labores y operaciones -PLO	19/04/2023	15/12/2023	11.851.082.216,00

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANTICIPO	1170	6/07/2023	100%	5.619.849.974,00	5.338.857.474,55	280.992.498,70	5.338.857.474,55
ANTICIPO	714	19/06/2024	0%	44.380.150.026,00	10.432.847.760,00	2.219.007.501,30	10.432.847.760,00
TOTALES							

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *01/07/2024 AL 31/08/2024*

Avance físico ejecutado 1.29% y avance financiero ejecutado 0%

32470

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%
2.1	Excavación en roca de la explanación y canales (m^3)	5.256,9	3,97





OBSERVACIONES: Se ejecuta la actividad desde el K1+540 AL K1+700, K1+700 AL PR1+950 Y K0+900 AL K1+980.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3241

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%
2.2	Excavación en material común de la explanación y canales (m^3)	22.930	7,41





OBSERVACIONES: Se ejecuta la actividad desde el K1+540 AL K1+700, K1+700 AL PR1+950 Y K0+900 AL K1+980.

32 de 72

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%
2.3	Transporte disposición final de escombros y sobrantes (m^3/Km)	54.728,7	0.71





OBSERVACIONES: Se realiza la actividad desde los puntos de excavación hasta las zonas de donación de material: el predio La Gran Vía, predio la Florida y la zona de nivelación en el predio el paraíso

32(47)

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%
2.4	Terraplenes con material mixto de rio sin procesar (m^3)	6.546,10	7,02





OBSERVACIONES: Se realiza la actividad desde K2 + 710 AL K2 + 829.94 y desde el K2 + 890 AL K3 + 162.09.


32 454

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%
2.5	Transporte de materiales granulares (m^3/Km)	51.730,70	1,09



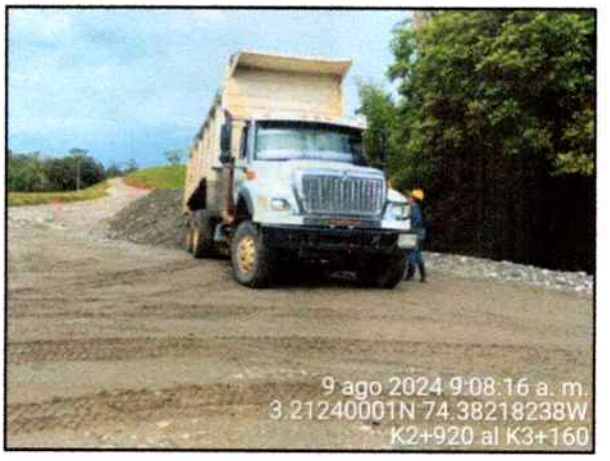

OBSERVACIONES: El transporte de material granular se realiza desde Triturados San José (proveedor) hasta cada uno de los puntos donde se construye el terraplén.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3245

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Se reporta un avance correspondiente a 1.29% ejecutado con respecto al programado que es de 0.63 %.
- Durante el presente periodo se generó avance las siguientes actividades: Excavación de material común de la explanación y canales, transporte disposición final de escombros y sobrantes, terraplenes con material mixto de rio sin procesar t máx. 3" y transporte de material granular y se continúa con la implementación del PMT y PMA.
- Es importante realizar recorridos constantes para verificar el estado de la señalización y la transitabilidad del corredor.
- Es necesario inspeccionar, comprobar la funcionalidad de las cunetas y mantenerlas despejadas para así direccionar las aguas de escorrentía y evitar deterioro en la vía.
- Es preciso tener presente que por los fuertes vientos se presenta caída de árboles sobre el corredor, lo que afecta la transitabilidad de los usuarios, por lo tanto, se recomienda realizar limpieza y despeje de estos sectores en el menor tiempo posible.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

84
32496

INFORME ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado
- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Control de Seguridad Industrial.
- Control de equipos.
- Estado del tiempo
- Manejo Ambiental
- Actas de comité técnico.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social.
- Copia de los ensayos de laboratorio, certificados de calidad de los materiales, y demás documentos que soporten el control de calidad.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 31 días del mes agosto del 2024.

Firma

Nombre: Fernando Vera Barrera
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202087420CND

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2520255760 CND

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CORRESPONDENCIA

(CD ANEXO)

INFORME GENERAL DE EQUIPOS

INFORME GENERAL DE EQUIPOS
LA URIBE - META

MES: 01 - 31 DE JULIO DEL 2024

EQUIPO	PLACA Y/O MARCA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 120K-04		A	A	A	I	I		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
BULLDOZER	D5M-02		A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		V	V	V
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CA 250-04		A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	ATLAS CA 250-07		V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V		V	V	V
VOLQUETA DOBLETROQUE	WLL 455		V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V		V	V	V
VOLQUETA DOBLETROQUE	WLL 456		A	A	A	I	I		A	I	A	A	A	I		I	A	I	I	I			V	V	V	V	V	V		V	V	V
VOLQUETA DOBLETROQUE	TRG 326		V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V		V	V	V
VOLQUETA DOBLETROQUE	TRG 327		A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A			A	A	A	I	A	A		I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	WLL 457		A	A	A	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	SRL 787		A	A	A	I	I		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	I			A	I	I	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	TRG 324		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A			I	I	I	A	I	A		I	I	I
VOLQUETA DUMPER	CAT -725-04		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I		I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	SPD 689		I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	A	I		I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	TFW 540		I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		I	I	I	I	I			I	I	I	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	TSV 038		I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	A		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I		I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	SNJ 705		I	I	I	I	I		I	I	I	I	A	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I		I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	TUK 315		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A			I	I	I	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	SRN 602		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	I			I	I	I	I	I	I		I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	SZO 378		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	A	A		A	A	A
EXCAVADORA	CATERPILLAR 320GC		A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A		I	A	A	A	A			I	I	A	A	A	A		A	A	A
EXCAVADORA	CATERPILLAR 323GX		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	I		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTONIVELADORA	CHAMPIONS 120		A	A	A	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A	V	V	V			V	V	V	A	A	A		A	A	A
RETROCARGADOR	CATERPILLAR 416		A	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	I			A	A	A	A	A	A		A	A	A
RETROCARGADOR	CATERPILLAR 416C		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I		I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CS533E		A	A	A	A	A		A	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V		V	V	V
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLLRAND		I	A	A	M	M		A	A	A	A	A	A		I	A	A	A	8			A	A	A	A	A	V		V	V	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	STO 330		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	UPS 884		I	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A		A	A	I	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	DBB 425		I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA SENCILLA	OLA 658		I	A	A	I	A		A	A	A	A	A	A		I	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
CAMIONETA FOTON	PLACA NFV 362		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
CAMIONETA FOTON	PLACA LVX 597		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
CAMION FORLAND	LZO 560		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A
COMPRESOR	KASSER M57		I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	A			I	I	I	I	I	I		A	A	A

R = REPARACIÓN
V = VARADO
I = INACTIVO
A = ACTIVO
M = MANTENIMIENTO

VoBo ING RESIDENTE _____

VoBo INTERVENTOR _____

33479

INFORME GENERAL DE EQUIPOS
LA URIBE - META

EQUIPO	PLACA Y/O MARCA	MES: 01 - 31 DE AGOSTO DEL 2024																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 120K-04	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	I	A	A	I		A	A	A	A	A	A
BULLDOZER	D5M-02	V	V	V		V	V	A	A	A			A	I	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CA 250-04	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	ATLAS CA 250-07	V	V	V		V	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V			V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V
EXCAVADORA	CATERPILLAR 324DL	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	A	A	A			A	A	A	A	I		A	A	V	V	V	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	WLL 455	I	I	I		A	I	I	I	I			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	WLL 456	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	TRG 326	V	V	V		V	V	V	V	V			V	V	V	V	V	V			V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V
VOLQUETA DOBLETROQUE	TRG 327	I	I	I		A	A	A	A	A			A	A	I	I	I	I			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	WLL 457	A	A	I		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	SRL 787	A	A	A		A	A	I	I	A			A	A	A	A	A	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	TRG 324	I	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DUMPER	CAT -725-03	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			A	I	A	I	I		A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DUMPER	CAT -725-04	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	A	A	A			A	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	SPD 689	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	TFW 540	A	A	A		A	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	TSV 038	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	SNJ 701	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	A	A			A	I	A	A	I		A	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	TUK 315	A	A	A		A	A	A	A	A			I	A	A	A	A	A			I	A	A	A	A		A	I	I	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	SRN 602	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	SZO 378	A	A	A		I	A	A	A	A			I	A	A	A	A	A			I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	SMN 395	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	SVF 702	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	TVF 702	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	A	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	TBO 048	I	I	I		A	A	I	A	A			I	I	A	I	I	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	TLM 551	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	A	A			A	A	A	A	A		A	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	UUD 443	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	SPX 663	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLETROQUE	SRM 030	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A
EXCAVADORA	CATERPILLAR 320GC	A	A	A		A	A	A	A	A			A	I	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
EXCAVADORA	CATERPILLAR 323GX	A	A	A		A	A	A	A	A			I	I	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA	CHAMPION 710A	I	A	A		A	A	A	A	I			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
RETROCARGADOR	CATERPILLAR 416	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
RETROCARGADOR	CATERPILLAR 416C	I	I	I		I	I	I	I	I			I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CS533E	A	A	A		A	A	I	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLLRAND	A	A	A		A	A	M	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	STO 330	I	I	A		I	I	A	A	A			A	A	A	A	A	A			I	A	A	A	A		A	I	I	I	I	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	UPS 884	A	A	A		I	I	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	I	I	I	A
VOLQUETA DOBLETROQUE	DBB 425	I	A	A		I	I	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	I		A	A	I	I	I	I
VOLQUETA SENCILLA	OLA 658	A	A	A		A	A	A	A	I			I	I	A	A	A	A			A	A	A	I	I		I	A	I	A	A	A
CAMIONETA FOTON	PLACA NFV 362	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
CAMIONETA FOTON	PLACA LVX 597	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
CAMION FORLAND	LZO 560	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
COMPRESOR	KASSER M57	A	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		I	A	A	A	A	A

R = REPARACIÓN I = INACTIVO M = MANTENIMIENTO
V = VARADO A = ACTIVO

VoBo ING RESIDENTE _____ VoBo INTERVENTOR _____

32480

INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INFORME DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CÓDIGO: FOREC-57
REVISIÓN: 1
FECHA: 25-04-2015
HOJA 1 DE 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

UBICACIÓN: URIBE - META

MES: JULIO

AÑO: 2024

INTERVENTORIA: CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO

CONTRATO: 779 DE 2022

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	12:00-1:00																															
	1:00-2:00																															
	2:00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00																															
	5:00-6:00																															
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															
PM	12:00-1:00																															
	1:00-2:00																															
	2:00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00																															
	5:00-6:00																															
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															

ELABORO: ARNALDO GONZALEZ

VoBo ING. RESIDENTE

VoBo INTERVENTOR

ESTADO DEL TIEMPO

LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL

33482

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INFORME DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CODIGO: FOR-EP-51	
REVISION: 1	
FECHA: 25-04-2015	
HOJA 1 DE 1	

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

UBICACIÓN: URIBE - META

MES: AGOSTO

AÑO: 2024

INTERVENTORIA: CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO

CONTRATO: 779 DE 2022

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00																															
	1:00-2:00																															
	2.00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00	N	N	N	N	N	N	N	N	LL	LL	N	LL	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	5:00-6:00	N	N	N	N	N	N	N	S	LL	LL	N	LL	LLVZ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N
	6:00-7:00	N	S	LLVZ	N	LL	N	S	S	LL	LL	N	LL	LLVZ	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	N	N	LLVZ	S	S
	7:00-8:00	N	S	N	S	LL	N	S	S	LLVZ	LL	N	LLVZ	LLVZ	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	N	LLVZ	S	S
	8:00-9:00	N	S	N	S	LLVZ	N	S	S	LLVZ	LL	S	LL	LL	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	LL	S	S
	9:00-10:00	S	S	N	S	LLVZ	N	S	S	LL	LL	S	LL	LL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LL	S	S	S	LL	S	S
	10:00-11:00	S	S	N	S	N	N	S	S	LL	LL	S	LL	LL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	LL	S	S	N	S	S
	11:00-12:00	N	S	N	S	N	N	S	S	N	LL	S	LL	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	LL	S	S	N	S	S
P.M.	12:00-1:00	N	S	N	S	LL	S	S	S	LLVZ	LL	S	LLVZ	LLVZ	N	S	N	S	S	S	S	S	S	S	N	S	LL	S	S	S	N	S
	1:00-2:00	LLVZ	S	N	S	LL	S	S	S	LL	LL	S	LLVZ	LLVZ	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	LL	N	S	S	N	S	S
	2.00-3:00	N	S	N	S	LL	S	S	S	LL	LL	S	LL	N	N	N	S	N	S	S	S	S	S	LLVZ	S	LL	LLVZ	S	N	N	S	S
	3:00-4:00	N	S	N	N	LLVZ	N	S	S	LL	LLVZ	S	LL	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	LLVZ	N	S	N	N	S	S
	4:00-5:00	N	S	LL	N	N	N	S	N	LLVZ	N	N	LL	N	N	S	S	S	N	N	LLVZ	S	S	LLVZ	S	N	S	S	N	N	S	H
	5:00-6:00	N	N	LL	N	N	N	N	N	LLVZ	N	N	LLVZ	LL	N	N	S	S	N	N	S	S	S	LLVZ	N	N	S	S	N	N	N	H
	6:00-7:00	N	N	LLVZ	N	N	N	N	N	N	N	N	LLVZ	LL	N	N	N	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	H
	7:00-8:00								LL		N	N	N	LLVZ																		
	8:00-9:00								LL				N																			
	9:00-10:00								LL																							
	10:00-11:00								LLVZ																							
	11:00-12:00								LLVZ																							

ELABORÓ: Aviado González A.

VoBo ING. RESIDENTE

VoBo INTERVENTOR

ESTADO DEL TIEMPO

LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL

324837

	INFORME ACTA PARCIAL	
	ACTA PARCIAL No. 2	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		

REUBICACIÓN DE CERCAS

Por el costado derecho desde el K2+200 al K2+250 y por el costado izquierdo desde el K0+280 al K0+340, K0+340 al K0+380, K0+600 al K0+635, K0+380 al K0+405, K0+635 K0+690, K1+840 al K1+940












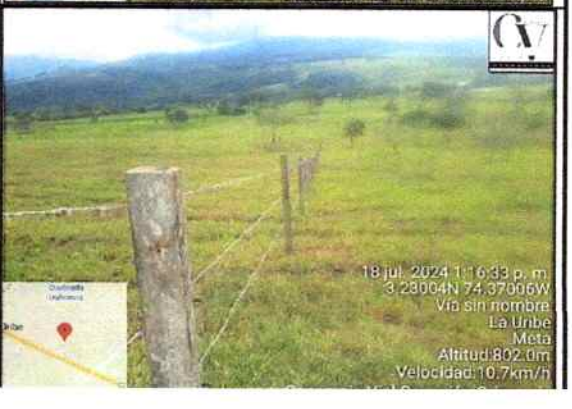

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES

Desde el K0 + 000 al K0 + 680













AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		









EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

Desde el K0 + 210 al K0 + 235





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		









TERRAPLENES CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR

En los tramos K2 + 710 AL K2 + 829.94 y K2 + 890 AL K3 + 162.09





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		









TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO

En los tramos K2 + 710 AL K2 + 829.94 y K2 + 890 AL K3 + 162.09





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		

Excavacion y perfilado de taludes k0+620 - k0+ 720





Excavacion K0+200 al K0+500












AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5


REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		

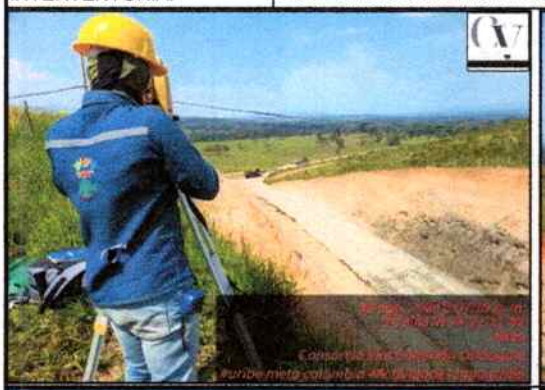

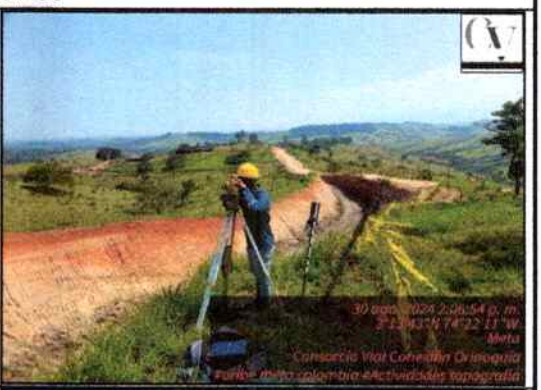

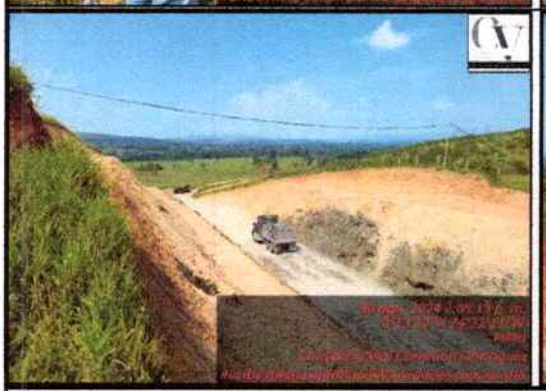

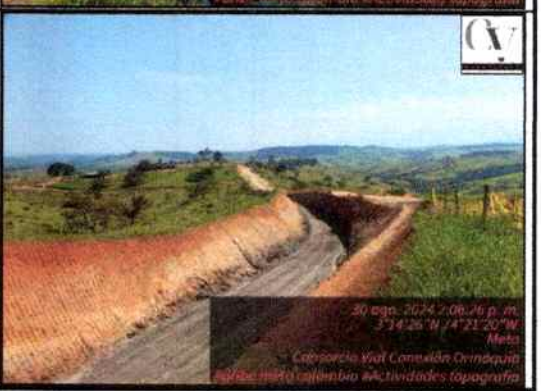

Demolicion en roca y excavacion k0+225- 0+235





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		











Levantamiento puntos de monitoreo

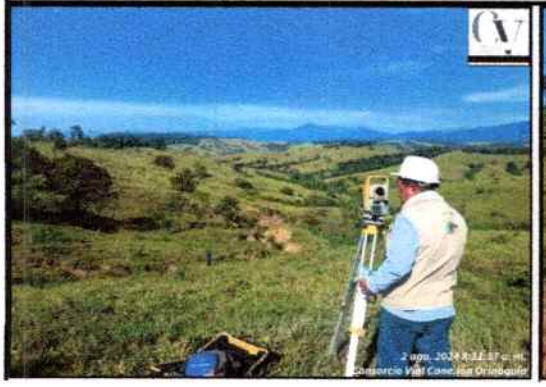

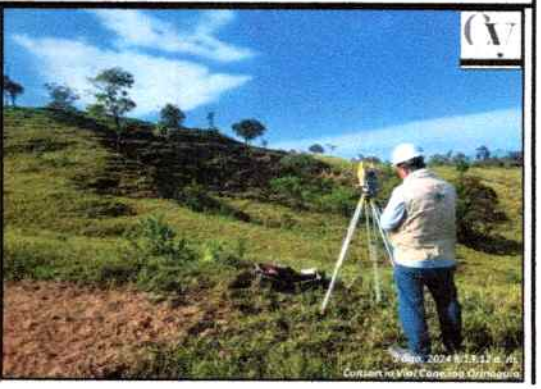

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		

Localización de eje k2+900 a k3+300, localización de chaflanes













AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		

DEMOLICION BAZOTE Y ALETAS BOX K0+512





TERRAPLENES CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR Desde el K2 + 900 al K3 + 160









AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		













AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5


REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		

TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO

En los tramos K2 + 710 AL K2 + 829.94, K2 + 890 AL K3 + 162.09 y K0+950 AL K1+050



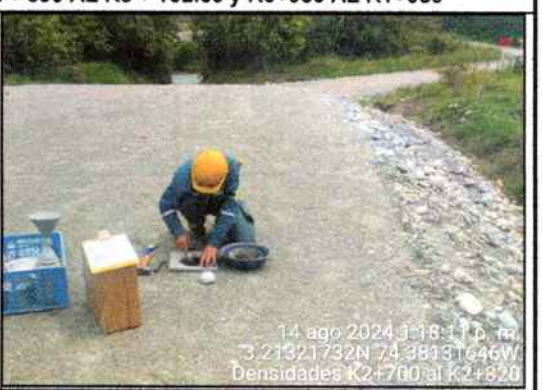





INFORME COMPONENTE SOCIAL

INFORME SOCIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°779 - 2022

"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"



ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INFORME MENSUAL DE CONSTRUCTOR N° 11
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA INFORME SOCIAL	CÓDIGO: 01 VERSIÓN: 01 Fecha versión:25.04.2023

REVISIÓN Y APROBACIÓN

GENERALIDADES			
Objeto del Contrato	**"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"**		
Título de Documento	**Informe De Obra**		
Documento No.	**INF-12**		
APROBACIÓN			
CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	Nombre	:	**NAYARITH RENGIFO MURILLO**
CARGO		:	**PROFESIONAL SOCIAL DE OBRA**
Responsable por la Revisión de Obra:	Firma	:	
	Fecha	:	**31/07/2024**

TABLA DE CONTENIDO

REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRUDUCCIÓN: 8
2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 9
3. ALCANCE 11
4. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 11
5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO. 11
8. CONCLUSIONES 32
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 33
10. ANEXOS 60

3250

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. inducción 12
Tabla 2. Retiros Julio 13
Tabla 3. Capacitación 13
Tabla 4. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra 13
Tabla 5. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado. 14
Tabla 6.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023. 15
Tabla 7.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024. 15
- Tabla 8.Ingresos personal julio. 16
Tabla 9. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial. 17
Tabla 10. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado 18
Tabla 11. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos 19
Tabla 12. Información de actividades realizadas en el periodo reportado 20
Tabla 13. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías 20
Tabla 14. Estado actual de las PQRS del proyecto 21
Tabla 15. Seguimiento PQRS del proyecto. 22
Tabla 16. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad. 25
Tabla 17. Actividades realizadas durante el periodo reportado. 26
Tabla 18. Indicador del subprograma 10.2 Subprograma seguimiento y control a la información y divulgación 27
Tabla 19. Actividades realizadas Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria. 29

Tabla 20. Indicador del subprograma 10.3 Subprograma seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria 29
Tabla 21. Correspondencia recibida en el periodo reportado 31
Tabla 22. Correspondencia enviada en el periodo reportado 32

3250

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1 Inducción al personal desde el componente social. 33
Fotografía 2 capacitación al personal desde el componente social. 36
Fotografía 3 verificación del personal vinculado en las bases sociales del municipio. 37
Fotografías 4 Visita a predios, verificación de compromisos y recorrido en el corredor vial. 37
Fotografías 5 Entrega de tanque de agua a propietario como compromiso establecido. 44
Fotografía 6 Verificación de afectaciones causadas en el acueducto de la vereda Versalles, las cuales fueron subsanadas. 45
Fotografía 7 Atención a comunidad 45
Fotografía 8 Cartelera informativa SAU 47
Fotografía 9 Aviso SAU 47
Fotografía 10 Instalación de punto móvil y apertura buzón 47
Fotografía 11 Piezas divulgativas 50
Fotografía 12 Actividad en seguridad vial con NN patinadores de Uribe Skating Club. 3 y 23.07.2024 52
Fotografías 13 Participación celebración de la llaneridad, invitación realizada por la casa de la cultura e Institución Educativa. 26.07.2024 53
Fotografías 14 Se participo en MIAF (Mesa de Infancia Adolescencia y Familia) donde se genera compromiso de realizar actividades de prevención de seguridad vial debido al riesgo que se vive en el casco urbano.24.07.2024 54
Fotografías 15 Participación en comité municipal 9.07.2024. 54
Fotografía 16 Participación en comité de obra 10.07.2024 55
Fotografías 17 Recorrido en el corredor vial y reunión con Interventoría, INVIAS, Consorcio de obra. 11.07.2024 55
Fotografías 18 Mesa de trabajo con interventoría n. 17.07.2024 – 27.07.2024 y 30.07.2024 57

Fotografías 19 Participación en consejo de política social 23.07.2024 58
Fotografías 20 Participación en reunión realizada por la alcaldía 24.07.2024 58
Fotografías 21 Participación en la campaña del día naranja, prevención de la violencia a la mujer. Actividad realizada por comisaria de familia y Hogar Infantil 26.07.2024 59

1. INTRUDUCCIÓN:

El presente informe da cuenta de las actividades ejecutadas y programadas en cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el área social del contrato de obra pública número N° 779 2022, que tiene como objeto "**MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META**". Logrando que la comunidad a través de la gestión social y acompañamiento tenga acceso a la información sobre la ejecución del proyecto, pueda manifestar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes e inquietudes, logre participar activamente durante la ejecución de la obra y ejerza control social sobre la misma, minimizar los impactos que puedan generarse con la intervención del proyecto y garantizar que las condiciones al finalizar la obra, sean iguales o mejores a las encontradas, la comunidad ha manifestado y demostrado el agradecimiento e interés por la obra que está en proceso de ejecución.

El presente informe, contempla los aspectos relacionados con la Gestión Social del proyecto, en concordancia con la ley aplicable y el contrato, teniendo como referencia la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero de Invias.

2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Localización: Municipio de La Uribe, Meta.

Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2028

Contratista: Consorcio Conexión Vial Orinoquía

El proyecto se enmarca dentro del programa "Colombia Rural"

El proyecto contempla el mejoramiento de 15 km de vía del corredor comprendido entre la Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces.

La ejecución del proyecto se divide en dos grandes etapas: Estudios y Diseños y Ejecución física de la obra.

Localización Geográfica Del Proyecto

El Municipio de Uribe – Meta es un Municipio colombiano situado en la región de los llanos orientales.
Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces en el Municipio de La Uribe, Departamento del Meta.
Km 1 vía Uribe Colombia Margen izquierda Puente sobre río Duda

Población: 8180 habitantes

Densidad poblacional: 1,3 hab/km²

Extensión: 630700 hectáreas

Altura: 685 metros sobre el nivel del mar

Etnias: el 2.2% de la población residente en La Uribe se autorreconoce como Indígena.

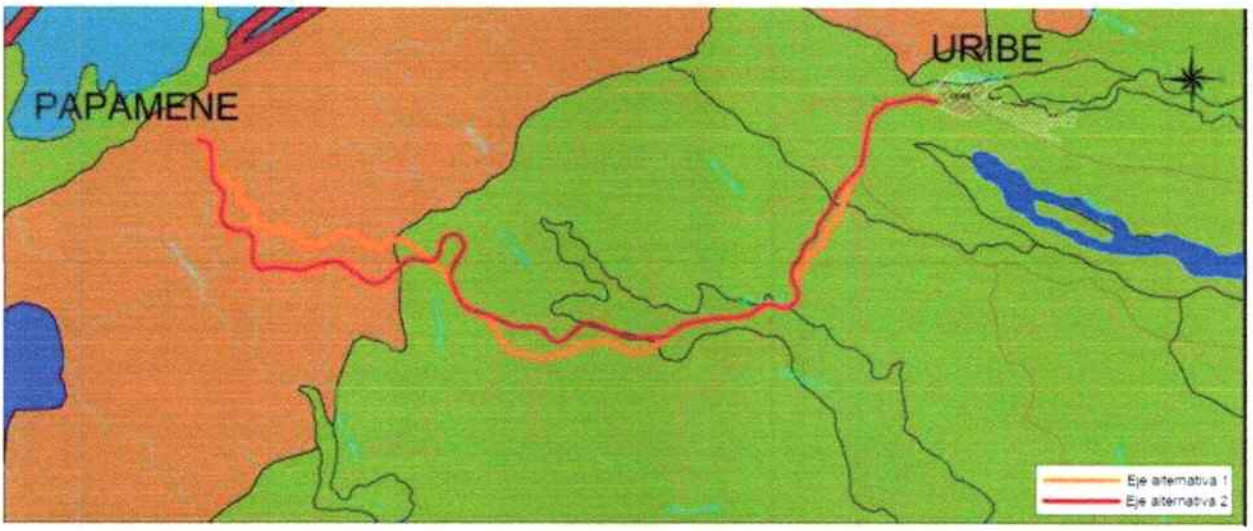


Ilustración 1 Localización del Proyecto

Área de influencia:

1. Vereda Papamene
2. Vereda Santander
3. Vereda Yavia

4. ALCANCE

4.1 Contrato de obra N° 779 DE 2022

El objeto del contrato se enmarca en el mejoramiento de los corredores viales para la conexión pacífico – Orinoquía – vía Uribe – cruce Versalles – Papamene – alto las cruces en el municipio de la Uribe departamento del meta, centrando las labores en los primeros quince kilómetros entre La Uribe y Papamene.

5. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el periodo reportado, se cuenta con Plan de Gestión Social, el cual fue aprobado por interventoría mediante oficio CE-01-042-016-2023 y PAGA aprobado por interventoría el 7 de septiembre con el oficio 01-042-0165-2023.

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO.

De acuerdo con el documento PAGA y Plan de Gestión Social se cuentan con los siguientes programas y subprogramas sociales a desarrollar durante la etapa de pre-construcción:

PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

- Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL

- Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.

PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

- Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

- Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

- Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.
- Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.
- Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

6.1 PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

El programa presenta tres (3) proyectos orientados al seguimiento y control de todas las actividades de manejo ambiental y social necesarias para la ejecución de las obras en el marco del cumplimiento de las normas contractuales y normatividad ambiental y social vigente, para el área social y sus obligaciones contractuales solo se estableció como parte del plan de gestión social el subprograma 1.2 capacitación y concienciación del personal de obra, el cual se relaciona a continuación.

6.1.1 Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

Objetivo del subprograma:

Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto desde el componente social. Durante este periodo se han realizado las siguientes actividades correspondientes a este subprograma.

Tabla 1. inducción

FECHA INDUCCIÓN	TEMA INDUCCION
• **17/07/2024** 2 personas conserjes • **19/07/2024** 1 persona topógrafo 1 Aux. administrativa • **23/07/2024** 1 persona sst	Inducción a las 12 personas que ingresaron desde el componente social, buen trato y respeto a la comunidad. **ANEXO 1.2 PLANILLA INDUCCIÓN.** Se presentaron 12 ingresos de los cuales 9 son personal con vinculación directa y 3 personas con vinculación indirecta. Se presento 1 retiro.

• **26/07/2024** 1persona Laboratorista • **29/07/202424** 3 conductores de Volqueta. 2 ayudantes de obra 1 controladora vial	

Tabla 2. Retiros Julio

RELACION DE PERSONAL EN OBRA RETIROS JUNIO						
ITEM	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO Y/O OFICIO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	JEFERSON LEANDRO GUIZA FUERTES	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1.120.926.420	PORCIUNCULA S.A.S	24/06/2024	23/07/2024

Tabla 3. Capacitación

FECHA CAPACITACIÓN	TEMA
30/07/2024	Capacitación al personal en trabajo en Comunicación asertiva. **ANEXO 1.2 CAPACITACION PERSONAL - Asistentes 36 personas.**

Tabla 4. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.° personal capacitado / N° inducciones realizadas* 100	12/12*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento del 100% del indicador.
N.° de personal capacitado / N° de personal vinculado al proyecto* 100	36/60*100=74%	100%	50%	1 mes	Se da cumplimiento del indicador con el 60% (36 personas), que participaron del proceso de capacitación desde el área social en la temática de

					comunicación asertiva. El 40% (24 personas) faltantes equivale a personal que se encuentra laborando fuera del área de influencia.

6.2 PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL.

En el programa de desarrollo local se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la promoción del desarrollo local en términos de empleabilidad, obras con participación comunitaria, con el fin de incorporar buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, que contribuyan a la conservación del ambiente y el desarrollo socioeconómico del territorio.

6.2.1 Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.

Objetivo del subprograma:

Verificar la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Tabla 5. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
1 al 31 de julio 2024	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo publicación de recepción de hojas de vida en el municipio de Uribe.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
1 al 31 de julio 2024	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo vinculación laboral de 12 personas

A continuación, se relaciona la información del personal vinculado actualmente al proyecto, para el periodo reportado:

Tabla 6.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Abril	3	3	0	2	1	1	2	0	3	0
Mayo	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Junio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Julio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Agosto	21	6	15	4	11	13	8	0	18	3
Septiembre	39	12	27	16	23	30	9	0	33	6
Octubre	43	15	28	19	24	35	8	0	36	7
Noviembre	50	16	34	18	32	41	9	1	42	8
Diciembre	41	14	27	16	25	34	7	1	36	5

Tabla 7.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Enero	42	17	25	20	22	33	9	1	36	6
Febrero	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Marzo	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Abril	37	16	21	10	27	9	28	1	33	4

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Mayo	39	16	23	16	23	30	9	1	35	4
Junio	53	26	27	29	24	44	9	1	40	13
Julio	60	33	27	34	26	48	12	1	44	16

ANEXO 6.1 ACTA Y CUADRO RELACION DEL PERSONAL.

Durante el periodo se realizaron 12 ingresos, del siguiente personal:

- 3 conductores de volqueta
- 2 conserje
- 1 laboratorista
- 1 topógrafo
- 1 supervisor SST
- 1 auxiliar administrativa
- 2 ayudantes de obra
- 1 controladora vial

- *Tabla 8.Ingresos personal julio.*

RELACION DE PERSONAL EN OBRA INGRESOS JULIO						
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	KEVIN DUVAN VARGAS PEREZ	CONDUCTOR	1.118.573.806	ASODUDA	29/07/2024	
1	HAROLD ALEXIS VARGAS PEREZ	CONDUCTOR	1.118.566.383	ASODUDA	29/07/2024	
3	CARLOS EDUARDO GOMEZ FERNANDEZ	CONDUCTOR	7.168.024	ASODUDA	18/07/2024	
4	JOAQUIN TRIANA GARCIA	CONSERJE	17.225.270	CVCO	17/07/2024	
5	HILMER BONILLA GONZALEZ	CONSERJE	1.123.142.335	CVCO	17/07/2024	
6	EDGAR MAURICIO ARIAS	LABORATORISTA	75.144.990	CVCO	26/07/2024	
7	FREDY ALEXANDER LOPEZ BUITRAGO	TOPOGRAFO	17.267.653	CVCO	19/07/2024	
8	YULY YADBREHILY ZARATE ENCINALEZ	SUPERVISOR SST	1.118.542.390	CVCO	23/07/2024	
9	MARIA CLAUDIA JIMENEZ LOPEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	30.946.281	CVCO	19/07/2024	
10	LUIS ALFONSO FORERO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	1.123.140.976	CVCO	30/07/2024	
11	YEISON LOPEZ FIGUEROA	AYUDANTE DE OBRA	1.119.947.755	CVCO	30/07/2024	

12	KERLY JULISA CASTRO ANDRADE	CONTROLADOR VIAL	1.006.420.079	CVCO	30/07/2024	

Para el período, se reportó la vinculación de mano de obra al proyecto, por parte del contratista de 33 colaboradores directos y 27 colaboradores con vinculación indirecta, de los cuales 34 pertenecen al área de Influencia directa del proyecto, 26 son del área de influencia indirecta del proyecto (foráneos) vinculación de 12 mujeres, 1 persona está vinculada a la ARN como firmante del acuerdo de paz, 5 personas con primer empleo, vinculación de 5 personas menores de 28 años, 4 mujeres vinculada al programa familias en acción y 18 personas inscritas en el registro único de víctimas.

ANEXO 6.2 CERTIFICADOS BASES SOCIALES.

Durante el periodo reportado se garantiza la afiliación al personal a la ARL, EPS, Pensión y Caja de Compensación Familiar.

Tabla 9. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.° de personas vinculadas de las zonas / N° total de empleos *100	34/60*100=57%	60%	1 mes	No se da cumplimiento al 60% del indicador, debido a que el proyecto se encuentra iniciando la fase constructiva y no se requiere una amplia vinculación laboral. 57% del personal son personas de la zona de influencia.
Mano de obra perteneciente a grupos vulnerables / N° total de empleos *100	38/60*100=63%	50%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador donde se cuenta con un indicador del 63% de cumplimiento

6.3 PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el Programa de Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través del establecimiento de los lineamientos para el acompañamiento desde la gestión social a las acciones técnicas necesarias a realizarse en predios, redes de servicios públicos y el adecuado uso del derecho de vía, para el desarrollo de las actividades constructivas de los proyectos liderados por INVÍAS y AIM.

6.3.1 Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

Objetivo del subprograma:

Verificar el registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente (cercas, servicios públicos y comunitarios, entre otros) aledaña a las áreas de intervención de la obra, infraestructura de uso temporal del contratista y en el derecho de vía, previo al inicio de cualquier actividad técnica del proyecto

Tabla 10. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
5, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 26, y 31 de julio del 2024	Vereda Yavia, Casco Urbano	Contratista Comunidad	Se realizo verificación de permisos de intervención voluntaria en predios, los cuales corresponden al tramo 2 del corredor vial, levantamiento acta de compromiso para correr cercas. El consorcio adelanta actividades en predios ubicados entre el K0+00 al k2+00 donde se realiza reubicación temporal de cercas.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
			Se realizaron visitas a predios, recorrido en corredor vial, verificación de compromisos con propietarios de predios y verificación de afectaciones presentadas en el acueducto veredal.
19/07/2024	Vereda Yavia	Contratista Propietarios predios	Se realiza entrega de tanque de agua de 5.000 L al propietario Alberto Barreto de la vereda Yavia como cumplimiento a compromiso, la entrega se realizó junto a interventoría. **Ver registro fotográfico**
23/07/2024	Vereda Versalles	Contratista Propietarios predios JAC -	Verificación de afectaciones causadas en el acueducto de la vereda Versalles, las cuales fueron subsanadas.

No se presentan afectaciones en infraestructura ni en predios, No aplican actividades para el periodo reportado.

Tabla 11. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.° de actas de vecindad realizadas / N° total de actas de vecindad construcciones aledañas *100	28/28*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador.
N° afectaciones subsanadas / N° afectaciones presentadas	0/0*100=0%	0%	60%	1 mes	No se presentan afectaciones en la infraestructura.

6.3.2 Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.

Objetivo del subprograma:

Verificar la generación y/o formulación de estrategias de apoyo interinstitucional con autoridades locales y otras entidades de relevancia en el área de influencia del proyecto, orientadas a promover la recuperación del derecho de vía de las carreteras a intervenir.

Tabla 12. Información de actividades realizadas en el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
12 marzo del 2024	Casco Urbano	Alcaldía	En el área de influencia no se cuentan con unidades económicas ubicadas en la franja vial. De igual forma el 12 de marzo se radico oficio CCV-ALC-402-779-2023, solicitando articulación para realizar socialización de la ley 1228 y la recuperación del espacio público con actores sociales en el área de influencia del proyecto. A la fecha no se cuenta con respuesta por parte de la administración, 30 junio 2024.

Tabla 13. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
Base de datos actualizada	1/1*100=100%	1	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición anual.
N° de asistentes a reunión / N° de reuniones programadas	2/2*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición trimestral.

N° actas de compromiso elaboradas / N° actas de compromiso ejecutadas	0/0*100=0%	100%	1 mes	Para el periodo reportado no se realizan actas de compromiso.

6.4 PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el programa de participación, gobernanza e inclusión social se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la garantía de la ejecución de procesos de información, participación y promoción de la organización comunitaria en torno a los proyectos de infraestructura vial. Además, se estipulan los enfoques de género, de derechos y diferencial como ejes transversales de la gestión socio ambiental de los proyectos.

6.4.1 Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.

Objetivo del subprograma:

Verificar el funcionamiento del sistema de atención y respuesta oportuna y eficaz a las manifestaciones (quejas, solicitudes, reclamos, peticiones, sugerencias, denuncias, etc.), interpuestas por comunidades y autoridades mediante los medios dispuestos para esto (correo electrónico, llamada telefónica, personalmente, entre otros).

6.4.1.1 ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO.

Durante el periodo reportado no se recibe PQRS, pero se tiene abierta 1 PQRS del mes de mayo la cual está a espera de aprobación por interventoría (mantenimiento en la vía de la vereda Papamene solicitado por la JAC de la vereda Papamene)

Tabla 14. Estado actual de las PQRS del proyecto

ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO			
MES /AÑO	**PRESENTADAS**	**ABIERTAS**	**CERRADAS**
Mayo 2023	0	0	0
Junio 2023	1	1	0
Julio 2023	0	0	0
Agosto 2023	0	0	0
Septiembre 2023	0	0	0
Octubre 2023	2	1	1
Noviembre 2023	3	2	1
Diciembre 2023	1	2	1
Enero 2024	0	1	0
Febrero 2024	0	1	0
Marzo 2024	0	1	0
Abril 2024	0	1	0
Mayo 2024	1	1	0
Junio 2024	0	1	0
Julio 2024	1	2	0

Tabla 15. Seguimiento PQRS del proyecto.

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
1	23/05/2023	JAC Vereda Papamene	Solicitud	El 20 de junio, el contratista envió respuesta a comunidad mediante oficio CVC-JAC 057-2023. Para el mes de julio, se realizó recorrido con la comunidad de la vereda Papamene para la identificación de los puntos críticos a intervenir, respondiendo a su solicitud. El 30 de junio del 2024 se realiza cierre a la PQRS solicitada.		X

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA INFORME SOCIAL	CÓDIGO: 01 VERSIÓN: 01 Fecha versión:25.04.2023

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
2	1/10/2023	Carlos Gómez	Solicitud	El señor Carlos Gómez Realiza solicitud de relleno en el predio con material de excavación de la obra, a lo cual se realizó respuesta mediante oficio CVC-JAC 271-779-2023.		X
3	6/10/2023	JAC Vereda Santander	Solicitud	El presidente de la JAC solicita MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA LAGARTIJA ESCUELA SANTANDER Y LA YE DE SANTANDER ALTO, a lo cual se realizó respuesta mediante oficio CVC-JAC 270-779-2023.		X
4	3/11/2023	Angela Chavarriaga Alcaldía	Solicitud	Asunto: Apoyo a celebración del día comunal para el día 19 de noviembre. El consorcio no realiza apoyo en la actividad, debido a que el contrato no cuenta con recursos para el desarrollo de estas actividades.		X
5	21/11/2023	JAC Vereda Papamene	Solicitud	Asunto: invitación a reunión con la directiva de la vereda Papamene. El miércoles 22 de noviembre se participó en reunión programada donde se acordó realizar campaña de seguridad vial con los niños y niñas de la vereda en el mes de diciembre.		X
6	29/11/2023	Geily Lorena Machuca Alcaldía	Solicitud	Asunto: invitación y solicitud de apoyo logístico al festival de la paz y la confraternidad Uribense 2023. El Consorcio acordó con la administración municipal apoyar la Travesía Ciclista MTB 45 K el día domingo 3 de diciembre, en la ruta Cabecera Municipal – vereda Papamene – cabecera municipal en lo siguiente 1. Conductor: Esneider Bedoya Beltrán Cedula: 1.134.434.496 de Mapiripan. Celular número: 3124635830 2. Camión tipo turbo, placa LZO560. Disponible desde las 6 am, el cual contara con camilla y botiquín. 3. Punto de hidratación, que cuenta con carpa, botiquín de primeros auxilios, camilla, residente social quien realizara campaña - sensibilización en seguridad vial y apoyo en la hidratación		X

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
				5. Personal del consorcio participara en la travesía. El 3 de diciembre se realizó cierre a la PQRS.		
7	19/12/2023	JAC Vereda Versalles	Solicitud	Solicitud incentivo navideño a los niños y niñas de la vereda		X
8	20/05/2024	JAC Vereda Papamene	Solicitud	Solicitud de mantenimiento en los puntos críticos del corredor vial de Papamene, las afectaciones en la vía se han presentado a causa de las fuertes lluvias, el mismo día se realiza notificación de afectaciones en la vía para tramitar solicitud de la comunidad. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS**	X	
9	30/07/2024	Hermes Luna Gaitan	Solicitud	Solicitud de donación de un viaje de material de excavación para un lote ubicado en la vereda Versalles. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS**	X	

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Julio 2024	Oficina contratista	Comunidad Interventoría Contratista	Se realizo conversación con el señor Jairo Campiño, presidente de la JAC de la vereda Papamene como seguimiento al mantenimiento realizado en la vía y solicitud realizada por la comunidad el día 20.05.2024
Julio 2024	Vereda Papamene	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Papamene, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva y constructiva).
Julio 2024	Vereda Santander	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Santander, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva y constructiva).
Julio 2024	Vereda Yavia	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Yavia, donde se relacionó información propia del contrato (número del

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
			contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva - constructiva).
Julio 2024	Alcaldía	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la alcaldia, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva - constructiva).
Julio 2024	Oficina Consorcio Vial Conexión Orinoquia.	Contratista, Interventoría y	Se cuenta con oficina de servicio de atención al usuario (SAU), ubicada en la dirección KM 0+900 vía Uribe la Julia – Puente Rio Duda. La cual fue aprobada por interventoría mediante oficio 01-042-0254-2023 basada en la visita que realizo la profesional social de interventoría al SAU el día 25/10/2023.

Durante el periodo reportado se recibió 1 PQRS

Tabla 16. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
# de PQRS recepcionadas / # de PQRS presentadas en el periodo * 100	1/1*100=100%	0	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Durante el periodo reportado se recepción una PQRS, se realiza tramite de 2 PQRS, de las cuales una se encuentra en proceso desde el mes de mayo del 2024 y la otra desde el mes de julio del 2024 .

# de PQRS contestadas dentro del término legal/ # de PQRS presentadas en el periodo * 100	0/0*100=100%	0	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Durante el periodo reportado se presenta una PQRS la cual está en proceso y se encuentra dentro del término legal.
N° de oficinas fijas propuestas/ N° de oficinas fijas implementadas X 100	1/1*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador, ya que se cuenta con SAU fija, la cual fue aprobada por interventoría mediante oficio 01-042-0254-2023.
N° puntos móviles de atención al usuario propuestas/ N° puntos móviles de atención al usuario implementadas X 100%	4/4*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador, ya que se tienen oficina móvil instalada en la vereda Yavia, Papamene, Santander e instalaciones de la Alcaldía.

6.4.2 Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.

Objetivo del subprograma:

Verificar la implementación de la estrategia pública de divulgación para brindar información oportuna, clara, veraz y actualizada a los actores sociales e institucionales sobre las actividades ejecutadas en el marco del contrato

Tabla 17. Actividades realizadas durante el periodo reportado.

133

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Julio 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas divulgativas en el grupo de Whatsapp, convocatorias laborales información del estado del proyecto: En julio se continúa divulgando la siguiente información Si eres técnico, tecnólogo, profesional, auxiliar, guarda de seguridad o tienes otro desempeño, ayúdanos a fortalecer la base de datos del nivel académico del Uribe, Meta. Ingresa al siguiente formulario y responde: https://forms.gle/FGbT21KEdZ6j5D9y5 
Julio 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparte piezas informativas con la ubicación del SAU y fase del contrato.
Julio 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas comunicativas de actividades realizadas en el corredor vial.
Julio 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas comunicativas de la realización del banco de hojas de vida de personas ubicadas en el área de influencia del proyecto.
Julio 2024	Whatsapp y físicas	Comunidad Contratista	Se comparten piezas divulgativas de seguridad y cultura vial.

Tabla 18. Indicador del subprograma 10.2 Subprograma seguimiento y control a la información y divulgación

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N° de reuniones de inicio ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	3/3*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador El 19 de abril se realizó socialización de inicio de

				actividades constructivas donde participaron las 3 veredas del área de influencia.
N° de reuniones de seguimiento ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	0/3*100=0%	100%	1 mes	No aplica para el periodo, se proyecta para cuando el proyecto lleve el 50% de ejecución.
N° de reuniones de finalización ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	0/3*100=0%	100%	1 mes	No aplica para el periodo reportado
N° de reuniones extraordinarias ejecutadas/ N° de reuniones solicitadas X 100	0/0*100=100%	100%	1 mes	Para el periodo, no se recibieron solicitudes de reuniones extraordinarias.
N° de videos programados/N° de videos presentes en la página web	0/1*100=0%	1	1 mes	Se entrega anualmente, a la fecha no aplica debido a que no se cumple el año.
N° de infografías entregadas/ N° propuestos	0/1*100=0%	1	1 mes	Se entrega anualmente, a la fecha no aplica debido a que no se cumple el año.
N° de piezas informativas y de divulgación / N° de piezas informativas y de divulgación propuestas X 100	3/3*100=100%	100%	1 mes	Se realizo entrega de 3 piezas de información y divulgación.

6.4.3 Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

Objetivo del programa:

Verificar las estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, líderes, comité de participación comunitaria y población en general. Validar los espacios para la participación y control social.

Tabla 19. Actividades realizadas Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Julio	Punto satélite – Alcaldía municipal	Contratista, comunidad	Se publicaron piezas en carteleras y redes, donde se promociona la seguridad vial se entregaron recomendaciones a los usuarios de la vía, se explicó que es la seguridad vial y como pueden aportar a disminuir riesgos de siniestros viales.
03 y 23 de Julio	Oficina y Casco urbano	Contratista, comunidad	Se realizo actividad de seguridad vial con los niños y niñas usuarios de la vía, que practican actividades en el corredor vial. Patinadores y patinadoras del Club Uribe Skating Club.
24 julio 2024	Biblioteca Municipal	Contratista, Alcaldía Municipal e Instituciones	Se participo en MIAF (Mesa de Infancia Adolescencia y Familia) donde se gerea compromiso de realizar actividades de prevención de seguridad vial debido al riesgo que se vive en el casco urbano.
26 julio 2024	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	Contratista, comunidad	Participación actividad "Celebración día de la llaneridad" donde se abordó actividad en seguridad vial.

Tabla 20. Indicador del subprograma 10.3 Subprograma seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N° de actividades de sensibilización ejecutadas/ N° de actividades programadas X 100	2/2*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador, donde se programó y ejecuto una actividad, entregando infografías de seguridad vial a la comunidad

				mediante redes sociales y Recorrido en la vereda Versalles para verificar señalización al ingreso de la escuela Versalles
N° de talleres de capacitación realizados/ N° de talleres programados X 100	1/1*100=0%	100%	1 mes	Se realizo campaña en seguridad vial con los niños y niñas estudiantes del La Institución Educativa, hogar infantil en articulación con casa de la cultura. En casco urbano el 26.07.2024
N° de campañas de seguridad vial realizadas/ N° campañas requeridas X 100	1/1*100=100%	100%	1 mes	Se realizo campaña en seguridad vial con los niños y niñas estudiantes de la escuela, hogar infantil en articulación con administración municipal. En casco urbano el 23.07.2024
N° bases de datos lideres realizadas/ N° de base de datos requeridas	1/1*100=100%	1	1 mes	Se da cumplimiento a cabalidad de este indicador.
N° de comités de participación programados/ N° de comités de participación programados ejecutados X 100	3/3*100=0%	2	1 mes	Se realizo actividad con el comité de participación de cada una de las veredas, en el marco de la socialización de inicio de la fase constructiva: 1. Papamene el día 16/04/2024 2. Yavia el día 16/04/2024 3. Santander el día 16/04/2024 Para el mes de mayo del 2024 se realizará

				acta de conformación y actividad.
N° de reuniones programadas con veeduria / N° de reuniones ejecutadas X 100	0/1*100=0%	1	1 mes	Los integrantes de la veeduría no programan reunión, se les informa que el consorcio está a disposición para dichas actividades, pero no realizan actividad. La frecuencia de medición es trimestral.

7. OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN SOCIAL

- ✓ Participación en comité municipal 09.07.2024.
- ✓ Se realizaron mesas de trabajo con la profesional social de interventoría.
- ✓ Julio, Se han establecido mesas de trabajo entre el equipo de gestión social, las cuales han sido significativas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mitigaciones de situaciones presentadas.
- ✓ 24 de julio, verificación del personal vinculado al consorcio en bases sociales del municipio.
- ✓ Julio 2024 Se realiza recepción de hojas de vida, construyendo el banco de hojas de vida.
- ✓ 23.07/2024. Participación en invitación al recibimiento de los patinadores del Club Uribe Skating.
- ✓ 24/07/2024Participación en reunión realizada por la alcaldía
- ✓ 25/07/2024. Participación en la campaña del día naranja, prevención de la violencia a la mujer. Actividad realizada por comisaria de familia y Hogar Infantil.
- ✓ 26/07/2024. Participación celebración de la llaneridad, invitación realizada por la casa de la cultura e Institución Educativa.
- ✓ Se realiza apoyo a interventoría para el diligenciamiento de los formatos iniciales y de seguimiento de INVIAS.

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Tabla 21. Correspondencia recibida en el periodo reportado

FECHA	RADICADO	REMITE	ASUNTO
17.07.2024	0179 - CCP-OP-1060-2022-0175	Interventoría	REMISION OBSERVACIONES INFORME MENSUAL JUNIO 2024 - RESPUESTA CCV-INT-537-779-2023
19.07.2024	0179 - CCP-OP-1060-2022-0179	Interventoría	Solicitud de verificación de los predios la Caracola y Asociación ACUME, y ampliación de área del predio Finca la Gran Vía para zona de donación.

Tabla 22. Correspondencia enviada en el periodo reportado

FECHA	RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO
17.07.2024	CCV-MIN-550-779-2023	CVCO	Determinación de procedencia o no procedencia de consulta previa para el proyecto 779 del 2022.
28.07.2024	CCV-INT-528-779-2023	CVCO	Respuesta a oficio CCP-OP-1060-2022-0123, que tiene como asunto respuesta a oficio CCV-INT-505-779-2023. Donación de material de excavación.

ANEXO 12. CORRESPONDENCIA

9. CONCLUSIONES

- Se continúan realizando acciones para el cumplimiento de las obligaciones sociales contractuales.
- Se tomo como base la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura modo carretero versión 2022, INVIAS.
- Se brindo atención al usuario desde el SAU a la comunidad.
- Se estableció y se mantiene buena articulación con la institucionalidad del municipio, interventoría y con comunidad.
- Se programaron actividades para el mes de julio y agosto del 2024.
- Se participa en comités semanales
- Se han establecido mesas de trabajo entre el equipo de gestión social, las cuales han sido significativas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Se han establecido mesas de trabajo entre el equipo de gestión social, las cuales han sido significativas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mitigaciones de situaciones presentadas.
- Se establecieron compromisos con propietarios de los predios intervenidos.
- Se realizaron actividades de seguridad vial con niños y niñas patinadoras.
- Se realizo apertura a los buzones.
- Se realizo recepción de 1 PQRS, se tiene una solicitud abierta desde el mes de mayo la cual está en proceso de aprobación por interventoría (Solicitud de mantenimiento realizado por la junta de acción comunal de la vereda Papamene).
- Se brindo atención en el SAU.
- Se recepcionaron hojas de vida.
- Se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el mes.
- Se tramitaron documentos para el proceso de donación de material de excavación autorizado por la alcaldía municipal.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Subprograma 1.2 Capacitación y concienciación del personal de obra.

Fotografía 1 Inducción al personal desde el componente social.









Galaxy S23 Ultra


Galaxy S23 Ultra


Galaxy S23 Ultra
31 de julio de 2024 3:54 p. m.

Fotografía 2 capacitación al personal desde el componente social.

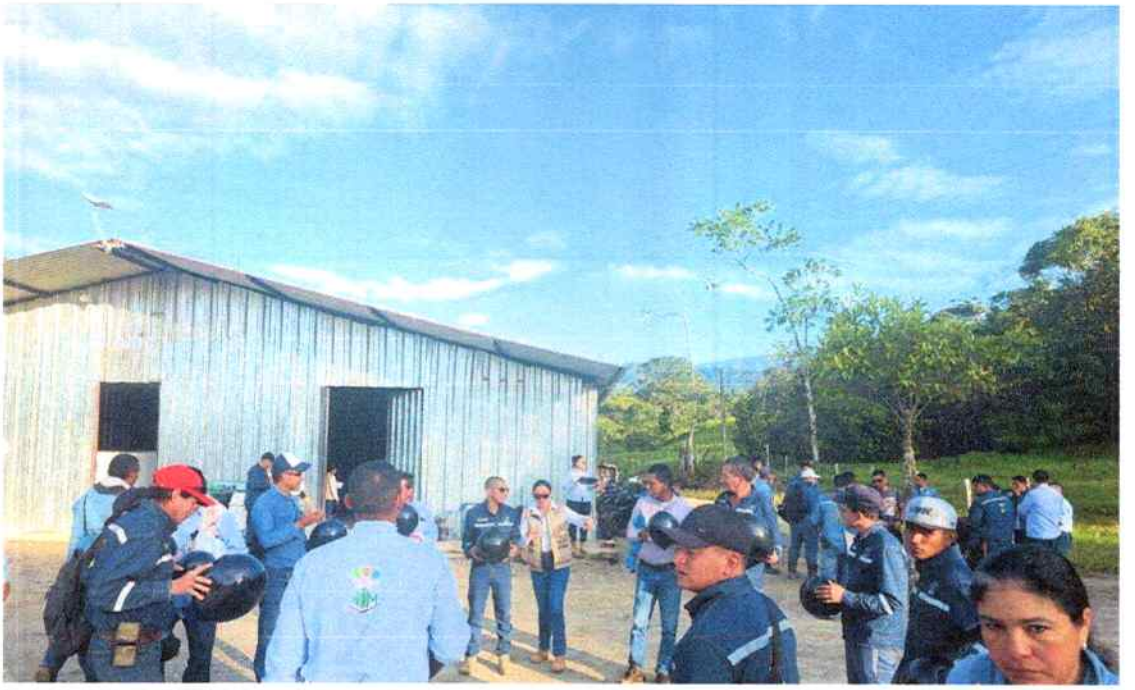



Fotografía 3 verificación del personal vinculado en las bases sociales del municipio.



Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

Fotografías 4 Visita a predios, verificación de compromisos y recorrido en el corredor vial.











Galaxy S23 Ultra
09 de julio de 2024 5:32 p. m.


Galaxy S23 Ultra
09 de julio de 2024 3:06 p. m.


Galaxy S23 Ultra
09 de julio de 2024 9:10 a. m.

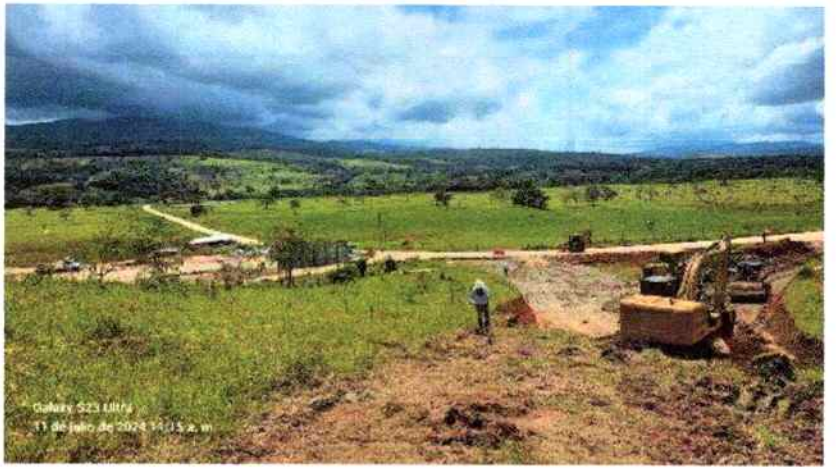
Galaxy S23 Ultra
11 de julio de 2024 14:13 a. m.


12 jul 2024


12 jul 2024

147
32538




Galaxy S23 Ultra
15 de julio de 2024 11:17 a. m.


Galaxy S23 Ultra
15 de julio de 2024 9:22 a. m.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: 01
	INFORME SOCIAL	VERSIÓN: 01 Fecha versión:25.04.2023








Galaxy S23 Ultra
16 de julio de 2024 8:45 a. m.


Galaxy S23 Ultra
23 de julio de 2024 8:25 a. m.







Fotografías 5 Entrega de tanque de agua a propietario como compromiso establecido.




Fotografía 6 Verificación de afectaciones causadas en el acueducto de la vereda Versalles, las cuales fueron subsanadas.



Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.

Fotografía 7 Atención a comunidad

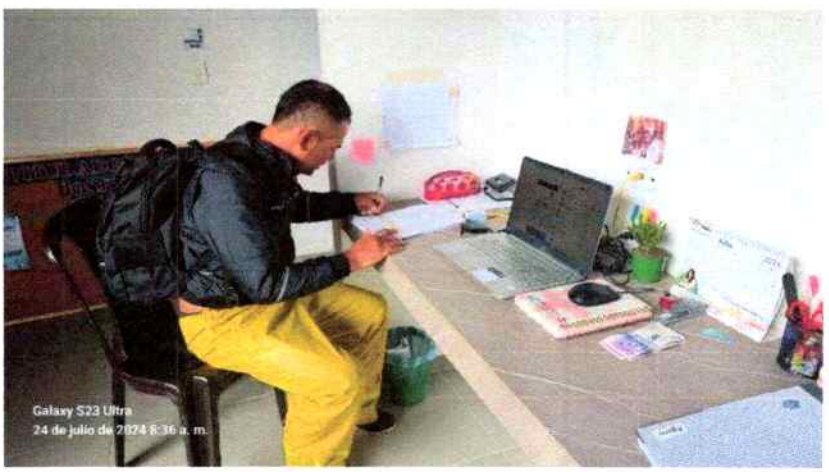


Galaxy S23 Ultra
30 de julio de 2024 2:19 p. m.


Galaxy S23 Ultra



Fotografía 8 Cartelera informativa SAU





Vereda Santander



Vereda Yavia



Vereda Papamene



Punto Atencion Alcaldia



Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.

Fotografía 11 Piezas divulgativas.









Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

Fotografía 12 Actividad en seguridad vial con NN patinadores de Uribe Skating Club. 3 y 23.07.2024







Fotografías 13 Participación celebración de la llaneridad, invitación realizada por la casa de la cultura e Institución Educativa. 26.07.2024



Fotografías 14 Se participo en MIAF (Mesa de Infancia Adolescencia y Familia) donde se genera compromiso de realizar actividades de prevención de seguridad vial debido al riesgo que se vive en el casco urbano.24.07.2024



Otras actividades.

Fotografías 15 Participación en comité municipal 9.07.2024.




Fotografía 16 Participación en comité de obra 10.07.2024




Fotografías 17 Recorrido en el corredor vial y reunión con Interventoría, INVIAS, Consorcio de obra. 11.07.2024




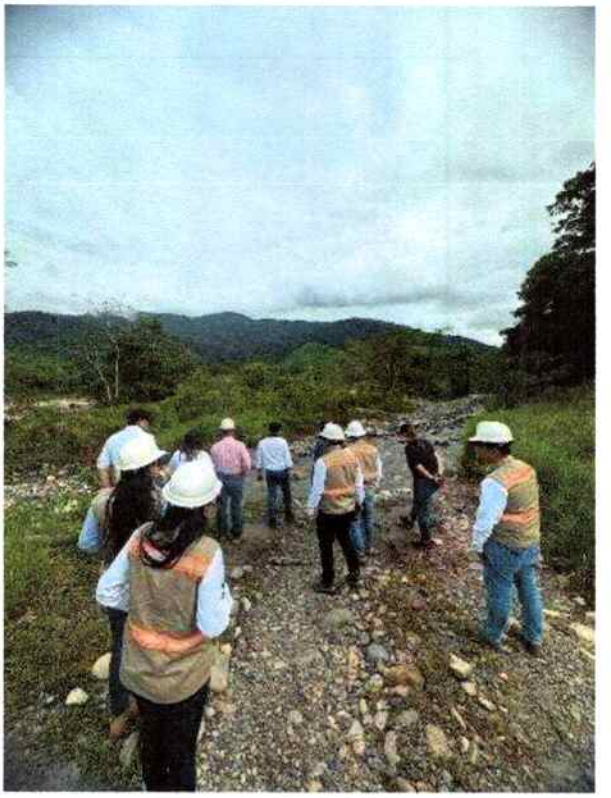


Galaxy S23 Ultra
11 de julio de 2024 1:54 p. m.

Fotografías 18 Mesa de trabajo con interventoría n. 17.07.2024 – 27.07.2024 y 30.07.2024

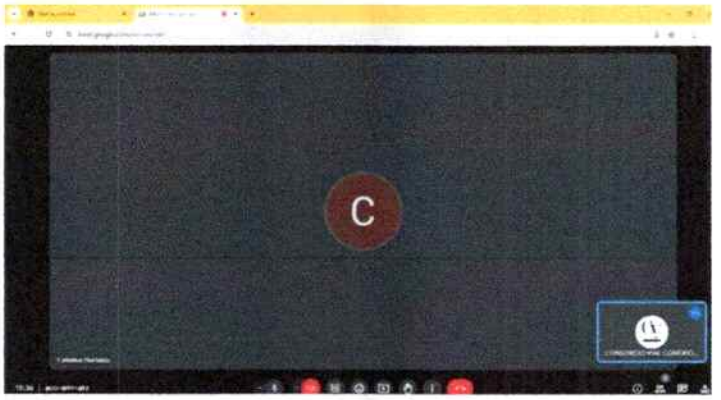

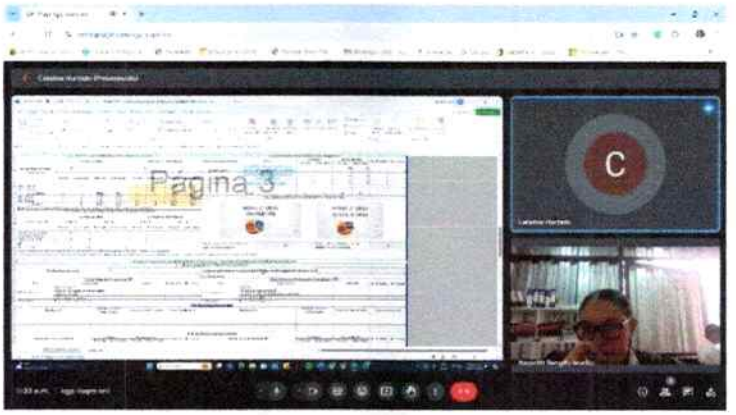



Fotografías 19 Participación en consejo de política social 23.07.2024



Fotografías 20 Participación en reunión realizada por la alcaldía 24.07.2024



Fotografías 21 Participación en la campaña del día naranja, prevención de la violencia a la mujer. Actividad realizada por comisaria de familia y Hogar Infantil 26.07.2024





INFORME SOCIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°779 - 2022

"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"



ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INFORME MENSUAL DE CONSTRUCTOR N° 13
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN


GENERALIDADES			
Objeto del Contrato			**"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"**
Título de Documento			**Informe De Obra**
Documento No.			**INF-13**
APROBACIÓN			
CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	Nombre	:	**NAYARITH RENGIFO MURILLO**
CARGO		:	**PROFESIONAL SOCIAL DE OBRA**
Responsable por la Revisión de Obra:	Firma	:	
	Fecha	:	**31/08/2024**

TABLA DE CONTENIDO

REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRUDUCCIÓN: 8
2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 9
4. ALCANCE 11
5. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 11
6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO. 11
3. CONCLUSIONES 52
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 53
5. ANEXOS 83

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. inducción 13
Tabla 2. Retiros agosto 14
Tabla 3. Capacitación 14
Tabla 4. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra 15
Tabla 5. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado 16
Tabla 6.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023. 16
Tabla 7.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024. 17
- Tabla 8.Ingresos personal agosto 17
Tabla 9. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial. 19
Tabla 10. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado 20
Tabla 11. Subprograma 6.2: Seguimiento y control a las obras con participación comunitaria. 20
Tabla 12. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado 21
Tabla 13. Subprograma 6.3. Seguimiento y control Apoyo a la capacidad productiva y negocios verdes. 21
Tabla 14. Seguimiento y control al Programa de Arqueología Preventiva. 22
Tabla 15. Subprograma 7.1 Seguimiento y control Programa de Arqueología Preventiva. 23
Tabla 16. Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e informada con comunidades étnicas 25
Tabla 17. Subprograma 7.4 Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e informada con comunidades étnicas.26
Tabla 18. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado 28
Tabla 19. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos 29
Tabla 20. Información de actividades realizadas en el periodo reportado 29

Tabla 21. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías 30
Tabla 22. Seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial 31
Tabla 23. Indicador del subprograma 9.1 Seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial 32
Tabla 24. Estado actual de las PQRS del proyecto 35
Tabla 25. Seguimiento PQRS del proyecto. 35
Tabla 26. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad. 39
Tabla 27. Actividades realizadas durante el periodo reportado. 40
Tabla 28. Indicador del subprograma 10.2 Subprograma seguimiento y control a la información y divulgación 41
Tabla 29. Actividades realizadas Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria. 43
Tabla 30. Indicador del subprograma 10.3 Subprograma seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria 43
Tabla 31. Seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género y de transversalización. 45
Tabla 32. Indicador del subprograma 10.4 Seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género y de transversalización. 46
Tabla 33. Seguimiento y control a la gobernanza. 48
Tabla 34. Indicador del subprograma 10.5 Seguimiento y control a la gobernanza. 49
Tabla 35. Correspondencia recibida en el periodo reportado 51
Tabla 36. Correspondencia enviada en el periodo reportado 51

3562

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1 Inducción al personal desde el componente social. 53
Fotografía 2 capacitación al personal desde el componente social en trabajo en Comunicación, ingreso en predios del corredor vial y prevención de violencia de genero. 57
Fotografía 3 jornada de bienestar laboral al personal vinculado al contrato, mediante la celebración de cumpleañeros de agosto. 59
Fotografía 4 capacitación al personal desde la ARL. 60
Fotografías 5 Visita a predios, verificación de compromisos y recorrido en el corredor vial. 60
Fotografía 6 Atención a comunidad 70
Fotografía 7 Cartelera informativa SAU 72
Fotografía 8 Aviso SAU 72
Fotografía 9 Instalación de punto móvil y apertura buzón 73
Fotografía 10 Piezas divulgativas 75
Fotografía 11 Actividad en seguridad vial con NN Institución educativa Rafael Uribe Uribe 78
Fotografías 12 Se realiza actividad de prevención de violencia a la mujer, con mujeres vinculadas al proyecto, se socializan rutas de atención y sanciones al personal 78
Fotografías 13 Se genera estrategia con el hogar Infantil para la flexibilización con las madres de niños y niñas vinculadas al proyecto 79
Fotografías 14 "Festival De Cometas" a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en articulación con organizaciones sociales como Uribe Skating /Club, Hogar Infantil, UT Corpovidesa 80
Fotografías 15 actividad de prevención de violencias con y socialización de rutas con niños y niñas vinculadas al club 81
Fotografía 16 Participación en actividad con las familias del Club Uribe Skating Club, quienes realizan actividad de reforzamiento de vinculo y almuerzo 81

Fotografías 17 participación en actividad realizada con niños y niñas, por parques nacionales y hogar infantil. 82

1. INTRUDUCCIÓN:

El presente informe da cuenta de las actividades ejecutadas y programadas en cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el área social del contrato de obra pública número N° 779 2022, que tiene como objeto "**MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META**". Logrando que la comunidad a través de la gestión social y acompañamiento tenga acceso a la información sobre la ejecución del proyecto, pueda manifestar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes e inquietudes, logre participar activamente durante la ejecución de la obra y ejerza control social sobre la misma, minimizar los impactos que puedan generarse con la intervención del proyecto y garantizar que las condiciones al finalizar la obra, sean iguales o mejores a las encontradas, la comunidad ha manifestado y demostrado el agradecimiento e interés por la obra que está en proceso de ejecución.

El presente informe, contempla los aspectos relacionados con la Gestión Social del proyecto, en concordancia con la ley aplicable y el contrato, teniendo como referencia la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero de Invias.

2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Localización: Municipio de La Uribe, Meta.

Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2028

Contratista: Consorcio Conexión Vial Orinoquía

El proyecto se enmarca dentro del programa "Colombia Rural"

El proyecto contempla el mejoramiento de 15 km de vía del corredor comprendido entre la Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces.

La ejecución del proyecto se divide en dos grandes etapas: Estudios y Diseños y Ejecución física de la obra.

2.1

2.2 Localización Geográfica Del Proyecto

El Municipio de Uribe – Meta es un Municipio colombiano situado en la región de los llanos orientales.
Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces en el Municipio de La Uribe, Departamento del Meta.
Km 1 vía Uribe Colombia Margen izquierda Puente sobre río Duda

Población: 8180 habitantes

Densidad poblacional: 1,3 hab/km²

Extensión: 630700 hectáreas

Altura: 685 metros sobre el nivel del mar

Etnias: el 2.2% de la población residente en La Uribe se autorreconoce como Indígena.

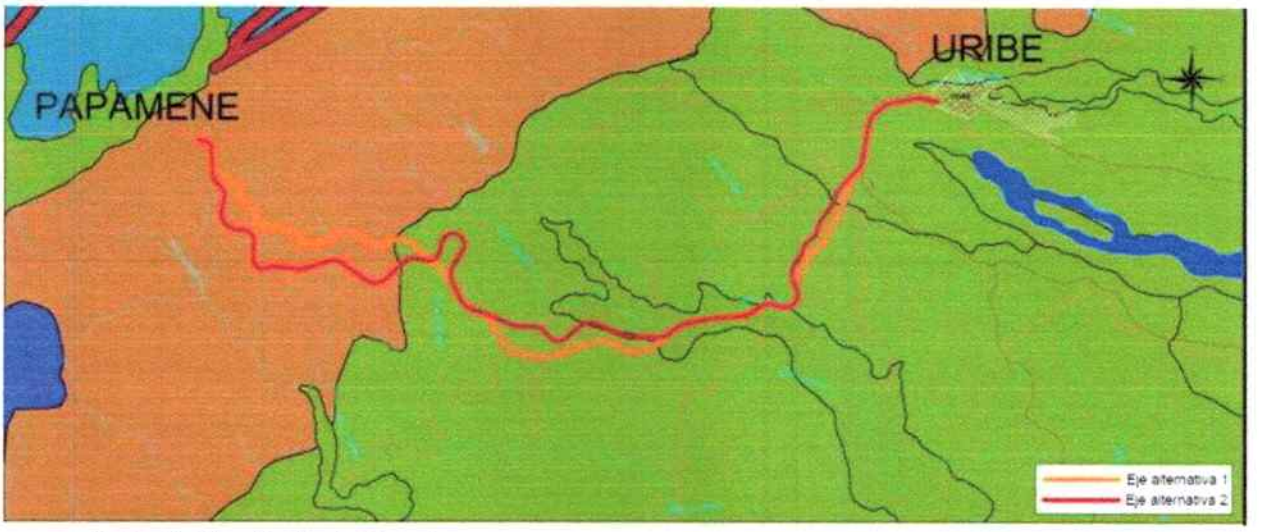


Ilustración 1 Localización del Proyecto

Área de influencia:

1. Vereda Papamene
2. Vereda Santander
3. Vereda Yavia

4. ALCANCE

4.1

4.2 Contrato de obra N° 779 DE 2022

El objeto del contrato se enmarca en el mejoramiento de los corredores viales para la conexión pacífico – Orinoquía – vía Uribe – cruce Versalles – Papamene – alto las cruces en el municipio de la Uribe departamento del meta, centrando las labores en los primeros quince kilómetros entre La Uribe y Papamene.

5. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el periodo reportado, se cuenta con Plan de Gestión Social, el cual fue aprobado por interventoría mediante oficio CE-01-042-016-2023 y PAGA aprobado por interventoría el 7 de septiembre del 2023 con el oficio 01-042-0165-2023.

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO.

De acuerdo con el documento PAGA y Plan de Gestión Social se cuentan con los siguientes programas y subprogramas sociales a desarrollar durante la etapa constructiva del proyecto:

PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

- Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL

- Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.
- Subprograma 6.2: seguimiento y control de las obras con participación comunitaria
- Subprograma 6.3: seguimiento y control al apoyo a la capacidad productiva y Negocios Verdes

PROGRAMA 7: COMUNIDADES ÉTNICAS, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERÉS SOCIOCULTURAL

- Subprograma 7.1: seguimiento y control al Programa de Arqueología Preventiva
- Subprograma 7.2: seguimiento y control a la protección del patrimonio arqueológico
- Subprograma 7.3: seguimiento y control a la protección del patrimonio geológico y paleontológico
- Subprograma 7.4: seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la Consulta Previa, libre e informada con comunidades étnicas

PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

- Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.
- Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.
- Subprograma 8.3: seguimiento y control al acompañamiento de la gestión socio predial

PROGRAMA 9: ACCESIBILIDAD

- Subprograma 9.1: seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

- Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.
- Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.
- Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.
- Subprograma 10.4: seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género y de transversalización
- Subprograma 5: seguimiento y control a la gobernanza

6.1 PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

El programa presenta tres (3) proyectos orientados al seguimiento y control de todas las actividades de manejo ambiental y social necesarias para la ejecución de las obras en el marco del cumplimiento de las normas contractuales y normatividad ambiental y social vigente, para el área social y sus obligaciones contractuales solo se estableció como parte del plan de gestión social el subprograma 1.2 capacitación y concienciación del personal de obra, el cual se relaciona a continuación.

6.1.1 Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

Objetivo del subprograma:

Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto desde el componente social. Durante este periodo se han realizado las siguientes actividades correspondientes a este subprograma.

Tabla 1. inducción

FECHA INGRESO	TEMA INDUCCION
• **5/08/2024** 3 personas (1 conductor, 1 ayudante de obra y 1 despachadora) • **7/08/2024** 1 persona (topógrafo) • **12/08/2024** 2 personas (controladoras viales) • **15/08/2024** 3 personas (2 operadores y 1 ayudante de obra) • **16/08/202424** 2 personas (Conductores de volqueta). • **17/08/2024** 3 personas (1 maestro de construcción, 1	Inducción a las 25 personas que ingresaron desde el componente social, buen trato y respeto a la comunidad. **ANEXO 1.2 PLANILLA INDUCCIÓN.** Se presentaron 25 ingresos de los cuales 9 son personal con vinculación directa y 16 personas con vinculación indirecta. No se presentaron retiros en el mes

conductor y 1 oficial de obra) • **21/08/2024** 2 personas (conductores de volquetas) • **22/08/202424** 2 personas (1 conductor de volqueta y 1 ayudante de obra). • **23/08/2024** 6 personas (3 controladoras viales, 2 ayudantes de obra y 1 operador de vibro) • **28/08/202424** 1 persona (conductor de volqueta).	

Tabla 2. Retiros agosto

RELACION DE PERSONAL EN OBRA RETIROS AGOSTO						
ITEM	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO Y/O OFICIO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**

En el mes reportado no se presentaron retiros.

Tabla 3. Capacitación

FECHA CAPACITACIÓN	TEMA
14/08/2024 y 26/08/2024	Capacitación al personal en trabajo en Comunicación, ingreso en predios del corredor vial y prevención de violencia de genero. **ANEXO 1.2 CAPACITACION PERSONAL. capacitación del 14.08.2024: 47 personas** **26.08.2040** Se realizo socialización al personal vinculado, de las rutas de atención ante la presencia de situaciones de violencia que se puedan presentar. 49 personas 3 de agosto se realizó capacitación al personal desde la ARL.

	31.08.2024 se realizó jornada de bienestar laboral al personal vinculado al contrato, mediante la celebración de cumpleañeros de agosto. 51 personas

Tabla 4. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.° personal capacitado / N° inducciones realizadas* 100	25/25*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento del 100% del indicador.
N.° de personal capacitado / N° de personal vinculado al proyecto* 100	47/84*100=56%	100%	50%	1 mes	Se da cumplimiento del indicador con el 56% (47 personas), que participaron del proceso de capacitación desde el área social en la temática de comunicación asertiva.

6.2 PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL.

En el programa de desarrollo local se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la promoción del desarrollo local en términos de empleabilidad, obras con participación comunitaria, con el fin de incorporar buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, que contribuyan a la conservación del ambiente y el desarrollo socioeconómico del territorio.

6.2.1 Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.

Objetivo del subprograma:

Verificar la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Tabla 5. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
1 al 31 de agosto 2024	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo publicación de recepción de hojas de vida en el municipio de Uribe.
1 al 31 de agosto 2024	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo vinculación laboral directa de 9 personas de las cuales 3 son mujeres.
21 agosto	Emisora ejercito	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Emisora	Se participo en programa radial donde se realiza promoción de vacantes en el CVCO.

A continuación, se relaciona la información del personal vinculado actualmente al proyecto, para el periodo reportado:

Tabla 6.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Abril	3	3	0	2	1	1	2	0	3	0
Mayo	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Junio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Julio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Agosto	21	6	15	4	11	13	8	0	18	3
Septiembre	39	12	27	16	23	30	9	0	33	6
Octubre	43	15	28	19	24	35	8	0	36	7
Noviembre	50	16	34	18	32	41	9	1	42	8

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Diciembre	41	14	27	16	25	34	7	1	36	5

Tabla 7.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Enero	42	17	25	20	22	33	9	1	36	6
Febrero	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Marzo	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Abril	37	16	21	10	27	9	28	1	33	4
Mayo	39	16	23	16	23	30	9	1	35	4
Junio	53	26	27	29	24	44	9	1	40	13
Julio	60	33	27	34	26	48	12	1	44	16
Agosto	84	42	42	50	34	66	18	1	68	28

ANEXO 6.1 ACTA Y CUADRO RELACION DEL PERSONAL.

Durante el periodo se realizaron 25 ingresos, del siguiente personal:

- 7 conductores de volqueta
- 1 conductor de camioneta
- 5 ayudantes de obra
- 5 controladoras viales
- 1 despachadora
- 1 maestro de obra
- 1 oficial de obra
- 3 operarios
- 1 topógrafo

- *Tabla 8.Ingresos personal agosto.*

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA INFORME SOCIAL	CÓDIGO: 01 VERSIÓN: 01 Fecha versión:25.04.2023

- RELACION DE PERSONAL EN OBRA
- INGRESOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	RESIDENCIA	MOC/ MONC	SEXO
1	JULIAN RICARDO AMADOR CAMARGO	CONDUCTOR	1.233.893.083	ASOVOLDUDA	5/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE
2	JAIRO ANTONIO CELY RODRIGUEZ	CONDUCTOR	4.234.693	ASOVOLDUDA	16/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE
3	EDWIN FERNEY BELTRAN PIÑEROS	CONDUCTOR	1.121.817.962	ASOVOLDUDA	16/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE
4	BRAYAN MUETE GARZON	CONDUCTOR	1.079.034.406	ASOVOLDUDA	22/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE
5	OSWALDO MARTINEZ	CONDUCTOR	74.346.127	ASOVOLDUDA	28/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE
6	FREDDY ALBERTO JIMENEZ	CONDUCTOR	1.079.033.998	ASOVOLDUDA	21/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE
7	HARRISON URREGO	CONDUCTOR	1.003.746.775	ASOVOLDUDA	21/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE
8	ASTRID CAROLINA ROBAYO ULCUE	CONTROLADOR VIAL	1.073.245.343	CVCO	12/08/2024		URIBE	MONC	MUJER
9	MIGUEL ANTONIO CHIQUILLO RINCON	TOPOGRAFO INSPECTOR	4.053.096	CVCO	7/08/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE
10	YURY TATIANA GONZALEZ VALENCIA	DESPACHADORA	1.006.777.528	CVCO	5/08/2024		URIBE	MONC	MUJER
11	ISMAEL VELASQUEZ LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	106.951.301	CVCO	5/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE
12	MARLENY RODRIGUEZ	CONTROLADOR VIAL	1.124.821.569	CVCO	23/08/2024		URIBE	MONC	MUJER
13	ANGELICA ASENCIO PINEDA	CONTROLADORA VIAL	1.123.143.017	CVCO	23/08/2024		URIBE	MONC	MUJER
14	DIANA PAOLA URREO	CONTROLADORA VIAL	1.123.140.079	CVCO	23/08/2024		URIBE	MONC	MUJER
15	KEVIN ROBERT FONSECA CARRERO	AYUDANTE DE OBRA	1.023.028.210	CVCO	23/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE
16	ADRIANA LUCIA DIAZ AMAYA	CONTROLADOR VIAL	1.005.822.953	CVCO	12/08/2024		URIBE	MONC	MUJER
17	GUILLERMO ESCOBAR	OPERADOR DUMPER	3.068.783	MEYAN S.A.S	15/08/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE
18	VICTOR BELTRAN	OPERADOR EXCAVADORA	3.214.968	MEYAN S.A.S	15/08/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE
19	ERNESTO MEDINA DURAN	OPERADOR VIBRO	17.548.999	MEYAN S.A.S	23/08/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE
20	MIGUEL BEJARANO	MAESTRO DE OBRA	79.670.027	CONSTRUCCIONES BEJARANO	17/08/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE
21	EDUARDO MENDOZA	CONDUCTOR	1.007.719.128	CONSTRUCCIONES BEJARANO	17/08/2024		FORANEO	MOC	HOMBRE

22	GUADALUPE HUNDA	OFICIAL	6609905	CONSTRUCCIONES BEJARANO	17/08/2024		FORANEO	MONC	HOMBRE
23	JHON FABER MAHECHA	AYUDANTE DE OBRA	1123141003	CONSTRUCCIONES BEJARANO	23/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE
24	FABIO RICARDO LOPEZ BEJARANO	AYUDANTE DE OBRA	1.031.121.914	CONSTRUCCIONES BEJARANO	15/08/2024		FORANEO	MONC	HOMBRE
25	LUIS MAHECHA	AYUDANTE DE OBRA	1.006.839.545	CONSTRUCCIONES BEJARANO	22/08/2024		URIBE	MONC	HOMBRE

Para el período, se reportó la vinculación de mano de obra al proyecto, por parte del contratista de 42 colaboradores directos y 42 colaboradores con vinculación indirecta, de los cuales 50 pertenecen al área de Influencia directa del proyecto, 34 son del área de influencia indirecta del proyecto (foráneos), vinculación de 18 mujeres, 1 persona está vinculada a la ARN como firmante del acuerdo de paz, 9 personas con primer empleo, vinculación de 9 personas menores de 28 años, 4 mujeres vinculada al programa familias en acción, 6 madres cabeza de hogar y 20 personas inscritas en el registro único de víctimas.

ANEXO 6.2 CERTIFICADOS BASES SOCIALES.

Durante el periodo reportado se garantiza la afiliación al personal a la ARL, EPS, Pensión y Caja de Compensación Familiar.

Tabla 9. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.° de personas vinculadas de las zonas / N° total de empleos *100	42/84*100=50%	60%	1 mes	No se da cumplimiento al 60% del indicador, debido a que el proyecto se encuentra iniciando la fase constructiva y no se requiere una amplia vinculación laboral. Se cuenta con el 50% del personal vinculado perteneciente al área de influencia.
Mano de obra perteneciente a	42/84*100=63%	50%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador donde se

grupos vulnerables / N° total de empleos *100				cuenta con un indicador del 63% de cumplimiento

6.2.2 Subprograma 6.2: Seguimiento y control a las obras con participación comunitaria.

Objetivo del subprograma:

Verificar la participación activa de la comunidad con el fin de generar procesos de mejoramiento del entorno e infraestructura comunitaria, propiciando el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y actores sociales del área de influencia de los proyectos de Infraestructura vial.

Tabla 10. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
		Inicio de actividades programadas para el mes de septiembre.

Tabla 11. Subprograma 6.2: Seguimiento y control a las obras con participación comunitaria.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL INDICADOR
Iniciativa OPC. N° iniciativas ejecutadas que fueron propuestas por la comunidad / N° iniciativas propuestas	0/3*100=100%	1	Informe periódico de actividades donde se presente el número de proyectos a desarrollar y las comunidades vinculadas	Indicador sujeto al plan de inversión social, por lo cual se iniciará proceso de concertación en el mes de septiembre.

6.2.3 Subprograma 6.3: Seguimiento y control Apoyo a la capacidad productiva y negocios verdes.

Objetivo del subprograma:

Verificar el fortalecimiento de los procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos productivos con responsabilidad social y buenas prácticas ambientales.

Tabla 12. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
		Inicio de actividades programadas para el mes de septiembre.

Tabla 13. Subprograma 6.3. Seguimiento y control Apoyo a la capacidad productiva y negocios verdes.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL INDICADOR
Proyectos productivos. N° de proyectos productivos implementados / N° de proyectos productivos identificados con la comunidad	0/0*100=100%	1	Informe periódico de actividades donde se presente el número de proyectos a desarrollar y las comunidades vinculadas	Indicador sujeto al plan de inversión social, por lo cual se iniciará proceso de concertación en el mes de septiembre.
Capacitaciones productivas. N° actividades del plan de capacitación culminadas / N° actividades del plan de capacitación planteadas	0/0*100=100%	50%	Plan de trabajo y certificaciones de las capacitaciones entregadas	

6.3 PROGRAMA 7: COMUNIDADES ÉTNICAS, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERÉS SOCIOCULTURAL.

Objetivo del programa:

En el programa de seguimiento y control a las medidas de manejo de comunidades étnicas con determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa, preservación de patrimonio y sitios de interés sociocultural, orientadas a la prevención, mitigación, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial que no requieren licencia ambiental, se formulan una serie de actividades e indicadores que le facilitarán al contratista la identificación temprana de riesgos y posibles incumplimientos a las metas establecidas, así como la definición de procedimientos o actuaciones de ajuste y/o rectificación.

6.3.1 Subprograma 7.1: Seguimiento y control al Programa de Arqueología Preventiva.

Objetivo del subprograma:

Verificar el cumplimiento de las fases del Programa de Arqueología Preventiva para garantizar la salvaguardia, conservación, recuperación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio arqueológico.

Tabla 14. Seguimiento y control al Programa de Arqueología Preventiva.

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ACTIVIDAD
23/08/2023	CCV-ICANH-138-779-2023	Se realizo solicitud ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, de concepto técnico sobre afectación al patrimonio arqueológico e histórico en el marco de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META". **VER ANEXO 7.1 OFICIO CONSULTA AL ICANH**
30/10/2023	*2023162000107831* ICANH - 2023162000107831 No.	Teniendo como base la respuesta emitida por Instituto Colombiano de Antropología e Historia, no se registra e implementar un Programa de

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ACTIVIDAD
	Entrada 2023184200094132	Arqueología Preventiva ante la entidad, para este programa. **VER ANEXO 7.1 OFICIO RESPUESTA CONSULTA ICANH**

Tabla 15. Subprograma 7.1 Seguimiento y control Programa de Arqueología Preventiva.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL INDICADOR
Verificación de las consultas realizadas a las entidades competentes sobre la existencia de BICs BICs= N° respuestas obtenidas / N° de consultas realizadas	1/1*100=100 %	100%	Registro de las consultas realizadas.	Se da cumplimiento al indicador donde se realizó consulta al ICANH y se obtiene como respuesta que NO se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad. Mediate el siguiente comunicado: *2023162000107831 ICANH - 2023162000107831 No. Entrada 2023184200094132
Validación de registro de actividades de divulgación pública **Capacitaciones =**	0/0*100=100 %	50%	Registro de actividades de divulgación	Teniendo como base la respuesta del ICANH: "NO se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un Programa de

N° personal asistente / N° personal contratado				Arqueología Preventiva ante esta entidad". No se programa ni se realiza actividad no se formula plan de arqueología preventiva.

6.3.2 Subprograma 7.2: Seguimiento y control a la protección al patrimonio arqueológico.

Objetivo del subprograma:

Verificar promoción de la protección y apropiación de los bienes de interés cultural existentes en las áreas de intervención y de influencia de los proyectos y evitar su alteración y/o destrucción.

No se desarrolla este subprograma ya que no aplica para el proyecto, Teniendo como base la respuesta emitida por Instituto Colombiano de Antropología e Historia, no se registra e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante la entidad, para este programa.

6.3.3 Subprograma 7.3: Seguimiento y control a la protección del patrimonio geológico y paleontológico.

Objetivo del subprograma:

Verificar el cumplimiento del subprograma de protección al patrimonio geológico y paleontológico.

No se desarrolla este subprograma ya que no aplica para el proyecto, Teniendo como base la respuesta emitida por Instituto Colombiano de Antropología e Historia, no se registra e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante la entidad, para este programa.

6.3.4 Subprograma 7.4: Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e informada con comunidades étnicas.

Objetivo del subprograma:

Verificar el cumplimiento a las directrices establecidas por el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de consulta previa, en caso de que se determine la procedencia y oportunidad de la consulta previa en el marco del proyecto.

Tabla 16. Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e informada con comunidades étnicas.

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ACTIVIDAD
13/07/2023	CCV-MIN-088-779-2023	Solicitud certificación de presencia de comunidades negras, indígenas raizales o palenqueras.
7/11/2023	CCV-MIN-088-779-2023	El contratista realizo consulta ante el ministerio del interior.
12/11/2023	2023-2-002410-059504 Id: 248677 Folios: 4 Fecha: 2023-12-11 12:48:17	Respuesta a radicado 2023-1-004044-083985 id: 229180 del 7 de noviembre de 2023. Solicitud información adicional para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"
26/02/2024	2024 2024-1-004044-014139 Id: 288131	Se realizo solicitud ante El Ministerio Del Interior mediante el cual se solicitó determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa para proyectos obras y actividades, para el proyecto denominado.
8/04/2024		Se realizo reunión virtual, aclararon inquietudes técnicas del proyecto.
17/07/2024	CCV-MIN-550-779-2023	Asunto: Determinación de procedencia o no procedencia de consulta previa para el proyecto 779 del 2022. En atención al radicado numero de 2024 2024-1-004044-014139 id 288131 del 26 de febrero, Ante El Ministerio Del Interior mediante el cual se solicitó

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ACTIVIDAD
		determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa para proyectos obras y actividades, para el proyecto denominado. "MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META", y teniendo como base la reunión virtual realizada del día lunes 8 de abril del presente año a las 10:00 am, donde se aclararon inquietudes técnicas del proyecto.
		Se enviará oficio en septiembre para continuar con el proceso para la determinación de procedencia o no procedencia de consulta previa del proyecto de la referencia.

VER ANEXO 7.4 OFICIOS CONSOLIDADOS

Tabla 17. Subprograma 7.4 Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e informada con comunidades étnicas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL INDICADOR
Verificación de las consultas realizadas a las entidades competentes sobre N° respuestas obtenidas / N° de consultas realizadas	1/1*100=100%	100%	Registros de consulta	Se da cumplimiento al indicador donde el contratista realiza consulta al ministerio del interior, a la fecha el ministerio no ha emitido concepto, ya que solicito información adicional, la cual fue enviada el 17 de julio del 2024.
Validar la respuesta al 100% de inquietudes que Manifiesten las comunidades consultadas y que estén relacionadas	0/0*100=100%	100%	Informe periódico de actividades donde se describa la totalidad de inquietudes presentadas y la respuesta dada para su atención.	Teniendo presente que aún no hay un concepto emitido No se programa ni se realiza actividad.

con el proyecto para una adecuada identificación de impactos y de medidas de manejo. N° Repuestas atendidas / N° inquietudes presentadas				
Revisar la suscripción de actas de acuerdos protocolizados con tiempos, costos y gestiones necesarios para su cumplimiento. N° Recuerdos cumplidos / N° Acuerdos suscritos	0/0*100=100%	100%	Actas de acuerdos suscritos y registro de asistencia a las reuniones de verificación de cumplimiento de los acuerdos.	Teniendo presente que aún no hay un concepto emitido No se programa ni se realiza actividad.

6.4 PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el Programa de Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través del establecimiento de los lineamientos para el acompañamiento desde la gestión social a las acciones técnicas necesarias a realizarse en predios, redes de servicios públicos y el adecuado uso del derecho de vía, para el desarrollo de las actividades constructivas de los proyectos liderados por INVÍAS y AIM.

193

6.4.1 Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

Objetivo del subprograma:

Verificar el registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente (cercas, servicios públicos y comunitarios, entre otros) aledaña a las áreas de intervención de la obra, infraestructura de uso temporal del contratista y en el derecho de vía, previo al inicio de cualquier actividad técnica del proyecto

Tabla 18. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
8, 10, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 28, 29 y 31 de agosto del 2024	Vereda Yavia, Casco Urbano	Contratista Comunidad	Se realizo verificación de permisos de intervención voluntaria en predios, los cuales corresponden al tramo 2 del corredor vial, levantamiento acta de compromiso para correr cercas. El consorcio adelanta actividades en predios ubicados entre el K0+00 al k2+00 donde se realiza reubicación temporal de cercas. Se realizaron visitas a predios, recorrido en corredor vial, verificación de compromisos con propietarios de predios, verificación - seguimiento en predios que han solicitado donación de material de excavación y verificación de afectaciones presentadas en la red eléctrica veredal.
Agosto 2024	Vereda Yavia	Contratista Propietarios predios	Se realiza donación de material de excavación en el predio la Gran Vía y Predio de la asociación de porcicultores, donación que fue autorizada por la alcaldía municipal y enviada para aprobación a interventoría. **Ver registro fotográfico y ANEXO 8.1 DOCUMENTACIÓN DE LOS PREDIOS.**
Agosto 2024	Vereda Versalles	Contratista Propietarios predios	Se proyecto realizar levantamiento del acta de vecindad de la construcción que está realizando la asociación MACAU, (construcción nueva sobre el corredor vial). Actividad programada para la primera

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
			semana de septiembre del 2024, en el marco de la reunión de la asociación.

No se presentan afectaciones en infraestructura ni en predios, No aplican actividades para el periodo reportado.

Tabla 19. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.° de actas de vecindad realizadas / N° total de actas de vecindad construcciones aledañas *100	28/28*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador.
N° afectaciones subsanadas / N° afectaciones presentadas	0/0*100=0%	0%	60%	1 mes	No se presentan afectaciones en la infraestructura.

6.4.2 Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.

Objetivo del subprograma:

Verificar la generación y/o formulación de estrategias de apoyo interinstitucional con autoridades locales y otras entidades de relevancia en el área de influencia del proyecto, orientadas a promover la recuperación del derecho de vía de las carreteras a intervenir.

Tabla 20. Información de actividades realizadas en el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
12 marzo del 2024	Casco Urbano	Alcaldía	En el área de influencia no se cuentan con unidades económicas ubicadas en la franja vial. De igual forma el 12 de marzo se radico oficio CCV-ALC-402-779-2023, solicitando articulación para realizar socialización de la ley 1228 y la recuperación del espacio público con actores sociales en el área de influencia del proyecto. A la fecha no se cuenta con respuesta por parte de la administración, 31 agosto 2024.

Tabla 21. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
Base de datos actualizada	1/1*100=100%	1	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición anual.
N° de asistentes a reunión / N° de reuniones programadas	2/2*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición trimestral.
N° actas de compromiso elaboradas / N° actas de compromiso ejecutadas	0/0*100=0%	100%	1 mes	Para el periodo reportado no se realizan actas de compromiso.

196

6.4.3 Subprograma 8.3: Seguimiento y control al acompañamiento de la gestión socio predial.

Objetivo del subprograma:

Verificar el acompañamiento desde la gestión social a las unidades sociales intervenidas por la ejecución del proyecto, en el marco de la adquisición predial para la ejecución de la obra.

No se desarrolla este subprograma ya que el proyecto no cuenta con item y recurso de la gestión socio predial.

6.5 PROGRAMA 9: ACCESIBILIDAD.

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el programa de accesibilidad se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la garantía de la accesibilidad de la población e integración territorial en torno a este tipo de proyectos.

6.5.1 Subprograma 9.1: Seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial.

Objetivo del subprograma:

Verificar la promoción de alternativas de acceso y generación de acciones que minimicen las afectaciones sobre la movilidad de la población y el intercambio de bienes y servicios.

Tabla 22. Seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
21 al 31 de agosto del 2024.	Redes sociales	Comunidad y usuarios de la vía.	Se realizo difusión de información del traslado de la circulación de la vía existente en el sector de la asociación de mujeres campesinas MACAU hacia la vía en

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
			construcción mediante el contrato 779 del 2022. Donde se habilitará circulación por el tramo nuevo en el K0+060, desde el 2 de septiembre del 2024. **VER IMAGEN DE DIFUSION**
			Se proyecta radicar oficio informando los cambios en la movilidad del corredor vial Yavia – Papamene, a la administración municipal y participar en programa radial de la emisora Colombia Estéreo para difundir información en el mes de septiembre. Los cambios en el corredor vial son: Traslado de la circulación de la vía existente en el sector de la asociación de mujeres campesinas MACAU hacia la vía en construcción mediante el contrato 779 del 2022.
			Se proyectan actividades y reuniones para el mes de septiembre.

Tabla 23. Indicador del subprograma 9.1 Seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL INDICADOR
Verificación de la suscripción de actas de gestión con instituciones relacionadas con la accesibilidad y conectividad **Actas Transit** N° actas suscritas con las instituciones	0/0*100=100%	100%	Actas de gestión suscritas con las instituciones relacionadas con la accesibilidad y conectividad en el área del proyecto	. Proyectada para el mes de septiembre

/ N° instituciones vinculadas con la movilidad				
Validación de inventarios de infraestructura de transporte vial y transitabilidad por frente de trabajo **Infraestructura** N° infraestructura intervenida por propietario / N° infraestructura existente	0/0*100=100%	100%	Actas de inventarios de infraestructura de transporte existente	Proyectada para el mes de septiembre
Revisión de la convocatoria a los actores en el territorio para fines de diagnóstico de movilidad. **Convocatoria** N° actores sociales participantes / N° actores territoriales convocados	0/0*100=100%	100%	Actas de reunión y bitácoras de trabajo participativo en donde se evidencian los requerimientos en temas de movilidad de los actores.	Proyectada para el mes de septiembre
Confirmación de la incorporación de los requerimientos de los actores en los Planes de	0/0*100=100%	100%	Actas de reunión y bitácoras de trabajo participativo y el PMT del proyecto.	Proyectada para el mes de septiembre

Manejo de Tránsito del proyecto **PMT:** N° Necesidades incorporadas en el PMT / N° Necesidades identificadas por los actores				

6.6 PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el programa de participación, gobernanza e inclusión social se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la garantía de la ejecución de procesos de información, participación y promoción de la organización comunitaria en torno a los proyectos de infraestructura vial. Además, se estipulan los enfoques de género, de derechos y diferencial como ejes transversales de la gestión socio ambiental de los proyectos.

6.6.1 Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.

Objetivo del subprograma:

Verificar el funcionamiento del sistema de atención y respuesta oportuna y eficaz a las manifestaciones (quejas, solicitudes, reclamos, peticiones, sugerencias, denuncias, etc.), interpuestas por comunidades y autoridades mediante los medios dispuestos para esto (correo electrónico, llamada telefónica, personalmente, entre otros).

1.1.1.1 ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO.

200

33591

Durante el periodo reportado se reciben 5 PQRS, se cuenta con 6 PQRS abiertas las cuales están en trámite, se tiene una PQRS abierta desde las Mes de mayo presentada por la JAC de la vereda Papamene que corresponde al asunte de apoyo en mantenimiento en puntos específicos de la vía en la vereda Papamene, la cual esta en tramite y proceso de aprobación por interventoría.

Tabla 24. Estado actual de las PQRS del proyecto

ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO			
MES /AÑO	**PRESENTADAS**	**ABIERTAS**	**CERRADAS**
Mayo 2023	0	0	0
Junio 2023	1	1	0
Julio 2023	0	0	0
Agosto 2023	0	0	0
Septiembre 2023	0	0	0
Octubre 2023	2	1	1
Noviembre 2023	3	2	1
Diciembre 2023	1	2	1
Enero 2024	0	1	0
Febrero 2024	0	1	0
Marzo 2024	0	1	0
Abril 2024	0	1	0
Mayo 2024	1	1	0
Junio 2024	0	1	0
Julio 2024	1	2	0
Agosto 2024	5	6	0

Tabla 25. Seguimiento PQRS del proyecto.
