INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°7

CONTRATO No. 414 DE 2023

EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 7

INTERVENTORÍA
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATISTA
CONSORCIO HORNILLAS 2023

CONTRATO DE OBRA No. 418 DE 2023

OBJETO

REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072

JUNIO DE 2024

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	418 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023
	NIT. 901.759.999-9
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
	C.C. 12.254.234 expedida en Algeciras
INTERVENTORIA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	EDINSON SUAZA HÉNDEZ
	C.C. 1.075.251.099 expedida en Neiva
OBJETO CONTRATO DE OBRA	REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($3.877.061.293,00) MCTE. INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 04 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 03 DE 2024

1.2. PÓLIZAS

Póliza suscripción

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 61-44-101051437			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/10/2023	13/02/2025	$1.163.118.387,90
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	13/10/2023	13/08/2027	$ 387.706.129,30
CALIDAD DEL SERVICIO	13/10/2023	13/02/2025	$ 775.412.258,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia a partir de la firma del acta de recibo final (5 años)		$1.163.118.387,90
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
POLIZA No. 61-40-101018719			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	13/10/2023	13/08/2024	$ 464.000.000,00

Póliza acta de inicio

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 61-44-101051437			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2023	06/04/2025	$1.163.118.387,90
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/12/2023	04/10/2027	$ 387.706.129,30
CALIDAD DEL SERVICIO	04/12/2023	06/04/2025	$ 775.412.258,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia a partir de la firma del acta de recibo final (5 años)		$1.163.118.387,90
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
POLIZA No. 61-40-101018719			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	04/12/2023	04/10/2024	$ 464.000.000,00

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	414 DE 2023
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
CONTRATISTA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	EDINSON SUAZA HÉNDEZ
	C.C. 1.075.251.099 expedida en Neiva
SUPERVISOR	ING. LAURA MARIA GONZALEZ C.
OBJETO	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($449.985.033,96) M/CTE., INCLUIDO LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 04 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 03 DE 2024

2.2. PÓLIZAS

Póliza suscripción

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 560-47-994000169417			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	05/10/2023	10/02/2025	$134.995.510,19
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05/10/2023	10/08/2027	$134.995.510,19
CALIDAD DEL SERVICIO	05/10/2023	05/10/2028	$134.995.510,19

Póliza acta de inicio

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 560-47-994000169417			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	04/12/2023	11/04/2025	$134.995.510,19
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	04/12/2023	09/10/2027	$134.995.510,19
CALIDAD DEL SERVICIO	04/12/2023	04/12/2028	$134.995.510,19

3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 418 de 2023 se desarrollará en la zona urbana de los municipios de Acevedo, Aipe, Algeciras, Baraya, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, Santa María y Suaza, de acuerdo a la siguiente distribución:

No.	MUNICIPIO	No. DE HORNILLAS
1	ACEVEDO	191
2	AIPE	33
3	ALGECIRAS	88
4	BARAYA	54
5	GUADALUPE	94
6	IQUIRA	103
7	ISNOS	38
8	LA ARGENTINA	107
9	LA PLATA	247
10	NATAGA	7
11	PAICOL	25
12	PALESTINA	120
13	PITALITO	173
14	SALADOBLANCO	40
15	SANTA MARIA	100
16	SUAZA	134
TOTAL		**1554**

Tabla 1. Distribución de hornillas contrato de obra No. 418 de 2023

En relación a lo anterior, dentro del marco del contrato de obra No. 418 de 2023 se desarrollará la construcción de 1554 hornillas ecoeficientes.

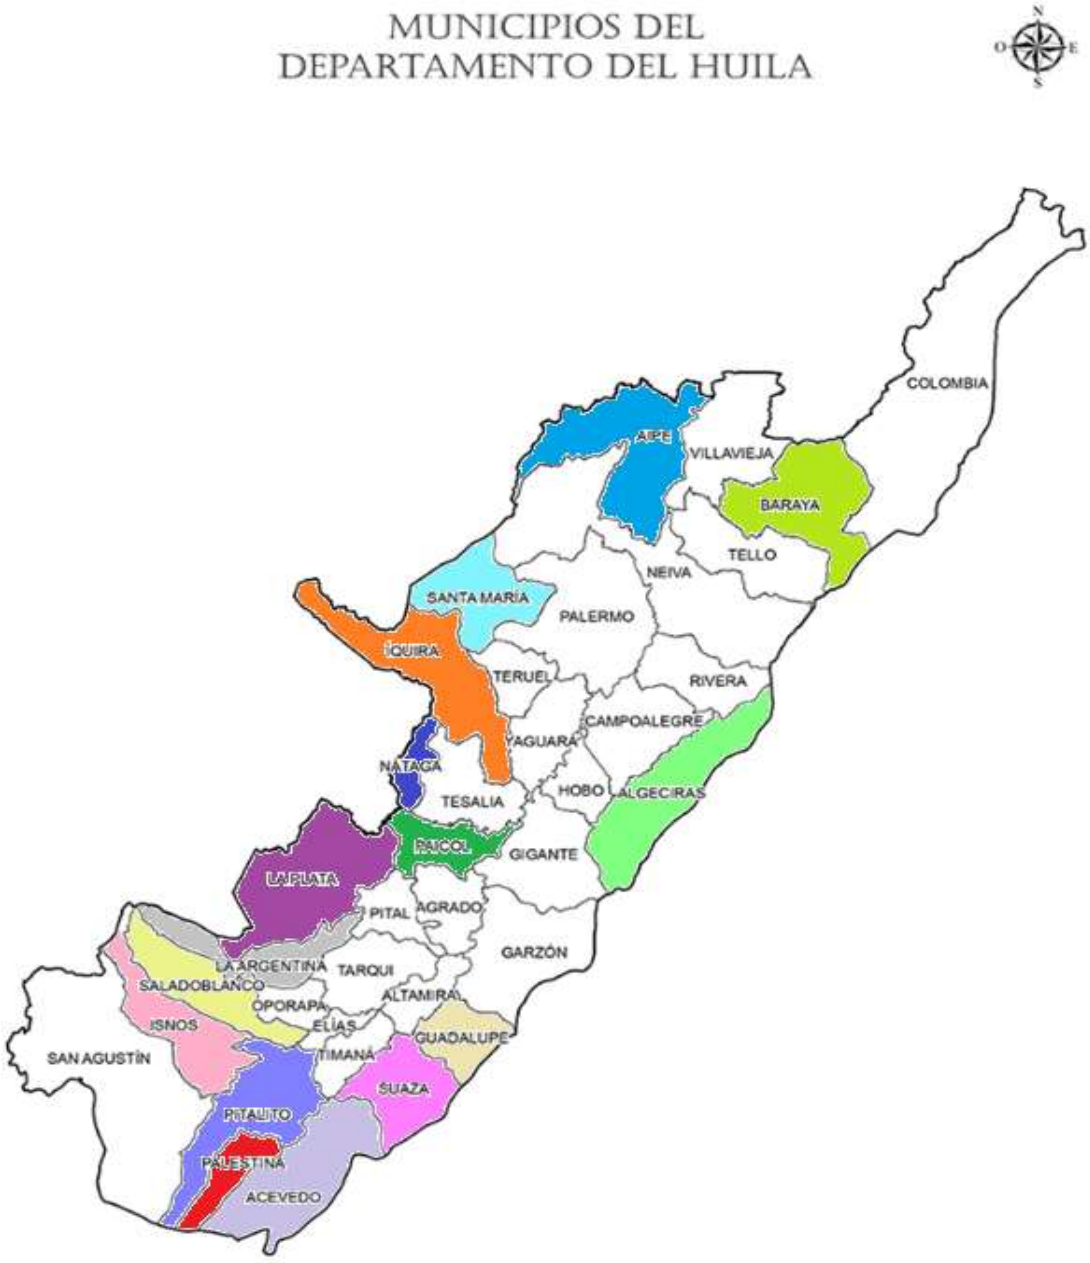


Imagen No 1. Localización proyecto hornillas ecoeficientes

4. AVANCE CONTRATO DE OBRA

Las actividades ejecutadas por el contratista se realizaron con personal idóneo conforme a lo ofertado, garantizando la correcta ejecución de los procesos, donde realizó verificación de los sitios de obra y actualización de información según lo requerido en la etapa de sensibilización contemplada en el contrato de obra No. 418 de 2023.

Durante el período informado se presenta el siguiente avance:

% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% FINANCIERO
77,42 %	39,72 %	30,77%

4.1. CONTROL DE PERSONAL

El contratista dispone del personal que se relaciona a continuación, sobre el cual se realiza el control respectivo:

Nombre	Cargo/Actividad	EPS	ARP	ARL
Oscar Iván Reinoso Merchán	Residente de obra	Salud Total	Colfondos	Positiva
Viviana Lizeth Hernández Rodríguez	Auxiliar administrativo	Sanitas	Colpensiones	Positiva
Jhon Alex Torres Delgado	Técnico	Sanitas	Porvenir	Positiva
Cristian David Hernández Borbón	Técnico	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Diego Alberto Bernal Lozano	Técnico	Nueva EPS	Protección	Positiva
Carlos Alberto González Giraldo	Técnico	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva
César Octavio Agudelo Polanía	Realizar construcción de hornillas	Nueva EPS	Colfondos	Positiva
Carlos Prias Vásquez	Realizar construcción de hornillas	Sanitas	Porvenir	Positiva
Yeferson Ramírez Sánchez	Realizar construcción de hornillas	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Esneider Vásquez Sabogal	Realizar construcción de hornillas	Sanitas	Protección	Positiva
Fender Andrés Parra	Maestro constructor	Sanitas	Protección	Positiva
Lester Segura Losada	Realizar construcción de hornillas	Sanitas	Protección	Positiva
Luis Orfidio Escobar Torres	Maestro constructor	Nueva EPS	Colfondos	Positiva
Orlando Chávez Rodríguez	Maestro constructor	AIC	Porvenir	Positiva
Anderson Avilez Alarcón	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Enrique Valderrama Molina	Ayudante	Nueva EPS	Protección	Positiva
José Oliver Escobar Torres	Ayudante	AIC	Porvenir	Positiva
Edinson Bustos Herrera	Ayudante	Sanitas	Protección	Positiva
Luis Miguel Bermúdez Hernández	Ayudante	Nueva EPS	Protección	Positiva
Ariz Fabián Papamija Calambas	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Jair Rivera Hernández	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Yilber Alexis Valderrama Perdomo	Ayudante	Asmet Salud	Porvenir	Positiva

4.2. EJECUCIÓN FINANCIERA

A la fecha se reporta un avance financiero del 30,77**%** de ejecución del contrato de obra No. 418 de 2023, toda vez que conforme a la Cláusula Cuarta. Forma de pago, se realizará un pago total del recurso asignado para la etapa de sensibilización con la presentación de un informe donde conste la verificación y validación de cumplimiento de requisitos y parámetros técnicos de los 1554 beneficiarios.

ITEM	CONDICIONES INICIALES		EJECUCION FINANCIERA				
			VALOR CONTRACTUAL			EJECUTADO ACUMULADO	
	DESCRIPCION Y/O ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR
1	ETAPA DE PRECONSTRUCCION	GLOBAL	1	$ 70,716,848	$ 70,716,848	0	$ 0
2	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN HORNILLA ECOEFICIENTE)	UNIDAD	1554	$ 2,447,692	$ 3,803,713,523	487	$ 1,192,026,053
3	PLEGABLES	UNIDAD	1554	$ 1,693	$ 2,630,922	487	$ 824,491
				TOTALES	**$ 3,877,061,293**		**$ 1,192,850,544**
					PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION		**30.77%**

5. AVANCE CONTRATO INTERVENTORÍA

La interventoría realiza actividades de seguimiento y de manera conjunta realizan revisión de la documentación que soporta la etapa de sensibilización.

En comité de seguimiento realizado el día 11 de junio de 2024, el contratista informó que hará entrega de 100 kit de materiales adicional a los ya entregados.

En mesa técnica del día 25 de junio del año en curso, la interventoría reiteró la necesidad de hacer entrega del plan de contingencia que permita nivelar el atraso presentado a la fecha y dar cumplimiento al plazo contractual. Así mismo, la supervisión manifestó que el avance de obra a la fecha presenta retrasos en la ejecución y socializó con el contratista y la interventoría, el estado actual y proyección del cumplimiento de las metas propuestas en la programación: en ese sentido, se presume que para finales del mes el atraso en el cronograma estaría alrededor del 7% aproximadamente.

El contratista manifestó que las festividades de San Juan y San Pedro ocasionaron retrasos, toda vez que, pese a que el personal en obra se encontraba disponible, los beneficiarios manifestaron atenderlos después de las mismas.

Con corte a 30 de junio de 2024, se reportó un avance mensual de 76 hornillas construidas distribuidas en los municipios de Pitalito (69) y Saladoblanco (7), para un total de 589 hornillas construidas a la fecha.

5.1. CONTROL DE PERSONAL

Nombre	Cargo/Actividad	EPS	ARP	ARL
Luis Alberto Torres Cuéllar	Director de interventoría	Nueva EPS	Protección	Positiva
Armando Aramendis Sierra	Residente de interventoría 1	Sanitas	Protección	Positiva
Jaime Andrés Guiza Pérez	Residente de interventoría 2	Sanitas	Porvenir	Positiva
Johan Stiben Sánchez Lazo	Inspector 1	Sanitas	Porvenir	Positiva
Yon Geimar Quinayas Peña	Inspector 2	Sanitas	Protección	Positiva
Felipe Adolfo Losada Imbachi	Inspector 3	Sanitas	Porvenir	Positiva
Juan Sebastián Rincón Cortés	Inspector 4	Sanitas	Colpensiones	Positiva
Alexandra Perdomo Gualtero	Auxiliar Administrativo	Sanitas	Porvenir	Positiva

5.2. EJECUCIÓN FINANCIERA

A la fecha el contrato de interventoría No. 414-2023 reporta un avance financiero del 30,77**%** de ejecución, toda vez que la forma de pago contempla por la CAM establece que se cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales en el mismo porcentaje que se realicen los pagos del contrato de obra.


ITEM	CONDICIONES					EJECUCION FINANCIERA					
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA	UND	1	$ 378,138,684.00	$ 378,138,684.00			0.3077	$ 116,341,451	0.3077	$ 116,341,451
				IVA	19.00%	$ 71,846,349.96				**$ 22,104,876**		$ 22,104,876
				VALOR TOTAL		**$ 449,985,033.96**				**$ 138,446,326**		**$ 138,446,326**
										PORCENTAJE EJECUTADO		**30.77%**

6. DOCUMENTOS ANEXOS

Hace parte integral del presente informe:

- Registro fotográfico
- Listado de beneficiarios con coordenadas formato geográficas decimales
- Actas comité técnico
- Correspondencia enviada

Atentamente,



EDINSON SUAZA HÉNDEZ
RL. EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MUNICIPIO DE PITALITO

	
Nombre: Ever Moreno Rodríguez **Vereda:** Agua Negra	**Nombre:** Wilmar Moreno Parra **Vereda:** Agua Negra
	
Nombre: Dany Ancisar Pérez Mosquera **Vereda:** Alto Charguayaco	**Nombre:** Amanda Liliana Pazu Morales **Vereda:** Alto Charguayaco

	
Nombre: Francy Janeth Guachetá Campo **Vereda:** Alto Charguayaco	**Nombre:** Andrés Felipe Bastidas Muñoz **Vereda:** Alto de la Cruz
	
Nombre: Luis Alberto Gómez **Vereda:** Alto Santa Rita	**Nombre:** Luz Marina Quinayas Quinayas **Vereda:** Alto Santa Rita

	
Nombre: Silvino Papamija Anacona **Vereda:** Alto Santa Rita	**Nombre:** Martha Briyith Correa Rivera **Vereda:** Alto Santa Rita
	
Nombre: Jairo Sierra Cortes **Vereda:** Higuerón	**Nombre:** María Stella Pérez Ramírez **Vereda:** Betania

	
Nombre: Flora María Narváez de Santofimio **Vereda:** Betania	**Nombre:** Yivi Jimena Ríos Ochoa **Vereda:** Monte Cristo
	
Nombre: Yan Franco Huelgos López **Vereda:** Cabuyal del Cedro	**Nombre:** Orfa Libia López Montiel **Vereda:** Cabuyal del Cedro

	
Nombre: Lizley Reyes Rivera **Vereda:** Chillurco	**Nombre:** Romelia Martínez Cabrera **Vereda:** Chillurco
	
Nombre: Yineth María Bolaños Hernández **Vereda:** Chillurco	**Nombre:** Andrea Meneses Martínez **Vereda:** Chillurco

	
Nombre: Yeimy Yohana Arias Martínez **Vereda:** Las Granjas	**Nombre:** Diana Milena Collazos Pujimuy **Vereda:** Chircal
	
Nombre: Angie Milena Zúñiga Samboni **Vereda:** Chircal	**Nombre:** María Midia Samboni Buesaquillo **Vereda:** Chircal

	
Nombre: Libardo Zúñiga **Vereda:** Chircal	**Nombre:** Luz Mery Murcia Ortega **Vereda:** Criollo
	
Nombre: Patricia Calderón Torres **Vereda:** Criollo	**Nombre:** Anael Betancourt Mosquera **Vereda:** El Pedregal

	
Nombre: Jenny Puerto Pacheco **Vereda:** El Recuerdo	**Nombre:** Fanny Córdoba Ñañez **Vereda:** El Recuerdo
	
Nombre: María Deyanira Córdoba Ñañez **Vereda:** Esperanza	**Nombre:** Yohana Ñañez Muñoz **Vereda:** Esperanza

	
Nombre: Bertha Ramírez Beltrán **Vereda:** Higuerón	**Nombre:** Ana Beiba Imbachi Trilleras **Vereda:** Miravalle
	
Nombre: Luis Isidro Labrador González **Vereda:** Miravalle	**Nombre:** María Gladis Piamba Aguilar **Vereda:** Miravalle

	
Nombre: Orfilia Guzmán Yara **Vereda:** Girasol	**Nombre:** Sandra Liliana Ordoñez Hernández **Vereda:** Girasol
	
Nombre: Eliseo Hernández Chimbaco **Vereda:** Girasol	**Nombre:** Esther Fanny Martínez Losada **Vereda:** Girasol

	
Nombre: Gustavo Vega Ramos **Vereda:** Las Granjas	**Nombre:** Mayerli Muñoz Palomino **Vereda:** Hacienda Laboyos
	
Nombre: Yemirly Narváez Lasso **Vereda:** La Guandinosa	**Nombre:** Cristian Fabian Córdoba Bolaños **Vereda:** La Hacienda

	
Nombre: Martha Clelia Ovalle Cruz **Vereda:** Las Brisas	**Nombre:** Silvio Samboni **Vereda:** Las Brisas
	
Nombre: Nohemy Valencia Vinasco **Vereda:** Las Brisas	**Nombre:** Carlos Torres Hernández **Vereda:** Las Granjas

	
Nombre: Segundo Marcial Gómez Ojeda **Vereda:** Las Granjas	**Nombre:** Silvio Chilito Chimonja **Vereda:** Miraflores
	
Nombre: Wilson Hernán Alvarez Jojoa **Vereda:** Miraflores	**Nombre:** Diana Carolina Samboni Silva **Vereda:** Miravalles

	
Nombre: Jaqueline Ruiz Muñoz **Vereda:** Normandía	**Nombre:** Isis Aurora Valle Garzón **Vereda:** Normandía
	
Nombre: Lilia Hermencia Hoyos Hoyos **Vereda:** Resinas	**Nombre:** José Alexander Vargas Zúñiga **Vereda:** Resinas

	
Nombre: Luz Dary Cleves **Vereda:** Resinas	**Nombre:** Nora Camacho Salinas **Vereda:** Regueros
	
Nombre: Edith Cruz Camacho **Vereda:** Regueros	**Nombre:** Lili Arcos Ordoñez **Vereda:** Rincón de Contador

	
Nombre: Flor Yisela Santofimio Diaz **Vereda:** San Francisco	**Nombre:** Ancizar Augusto Bermeo Rivera **Vereda:** San Francisco
	
Nombre: Ricardo Rojas Molina **Vereda:** San Francisco	**Nombre:** Duberney Ortiz Perdomo **Vereda:** Santa Inés

	
Nombre: Alberto González González **Vereda:** Vegas de Alumbre	**Nombre:** Yuri Alejandra Córdoba Hurtado **Vereda:** Vegas de Alumbre
	
Nombre: Isaac Muñoz Puentes **Vereda:** Vegas de Alumbre	**Nombre:** Evangelina Villota Ordoñez **Vereda:** Vegas de Alumbre



Nombre: Eliana Fernanda González León
Vereda: Vegas de Alumbre

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

	
Nombre: Mariela Sánchez de Ríos **Vereda:** Palma	**Nombre:** Ricardo Guzmán **Vereda:** Palma
	
Nombre: Alfonso Peña Muñoz **Vereda:** Palma	**Nombre:** Jaime Peña Muñoz **Vereda:** Palma



Nombre: Marcos Triana Becerra
Vereda: Palma



Nombre: Carlos Tulio Peña Sterling
Vereda: Pitas



Nombre: Rodolfo Esterling Hoyos
Vereda: Pitas

LISTADO BENEFICIARIOS CON COORDENADAS

No.	CÓDIGO	MUNICIPIO	VEREDA	NOMBRE USUARIO	CÉDULA	X	Y
1	1110	Pitalito	Agua Negra	Ever Moreno Rodriguez	96,351,085	- 75.998530	1.867060
2	1112	Pitalito	Agua Negra	Wilmar Moreno Parra	83,215,971	- 75.998800	1.867600
3	1113	Pitalito	Alto Charguayaco	Dany Ancisar Perez Mosquera	1,083,897,580	- 76.034700	1.778600
4	1114	Pitalito	Alto Charguayaco	Amanda Liliana Pazu Morales	1,083,911,412	- 76.034500	1.779200
5	1115	Pitalito	Alto Charguayaco	Francy Janeth Guacheta Campo	1,067,462,014	- 76.034310	1.778350
6	1117	Pitalito	Alto De La Cruz	Andres Felipe Bastidas Muñoz	1,080,936,342	- 76.165600	1.754000
7	1122	Pitalito	Alto Santa Rita	Luis Alberto Gomez	12,281,163	- 76.013100	1.794900
8	1123	Pitalito	Alto Santa Rita	Luz Marina Quinayas Quinayas	36,288,124	- 76.013320	1.795930
9	1124	Pitalito	Alto Santa Rita	Silvino Papamija Anacona	12,238,144	- 76.013250	1.797150
10	1126	Pitalito	Alto Santa Rita	Martha Briyith Correa Rivera	36,291,441	- 76.017480	1.796840
11	1127	Pitalito	Higueron	Jairo Sierra Cortes	12,231,529	- 76.019800	1.833900
12	1133	Pitalito	Betania	Maria Stella Perez Ramirez	36,274,047	- 76.093500	1.803200
13	1134	Pitalito	Betania	Flora Maria Narvaez De Santofimio	36,271,960	- 76.090790	1.800980
14	1135	Pitalito	Monte Cristo	Yivi Jimena Rios Ochoa	1,079,389,125	- 76.211200	1.705900
15	1138	Pitalito	Cabuyal Del Cedro	Yan Franco Huelgos Lopez	1,083,919,408	- 76.129300	1.790700
16	1139	Pitalito	Cabuyal Del Cedro	Orfa Libia Lopez Montiel	52,432,752	- 76.131000	1.795600
17	1146	Pitalito	Chillurco	Lizley Reyes Rivera	12,262,664	- 76.144620	1.888000
18	1147	Pitalito	Chillurco	Romelia Martinez Cabrera	36,275,917	- 76.143570	1.891620
19	1148	Pitalito	Chillurco	Yineth Maria Bolaños Hernandez	1,083,895,052	- 76.144900	1.890900
20	1149	Pitalito	Chillurco	Andrea Meneses Martinez	36,287,371	- 76.148000	1.884100
21	1150	Pitalito	Las Granjas	Yeimy Yohana Arias Martinez	1,083,872,243	- 76.129643	1.881032
22	1151	Pitalito	Chircal	Diana Milena Collazos Pujimuy	1,083,866,110	- 76.093300	1.925500
23	1152	Pitalito	Chircal	Angie Milena Zuñiga Samboni	1,007,284,796	- 76.081750	1.935470
24	1153	Pitalito	Chircal	Maria Midia Samboni Buesaquillo	36,282,048	- 76.081940	1.935210
25	1154	Pitalito	Chircal	Libardo Zuñiga	83,160,579	- 76.079350	1.937450
26	1157	Pitalito	Criollo	Luz Mery Murcia Ortega	1,083,865,152	- 76.149100	1.856900
27	1159	Pitalito	Criollo	Patricia Calderon Torres	1,083,881,780	- 76.150337	1.853696
28	1166	Pitalito	El Pedregal	Anael Betancourt Mosquera	36,280,284	- 76.135526	1.891633
29	1167	Pitalito	El Recuerdo	Jenny Puerto Pacheco	1,090,380,940	- 76.139500	1.844800
30	1168	Pitalito	El Recuerdo	Fanny Corboba Ñañez	36,277,693	- 76.143600	1.847200
31	1170	Pitalito	Esperanza	Maria Deyanira Cordoba Ñañez	26,550,511	- 76.220420	1.747640
32	1171	Pitalito	Esperanza	Yohana Ñañez Muñoz	1,083,874,386	- 76.219500	1.742700
33	1173	Pitalito	Higueron	Bertha Ramirez Beltran	36,290,881	- 76.015460	1.834100
34	1178	Pitalito	Miravalle	Ana Beiba Imbachi Trilleras	36,286,172	- 76.065110	1.919440
35	1179	Pitalito	Miravalle	Luis Isidro Labrador Gonzalez	12,222,488	- 76.066400	1.921400
36	1181	Pitalito	Miravalle	Maria Gladis Piamba Aguilar	36,294,712	- 76.065710	1.907530
37	1182	Pitalito	Girasol	Orfilia Guzman Yara	38,203,986	- 76.069300	1.928900
38	1183	Pitalito	Girasol	Sandra Liliana Ordoñez Hernandez	53,119,467	- 76.072820	1.930210
39	1184	Pitalito	Girasol	Eliseo Hernandez Chimbaco	4,923,542	- 76.068900	1.930100
40	1185	Pitalito	Girasol	Esther Fanny Martinez Losada	36,293,832	- 76.068000	1.932200
41	1187	Pitalito	Las Granjas	Gustavo Vega Ramos	12,228,425	- 76.131410	1.887310
42	1188	Pitalito	Hacienda Laboyos	Mayerli Muñoz Palomino	1,083,911,693	- 76.102870	1.848220
43	1198	Pitalito	La Guandinosa	Yemirly Narvaez Lasso	55,216,707	- 76.176700	1.788800
44	1200	Pitalito	La Hacienda	Cristian Fabian Cordoba Bolaños	1,083,889,948	- 76.201180	1.771410
45	1207	Pitalito	Las Brisas	Martha Clelia Ovalle Cruz	26,553,770	- 76.155690	1.748080
46	1208	Pitalito	Las Brisas	Silvio Samboni	12,370,107	- 76.153500	1.747400
47	1209	Pitalito	Las Brisas	Nohemy Valencia Vinasco	1,083,875,850	- 76.156500	1.747800
48	1211	Pitalito	Las Granjas	Carlos Torres Hernandez	1,119,213,435	- 76.127295	1.880165
49	1213	Pitalito	Las Granjas	Segundo Marcial Gomez Ojeda	5,336,947	- 76.130300	1.883200
50	1215	Pitalito	Miraflores	Silvio Chilito Chimunja	4,756,525	- 76.214530	1.784810
51	1216	Pitalito	Miraflores	Wilson Hernan Alvarez Jojoa	83,216,002	- 76.222600	1.783600
52	1218	Pitalito	Miravalles	Diana Carolina Samboni Silva	1,083,894,721	- 76.065840	1.931760
53	1233	Pitalito	Normandia	Jaqueline Ruiz Muñoz	36,281,019	- 76.191520	1.799890
54	1234	Pitalito	Normandia	Isis Aurora Valle Garzon	1,144,132,195	- 76.193200	1.802400
55	1255	Pitalito	Resinas	Lilia Hermencia Hoyos Hoyos	36,382,085	- 76.033680	1.752300
56	1257	Pitalito	Resinas	Jose Alexander Vargas Zuñiga	12,240,862	- 76.032600	1.752500
57	1258	Pitalito	Resinas	Luz Dary Cleves	26,437,216	- 76.031300	1.749400
58	1261	Pitalito	Regueros	Nora Camacho Salinas	36,285,807	- 76.027700	1.911000
59	1262	Pitalito	Regueros	Edith Cruz Camacho	36,293,801	- 76.027100	1.911900
60	1266	Pitalito	Rincon De Contador	Lili Arcos Ordoñez	36,285,374	- 76.093320	1.867290
61	1267	Pitalito	San Francisco	Flor Yisela Santofimio Diaz	36,292,217	- 76.112270	1.823430
62	1269	Pitalito	San Francisco	Ancizar Augusto Bermeo Rivera	1,083,872,064	- 76.098190	1.841740
63	1270	Pitalito	San Francisco	Ricardo Rojas Molina	1,075,213,732	- 76.098240	1.841750
64	1274	Pitalito	Santa Ines	Duberney Ortiz Perdomo	1,083,870,835	- 76.124980	1.801810
65	1275	Pitalito	Vegas De Alumbre	Alberto Gonzalez Gonzalez	4,888,016	- 76.109300	1.922800
66	1276	Pitalito	Vegas De Alumbre	Yuri Alejandra Cordoba Hurtado	1,083,914,751	- 76.108800	1.927900
67	1277	Pitalito	Vegas De Alumbre	Isaac Muñoz Puentes	1,032,412,788	- 76.111400	1.924900
68	1278	Pitalito	Vegas De Alumbre	Evangelina Villota Ordoñez	36,288,390	- 76.114500	1.918200
69	1279	Pitalito	Vegas De Alumbre	Eliana Fernanda Gonzalez Leon	1,083,903,795	- 76.111700	1.922000
70	1294	Saladoblanco	Palma	Mariela Sanchez De Rios	36,270,375	- 76.102200	2.000700
71	1295	Saladoblanco	Palma	Ricardo Guzman	83,028,893	- 76.101700	2.008400
72	1296	Saladoblanco	Palma	Alfonso Peña Muñoz	83,029,059	- 76.099400	2.004600
73	1297	Saladoblanco	Palma	Jaime Peña Muñoz	4,937,707	- 76.098000	2.007100
74	1298	Saladoblanco	Palma	Marcos Triana Becerra	83,029,444	- 76.098200	2.007600
75	1305	Saladoblanco	Pitas	Carlos Tulio Peña Sterling	83,029,726	- 76.083700	2.010900
76	1306	Saladoblanco	Pitas	Rodolfo Esterling Hoyos	1,081,729,673	- 76.085900	2.004800

ACTAS COMITÉ TÉCNICO

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	20	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JUNIO 11 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

La supervsión solicitó ir avanzado en la revisión de papelería para evitar retrazos o demoras en el trámite de actas parciales, tanto de obra como de interventoría. Recalcó la importancia de diligenciar las actas de forma correcta, verificando datos allí contenidos.

La interventoría informó que se viene realizando visitas de verificación de cumplimiento de condiciones técnicas para proceder con el recibo a satisfacción de las mismas.

El contratista presentó el avance a la fecha, manifestando que se encuentran construidas 595 hornillas y que en las próximas semanas realizará entrega de material para 100 nuevas hornillas.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	25/06/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los once (11) días del mes de junio de 2024.			

ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	21	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	JUNIO 25 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
JOHAN STIBEN SÁNCHEZ LAZO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA - TEMAS TRATADOS

La supervisión manifiesta que el avance de obra a la fecha presenta retrasos en la ejecución y socializa con el contratista y la interventoria el estado actual y proyección del cumplimiento de las metas propuestas en la programación: en este sentido se presume que para finales de este mes, estaría presentándose un retraso en el cronograma del 7% aproximadamente, para lo cual se solicita al contratista tomar acciones y a la interventoría realizar el respectivo seguimiento y reporte semanal en las mesas de trabajo del avance de la obra.

El contratista informa que el rendimiento en las 2 últimas semanas de junio ha disminuido, debido a que los beneficiarios han manifestado que por las festividades de San Juan y San Pedro no podrán recibir materiales, generando retrazos en la etapa de construcción y por lo tanto, las metas propuestas no podrán ser cumplidas.

Interventoría reitera la necesidad de entregar un plan de contingencia que permita nivelar el atraso y dar cumplimiento al plazo contractual (3 de octubre de 2024).

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS		
Tema Tratado	**Actividad a desarrollar**	**Responsable**

DOCUMENTOS RECIBIDOS		
Nombre del Documento	**Asunto**	**Tema Relacionado**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	9/07/2024	**Lugar**	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2024.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CO-2023-414-049
Neiva, junio 04 de 2024

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO HORNILLAS 2023
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es “Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072”

Asunto: Comité técnico

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones de interventores del contrato de la referencia, me permito citarlo a comité técnico el día 06 de junio de 2024 a las 2:30 p.m. en la sala de juntas de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM.

Atentamente,

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal - Interventoría

CO-2023-414-050
Neiva, junio 06 de 2024

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO HORNILLAS 2023
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es “Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072”

Asunto: Comité técnico

Cordial saludo.

Nos permitimos reprogramar el comité técnico para el día 11 de junio de 2024 a las 2:30 p.m. en la sala de juntas de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM.

Atentamente,

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal - Interventoría

CO-2023-414-051
Neiva, junio 20 de 2024

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO HORNILLAS 2023
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto "instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072"

Asunto: Avance contrato

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones como interventores del contrato de la referencia y teniendo en cuenta que la cláusula segunda. obligaciones de las partes, capítulo desarrollo y ejecución de la obra establece: "Controlar el avance del contrato de obra, de acuerdo con el cronograma de programación de la obra, previamente presentado por el contratista y aprobado por la Interventoría", esta interventoría considera importante tener en cuenta las siguientes precisiones:

1. El acta de inicio del contrato de obra fue suscrita el 4 de diciembre de 2023.
2. El plazo de ejecución del contrato es de diez (10) meses, por lo cual, la fecha de finalización es el 3 de octubre de 2024.
3. A la fecha se tiene una ejecución física del 38.94%
4. Conforme al cronograma de ejecución de obra propuesta por la firma contratista, la ejecución proyectada a la fecha es de 68.50%.
5. A la fecha se han ejecutado 595 hornillas ecoeficientes, de las 1554 pactadas en el contrato.
6. El promedio de ejecución física semanal es de 40 unidades.
7. El tiempo de ejecución faltante es de aproximadamente 15 semanas.

De acuerdo a lo expuesto, esta interventoría se permite manifestar su preocupación respecto al avance del contrato, toda vez que a la fecha se tiene un atraso en el cronograma del 29.56% y conforme al promedio de ejecución física que se viene llevando a cabo, es necesario que semanalmente se ejecuten un promedio de 64 unidades para llevar a cabo finalización de la ejecución en la fecha pactada.

Por lo anterior, me permito solicitar a la firma contratista, presentar plan de contingencia donde se detalle claramente como afrontará la ejecución en el plazo restante, indicando las estrategias logísticas y de personal que permitan nivelar el atraso y dar terminación dentro del plazo contractual establecido.

Atentamente,

EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal

Carrera 7 No-8-18 of. 201
Neiva – Huila (Colombia)
gerencia@emc2ingenieria.com
3114869253

Estudios, Medioambiente, Construcciones y Consultorías

CO-2023-414-052
Neiva, junio 20 de 2024

Ingeniero
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA
Representante Legal
CONSORCIO HORNILLAS 2023
Ciudad


Referencia: Contrato de obra No. 418 de 2023 cuyo objeto es “Realizar a todo costo la construcción de hornillas domésticas ecoeficientes como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como también la conservación de áreas de interés ecosistémico en el marco del proyecto “instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del departamento del Huila código BPIN 2023004410072”

Asunto: Observaciones constructivas municipio de Pitalito.

Cordial saludo.

A través de esta comunicación y en relación con la revisión de las obras en curso, deseo compartir las observaciones de obra a las hornillas del municipio de Pitalito. Conforme al contrato, se establece una fase de sensibilización, en la que se deben considerar las condiciones técnicas necesarias para la ejecución de la obra, proporcionando soluciones específicas para cada proyecto, por lo que, de acuerdo la revisión realizada, se solicita amablemente que las observaciones mencionadas sean abordadas en un plazo de 8 días y se realicé la entrega de un informe de subsanación de las mismas, para garantizar la entrega satisfactoria de la obra.

Atentamente,



EDINSON SUAZA HÉNDEZ
Representante legal – Interventoría
Anexo:

- Observaciones hornillas Pitalito.

- Beneficiario: Silvio Chilito Chimunja

Código: 1215
Vereda: Miraflores



Se identificó durante la visita de recibo de obra que el calentador de agua fue retirado por el contratista a razón de hacer el respectivo cambio, se solicita realizar la instalación para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

- Beneficiario: Yemirly Narvaez Lasso

Código: 1198
Vereda: La Guandinosa



Se identificó durante la visita de recibo de obra filtración de agua en la unión de la cubierta y la chimenea, se solicita realizar los ajustes correspondientes para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

- Beneficiario: Eliana Fernanda Gonzalez Leon

Código: 1279

Vereda: Vegas de alumbre



Se identificó durante la visita de recibo de obra que la tapa del cenicero no cierra correctamente, se solicita realizar los ajustes correspondientes para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

- Beneficiario: Wilmar Moreno Parra
  Código: 1112
  Vereda: Agua Negra



Se identificó durante la visita de recibo de obra filtración de agua en la unión de la cubierta y la chimenea, se solicita realizar los ajustes correspondientes para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

- Beneficiario: Anael Betancourt Mosquera

Código: 1166

Vereda: El pedregal



Se identificó durante la visita de recibo de obra que el horno no está instalado correctamente, se solicita realizar los ajustes correspondientes para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

- Beneficiario: Jose Alexander Vargas Zuñiga

Código: 1257

Vereda: Resinas



Se identificó durante la visita de recibo de obra que no se realizó la instalación de la tapa del cenicero, se solicita realizar los ajustes requeridos para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

- Beneficiario: Luz Dary Cleves
Código: 1258
Vereda: Resinas



Se identificó durante la visita de recibo de obra filtración de agua en la unión de la cubierta y la chimenea, se solicita realizar los ajustes correspondientes para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

- Beneficiario: Flora Maria Narvaez De Santofimio

Código: 1134
Vereda: Betania



Se identificó durante la visita de recibo de obra filtración de agua en la unión de la cubierta y la chimenea, se solicita realizar los ajustes correspondientes para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.

- Beneficiario: Ricardo Rojas Molina
Código: 1270
Vereda: San Francisco



Se identificó durante la visita de recibo de obra no se realizó la instalación de la tapa de entrada de aire, se solicita realizar los ajustes correspondientes para realizar el respectivo recibo a satisfacción de la obra.
