CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-008-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO III)".

ACTA PARCIAL DE OBRA N ° 1

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A

EDUBAR	**ACTA MODIFICATIVA No. 01** **CONTRATO Nº SA-EDU-008-2024**

CONTRATO No:	**SA-EDU-008-2024**
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS URBANAS 2024**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO DS**
SUPERVISOR:	**JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**
VALOR INICIAL:	**8.793.381.504,00**
VALOR ADICIONES:	**0,00**
VALOR ACUMULADO:	**8.793.381.504,00**
PLAZO CONTRACTUAL:	**HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE INICIACIÓN:	**26 DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**-**
FECHA DE REINICIO:	**-**
FECHA PRESENTE ACTA:	**18 DE OCTUBRE DE 2024**

		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MENORES CANTIDADES			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MAYORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°1 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2024		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+/-**	**CANT.**	**TOTAL**	**+/-**	**CANT.**	**TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
I	**PRELIMINARES**				**$ 288.099.422,00**			**-16.933.690,00**			**60.724.225,00**			**331.889.957,00**
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	23.047,56	$ 2.607,00	$ 60.084.989,00	(-)	-6.495,47	$ (16.933.690,00)			$ -	16.552,09	$ 2.607,00	$ 43.151.299,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	8.813,88	$ 25.805,00	$ 227.442.173,00			$ -			$ -	8.813,88	$ 25.805,00	$ 227.442.173,00
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	20,00	$ 28.613,00	$ 572.260,00			$ -	(+)	2.122,26	$ 60.724.225,00	2.142,26	$ 28.613,00	$ 61.296.485,00
II	**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**				**$ 4.545.955.201,00**			**-434.351.578,00**			**124.527.000,00**			**4.236.130.623,00**
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	18.537,13	$ 37.945,00	$ 703.391.398,00	(-)	-6.511,94	$ (247.095.563,00)			$ -	12.025,19	$ 37.945,00	$ 456.295.835,00
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	4.834,11	$ 72.039,00	$ 348.244.450,00	(-)	-2.599,37	$ (187.256.015,00)			$ -	2.234,74	$ 72.039,00	$ 160.988.435,00
8829	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	1,00	$ 55.170,00	$ 55.170,00			$ -	(+)	1.980,00	$ 109.236.600,00	1.981,00	$ 55.170,00	$ 109.291.770,00
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	30,00	$ 78.871,00	$ 2.366.130,00			$ -			$ -	30,00	$ 78.871,00	$ 2.366.130,00
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	15.073,86	$ 155.535,00	$ 2.344.512.815,00			$ -			$ -	15.073,86	$ 155.535,00	$ 2.344.512.815,00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	20,00	$ 219.742,00	$ 4.394.840,00			$ -			$ -	20,00	$ 219.742,00	$ 4.394.840,00
3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2.394,00	$ 202.882,00	$ 485.699.508,00			$ -			$ -	2.394,00	$ 202.882,00	$ 485.699.508,00
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 240.097,00	$ 240.097,00			$ -			$ -	1,00	$ 240.097,00	$ 240.097,00
4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	$ 234.589,00	$ 234.589,00			$ -			$ -	1,00	$ 234.589,00	$ 234.589,00
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	5.551,70	$ 38.167,00	$ 211.891.734,00			$ -			$ -	5.551,70	$ 38.167,00	$ 211.891.734,00
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	$ 50.968,00	$ 50.968,00			$ -	(+)	300,00	$ 15.290.400,00	301,00	$ 50.968,00	$ 15.341.368,00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5.551,70	$ 72.389,00	$ 401.882.011,00			$ -			$ -	5.551,70	$ 72.389,00	$ 401.882.011,00
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	5.773,77	$ 7.446,00	$ 42.991.491,00			$ -			$ -	5.773,77	$ 7.446,00	$ 42.991.491,00
III	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 256.710.382,00**			**0,00**			**266.034.043,00**			**522.744.425,00**
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	311,36	$ 97.351,00	$ 30.310.891,00			$ -	(+)	2.694,94	$ 262.354.893,00	3.006,29	$ 97.351,00	$ 292.665.784,00
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	301,48	$ 108.403,00	$ 32.681.336,00			$ -			$ -	301,48	$ 108.403,00	$ 32.681.336,00
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	44,12	$ 955.175,00	$ 42.142.321,00			$ -			$ -	44,12	$ 955.175,00	$ 42.142.321,00

EDUBAR	ACTA MODIFICATIVA No. 01 CONTRATO Nº SA-EDU-008-2024

CONTRATO No:	SA-EDU-008-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	8.793.381.504,00
VALOR ADICIONES:	0,00
VALOR ACUMULADO:	8.793.381.504,00
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE OCTUBRE DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MENORES CANTIDADES			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MAYORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°1 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2024		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	+/-	CANT.	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	6.176,80	$ 7.565,00	$ 46.727.492,00			$ -			$ -	6.176,80	$ 7.565,00	$ 46.727.492,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	9,00	$ 620.446,00	$ 5.584.014,00			$ -			$ -	9,00	$ 620.446,00	$ 5.584.014,00
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	42,00	$ 36.312,00	$ 1.525.104,00			$ -			$ -	42,00	$ 36.312,00	$ 1.525.104,00
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	252,00	$ 356.595,00	$ 89.861.940,00			$ -			$ -	252,00	$ 356.595,00	$ 89.861.940,00
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	8,00	$ 543.472,00	$ 4.347.776,00			$ -			$ -	8,00	$ 543.472,00	$ 4.347.776,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	28,00	$ 73.583,00	$ 2.060.324,00			$ -	(+)	50,00	$ 3.679.150,00	78,00	$ 73.583,00	$ 5.739.474,00
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	8,00	$ 183.648,00	$ 1.469.184,00			$ -			$ -	8,00	$ 183.648,00	$ 1.469.184,00
IV	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL				$ 66.030.723,00			0,00			0,00			66.030.723,00
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	51,00	$ 434.148,00	$ 22.141.548,00			$ -			$ -	51,00	$ 434.148,00	$ 22.141.548,00
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	51,00	$ 241.695,00	$ 12.326.445,00			$ -			$ -	51,00	$ 241.695,00	$ 12.326.445,00
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	841,00	$ 37.530,00	$ 31.562.730,00			$ -			$ -	841,00	$ 37.530,00	$ 31.562.730,00
V	FRENTE DE SEGURIDAD				$ 21.045.045,00			0,00			0,00			21.045.045,00
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	555,00	$ 37.919,00	$ 21.045.045,00			$ -			$ -	555,00	$ 37.919,00	$ 21.045.045,00
VI	PROVISIONES				$ 67.081.000,00			0,00			0,00			67.081.000,00
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 33.540.500,00	$ 33.540.500,00			$ -			$ -	1,00	$ 33.540.500,00	$ 33.540.500,00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 33.540.500,00	$ 33.540.500,00			$ -			$ -	1,00	$ 33.540.500,00	$ 33.540.500,00
VII	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS				$ 1.519.217.845,00			0,00			0,00			1.519.217.845,00
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	226,00	$ 94.488,00	$ 21.354.288,00			$ -			$ -	226,00	$ 94.488,00	$ 21.354.288,00
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	231,00	$ 172.302,00	$ 39.801.762,00			$ -			$ -	231,00	$ 172.302,00	$ 39.801.762,00
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1.505,71	$ 63.099,00	$ 95.008.795,00			$ -			$ -	1.505,71	$ 63.099,00	$ 95.008.795,00
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1.328,57	$ 17.538,00	$ 23.300.461,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 17.538,00	$ 23.300.461,00
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	132,85	$ 208.309,00	$ 27.673.851,00			$ -			$ -	132,85	$ 208.309,00	$ 27.673.851,00
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	9,00	$ 671.331,00	$ 6.041.979,00			$ -			$ -	9,00	$ 671.331,00	$ 6.041.979,00
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	168,00	$ 215.308,00	$ 36.171.744,00			$ -			$ -	168,00	$ 215.308,00	$ 36.171.744,00
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1.328,57	$ 195.941,00	$ 260.321.334,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 195.941,00	$ 260.321.334,00
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.328,00	$ 231.060,00	$ 306.847.680,00			$ -			$ -	1.328,00	$ 231.060,00	$ 306.847.680,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1.328,57	$ 58.572,00	$ 77.817.002,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 58.572,00	$ 77.817.002,00
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1.328,57	$ 77.863,00	$ 103.446.446,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 77.863,00	$ 103.446.446,00
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	150,57	$ 42.226,00	$ 6.357.969,00			$ -			$ -	150,57	$ 42.226,00	$ 6.357.969,00
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	18,00	$ 3.812.508,00	$ 68.625.144,00			$ -			$ -	18,00	$ 3.812.508,00	$ 68.625.144,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	119,57	$ 122.940,00	$ 14.699.936,00			$ -			$ -	119,57	$ 122.940,00	$ 14.699.936,00
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	993,77	$ 30.474,00	$ 30.284.147,00			$ -			$ -	993,77	$ 30.474,00	$ 30.284.147,00

6.

EDUBAR	**ACTA MODIFICATIVA No. 01** **CONTRATO Nº SA-EDU-008-2024**

CONTRATO No:	**SA-EDU-008-2024**
CONTRATANTE:	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS URBANAS 2024**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO DS**
SUPERVISOR:	**JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**
VALOR INICIAL:	**8.793.381.504,00**
VALOR ADICIONES:	**0,00**
VALOR ACUMULADO:	**8.793.381.504,00**
PLAZO CONTRACTUAL:	**HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE INICIACIÓN:	**26 DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**-**
FECHA DE REINICIO:	**-**
FECHA PRESENTE ACTA:	**18 DE OCTUBRE DE 2024**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MENORES CANTIDADES			MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS MAYORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°1 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2024		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+/-**	**CANT.**	**TOTAL**	**+/-**	**CANT.**	**TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
7	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	1.054,00	$ 6.689,00	$ 7.050.206,00			$ -			$ -	1.054,00	$ 6.689,00	$ 7.050.206,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1.328,57	$ 97.373,00	$ 129.366.847,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 97.373,00	$ 129.366.847,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1.328,57	$ 133.001,00	$ 176.701.139,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 133.001,00	$ 176.701.139,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	1.328,57	$ 14.198,00	$ 18.863.037,00			$ -			$ -	1.328,57	$ 14.198,00	$ 18.863.037,00
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	137,93	$ 30.888,00	$ 4.260.382,00			$ -			$ -	137,93	$ 30.888,00	$ 4.260.382,00
8800-1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	18,00	$ 543.472,00	$ 9.782.496,00			$ -			$ -	18,00	$ 543.472,00	$ 9.782.496,00
3432-1	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	400,00	$ 138.603,00	$ 55.441.200,00			$ -			$ -	400,00	$ 138.603,00	$ 55.441.200,00
	COSTO DIRECTO				$ 6.764.139.618,00			$ (451.285.268,00)			$ 451.285.268,00			$ 6.764.139.618,00
	ADMINISTRACIÓN (A) = 22%				$ 1.488.110.716,00			$ (99.282.758,96)			$ 99.282.758,96			$ 1.488.110.716,00
	IMPREVISTO (I) = 3%				$ 202.924.189,00			$ (13.538.558,04)			$ 13.538.558,04			$ 202.924.189,00
	UTILIDAD (U) = 5%				$ 338.206.981,00			$ (22.564.263,40)			$ 22.564.263,40			$ 338.206.981,00
	VALOR TOTAL				$ 8.793.381.504,00			$ (586.670.848,40)			$ 586.670.848,40			$ 8.793.381.504,00

CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS URBANAS 2024 - CONTRATISTA

ALEJANDRO ALEA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DS - INTERVENTORIA

VoBo

ANGELLY ERIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

Dirección: Vía 40 #72 - 290 / 75 9 - NIB CENTRO DE NEGOCIOS
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionciudadano@edubar.com.co
NIT 900.091.140-4

EDUBAR	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 CONTRATO Nº SA-EDU-008-2024 DE 2024	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	6/09/21
		Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-008-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.793.381.504,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 8.793.381.504
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 26 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE ACTA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	2,86%
% DE AVANCE ACUMULADO:	2,86%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATIVA Nº1 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2024			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I	PRELIMINARES															
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	23.047,56	2.607,00	60.084.989,00	16.552,09	2.607,00	43.151.299,00			6.907,69	18.008.348,00	6.907,69	18.008.348,00	9.644,40	25.142.951,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	8.813,88	25.805,00	227.442.173,00	8.813,88	25.805,00	227.442.173,00			1.266,72	32.687.710,00	1.266,72	32.687.710,00	7.547,16	194.754.463,00
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	20,00	28.613,00	572.260,00	2.142,26	28.613,00	61.296.485,00			670,26	19.178.149,00	670,26	19.178.149,00	1.472,00	42.118.336,00
II	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO															
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	18.537,13	37.945,00	703.391.398,00	12.025,19	37.945,00	456.295.835,00			334,26	12.683.496,00	334,26	12.683.496,00	11.690,93	443.612.339,00
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	4.834,11	72.039,00	348.244.450,00	2.234,74	72.039,00	160.988.435,00			80,26	5.781.850,00	80,26	5.781.850,00	2.154,48	155.206.585,00
8829	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	1,00	55.170,00	55.170,00	1.981,00	55.170,00	109.291.770,00			-		-		1.981,00	109.291.770,00
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	30,00	78.871,00	2.366.130,00	30,00	78.871,00	2.366.130,00			-		-		30,00	2.366.130,00
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	15.073,86	155.535,00	2.344.512.815,00	15.073,86	155.535,00	2.344.512.815,00			241,32	37.533.706,00	241,32	37.533.706,00	14.832,54	2.306.979.109,00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	20,00	219.742,00	4.394.840,00	20,00	219.742,00	4.394.840,00			-		-		20,00	4.394.840,00
3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2.394,00	202.882,00	485.699.508,00	2.394,00	202.882,00	485.699.508,00			-		-		2.394,00	485.699.508,00
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	240.097,00	240.097,00	1,00	240.097,00	240.097,00			-		-		1,00	240.097,00
4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	234.589,00	234.589,00	1,00	234.589,00	234.589,00			-		-		1,00	234.589,00
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	5.551,70	38.167,00	211.891.734,00	5.551,70	38.167,00	211.891.734,00			110,00	4.198.370,00	110,00	4.198.370,00	5.441,70	207.693.364,00
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	50.968,00	50.968,00	301,00	50.968,00	15.341.368,00			21,20	1.080.522,00	21,20	1.080.522,00	279,80	14.260.846,00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5.551,70	72.389,00	401.882.011,00	5.551,70	72.389,00	401.882.011,00			170,98	12.377.071,00	170,98	12.377.071,00	5.380,72	389.504.940,00

EDUBAR	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 CONTRATO Nº SA-EDU-008-2024 DE 2024	Código: IP-FM-32 VERSION: 01 FECHA: 6/09/21 Paginas: 1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-008-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.793.381.504,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 8.793.381.504
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 26 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE ACTA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	2,86%
% DE AVANCE ACUMULADO:	2,86%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATIVA N°1 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2024			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	5.773,77	7.446,00	42.991.491,00	5.773,77	7.446,00	42.991.491,00			256,60	1.910.644,00	256,60	1.910.644,00	5.517,17	41.080.847,00
III	OBRAS COMPLEMENTARIAS															
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	311,36	97.351,00	30.310.891,00	3.006,29	97.351,00	292.665.784,00			80,58	7.844.544,00	80,58	7.844.544,00	2.925,71	284.821.240,00
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	301,48	108.403,00	32.681.336,00	301,48	108.403,00	32.681.336,00			-		-		301,48	32.681.336,00
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	44,12	955.175,00	42.142.321,00	44,12	955.175,00	42.142.321,00			-		-		44,12	42.142.321,00
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	6.176,80	7.565,00	46.727.492,00	6.176,80	7.565,00	46.727.492,00			-		-		6.176,80	46.727.492,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	9,00	620.446,00	5.584.014,00	9,00	620.446,00	5.584.014,00			-		-		9,00	5.584.014,00
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	42,00	36.312,00	1.525.104,00	42,00	36.312,00	1.525.104,00			-		-		42,00	1.525.104,00
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	252,00	356.595,00	89.861.940,00	252,00	356.595,00	89.861.940,00			24,00	8.558.280,00	24,00	8.558.280,00	228,00	81.303.660,00
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	8,00	543.472,00	4.347.776,00	8,00	543.472,00	4.347.776,00			1,00	543.472,00	1,00	543.472,00	7,00	3.804.304,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	28,00	73.583,00	2.060.324,00	78,00	73.583,00	5.739.474,00			10,00	735.830,00	10,00	735.830,00	68,00	5.003.644,00
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	8,00	183.648,00	1.469.184,00	8,00	183.648,00	1.469.184,00			-		-		8,00	1.469.184,00
IV	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL															
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	51,00	434.148,00	22.141.548,00	51,00	434.148,00	22.141.548,00			-		-		51,00	22.141.548,00
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	51,00	241.695,00	12.326.445,00	51,00	241.695,00	12.326.445,00			-		-		51,00	12.326.445,00
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	841,00	37.530,00	31.562.730,00	841,00	37.530,00	31.562.730,00			-		-		841,00	31.562.730,00
V	FRENTE DE SEGURIDAD															
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	555,00	37.919,00	21.045.045,00	555,00	37.919,00	21.045.045,00			-		-		555,00	21.045.045,00
VI	PROVISIONES															
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	33.540.500,00	33.540.500,00	1,00	33.540.500,00	33.540.500,00			-		-		1,00	33.540.500,00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	33.540.500,00	33.540.500,00	1,00	33.540.500,00	33.540.500,00			-		-		1,00	33.540.500,00
VII	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS															
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	226,00	94.488,00	21.354.288,00	226,00	94.488,00	21.354.288,00			-		-		226,00	21.354.288,00
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	231,00	172.302,00	39.801.762,00	231,00	172.302,00	39.801.762,00			-		-		231,00	39.801.762,00
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1.505,71	63.099,00	95.008.795,00	1.505,71	63.099,00	95.008.795,00			91,29	5.760.308,00	91,29	5.760.308,00	1.414,42	89.248.487,00
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1.328,57	17.538,00	23.300.461,00	1.328,57	17.538,00	23.300.461,00			36,20	634.876,00	36,20	634.876,00	1.292,37	22.665.585,00

EDUBAR	ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 CONTRATO N° SA-EDU-008-2024 DE 2024	Código:	IP-FM-32
		VERSION:	01
		FECHA:	6/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO No:	SA-EDU-008-2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.793.381.504,00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 8.793.381.504
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 26 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DEL PRESENTE ACTA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	2,86%
% DE AVANCE ACUMULADO:	2,86%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATIVA N°1 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2024			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 1		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	132,85	208.309,00	27.673.851,00	132,85	208.309,00	27.673.851,00			-		-		132,85	27.673.851,00
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	9,00	671.331,00	6.041.979,00	9,00	671.331,00	6.041.979,00			-		-		9,00	6.041.979,00
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	168,00	215.308,00	36.171.744,00	168,00	215.308,00	36.171.744,00			-		-		168,00	36.171.744,00
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1.328,57	195.941,00	260.321.334,00	1.328,57	195.941,00	260.321.334,00			-		-		1.328,57	260.321.334,00
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.328,00	231.060,00	306.847.680,00	1.328,00	231.060,00	306.847.680,00			24,00	5.545.440,00	24,00	5.545.440,00	1.304,00	301.302.240,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1.328,57	58.572,00	77.817.002,00	1.328,57	58.572,00	77.817.002,00			-		-		1.328,57	77.817.002,00
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1.328,57	77.863,00	103.446.446,00	1.328,57	77.863,00	103.446.446,00			154,50	12.029.834,00	154,50	12.029.834,00	1.174,07	91.416.612,00
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	150,57	42.226,00	6.357.969,00	150,57	42.226,00	6.357.969,00			-		-		150,57	6.357.969,00
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	18,00	3.812.508,00	68.625.144,00	18,00	3.812.508,00	68.625.144,00			-		-		18,00	68.625.144,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	119,57	122.940,00	14.699.936,00	119,57	122.940,00	14.699.936,00			50,76	6.240.434,00	50,76	6.240.434,00	68,81	8.459.502,00
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	993,77	30.474,00	30.284.147,00	993,77	30.474,00	30.284.147,00			-		-		993,77	30.284.147,00
7	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	1.054,00	6.689,00	7.050.206,00	1.054,00	6.689,00	7.050.206,00			-		-		1.054,00	7.050.206,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1.328,57	97.373,00	129.366.847,00	1.328,57	97.373,00	129.366.847,00			-		-		1.328,57	129.366.847,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1.328,57	133.001,00	176.701.139,00	1.328,57	133.001,00	176.701.139,00			-		-		1.328,57	176.701.139,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	1.328,57	14.198,00	18.863.037,00	1.328,57	14.198,00	18.863.037,00			-		-		1.328,57	18.863.037,00
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	137,93	30.888,00	4.260.382,00	137,93	30.888,00	4.260.382,00			-		-		137,93	4.260.382,00
8800-1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	18,00	543.472,00	9.782.496,00	18,00	543.472,00	9.782.496,00			-		-		18,00	9.782.496,00
3432-1	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	400,00	138.603,00	55.441.200,00	400,00	138.603,00	55.441.200,00			1,00	138.603,00	1,00	138.603,00	399,00	55.302.597,00
													-		-	
	COSTO DIRECTO				$ 6.764.139.618,00			$ 6.764.139.618,00		$ -		$ 193.471.487,00		$ 193.471.487,00		$ 6.570.668.131,00
	ADMINISTRACIÓN (A) = 22%				$ 1.488.110.716,00			$ 1.488.110.716,00		$ -		$ 42.563.727,00		$ 42.563.727,00		$ 1.445.546.989,00
	IMPREVISTO (I) = 3%				$ 202.924.189,00			$ 202.924.189,00		$ -		$ 5.804.145,00		$ 5.804.145,00		$ 197.120.044,00
	UTILIDAD (U) = 5%				$ 338.206.981,00			$ 338.206.981,00		$ -		$ 9.673.574,00		$ 9.673.574,00		$ 328.533.407,00
	VALOR TOTAL				$ 8.793.381.504,00			$ 8.793.381.504,00		$ -		$ 251.512.933,00		$ 251.512.933,00		$ 8.541.868.571,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 21 días del mes de octubre de 2024.

CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS URBANAS 2024 - CONTRATISTA

ALEJANDRO ALBA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DS - INTERVENTORIA

VoBo

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

	PRE-ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES	Código:	IP-FM-35
		VERSION:	01
		FECHA:	7/09/21

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO DS
DIRECCION	
FECHA	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024

		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°1 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2024				ACUMULADO ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
I	**PRELIMINARES**				**331.889.957,00**		**0,00**		**69.874.207,00**	**0,00**	**69.874.207,00**		**262.015.750,00**
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	16.552,09	2.607,00	43.151.299,00		0,00	6.907,69	18.008.348,00	6.907,69	18.008.348,00	9.644,40	25.142.951,00
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	8.813,88	25.805,00	227.442.173,00		0,00	1.266,72	32.687.710,00	1.266,72	32.687.710,00	7.547,16	194.754.463,00
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2.142,26	28.613,00	61.296.485,00		0,00	670,26	19.178.149,00	670,26	19.178.149,00	1.472,00	42.118.336,00
II	**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**		**0,00**		**4.236.130.623,00**		**0,00**		**75.565.659,00**	**0,00**	**75.565.659,00**		**4.160.564.964,00**
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	12.025,19	37.945,00	456.295.835,00		0,00	334,26	12.683.496,00	334,26	12.683.496,00	11.690,93	443.612.339,00
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	2.234,74	72.039,00	160.988.435,00		0,00	80,26	5.781.850,00	80,26	5.781.850,00	2.154,48	155.206.585,00
8829	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	1.981,00	55.170,00	109.291.770,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.981,00	109.291.770,00
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	30,00	78.871,00	2.366.130,00		0,00		0,00	0,00	0,00	30,00	2.366.130,00
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	15.073,86	155.535,00	2.344.512.815,00		0,00	241,32	37.533.706,00	241,32	37.533.706,00	14.832,54	2.306.979.109,00
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	20,00	219.742,00	4.394.840,00		0,00		0,00	0,00	0,00	20,00	4.394.840,00
3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2.394,00	202.882,00	485.699.508,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.394,00	485.699.508,00
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	240.097,00	240.097,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	240.097,00
4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	1,00	234.589,00	234.589,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	234.589,00
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	5.551,70	38.167,00	211.891.734,00		0,00	110,00	4.198.370,00	110,00	4.198.370,00	5.441,70	207.693.364,00
4309	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	301,00	50.968,00	15.341.368,00		0,00	21,20	1.080.522,00	21,20	1.080.522,00	279,80	14.260.846,00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0,07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5.551,70	72.389,00	401.882.011,00		0,00	170,98	12.377.071,00	170,98	12.377.071,00	5.380,72	389.504.940,00
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	5.773,77	7.446,00	42.991.491,00		0,00	256,60	1.910.644,00	256,60	1.910.644,00	5.517,17	41.080.847,00
III	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		**0,00**		**522.744.425,00**		**0,00**		**17.682.126,00**	**0,00**	**17.682.126,00**		**505.062.299,00**
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	3.006,29	97.351,00	292.665.784,00		0,00	80,58	7.844.544,00	80,58	7.844.544,00	2.925,71	284.821.240,00
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	301,48	108.403,00	32.681.336,00		0,00		0,00	0,00	0,00	301,48	32.681.336,00
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	44,12	955.175,00	42.142.321,00		0,00		0,00	0,00	0,00	44,12	42.142.321,00
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	6.176,80	7.565,00	46.727.492,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6.176,80	46.727.492,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	9,00	620.446,00	5.584.014,00		0,00		0,00	0,00	0,00	9,00	5.584.014,00
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	42,00	36.312,00	1.525.104,00		0,00		0,00	0,00	0,00	42,00	1.525.104,00
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	252,00	356.595,00	89.861.940,00		0,00	24,00	8.558.280,00	24,00	8.558.280,00	228,00	81.303.660,00
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	8,00	543.472,00	4.347.776,00		0,00	1,00	543.472,00	1,00	543.472,00	7,00	3.804.304,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	78,00	73.583,00	5.739.474,00		0,00	10,00	735.830,00	10,00	735.830,00	68,00	5.003.644,00
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	8,00	183.648,00	1.469.184,00		0,00		0,00	0,00	0,00	8,00	1.469.184,00
IV	**SEÑALIZACION INSTITUCIONAL**		**0,00**		**66.030.723,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**66.030.723,00**
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1.05 X 2,10, INSTALADOS	UN	51,00	434.148,00	22.141.548,00		0,00		0,00	0,00	0,00	51,00	22.141.548,00
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	51,00	241.695,00	12.326.445,00		0,00		0,00	0,00	0,00	51,00	12.326.445,00
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	841,00	37.530,00	31.562.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	31.562.730,00
V	**FRENTE DE SEGURIDAD**		**0,00**		**21.045.045,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**21.045.045,00**
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	555,00	37.919,00	21.045.045,00		0,00		0,00	0,00	0,00	555,00	21.045.045,00
VI	**PROVISIONES**		**0,00**		**67.081.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**67.081.000,00**
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	33.540.500,00	33.540.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	33.540.500,00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1,00	33.540.500,00	33.540.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	33.540.500,00
VII	**OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS**		**0,00**		**1.519.217.845,00**		**0,00**		**30.349.495,00**	**0,00**	**30.349.495,00**		**1.488.868.350,00**
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	226,00	94.488,00	21.354.288,00		0,00		0,00	0,00	0,00	226,00	21.354.288,00
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	231,00	172.302,00	39.801.762,00		0,00		0,00	0,00	0,00	231,00	39.801.762,00

	PRE-ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES	Cód/po.	
		VERSION:	01
		FECHA:	7/05/24

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO DS

DIRECCION:

FECHA: VEINTIUN (21) DE OCTUBRE DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°1 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2024 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS CANTIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS VALOR TOTAL	CANTIDADES POR EJECUTAR CANTIDAD	CANTIDADES POR EJECUTAR VALOR
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1.555,71	63.099,00	98.068.796,00		0,00	91,29	5.760.308,00	91,29	5.760.308,00	1.414,42	89.248.487,00
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1.328,57	17.538,00	23.300.461,00		0,00	36,20	634.876,00	36,20	634.876,00	1.292,37	22.665.585,00
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	132,85	208.309,00	27.673.851,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,85	27.673.851,00
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" NSC PN10	UN	9,00	671.331,00	6.041.979,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6.041.979,00
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	168,00	215.338,00	36.171.744,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	36.171.744,00
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1.328,57	195.941,00	260.321.334,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,57	260.321.334,00
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.328,00	231.060,00	306.847.680,00		0,00	24,00	5.545.440,00	24,00	5.545.440,00	1.304,00	301.302.240,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1.328,57	58.572,00	77.817.002,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,57	77.817.002,00
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1.328,57	77.863,00	103.446.446,00		0,00	154,50	12.029.834,00	154,50	12.029.834,00	1.174,07	91.416.612,00
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	150,57	42.226,00	6.357.969,00		0,00		0,00	0,00	0,00	150,57	6.357.969,00
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCION 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	18,00	3.812.508,00	68.625.144,00		0,00		0,00	0,00	0,00	18,00	68.625.144,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	119,57	122.940,00	14.699.936,00		0,00	50,76	6.240.434,00	50,76	6.240.434,00	68,81	8.459.502,00
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	993,77	30.474,00	30.284.147,00		0,00		0,00	0,00	0,00	993,77	30.284.147,00
7	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	1.054,00	6.689,00	7.050.206,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.054,00	7.050.206,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERIA)	ML	1.328,57	97.373,00	129.366.847,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.328,57	129.366.847,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERIA)	ML	1.328,57	133.007,00	176.701.139,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.328,57	176.701.139,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	1.328,57	14.196,00	18.863.037,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.328,57	18.863.037,00
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACION Y COMPACTACION	M3	137,93	30.888,00	4.260.382,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	4.260.382,00
8830-1	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD TAP 24"	UN	18,00	543.472,00	9.782.496,00		0,00		0,00	0,00	0,00	18,00	9.782.496,00
3432-1	CONSTRUCCION REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	400,00	138.993,00	55.441.200,00		0,00	1,00	138.993,00	1,00	138.993,00	399,00	55.302.207,00
VII	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 01	ENSAYO C.B.R. (CALIFORNIA BEARING RATIO) EN LABORATORIO, Y PROCTOR MODIFICADO PARA CONFIRMACION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	UN	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP 02	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.80 M< H<= 3.00 M	UN	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP 03	INVELACION DE CAJAS DE INSPECCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO CON LADRILLO TOLETE	UN	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP 04	P.B.O. INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 315MM (12") - INCLUYE TRANSPORTE	ML	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP 05	DEMOLICION DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP 06	REPLANTEO GENERAL PARA REDES	M2	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP 07	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NP 08	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM PARA REFUERZO DE ACCESOS VEHICULARES Y ANDENES DONDE SE REQUIERA	M2	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTO DIRECTO		$ 6.764.139.618,00	$ -		$ 193.471.487,00	$ 193.471.487,00		$ 6.570.668.131,00
ADMINISTRACION (A)	22,00%	$ 1.488.110.716,00	$ -		$ 42.563.727,00	$ 42.563.727,00		$ 1.445.546.989,00
IMPREVISTO (I)	3,00%	$ 202.924.189,00	$ -		$ 5.804.145,00	$ 5.804.145,00		$ 197.120.044,00
UTILIDAD (U)	5,00%	$ 338.206.981,00	$ -		$ 9.673.574,00	$ 9.673.574,00		$ 328.533.407,00
VALOR TOTAL		$ 8.793.381.504,00	$ -		$ 251.512.933,00	$ 251.512.933,00		$ 8.541.868.571,00

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: JAVIER MAURICIO TORRES VERGARA
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: MIGUEL CHUNZA CAMELO
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA



CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-008-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MODULO III)".

MEMORIA DE CANTIDADES

COPIA N ° 1

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Página:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	88	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+003,41	K0+063,10	59,69	7,40		M2	1,00		441,71	
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+000,00	K0+520,00	520,00	8,40		M2	1,00		4.368,00	
FRENTE DE OBRA 6.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 208 Y 218	K0+520,00	K0+649,76	129,76	8,40		M2	1,00		1.089,98	
FRENTE DE OBRA 7.										
CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44	K0+000,00	K0+120,00	120,00	8,40		M2	1,00		1.008,00	

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	16.552,09
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	6.907,69
Obra por ejecutar	9.644,40

TOTAL PRESENTE ACTA:	6.907,69

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP. 021037-0598582 ATL

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


NOMBRE: LILEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
MP. 17202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	88	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

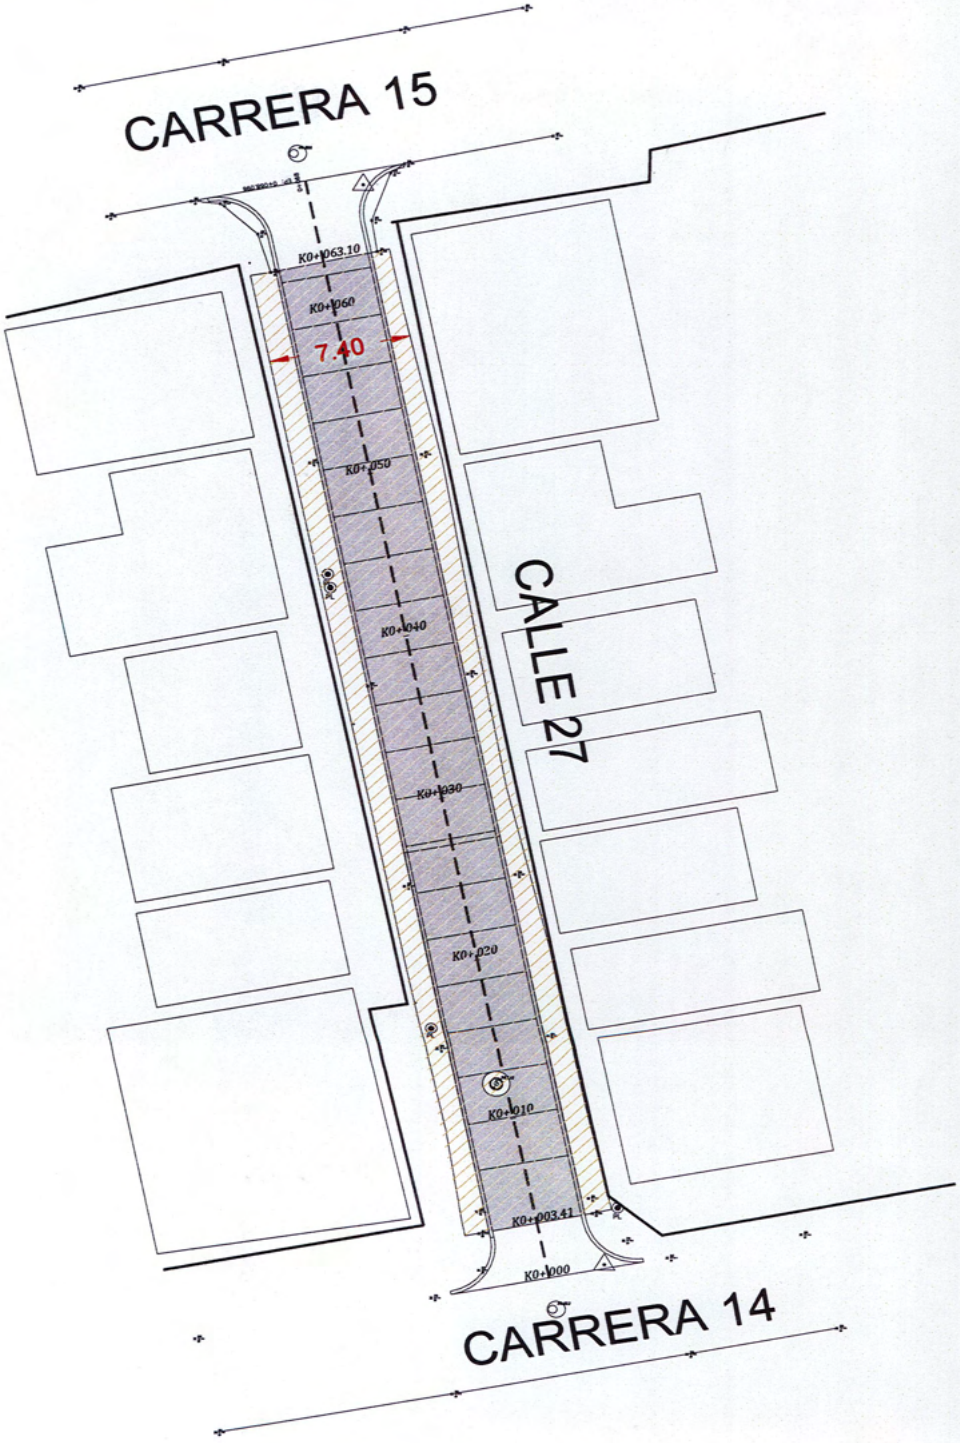


EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	88	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS

FRENTE DE OBRA 7. CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

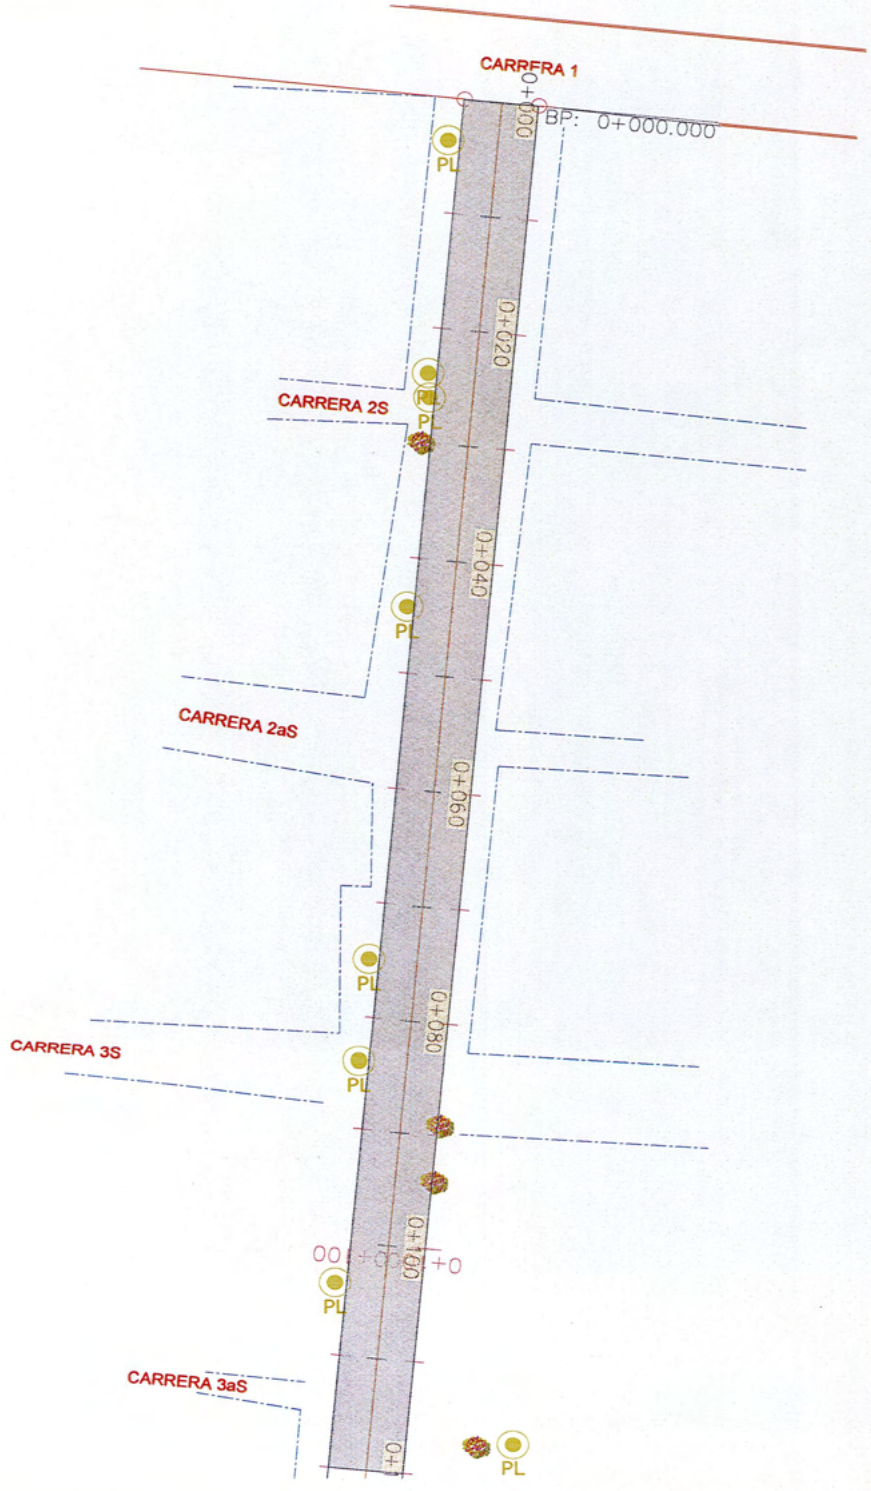

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	5913	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+003,41	K0+063,10	59,69	5,60	0,70	M3	1,00			233,98
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+000,00	K0+200,00	200,00	6,60	0,70	M3	1,00			924,00
ALCANTARILLADO										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+000,00	K0+071,50	71,50	0,60	0,89	M3	1,00			38,25
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+071,50	K0+154,50	83,00	0,60	0,89	M3	1,00			44,40
ACUEDUCTO										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+003,50	K0+062,83	59,33	0,40	0,50	M3	1,00			11,87
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+073,23	K0+144,32	71,09	0,40	0,50	M3	1,00			14,22

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	8.813,88
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	1.266,72
Obra por ejecutar	7.547,16

TOTAL PRESENTE ACTA:	1.266,72

OBSERVACIONES:


Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ MP. 021037-0598582 ATL	NOMBRE: LIBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ MP. 17202-359997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	5913	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

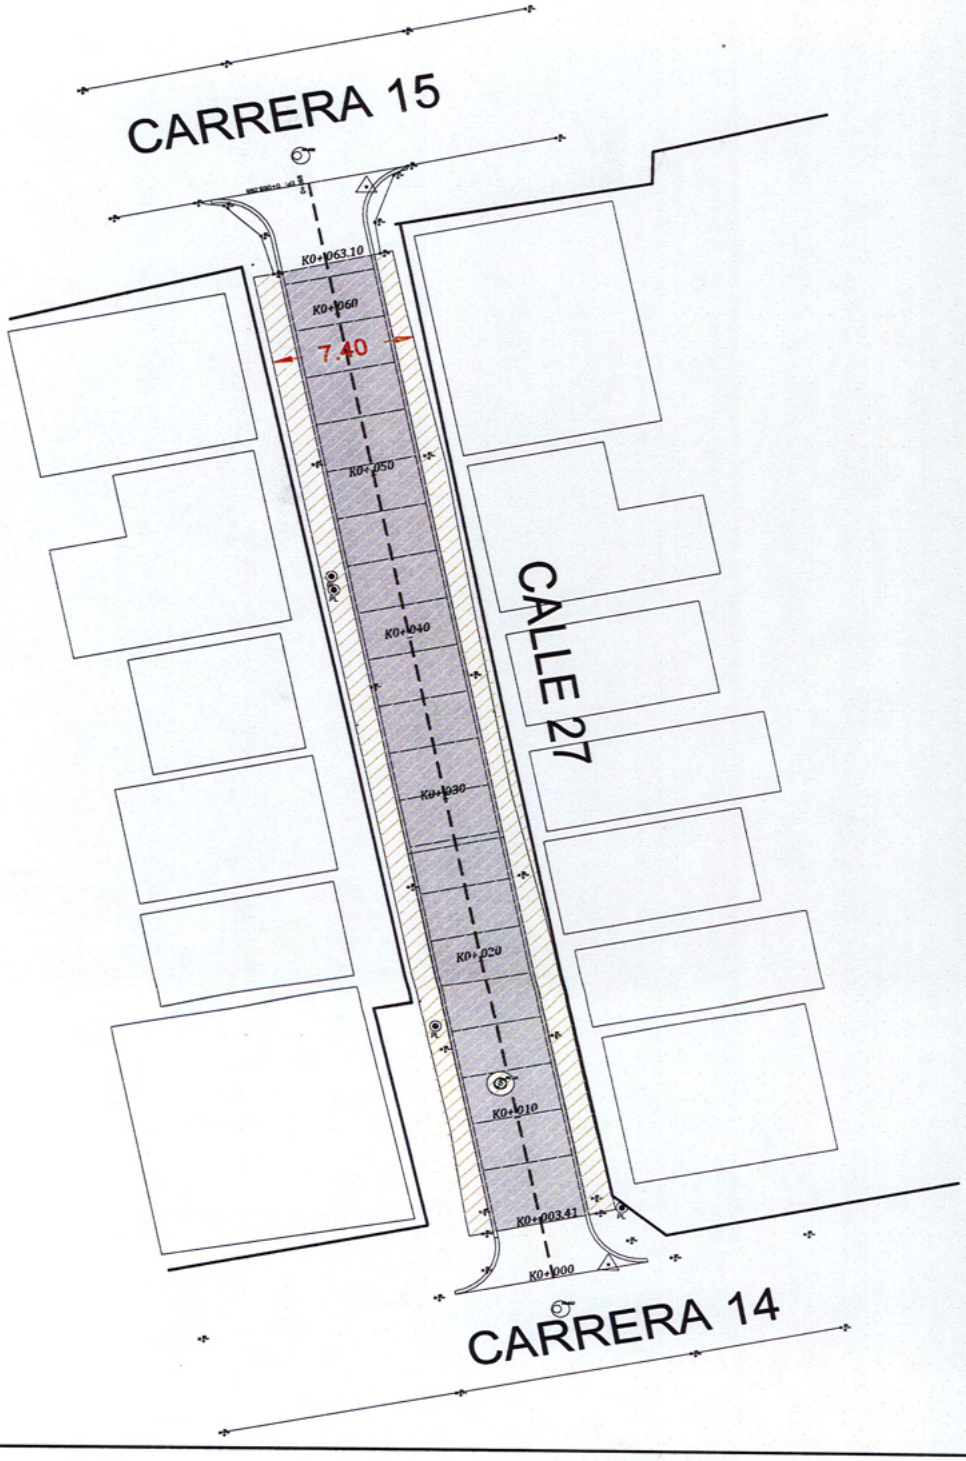


EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	5913	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES

FRENTE DE OBRA 5. CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

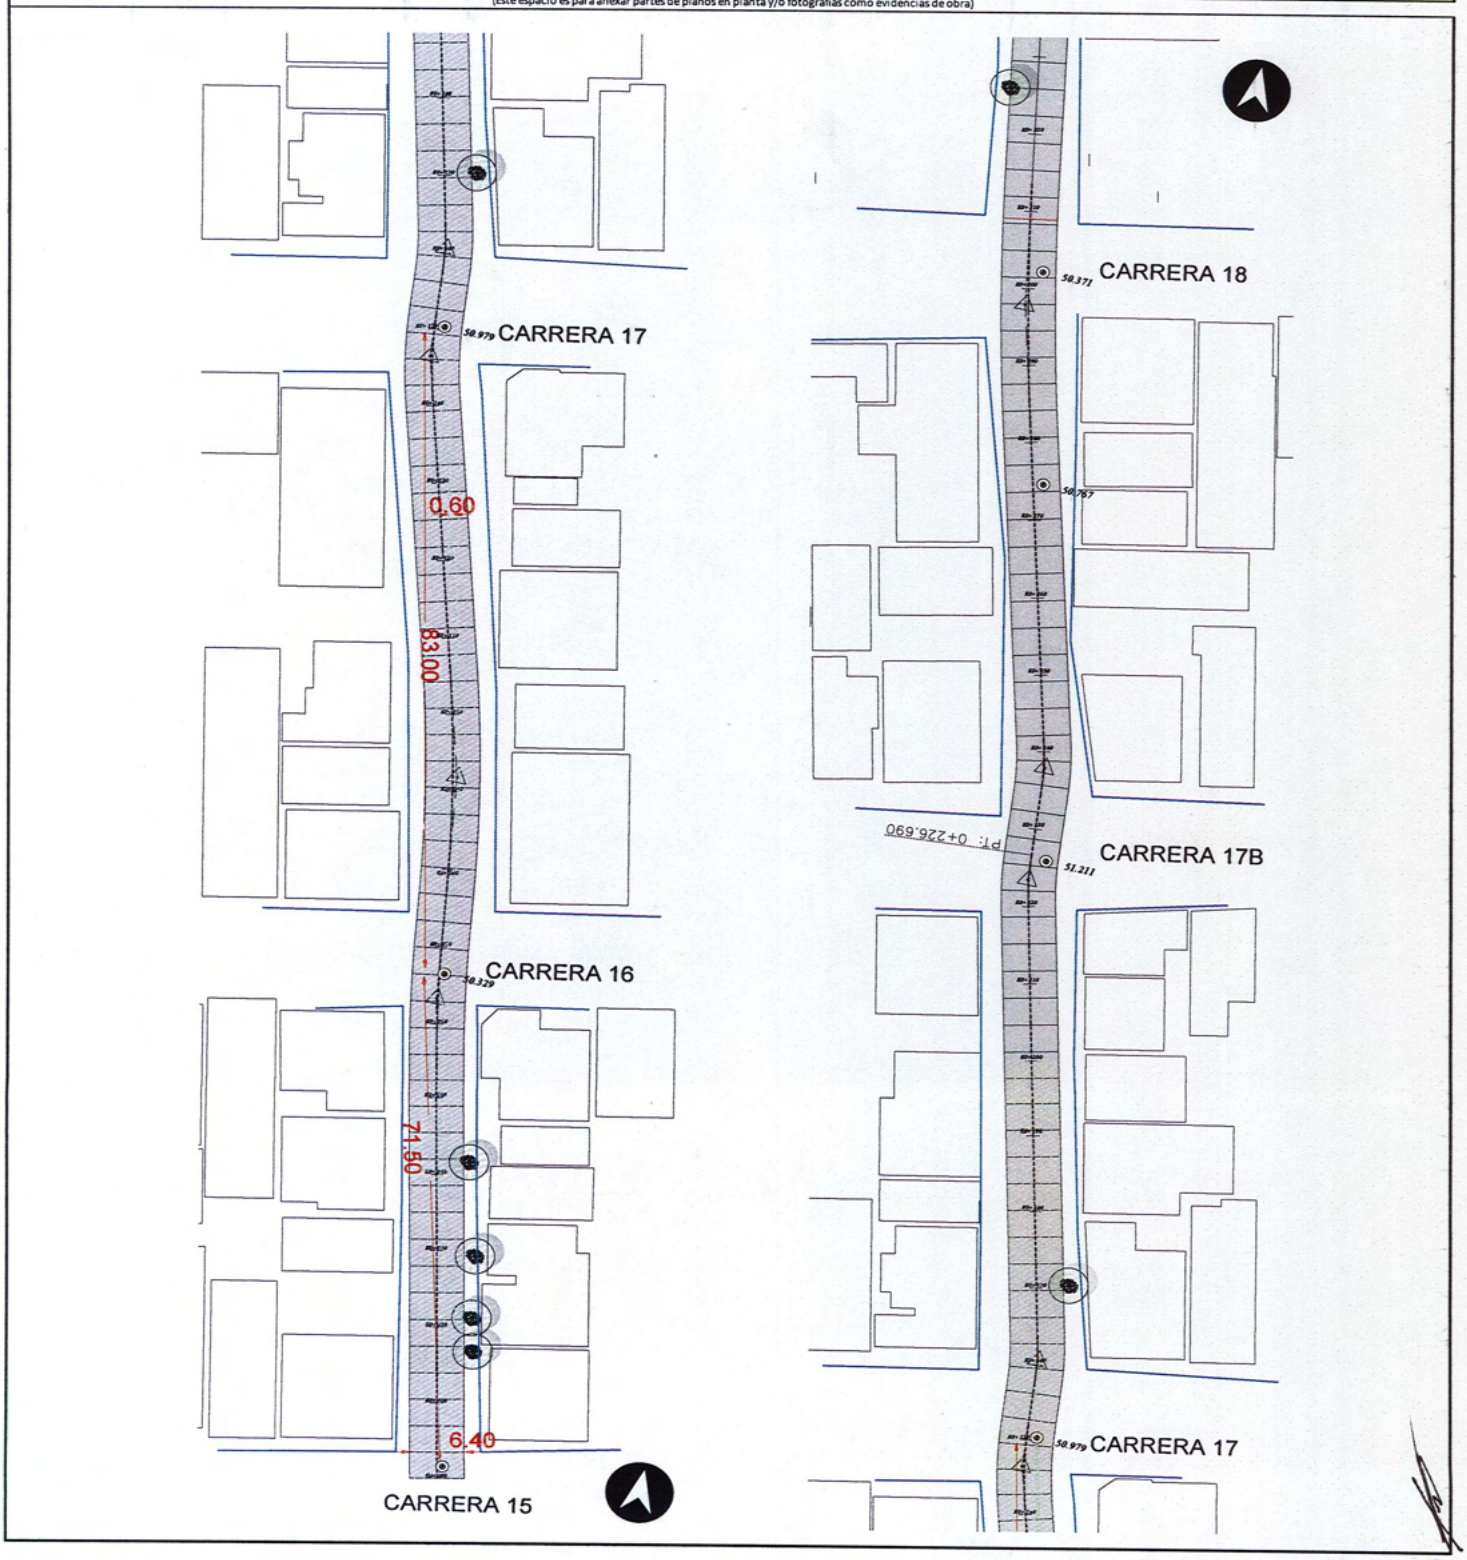

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Página:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024		
CAPITULO: PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM: 556	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 7.										
CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44	K0+000,00	K0+100,00	100,00	6,40		M2	1,00		640,00	
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B (CARRERA 16 BOCACALLE)	K0+072,00	K0+072,00	3,40	8,90		M2	1,00		30,26	

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	2.142,26
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	670,26
Obra por ejecutar	1.472,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	670,26

OBSERVACIONES:


Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ MP. 08103T-0598582 ATL	NOMBRE: LISEY GARCÍA BOHÓRQUEZ MP. 17202-341997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	556	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL

FRENTE DE OBRA 7. CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

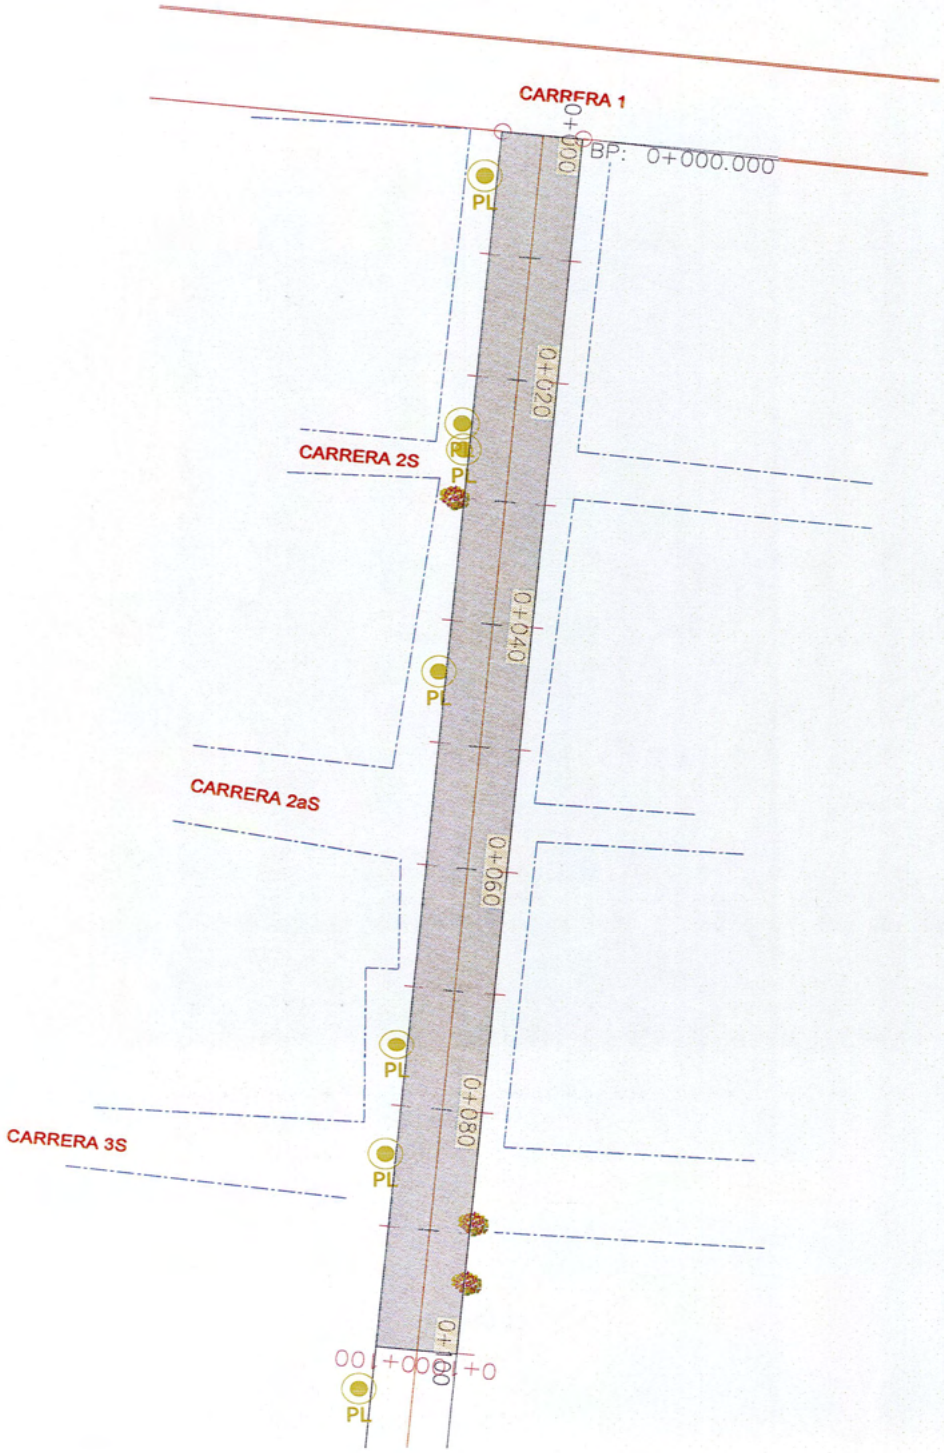


EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PRELIMINARES	CÓDIGO DEL ITEM:	556	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL

FRENTE DE OBRA 5. CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B (CARRERA 16 BOCACALLE)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

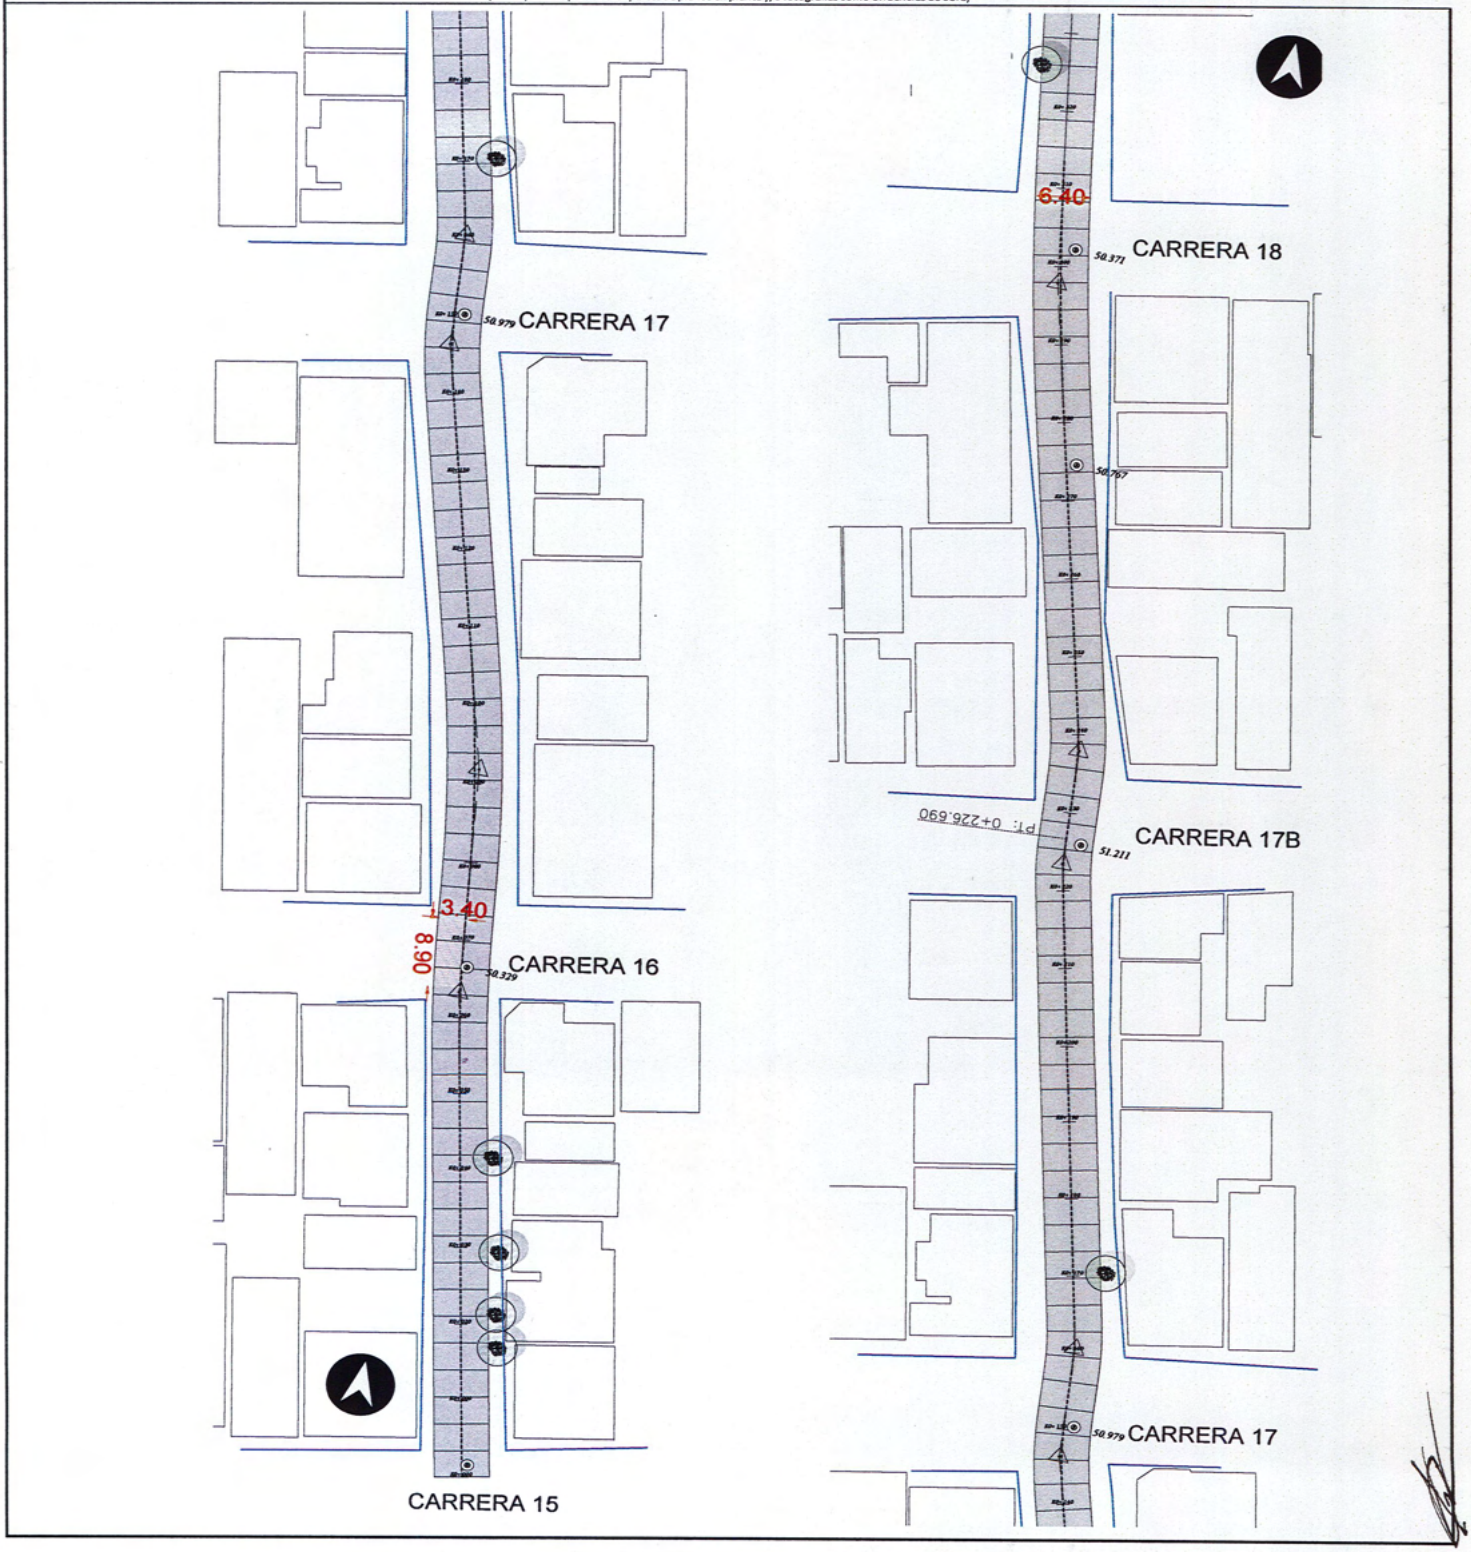

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	7795	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+003,41	K0+063,10	59,69	5,60		M2	1,00		334,26	

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	12.025,19
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	334,26
Obra por ejecutar	11.690,93

TOTAL PRESENTE ACTA:	334,26
TOTAL PRESENTE ACTA:	

OBSERVACIONES:


Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ MP. 021087-0598582 ATL	NOMBRE: LIBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ MP. 17202-349997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	7795	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

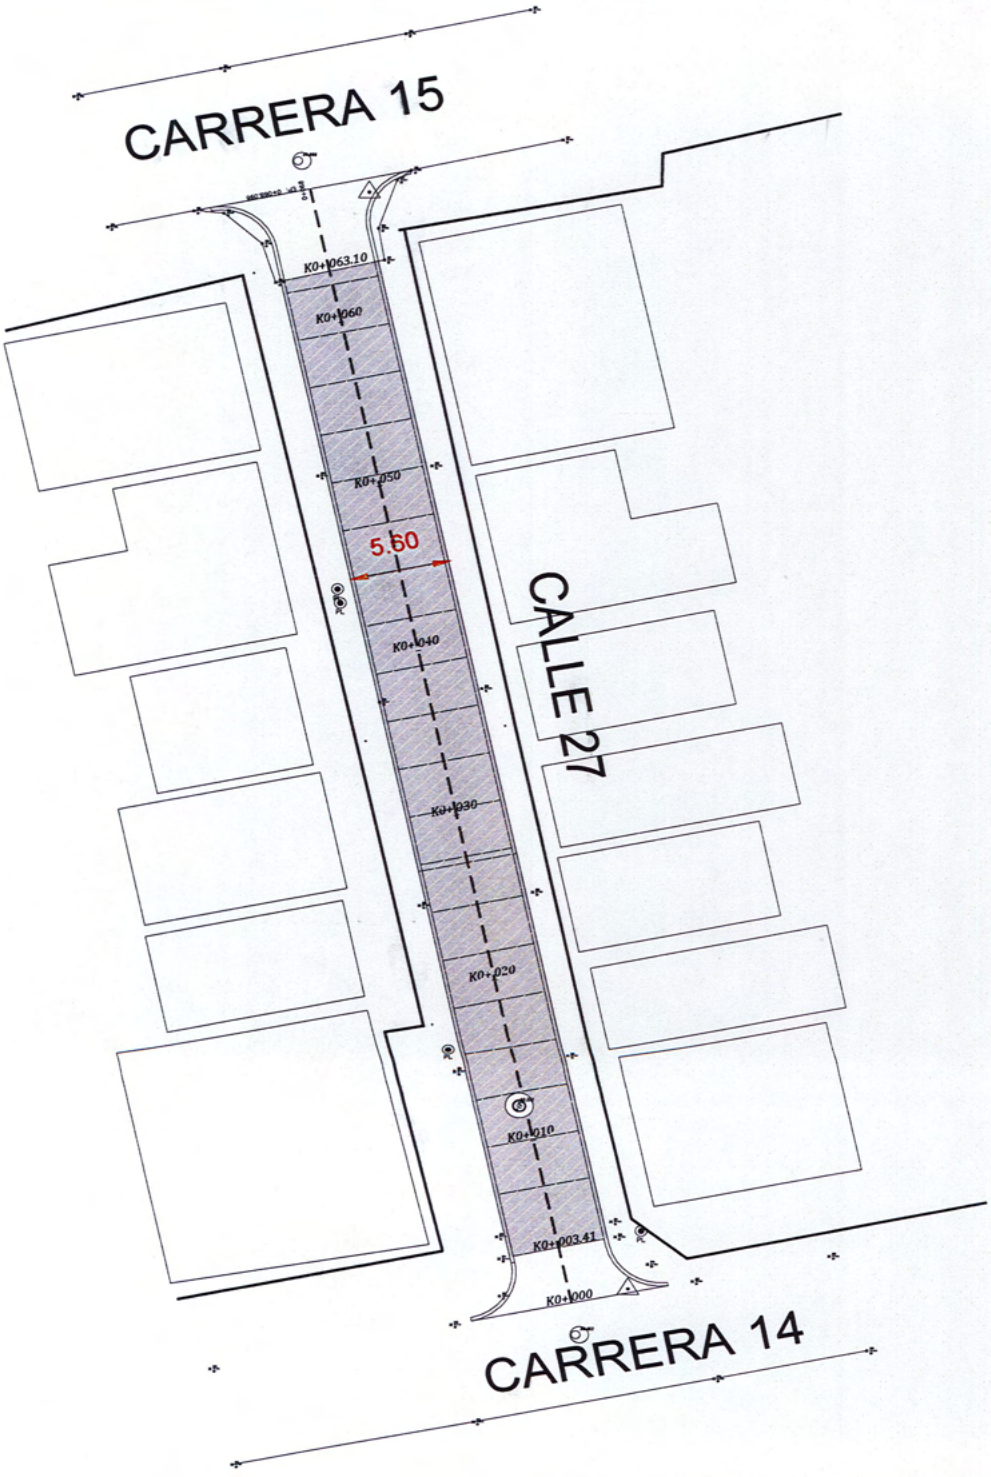

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	7789	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



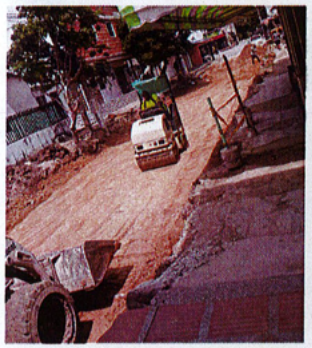



LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+003,41	K0+063,10	59,69	5,60	0,10	M3	1,00			33,43
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+000,00	K0+030,00	30,00	6,60	0,10	M3	1,00			19,80
ALCANTARILLADO										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+000,00	K0+071,50	71,50	0,60	0,29	M3	1,00			12,51
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+071,50	K0+154,50	83,00	0,60	0,29	M3	1,00			14,52

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	2.234,73
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	80,26
Obra por ejecutar	2.154,47

TOTAL PRESENTE ACTA:	80,26

OBSERVACIONES:


Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ MP. 021037-0598582 ATL	NOMBRE: LILEY GARCÍA BOHÓRQUEZ MP. 17202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	7789	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

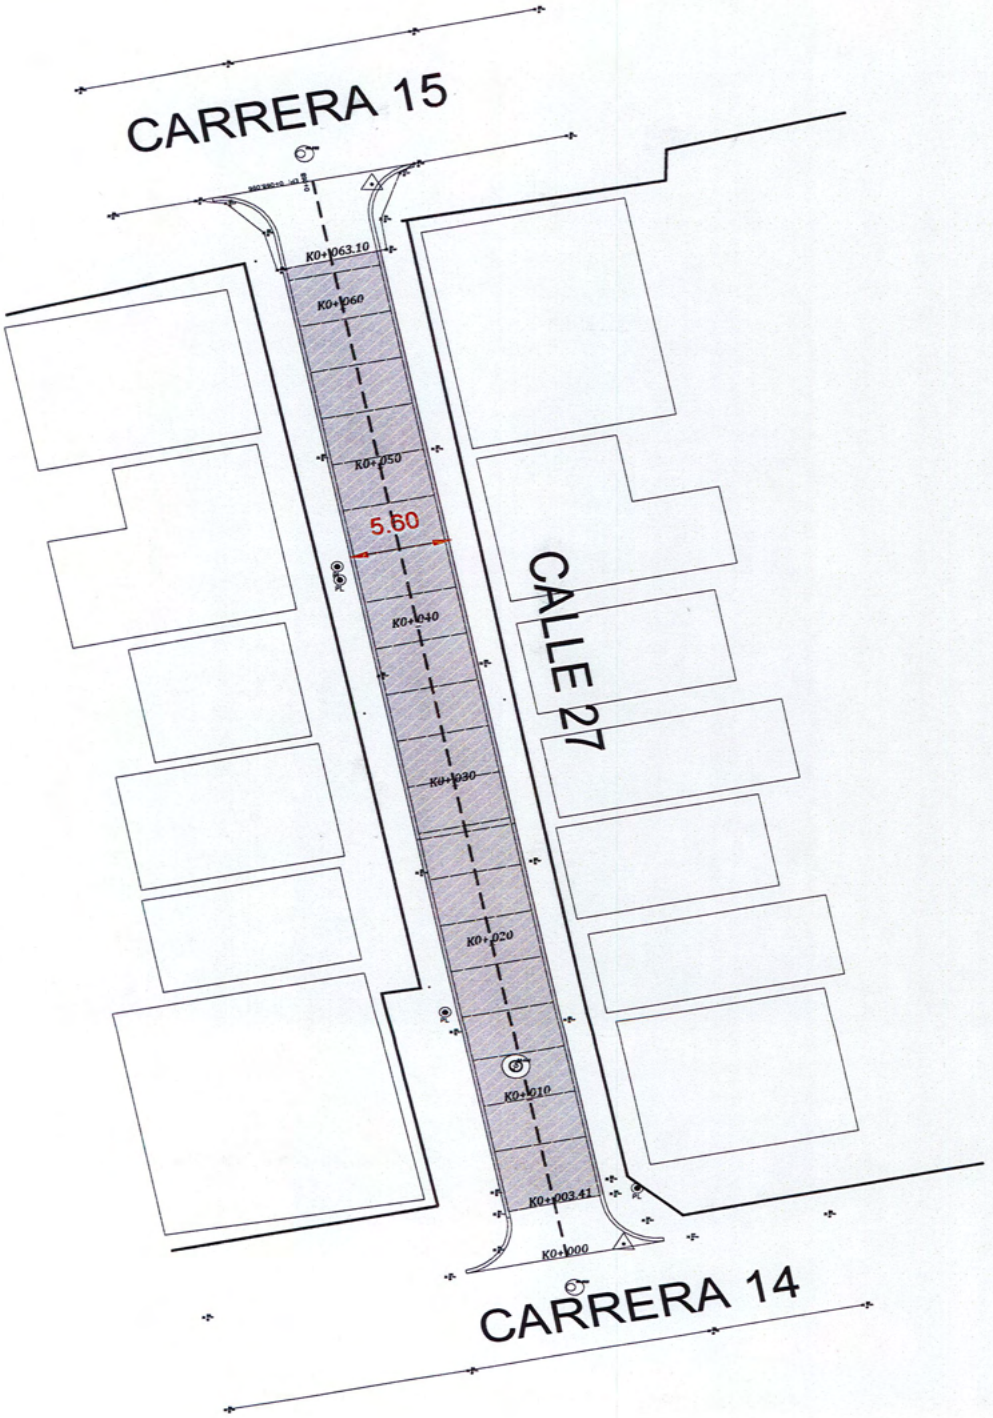


EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	7789	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA

FRENTE DE OBRA 5. CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

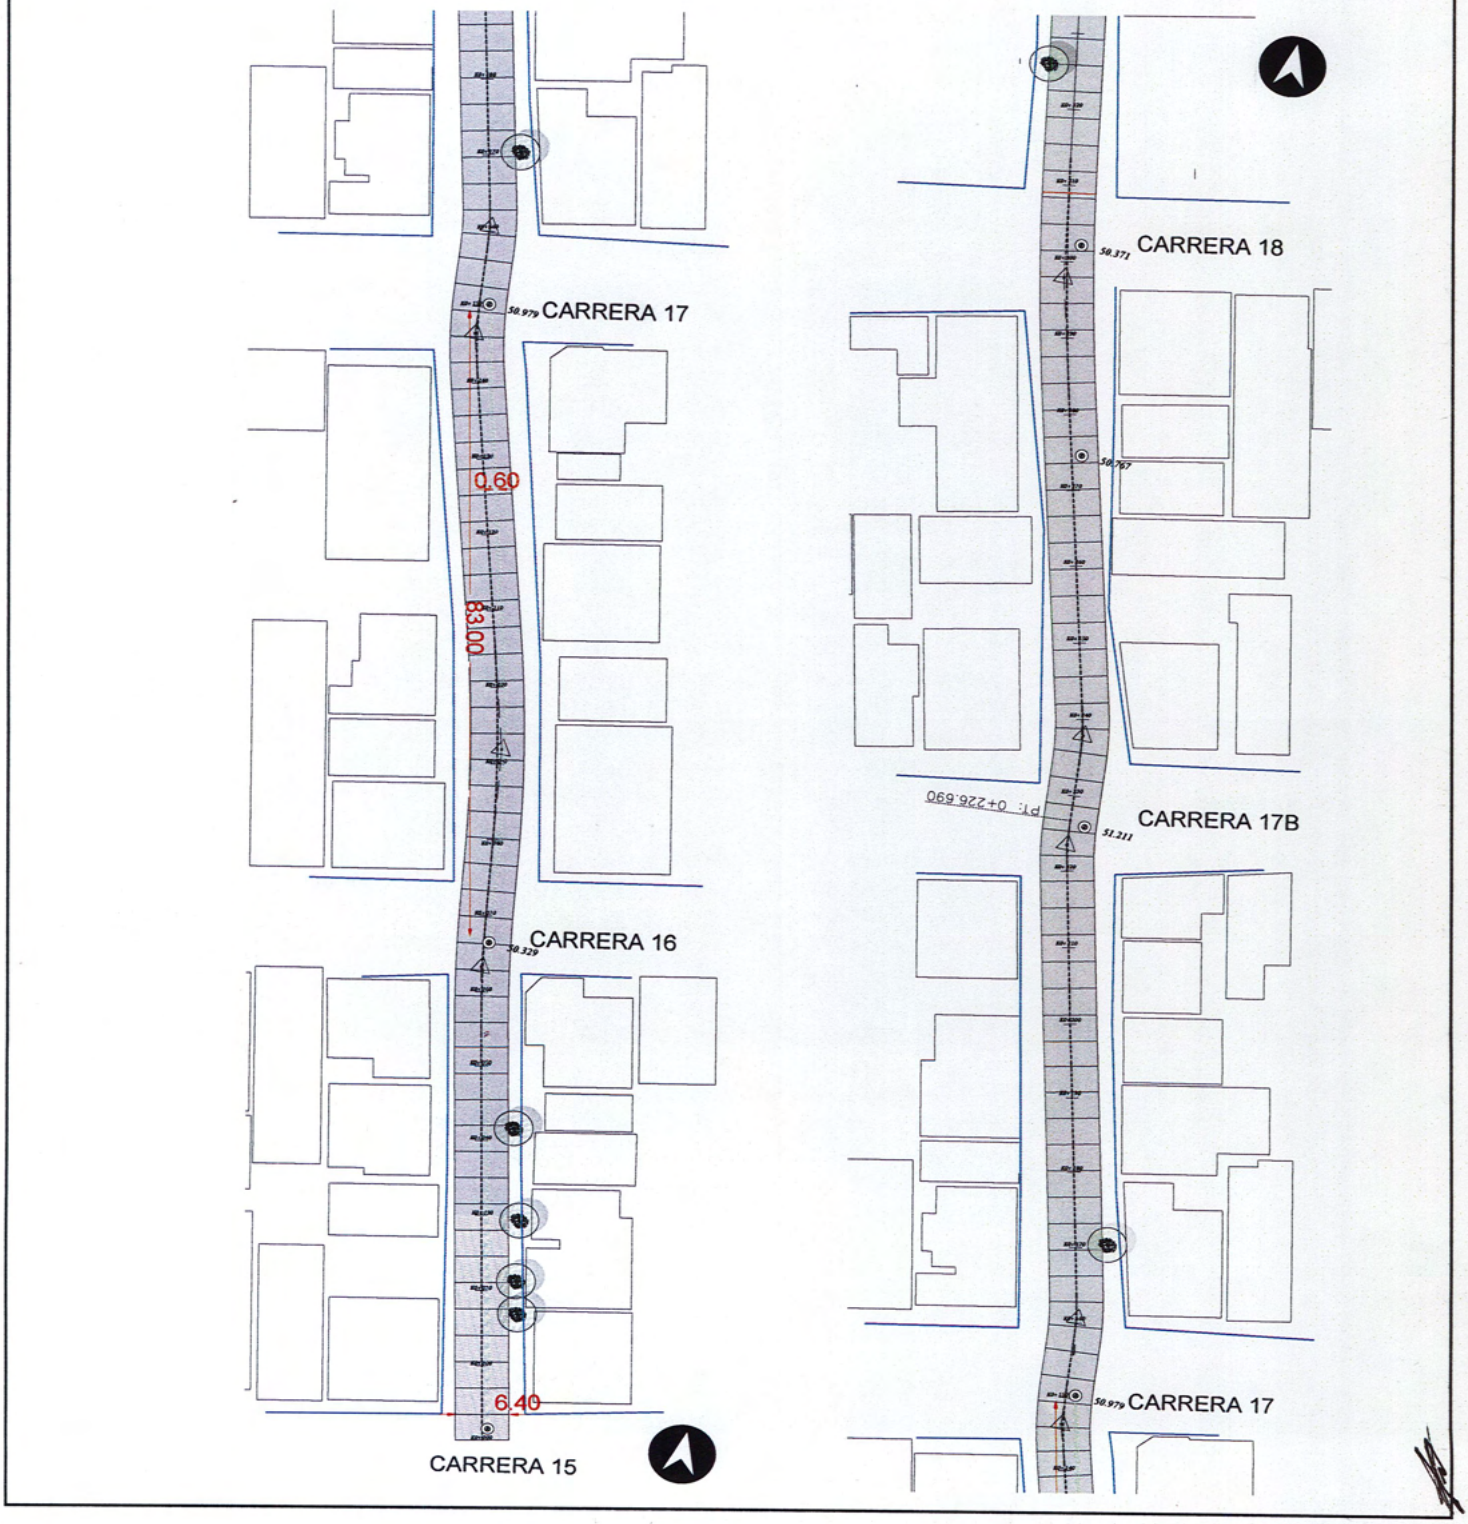


EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	8755	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

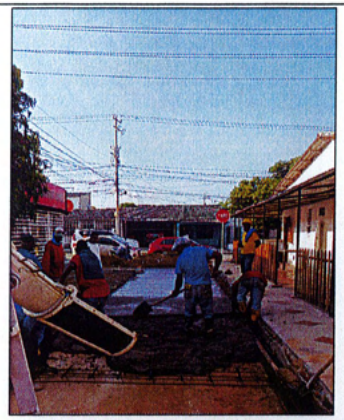





LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALZADA DERECHA: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	KD+003,41	KD+063,10	59,69	2,70		M2	1,00		161,16	
CALZADA IZQUIERDA: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	KD+003,41	KD+033,10	29,69	2,70		M2	1,00		80,16	

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	15.073,86
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	241,32
Obra por ejecutar	14.832,54

TOTAL PRESENTE ACTA:	241,32

OBSERVACIONES:


Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ MP. 021087-0598582 ATL	NOMBRE: LISEY GARCÍA BOHÓRQUEZ MP. 17202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1			Código:	IP-FM-29
				Versión:	02
				Fecha:	7/09/21
				Página:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	8755	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

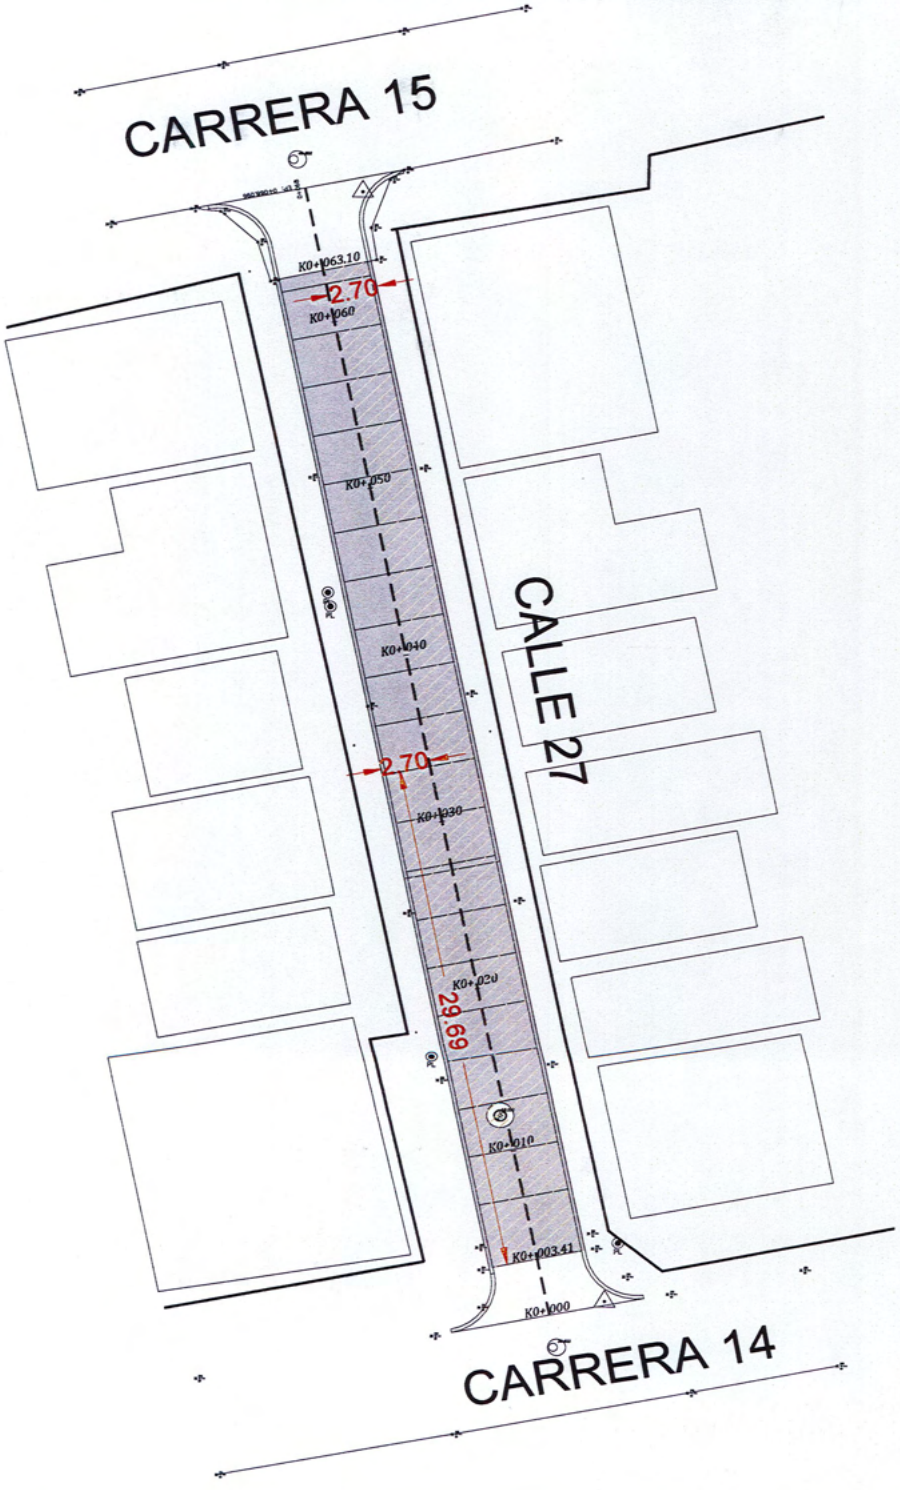

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Página:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	8756	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALZADA DERECHA: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	KD+002,00	KD+058,00	56,00			ML	1,00	56,00		
CALZADA DERECHA: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	KD+000,00	KD+054,00	54,00			ML	1,00	54,00		

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	5.551,70
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	110,00
Obra por ejecutar	5.441,70

TOTAL PRESENTE ACTA:	110,00

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP. 021007-0598582 ATL

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


NOMBRE: UBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
MP. 17202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	8756	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

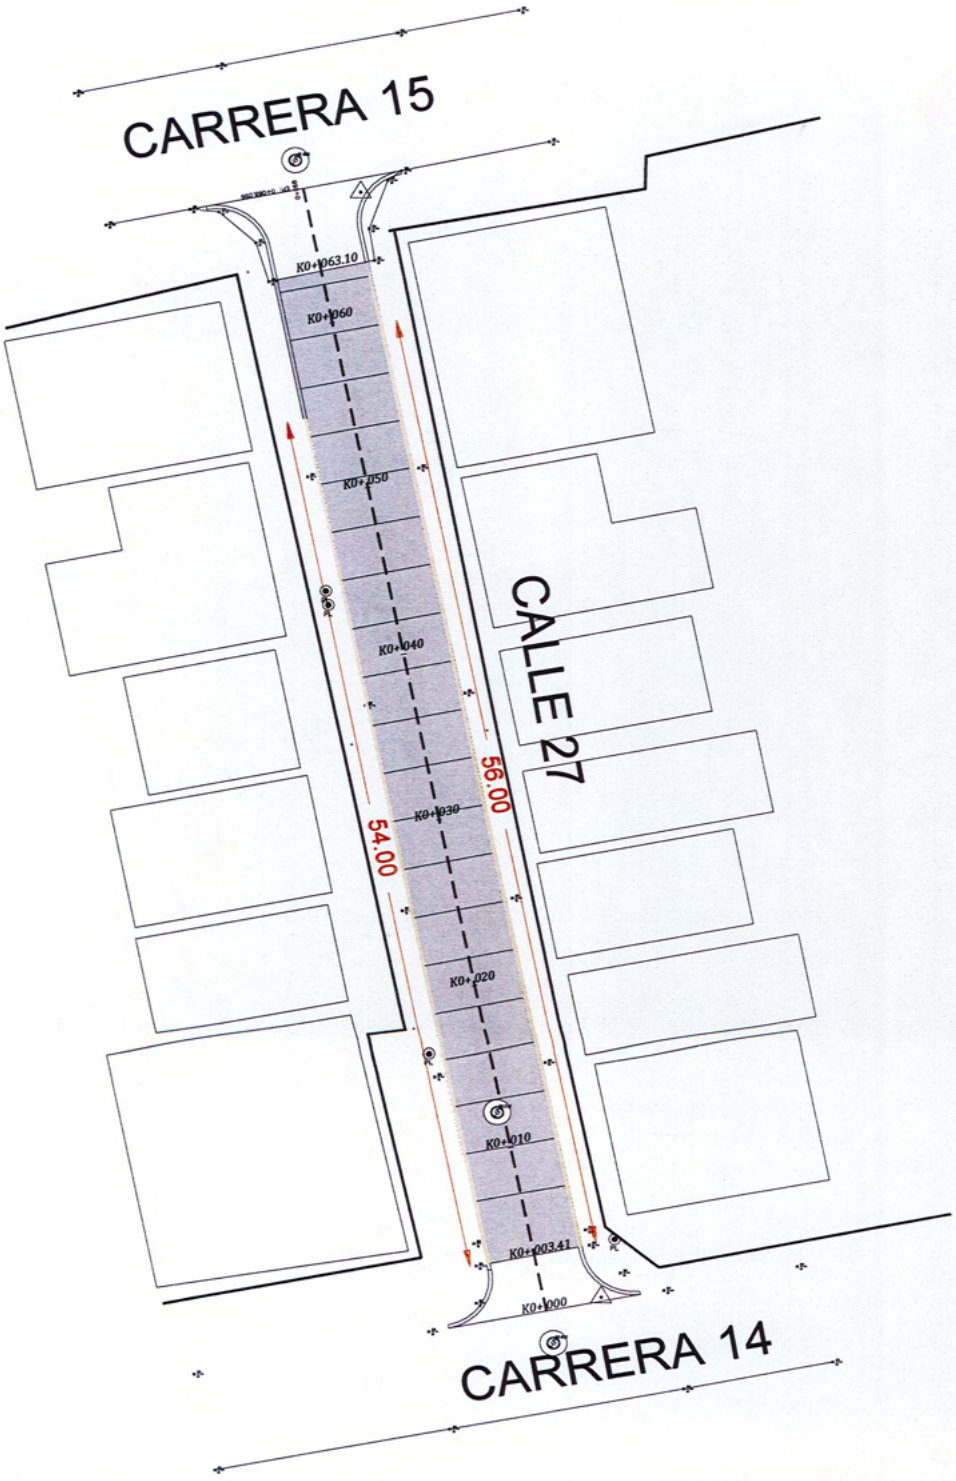

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Página:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	4309	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)







LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALZADA DERECHA: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+000,00	K0+002,00	2,00			ML	1,00	2,00		
CALZADA DERECHA: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+058,00	K0+065,60	7,60			ML	1,00	7,60		
CALZADA IZQUIERDA: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+054,00	K0+065,60	11,60			ML	1,00	11,60		

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	301,00
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	21,20
Obra por ejecutar	279,80

TOTAL PRESENTE ACTA:	21,20

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP. 021007-0598582 ATL

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


NOMBRE: UBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
M.P. 17202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	4309	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

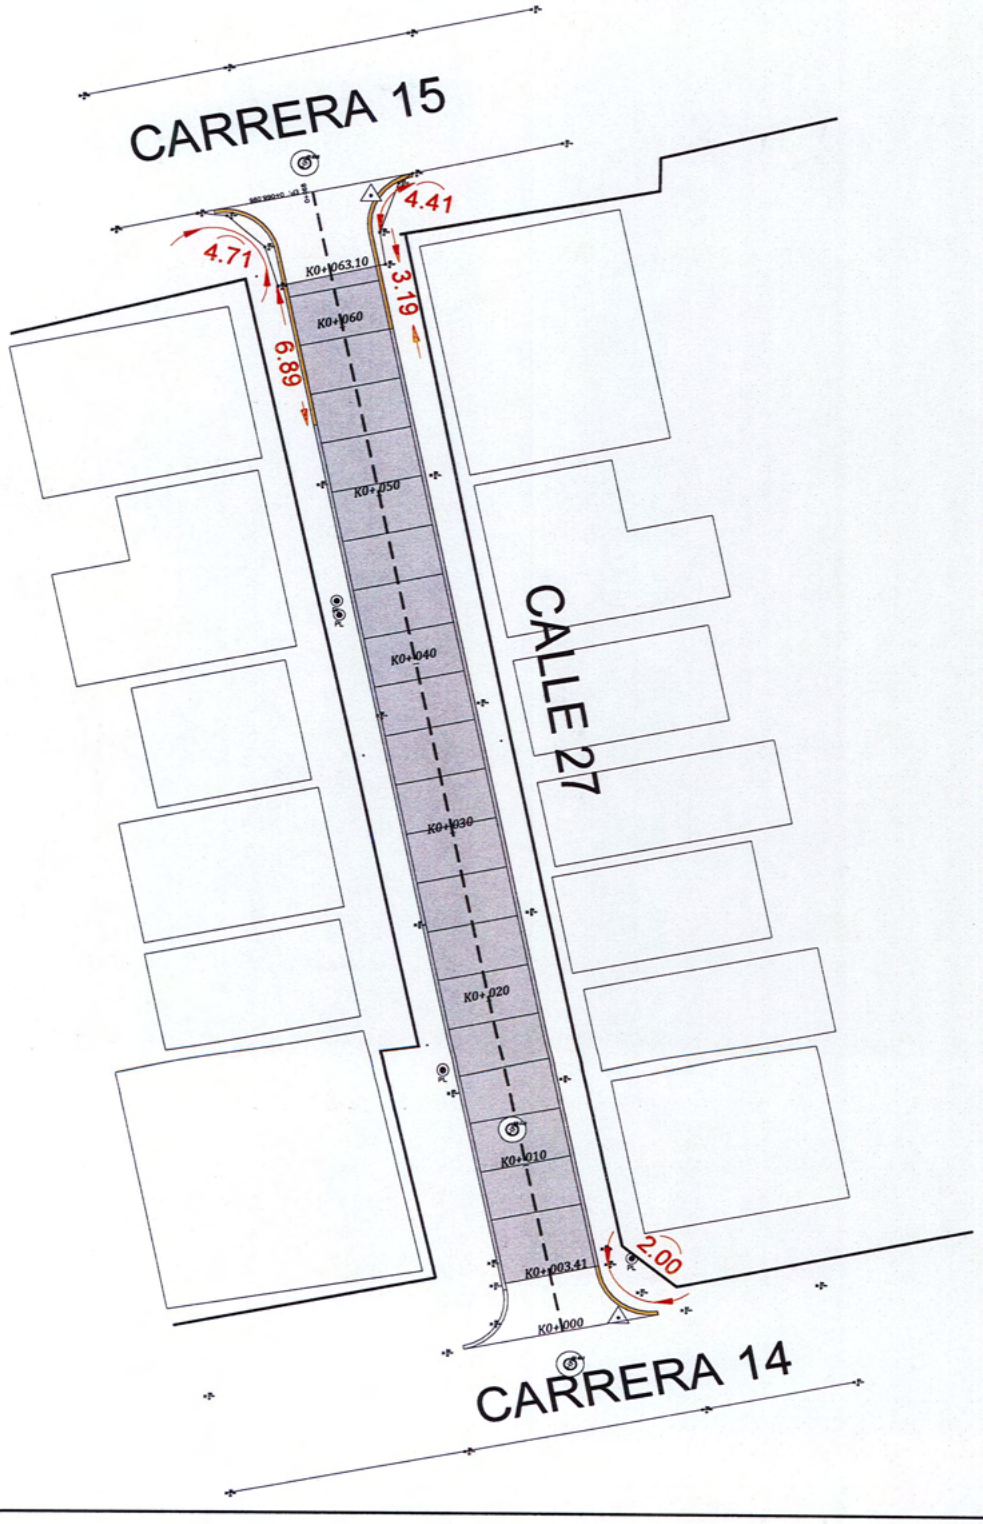

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA E.S.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024		
CAPITULO: PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM: 7801	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



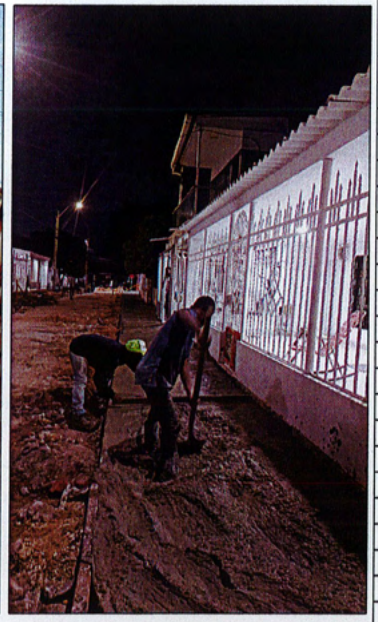

LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALZADA DERECHA: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+003,41	K0+063,10	59,15	1,21		M2	1,00		71,57	
CALZADA IZQUIERDA: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+003,41	K0+063,10	59,15	1,07		M2	1,00		63,29	
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 (RAMPA DE ACCESO)	K0+003,41	K0+063,10	4,30	2,80		M2	3,00		36,12	

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	5.551,70
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	170,98
Obra por ejecutar	5.380,72

TOTAL PRESENTE ACTA:	170,98

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP. 021007-0598582 ATL


Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: LILEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
MP. 17202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1			Código:	IP-FM-29
				Versión:	02
				Fecha:	7/09/21
				Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	7801	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

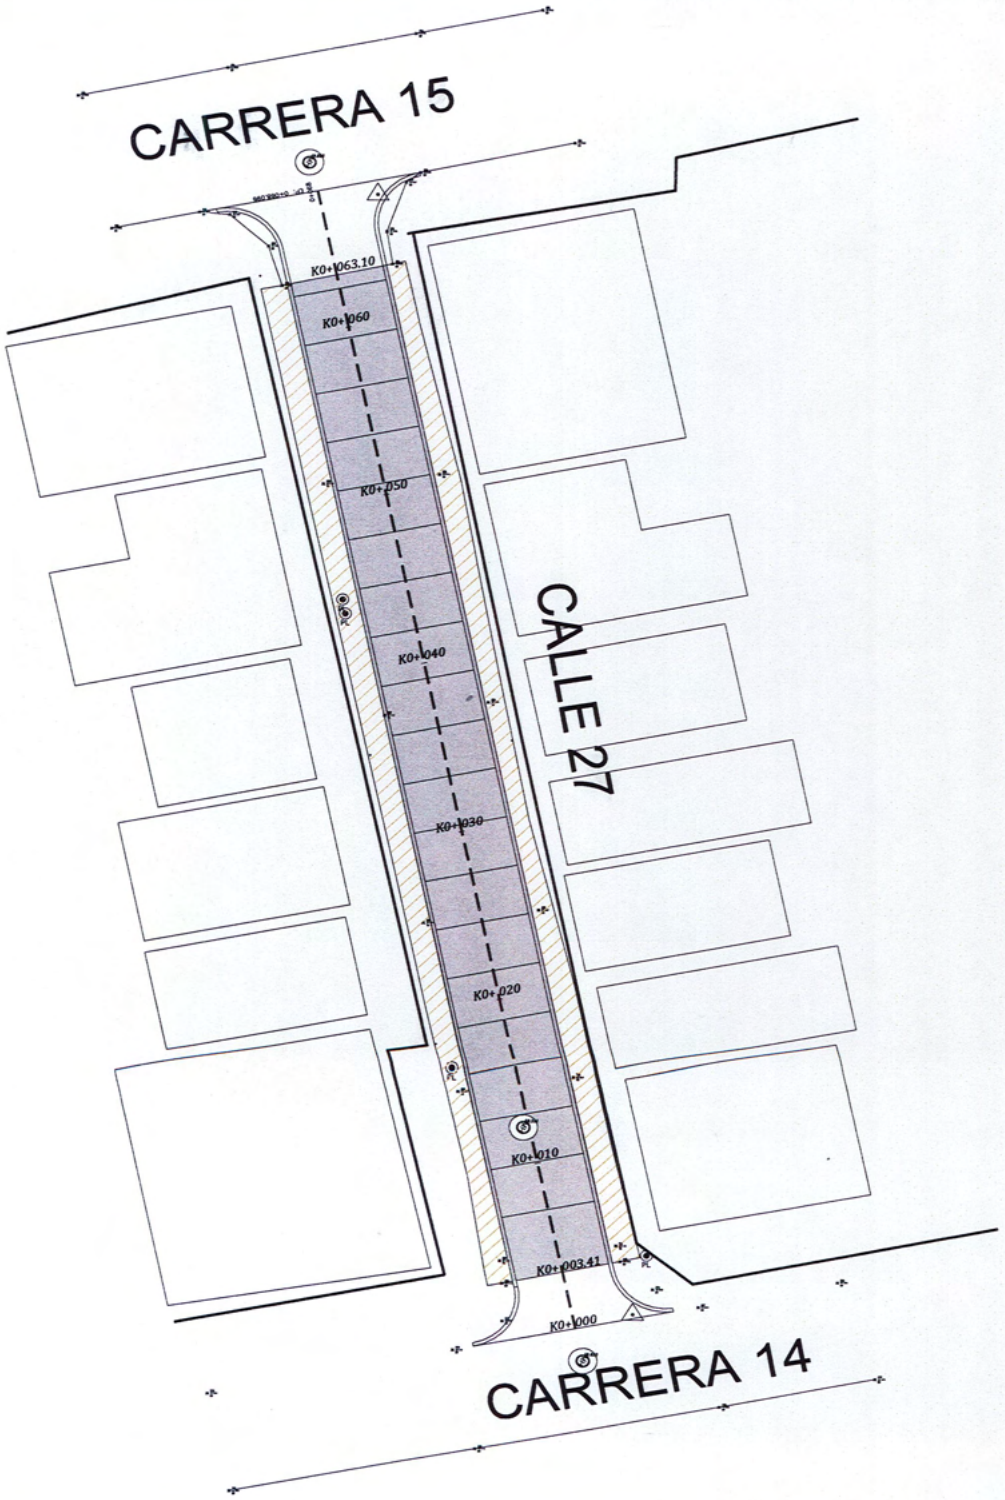

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	7790	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	8. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	DIMENSIONES		LONGITUD (m)	PESO UNITARIO (KG/ML)	UND	CANT.	TOTALES			
	SENTIDO	DIAMETRO (PULG)					ML	KG	CANT.	TOTAL
FRENTE DE OBRA 2.										
CALDAZA DERECHO: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 DESDE K0+10,09 HASTA K0+12,99	LONGITUDINAL	1/2"	5,70	1,00	KG	11,3	64,15	64,15	1,00	64,15
CALDAZA DERECHO: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 DESDE K0+10,09 HASTA K0+12,99	TRANSVERSAL	1/2"	2,60	1,00	KG	24,7	64,15	64,15	1,00	64,15
CALZADA IZQUIERDO: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 DESDE K0+10,09 HASTA K0+12,99	LONGITUDINAL	1/2"	5,70	1,00	KG	11,3	64,15	64,15	1,00	64,15
CALZADA IZQUIERDO: CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 DESDE K0+10,09 HASTA K0+12,99	TRANSVERSAL	1/2"	2,60	1,00	KG	24,7	64,15	64,15	1,00	64,15

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	5.773,77
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	256,60
Obra por ejecutar	5.517,17

TOTAL PRESENTE ACTA:	256,60

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP: 021067-0598582 ATL

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


NOMBRE: LIBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
MP: 17202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	CÓDIGO DEL ITEM:	7790	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

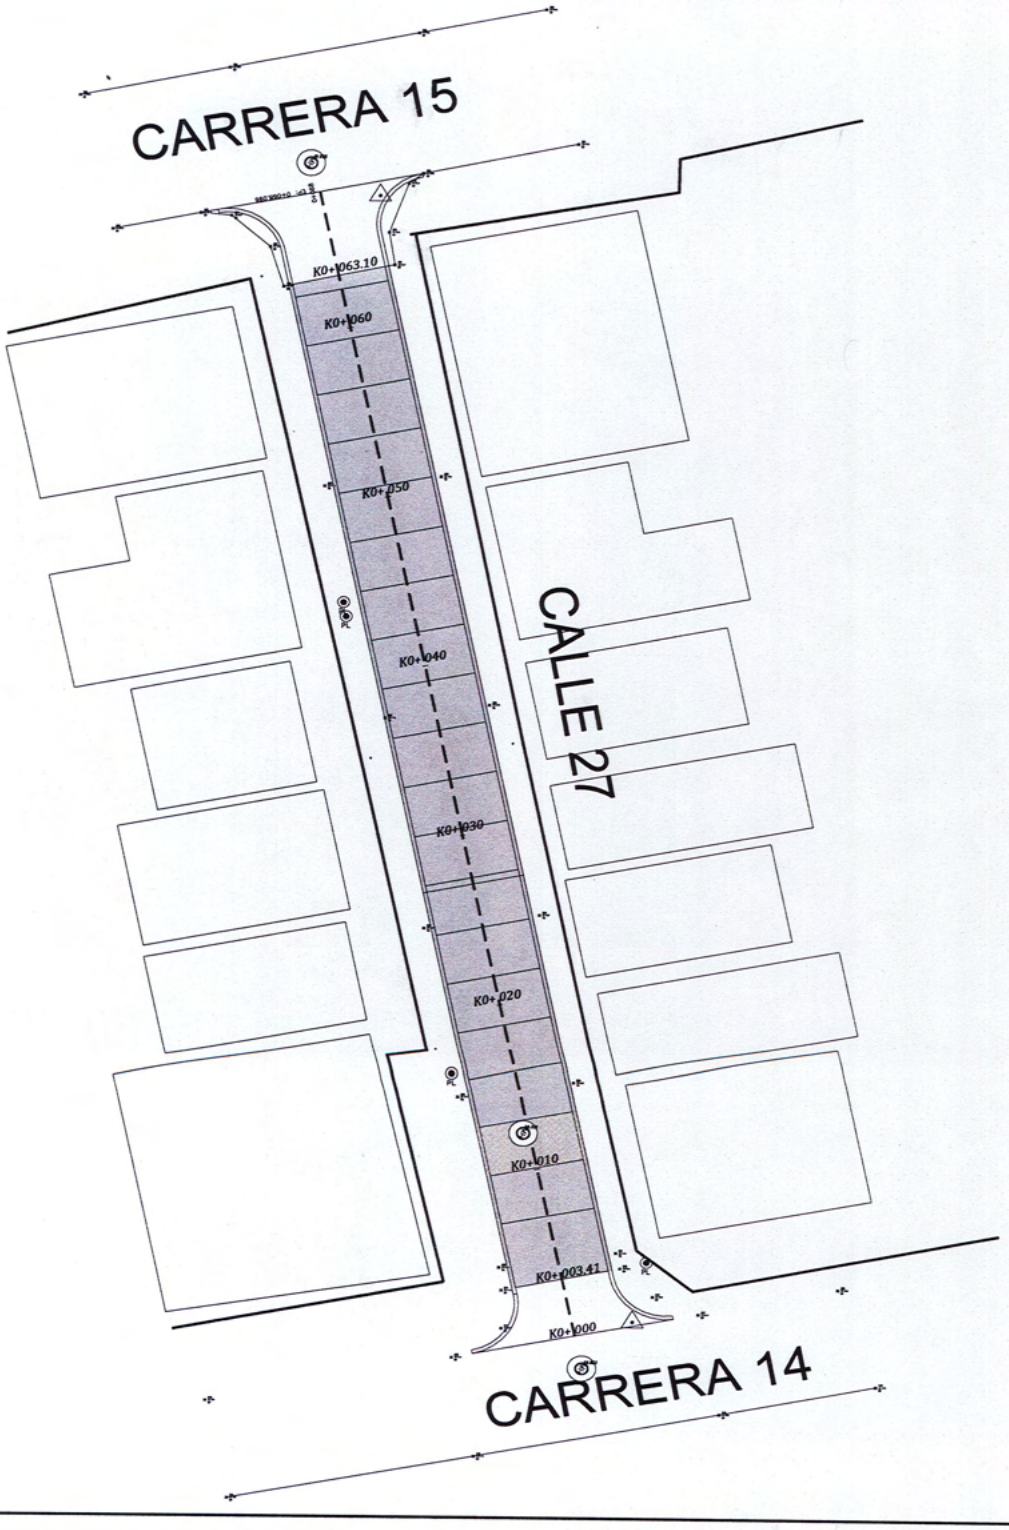

EDUMBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	7809	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+003,41	K0+063,10	59,69	5,40	0,25	M3	1,00			80,58

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	3.006,30
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	80,58
Obra por ejecutar	2.925,72

TOTAL PRESENTE ACTA:	80,58

OBSERVACIONES:


Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ MP. 021007-0598582 ATL	NOMBRE: JHEY GARCÍA BOHÓRQUEZ MP. 17302-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	7809	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

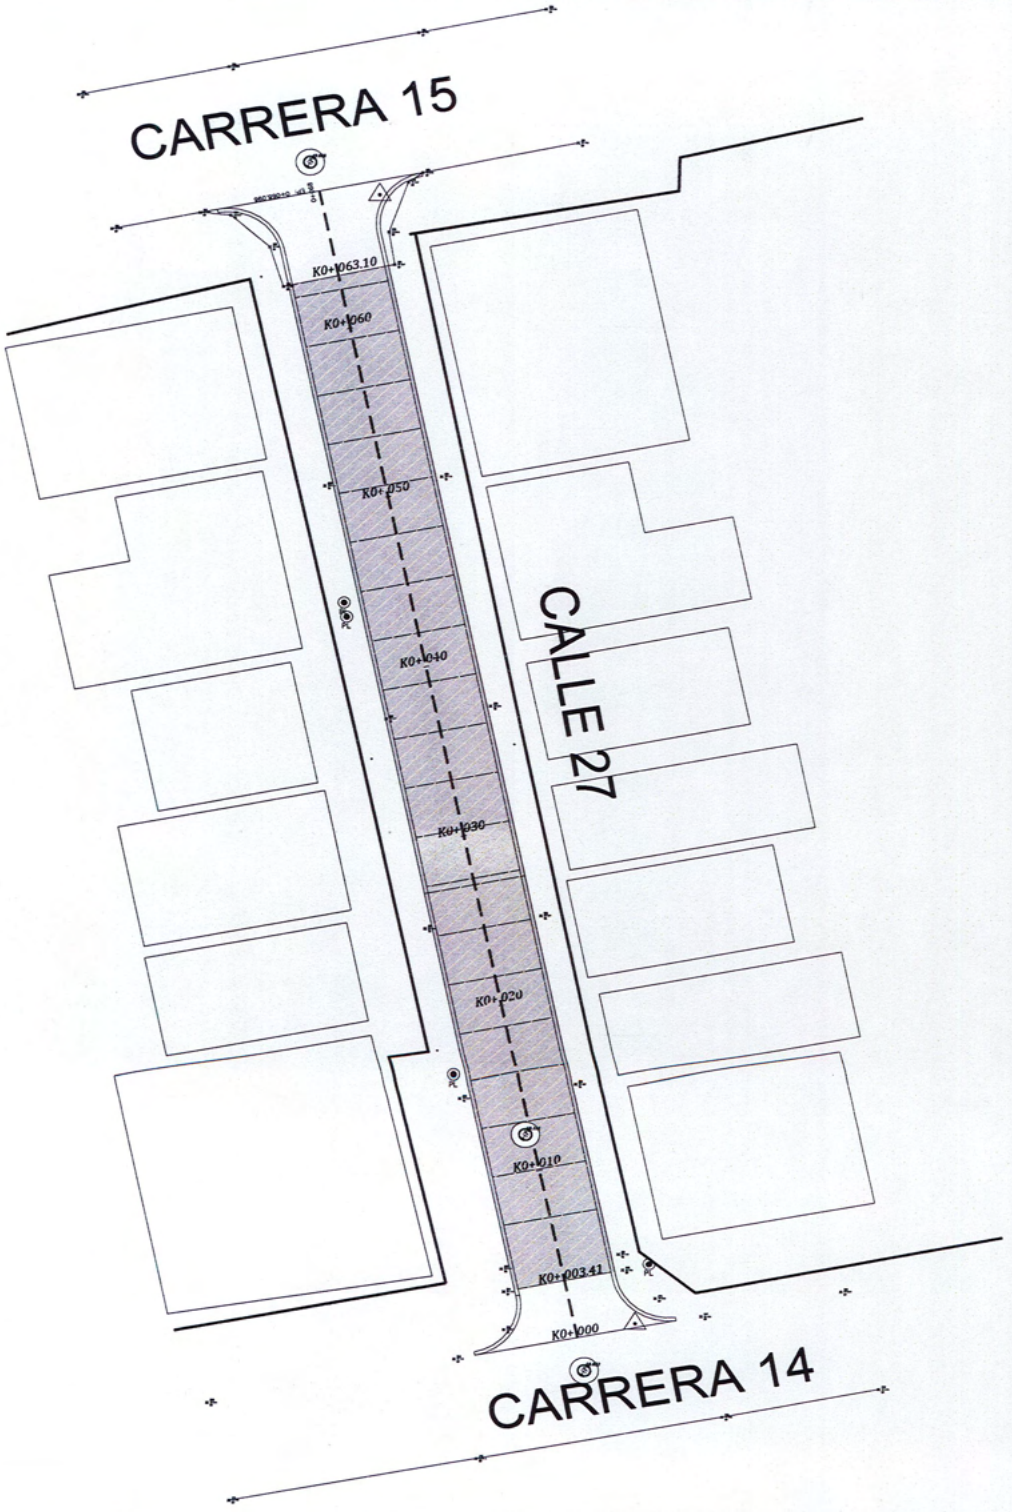

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	7811	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B	K0+000,00	K0+071,50				UND	12,00			
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B	K0+071,50	K0+154,50				UND	12,00			

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	252,00
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	24,00
Obra por ejecutar	228,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	24,00

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP. 021087-0598582 ATL

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


NOMBRE: LIBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
MP. 1202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	7811	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO

FRENTE DE OBRA 5. CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B (CARRERA 16 BOCACALLE)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

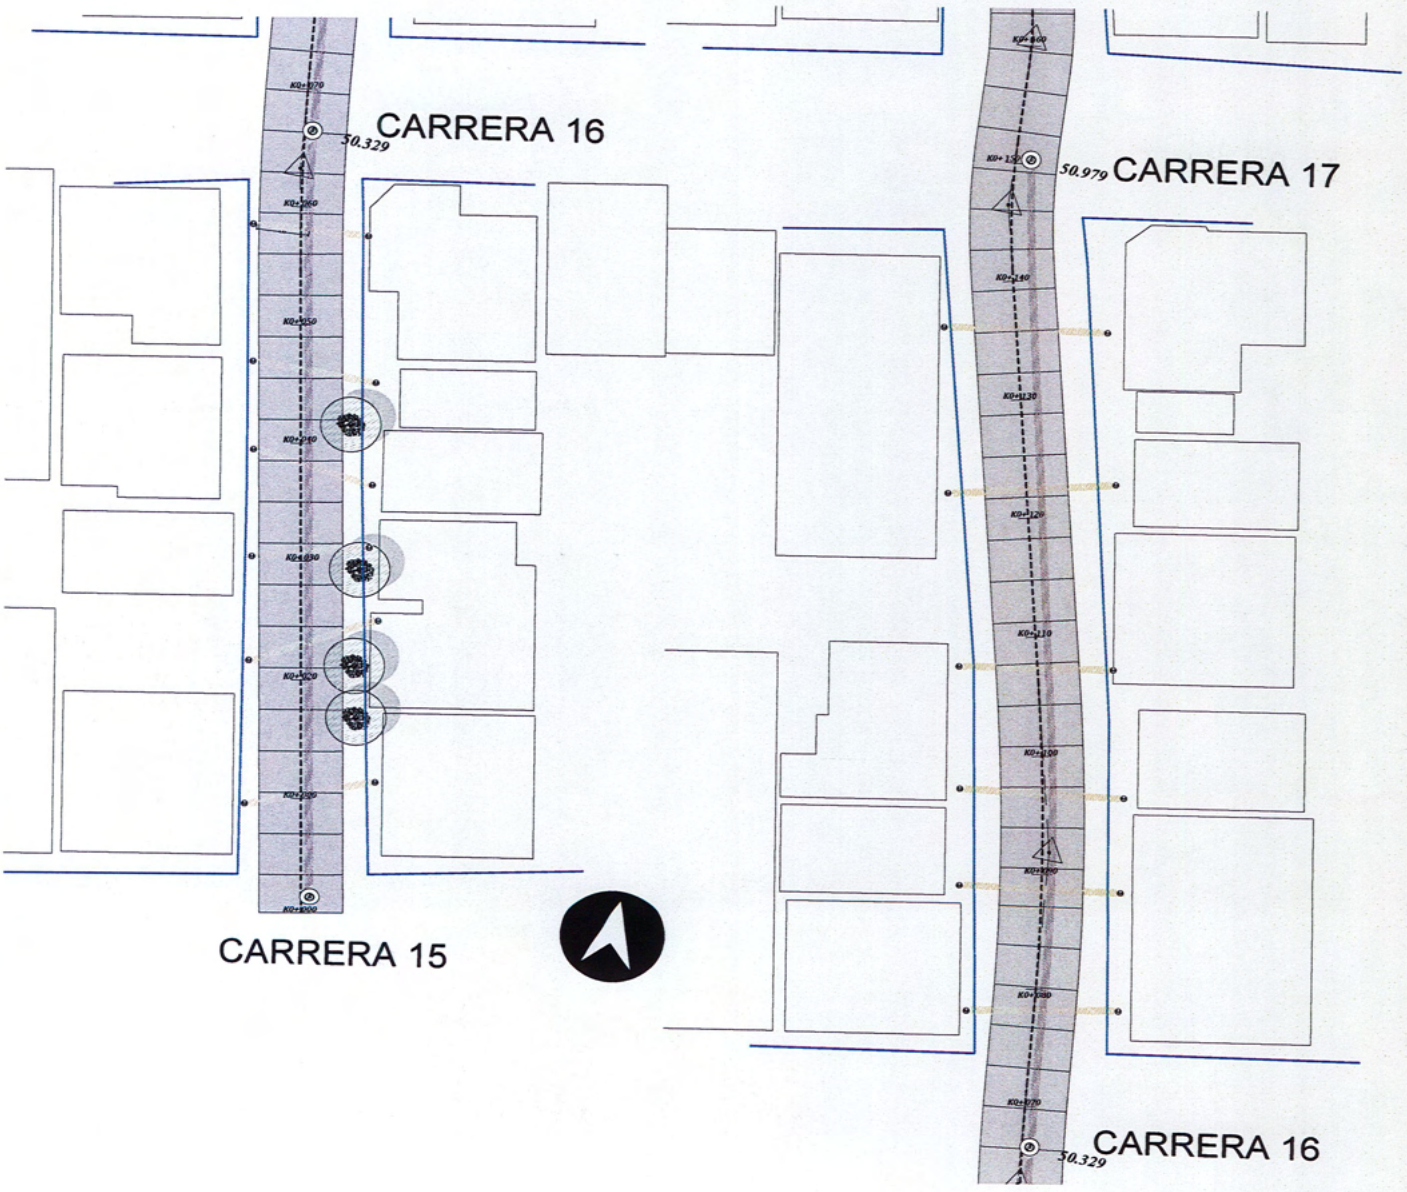

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Página:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8800	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+010,09	K0+012,99				UND	1,00			

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	8,00
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	1,00
Obra por ejecutar	7,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP. 021007-0598582 ATL

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


NOMBRE: UBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
MP. 17302-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8800	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

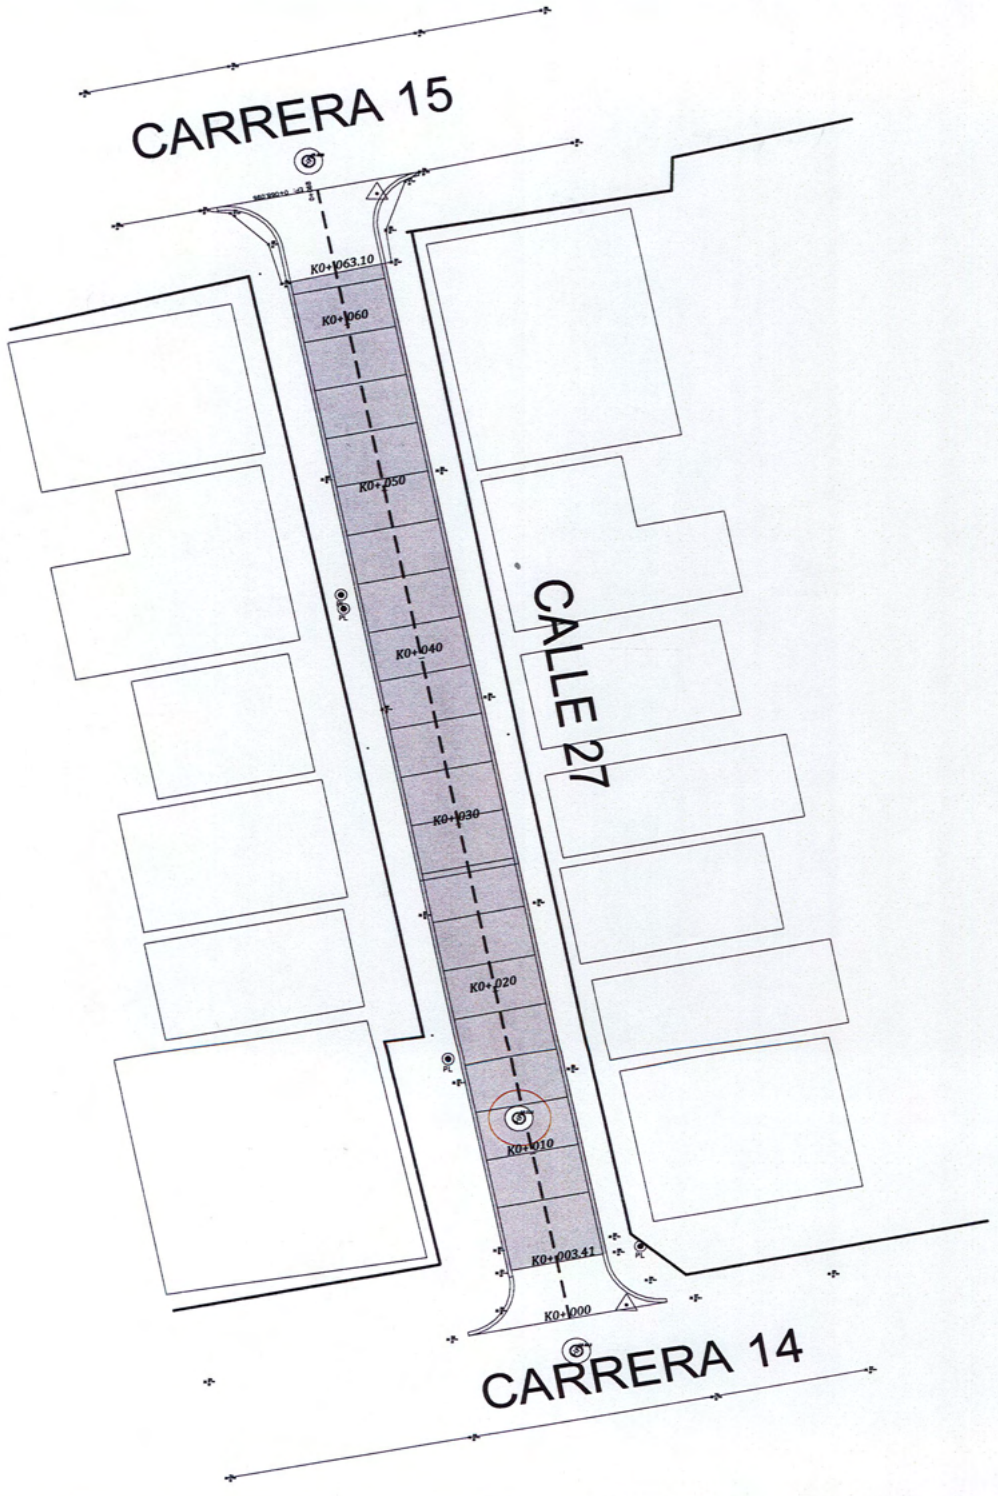

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	7822	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+007,00	K0+007,00				UND	1,00			
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+018,00	K0+018,00				UND	1,00			
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+021,00	K0+021,00				UND	1,00			
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+022,00	K0+022,00				UND	1,00			
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+035,00	K0+035,00				UND	1,00			
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+036,00	K0+036,00				UND	1,00			
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+048,00	K0+048,00				UND	1,00			
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+083,00	K0+083,00				UND	1,00			
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+092,00	K0+092,00				UND	1,00			
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+107,00	K0+107,00				UND	1,00			

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	78,00
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	10,00
Obra por ejecutar	68,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	10,00

OBSERVACIONES:


Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: [illegible] HERNANDEZ LOPEZ MP. 08103T-0598582 ATL	NOMBRE: LISEY GARCÍA BOHÓRQUEZ MP. 17302-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	7822	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

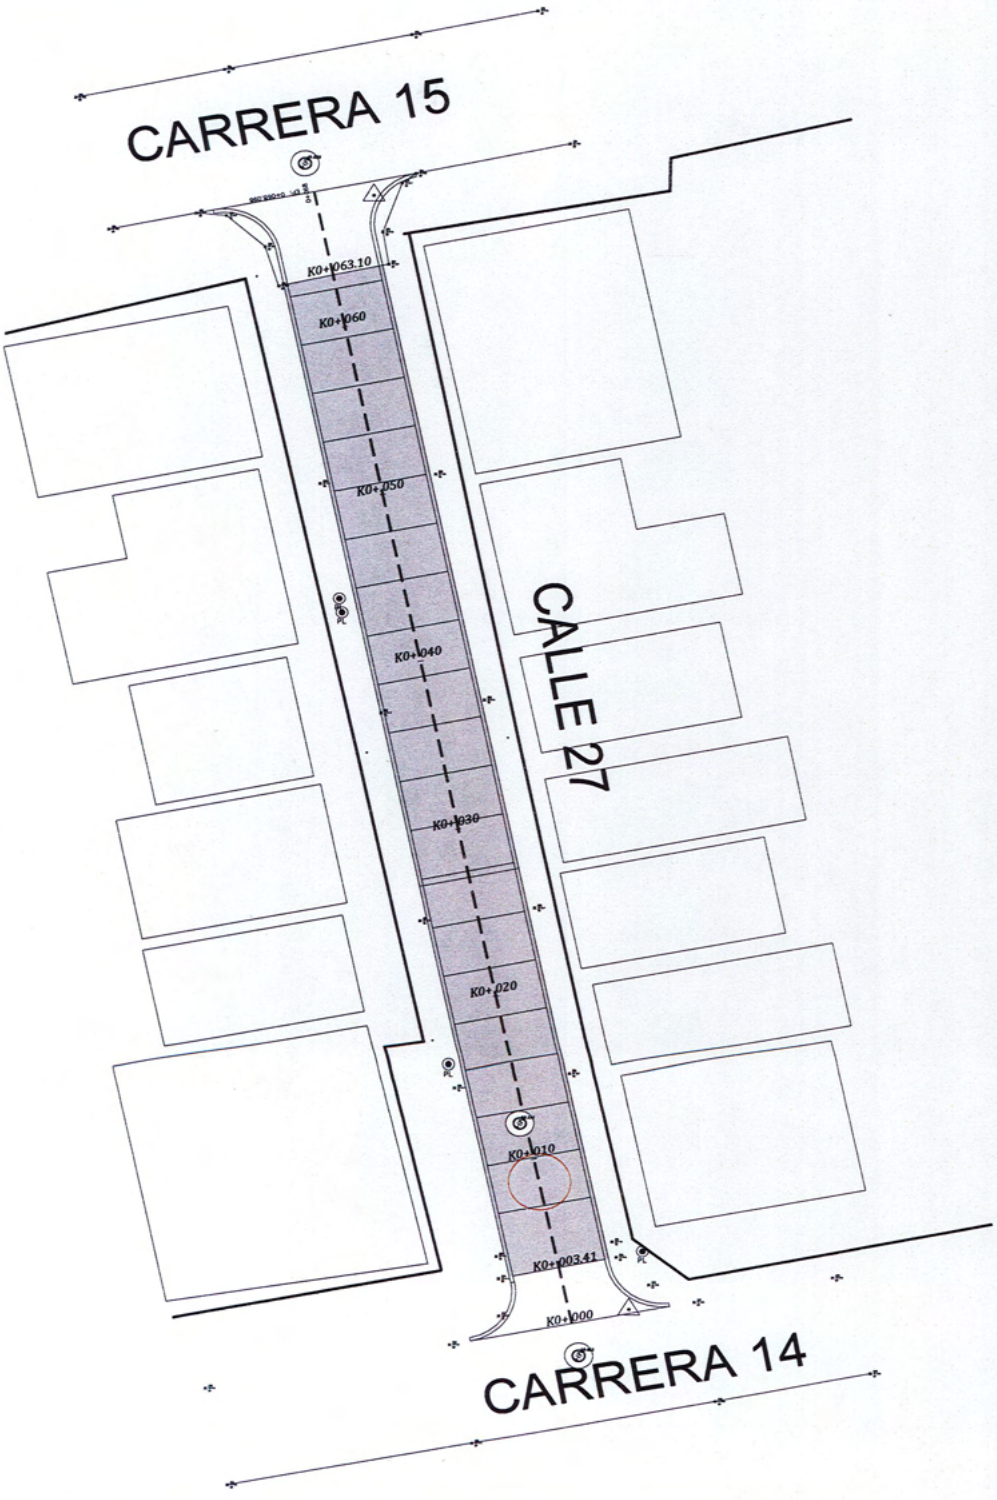


EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	7822	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE

FRENTE DE OBRA 5. CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

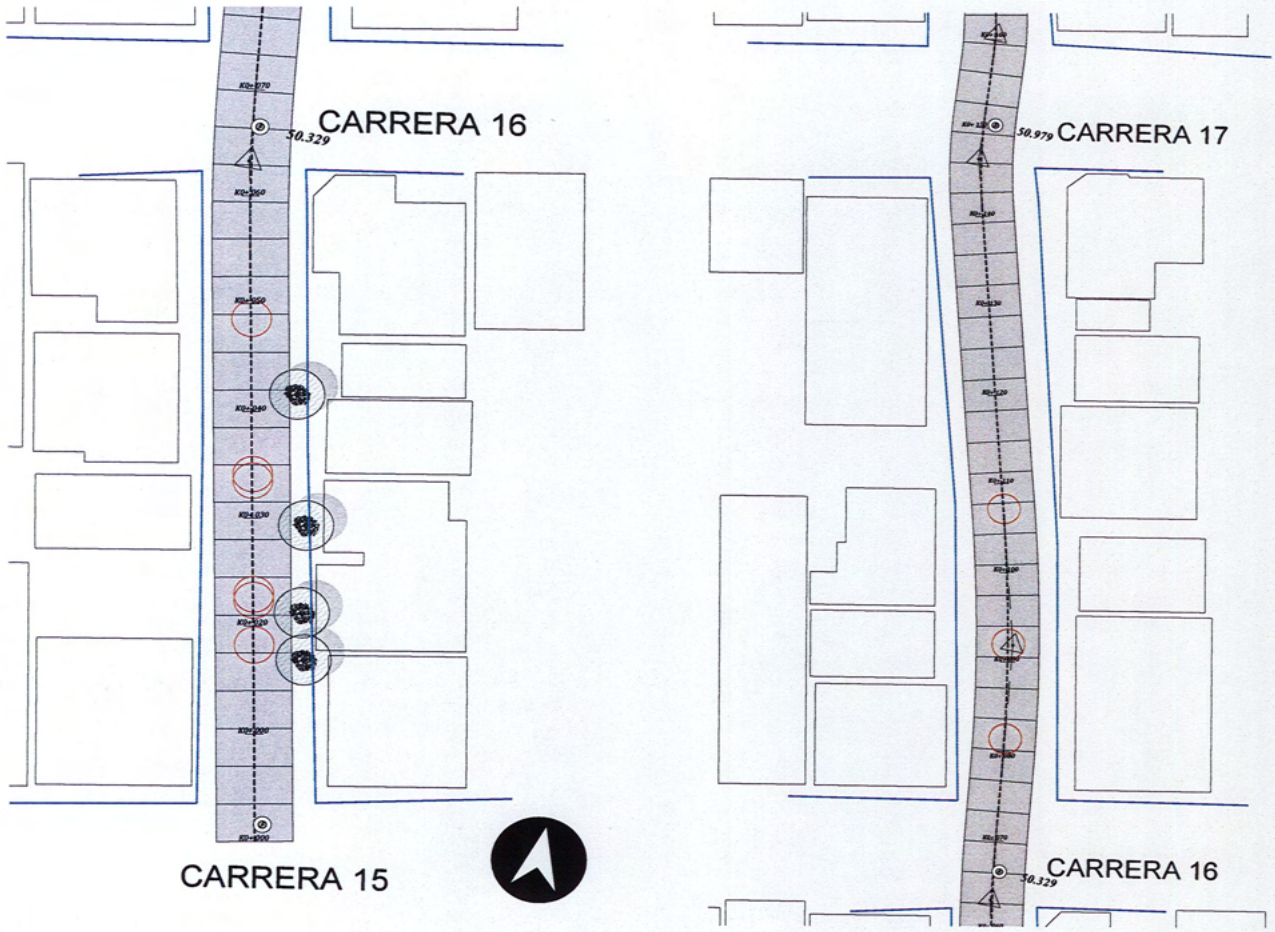

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8765	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B	K0+003,50	K0+062,83	59,33			ML	0,70	41,53		
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B	K0+073,23	K0+144,32	71,09			ML	0,70	49,76		

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	1.505,71
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	91,29
Obra por ejecutar	1.414,42

TOTAL PRESENTE ACTA:	91,29

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP. 021087-0598582 ATL


Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: LIBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
MP. 17202-341997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8765	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10

FRENTE DE OBRA 5. CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B (CARRERA 16 BOCACALLE)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

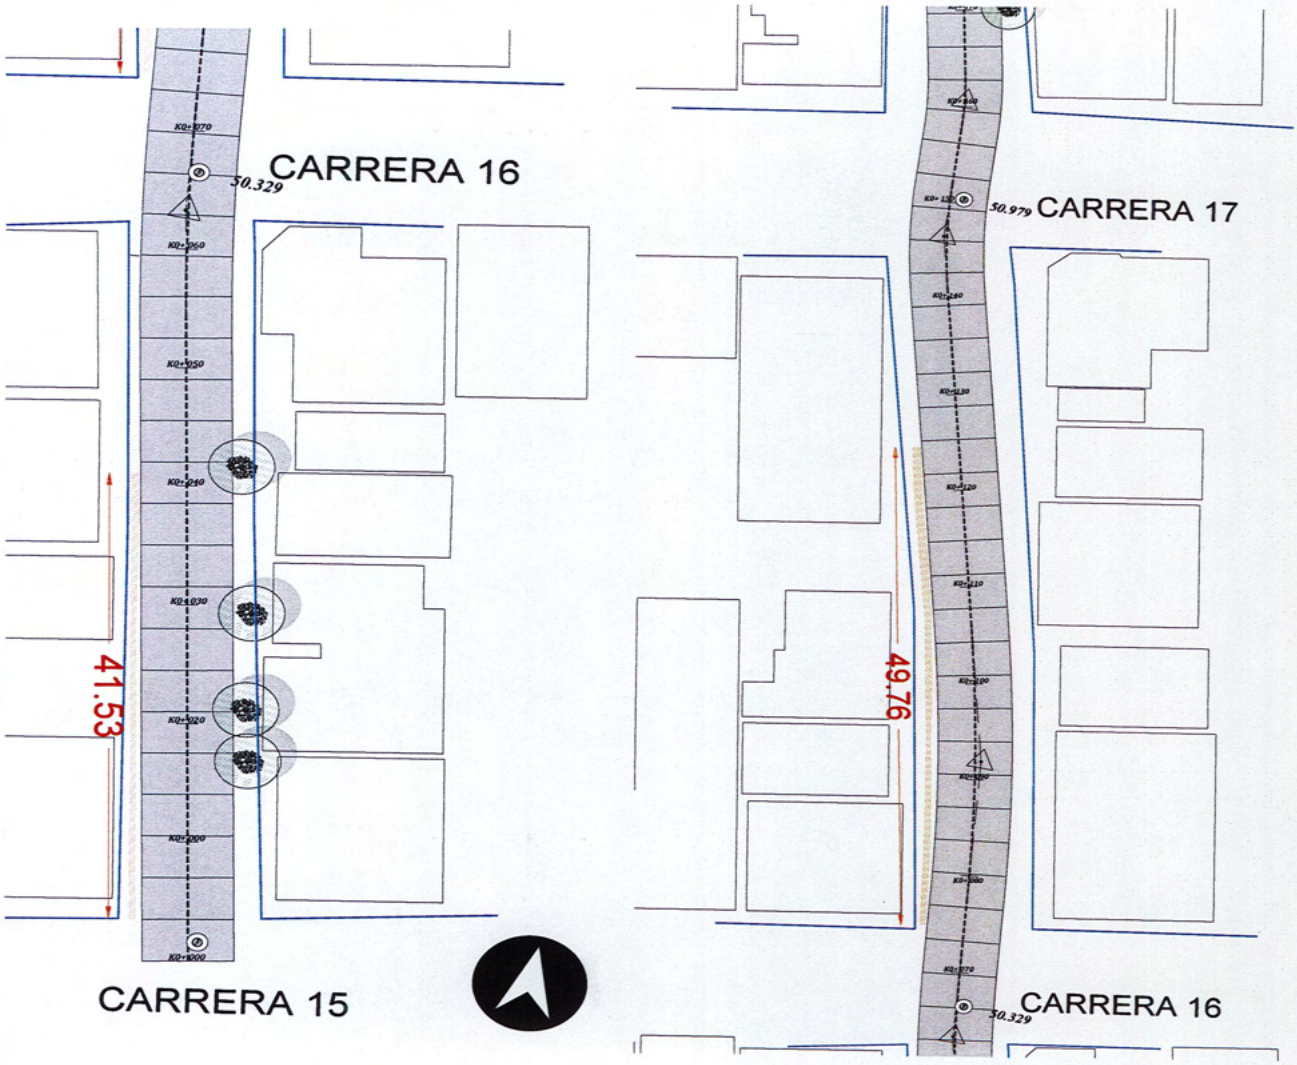

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8767	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+015,00	K0+015,00	5,70			ML	1,00	5,70		
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+030,00	K0+030,00	5,70			ML	1,00	5,70		
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+047,00	K0+047,00	5,70			ML	1,00	5,70		
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+058,00	K0+058,00	5,70			ML	1,00	5,70		
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+115,00	K0+115,00	6,70			ML	1,00	6,70		
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 208	K0+160,00	K0+160,00	6,70			ML	1,00	6,70		

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	1.328,57
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	36,20
Obra por ejecutar	1.292,37

TOTAL PRESENTE ACTA:	36,20

OBSERVACIONES:


Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ MP. 08103705598582 ATL	NOMBRE: ULEY GARCÍA BOHÓRQUEZ MP. 17202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8767	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

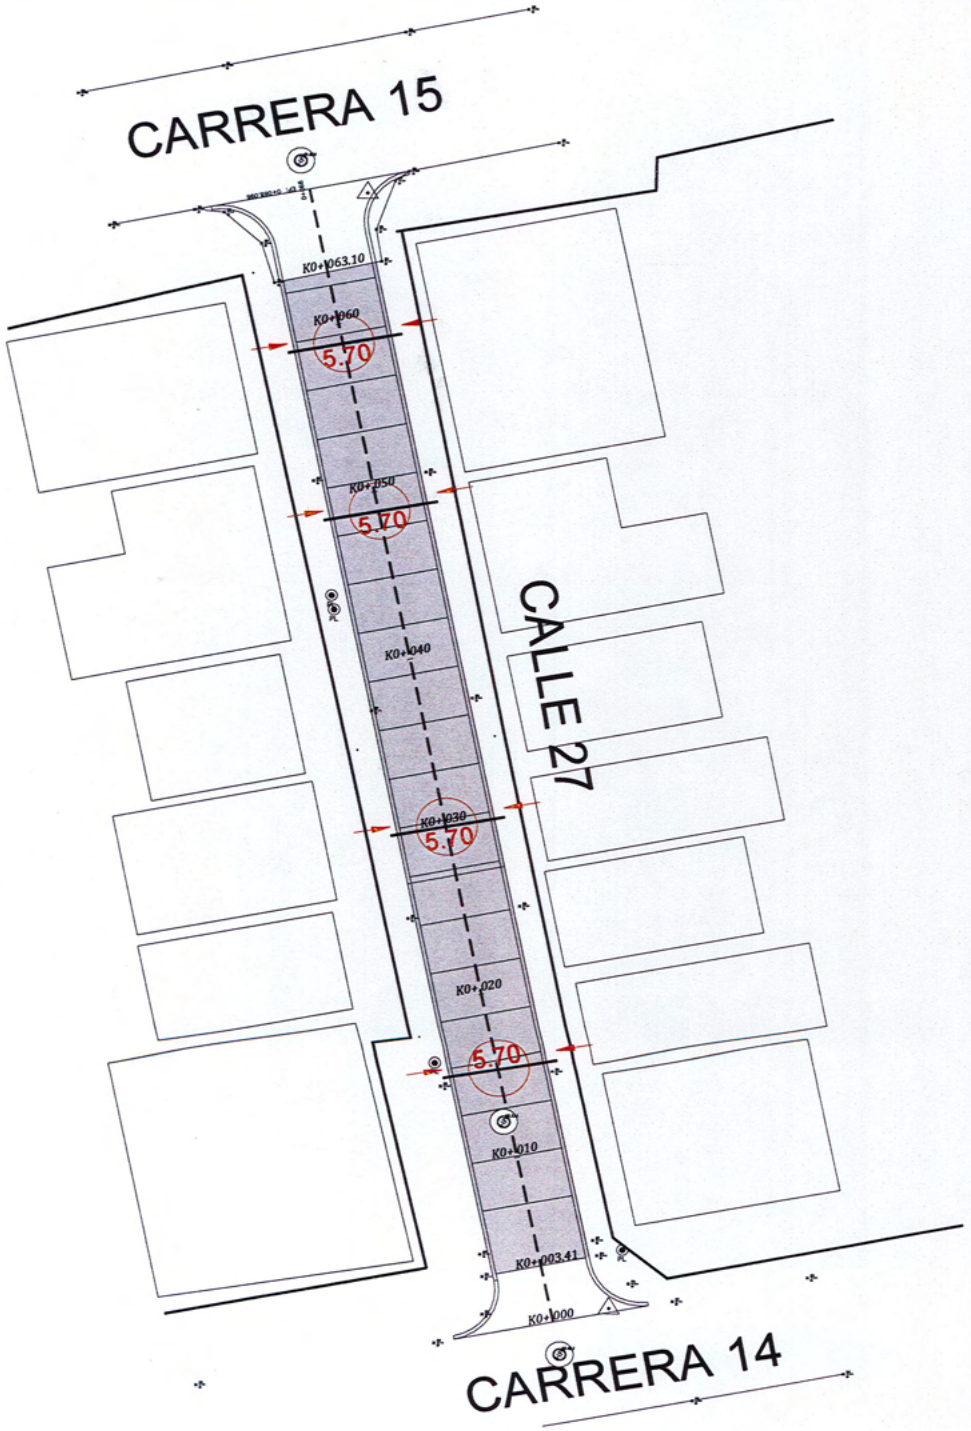


EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8767	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10

FRENTE DE OBRA 5. CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

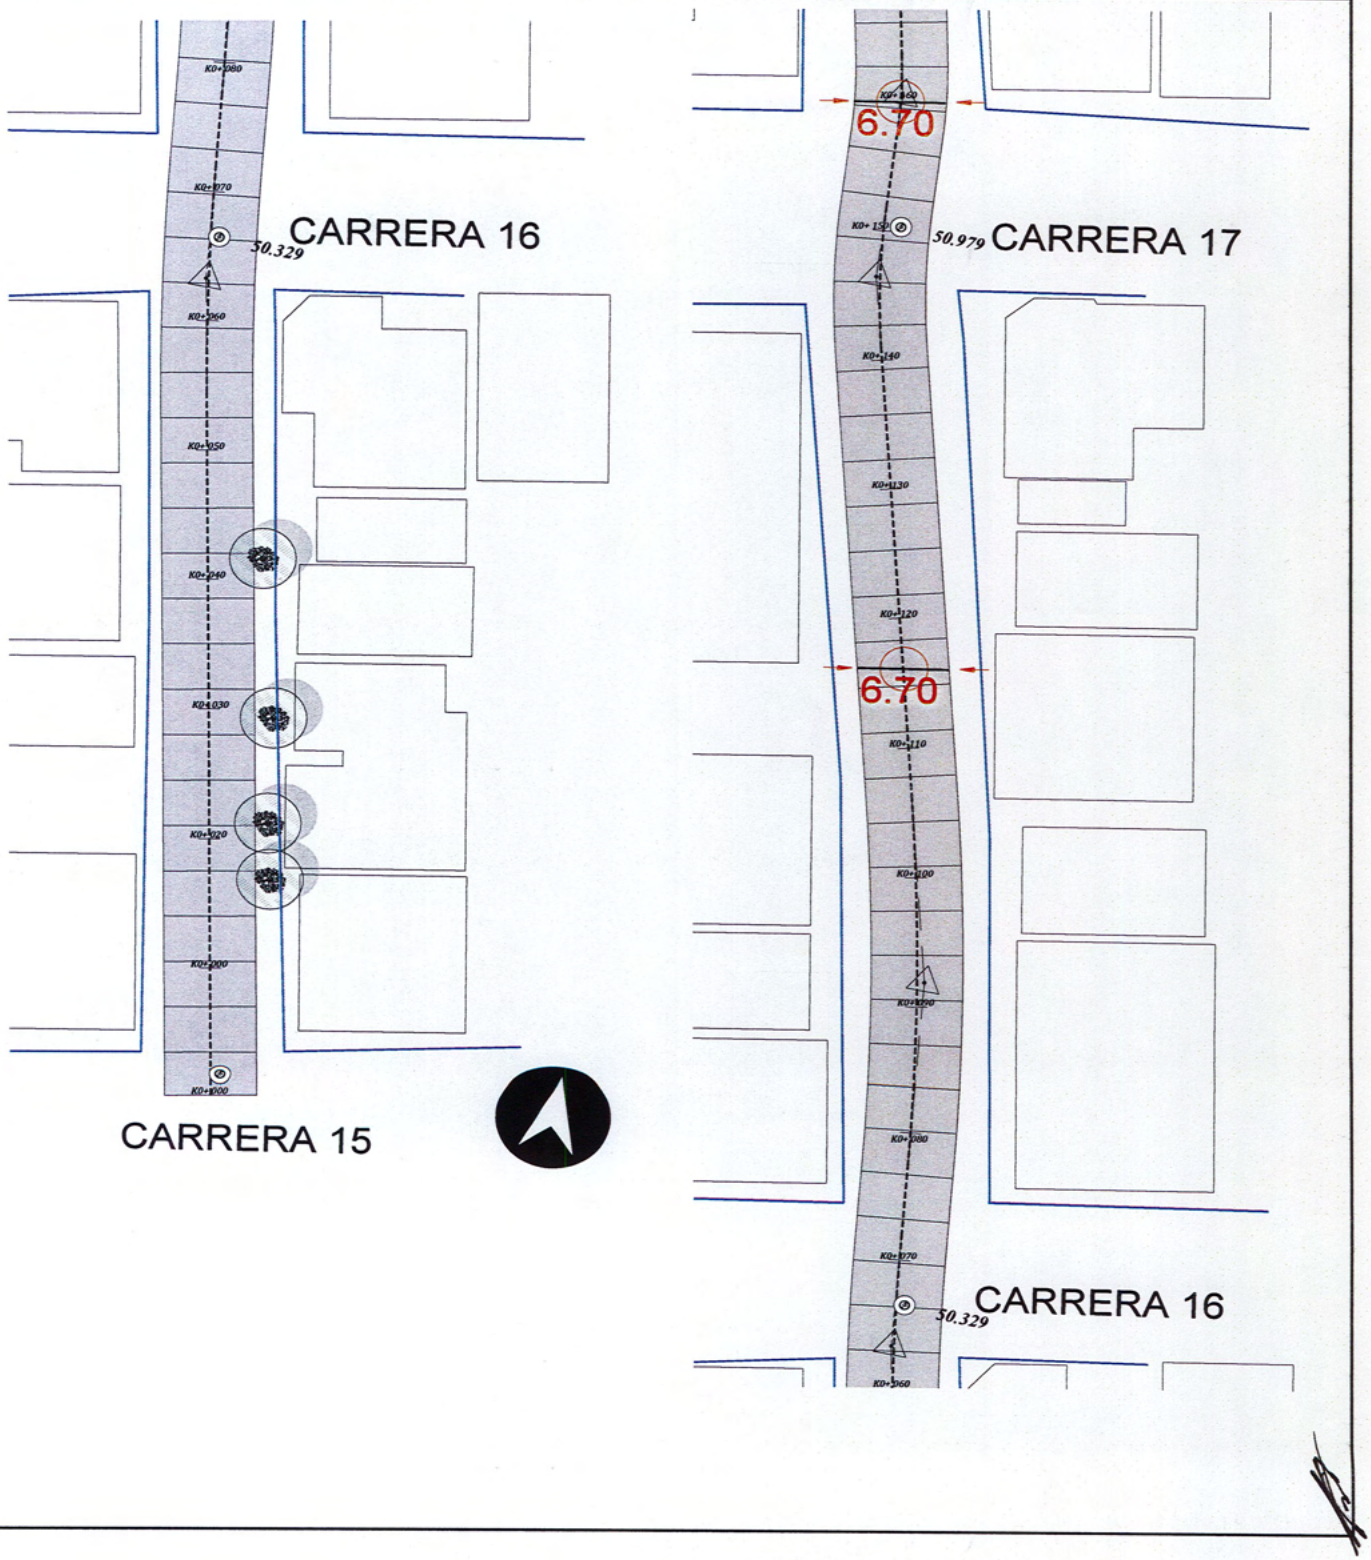

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA E.S.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Página:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8779	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B	K0+000,00	K0+071,50				UND	12,00			
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B	K0+071,50	K0+154,50				UND	12,00			

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	1.328,00
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	24,00
Obra por ejecutar	1.304,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	24,00

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP. 021067-0598582 ATL

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


NOMBRE: LISEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
MP. 17302-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8779	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM

FRENTE DE OBRA 5. CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B (CARRERA 16 BOCACALLE)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

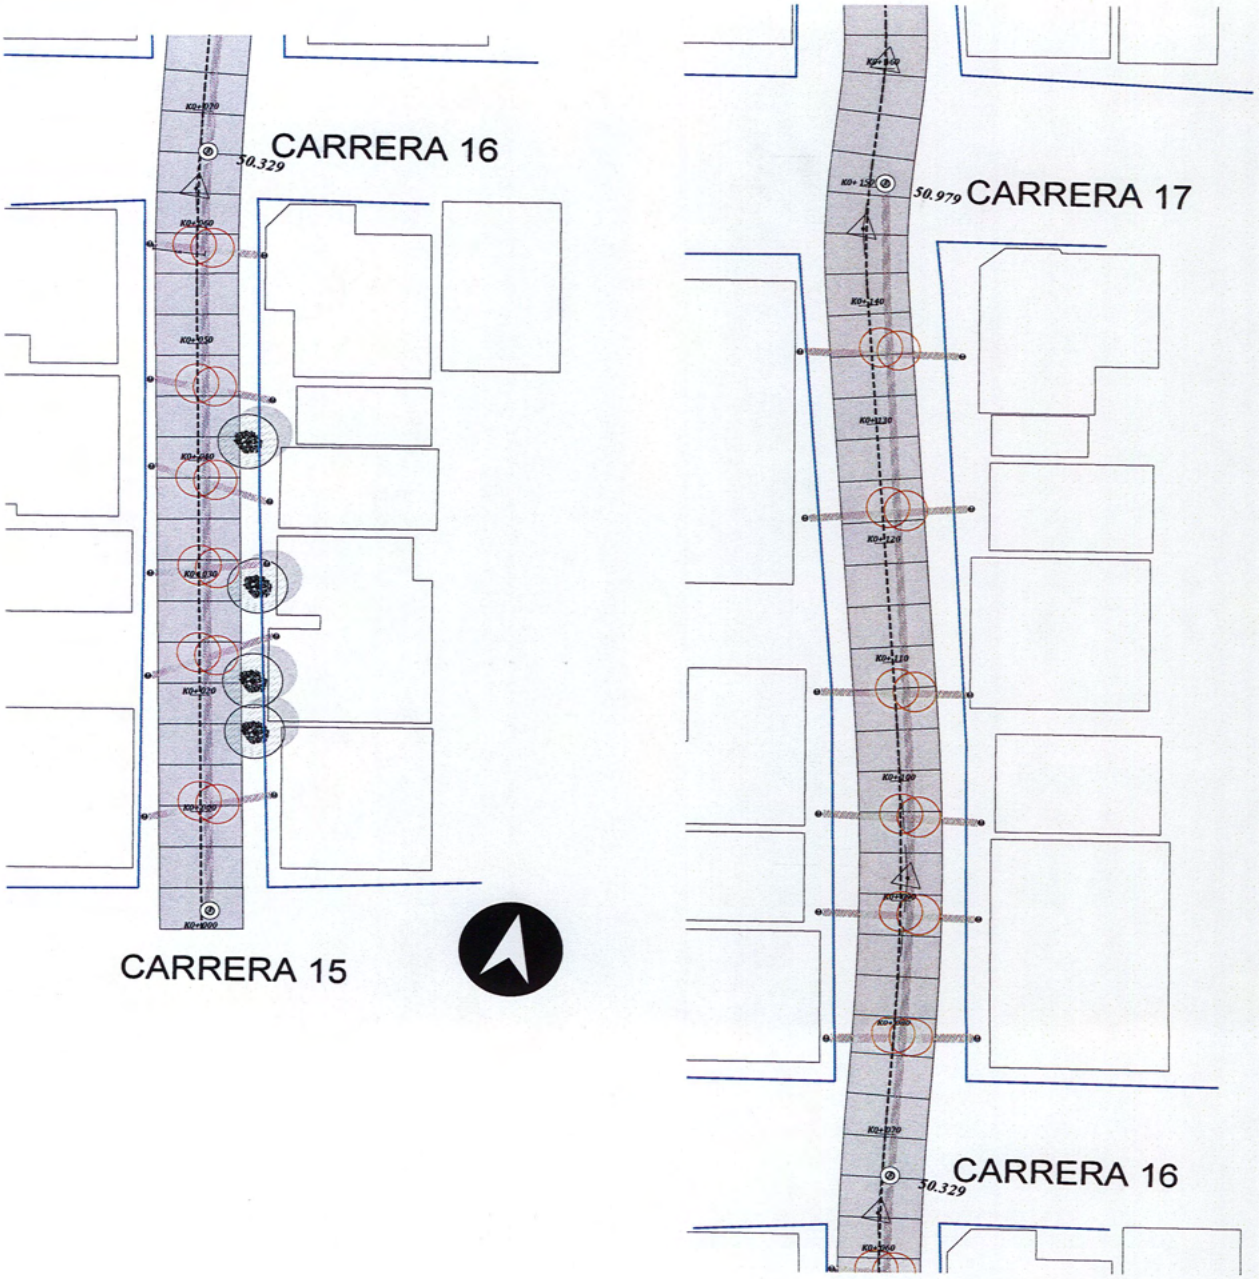

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8784	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B	K0+000,00	K0+071,50	71,50			ML	1,00	71,50		
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B	K0+071,50	K0+154,50	83,00			ML	1,00	83,00		

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	1.328,57
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	154,50
Obra por ejecutar	1.174,07

TOTAL PRESENTE ACTA:	154,50

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP. 021007-0598582 ATL

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


NOMBRE: LIBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
MP. 17202-349997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	8784	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")

FRENTE DE OBRA 5. CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B (CARRERA 16 BOCACALLE)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

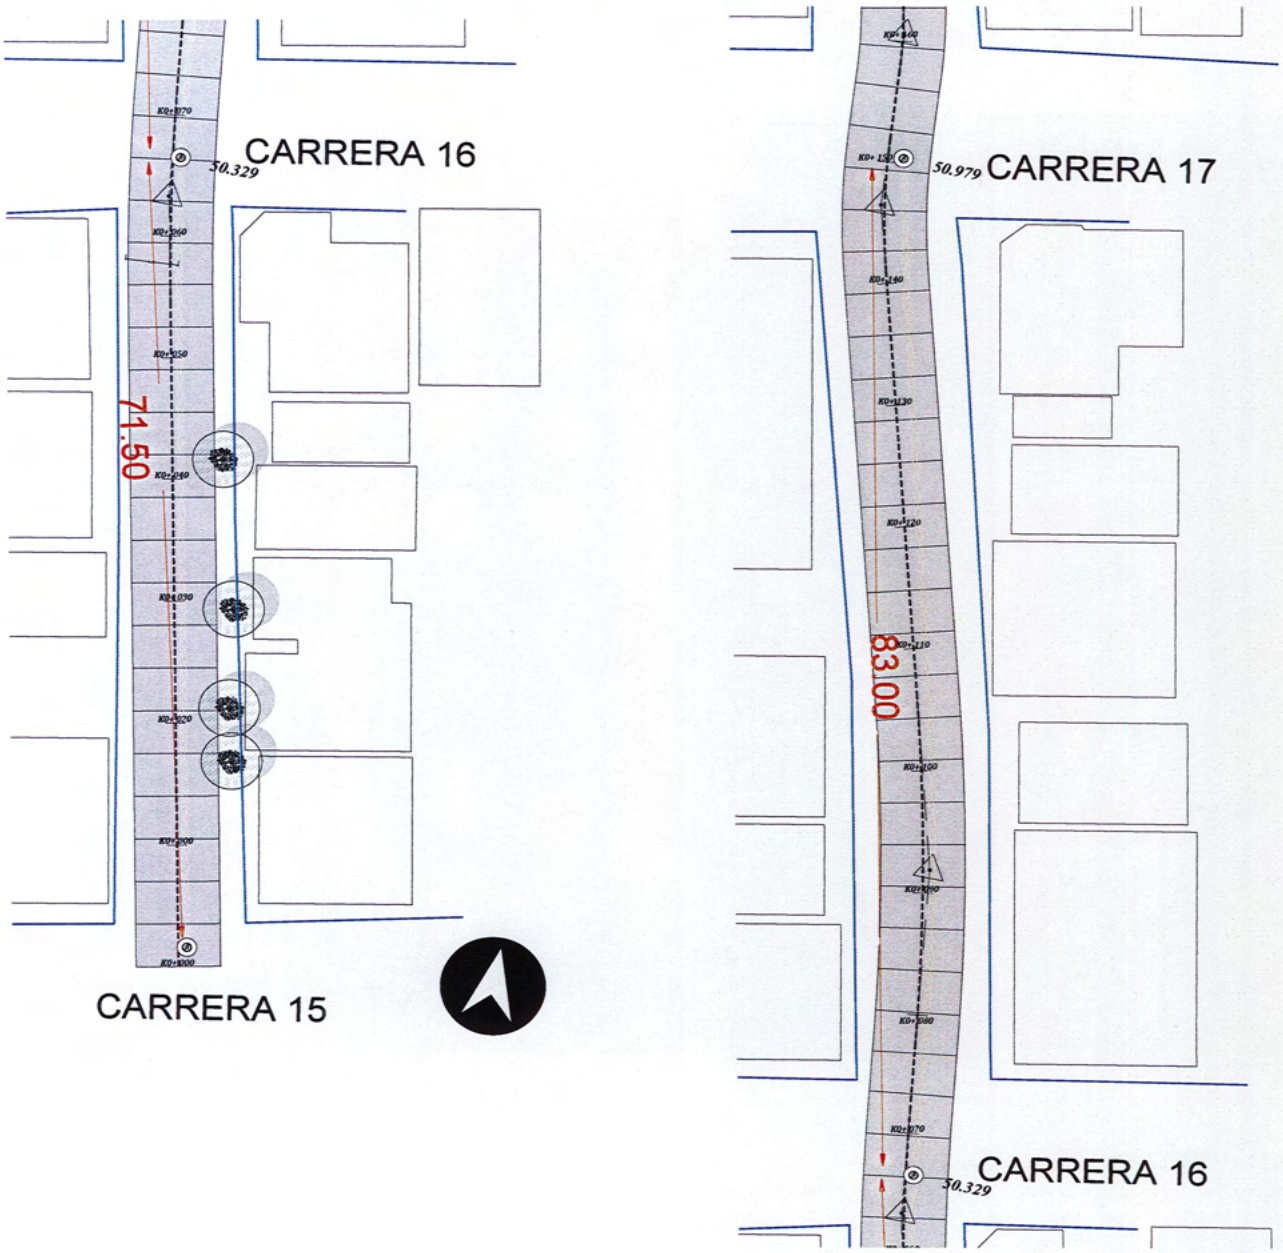

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 5.										
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B	K0+000,00	K0+071,50	71,50	0,33		M3	1,00			23,49
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B	K0+071,50	K0+154,50	83,00	0,33		M3	1,00			27,27
										0,00

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	119,57
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	50,76
Obra por ejecutar	68,81

TOTAL PRESENTE ACTA:	50,76

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ
MP. 021007-0598582 ATL

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: UBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ
MP. 1202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

FRENTE DE OBRA 5. CALLE 23 ENTRE CARRERAS 15 Y 20B (CARRERA 16 BOCACALLE)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 1

Código:	IP-FM-29
Versión:	02
Fecha:	7/09/21
Página:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	3432-1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



LOCALIZACION	Abscisa Inicial	Abscisa Final	DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
FRENTE DE OBRA 2.										
CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15	K0+048,00	K0+048,00				UND	1,00			

Cantidad Contractual Según Modificativa N°1	400,00
Acumulado anterior	0,00
Acumulado a presente acta	1,00
Obra por ejecutar	399,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESIDENTE DE OBRA	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: JOSE HERNANDEZ LOPEZ MP. 021087-0598582 ATL	NOMBRE: LIBEY GARCÍA BOHÓRQUEZ MP. 17202-369997 CLD

EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1	Código:	IP-FM-29
		Versión:	02
		Fecha:	7/09/21
		Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	SA-EDU-017-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
FECHA:	VEINTIÚN (21) DE OCTUBRE DE 2024				
CAPITULO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CÓDIGO DEL ITEM:	3432	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.

FRENTE DE OBRA 2. CALLE 27 ENTRE CARRERAS 14 Y 15

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

