INFORME DE SUPERVISIÓN
CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
CONTRATO N° SVIV-CONX-SOL-002-2024

AUNIR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE OCAÑA Y LA ASOCIACION COMUNAL DE LA JUNTA DEL CORREGIMIENTO DE AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIUO DE OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DEL AGUA DE LA VIRGEN
NIT900370847-2

SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
ALCALDIA MUNICIPAL
Ocaña, 2024

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Ocaña, adelantó un proceso de Convenio solidario No. SVIV-CONV-SOL-002-2024 bajo el cual se aúnan esfuerzos entre el municipio de Ocaña y la Asociación comunal de juntas del corregimiento del Agua de la Virgen del municipio de Ocaña, de fecha 2 de septiembre de 2024, cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el municipio de Ocaña y la Asociación comunal de juntas del corregimiento del Agua de la Virgen del municipio de Ocaña para el mejoramiento de las vías terciarias.

Las juntas del corregimiento del Agua de la Virgen del municipio de Ocaña en cumplimiento de las obligaciones delegadas al supervisor del contrato de obra, se permite presentar el Informe parcial comprendido entre el **10 DE SEPTIEMBRE 2024 HASTA 27 DE NOVIEMBRE 2024** con el objeto de informar al municipio el avance de las actividades supervisadas y entregadas por el contratista al Supervisor administrativo, legal y financiero, durante la etapa de ejecución del contrato de la referencia. En el presente informe se detallarán las actividades anteriormente descritas y desarrolladas por el contratista de obra y la Supervisión como parte integral de la ejecución del contrato y se elabora de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad contratante.

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO AGUAN FE LA VIRGEN
NIT:	900370847-2
REPRESENTANTE LEGAL:	**HECTOR JORGE NAVARRO SANCHEZ**
IDENTIFICACIÓN:	5.469.410 EXPEDIDA EN OCAÑA
OBJETO:	ANUAR ESFUERSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE OCAÑA Y ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO DE AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA PARA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS.
VALOR:	**$ 141.397.871.00**
ANTICIPO DEL 20%	$ 28.279.574.2
VALOR ADICION	$ 00.00
VALOR FINAL	$ 00.00
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	8 DE DICIEMBRE DEL 2024
SUPERVISOR:	**GUSTAVO CASTILLA VERGEL**

1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del municipio de Ocaña, del departamento de Norte de Santander, específicamente en los corregimiento y veredas.

TRAMO	REFERENCIA	DIRECCIÓN	ANCHO VIA	DISTANCIA Kmts
1	La cordillera	Corregimiento de Mariquita	5 mts	1.79 km
2	San francisco	Corregimiento de Mariquita	5 mts	1.64 km
3	La pacha	Corregimiento de Mariquita	5 mts	2.16 km
4	Filo del cordón	Corregimiento de Mariquita	5 mts	3.47 km
5	Cerro negro	Corregimiento de Espíritu Santo	5 mts	0.57 km
6	Sinuga	Corregimiento de Espíritu Santo	5 mts	2.80 km
7	Filo del pajuil	Corregimiento de Espíritu Santo	5 mts	5.10 km
8	Papamitos	Corregimiento Agua de la Virgen	5 mts	9 km

9	San pedro	Corregimiento Agua de la Virgen	5 mts	4 km
10	Nuevo amanecer	Corregimiento Agua de la Virgen	5 mts	6 km
11	San Agustín	Corregimiento Agua de la Virgen	5 mts	3 km
12	Alto del lucero	Corregimiento Agua de la Virgen	5 mts	7 km
DISTANCIA TOTAL				**46.53 KM**

2. RESUMEN EJECUTIVO

El municipio de Ocaña suscribió contrato SVIV-CONV-SOL-002-2024 de fecha 9 de septiembre de 2024, cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el municipio de Ocaña y la Asociación comunal de juntas del corregimiento del Agua de la Virgen del municipio de Ocaña para el mejoramiento de las vías terciarias.

El presente proyecto de mejoramiento en las vías terciarias que consiste en, Mejoramiento y conformación de la calzada existente y Mejoramiento de la subrasante empleando material adicional de la zona. se enmarca en los planes de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial rural en Ocaña norte de Santander, con el objetivo de restaurar la funcionalidad y seguridad de las vías afectadas por el deterioro por efectos de la ola invernal que han generado deslizamientos de tierra, volcamiento de tierra e igualmente fracturas y deslizamiento de las calzadas por socavación de las vías que han generado cierre de la vía. por lo antes expuesto. El contrato, se venía ejecutando con normalidad hasta la fecha, al presentarse la segunda temporada de régimen de lluvias se han presentado atrasos en la ejecución de la obra los cuales se han subsanado gracias a la comunidad.

3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Entre el 10 de septiembre de 2024 y el 20 de noviembre de 2024 el contratista realiza las actividades correspondientes, Mejoramiento y conformación de la calzada existente y Mejoramiento de la subrasante empleando material adicional de la zona, de acuerdo con la siguiente descripción.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA PARCIAL No.01
1	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCEARIAS CORREGIMIENTO DE MARIQUITA			CANTIDAD EJECUTADA
1.1	Mejoramiento y conformación de la calzada existente	M2	111872.10	100684.89
1.2	Mejoramiento de la subrasante con material de la zona	m3	3375	3037.5

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA PARCIAL No.01
1	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCEARIAS CORREGIMIENTO DE ESPIRITU SANTO			CANTIDAD EJECUTADA
1.1	Mejoramiento y conformación de la calzada existente	M2	150000	135.000
1.2	Mejoramiento de la subrasante con material de la zona	m3	1875	1687.5

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ACTA PARCIAL No.01
1	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCEARIAS CORREGIMIENTO DE AGUA DE LA VIRGEN			CANTIDAD EJECUTADA
1.1	Mejoramiento y conformación de la calzada existente	M2	160000.00	144.000
1.2	Mejoramiento de la subrasante con material de la zona	m3	4125.00	3712.5

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial	$141.397.871,00
Anticipo según orden de pago N° DF 2208 del 17 octubre de 2024	$28.279.574,20
Acta Parcial No 01	$127.258.083,90
% ejecutado	90%
SALDO POR EJECUTAR	**$14.139.787,10**
% POR EJECUTAR	**10%**

5. VISITAS TECNICAS REALIZADAS

El ingeniero residente realizó junto con el presidente de la asociación comunal de juntas del corregimiento de Agua de la Virgen, **Héctor Jorge Navarro Sánchez** las visitas técnicas de seguimiento y ejecución de las actividades en el periodo del contrato, que da como resultado el

cumplimentó del 90% del contrato en las actividades mencionadas anteriormente y quedara plasmado en el anexo de registro fotográfico del presente informe.

6. PROGRAMACIÓN DE OBRA

El plazo inicial para la ejecución de la obra se estimó en un tiempo de tres (3) meses.

Acta	Fecha	Plazo	Fecha de terminación
Acta de Inicio	2 de septiembre de 2024	3 meses	8 de diciembre de 2024


El contrato se encuentra vigente en ejecución y dentro de los plazos establecidos.

HECTOR JORGE NAVARRO SANCHEZ
Contratista

WILLIAM ALONSO PACHECO ORTIZ
Residente de obra


ANEXO ACTA PARCIAL N° 1

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO ESPIRITU SANTO
VEREDA CERO NEGRO

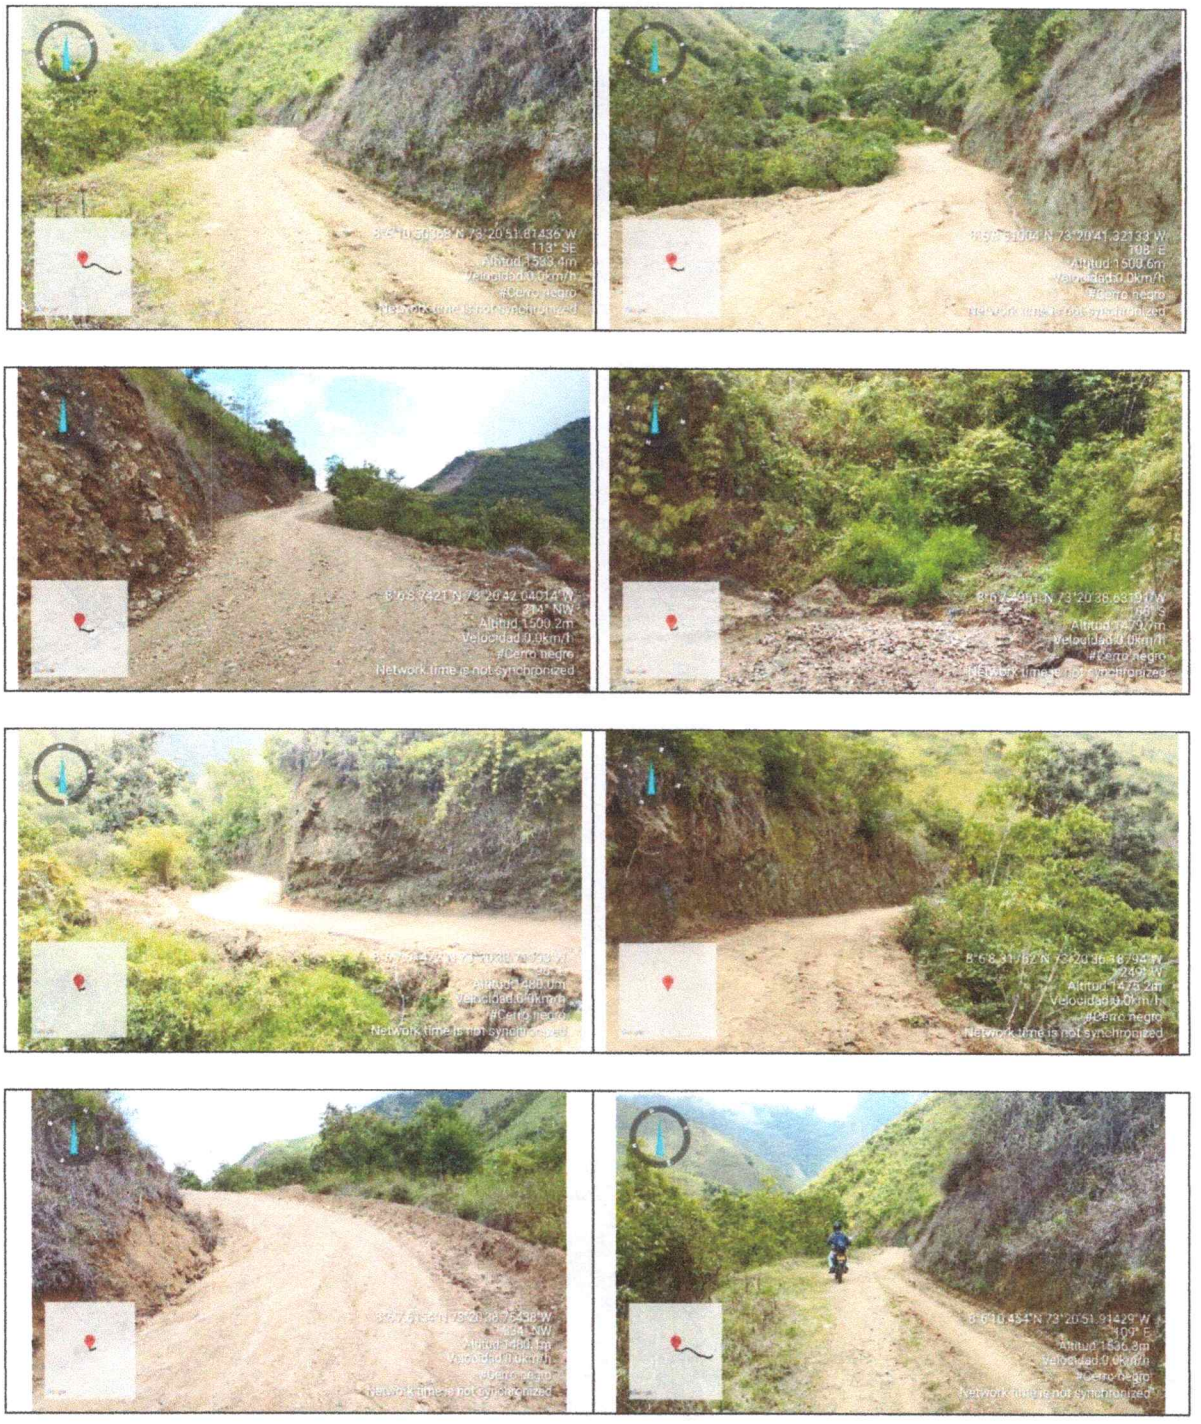


ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO ESPIRITU SANTO
VEREDA ESPIRITU SANTO




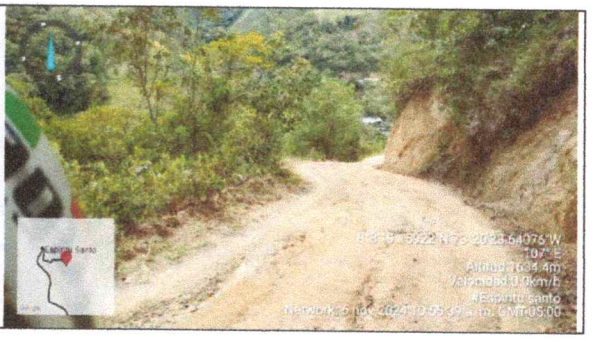




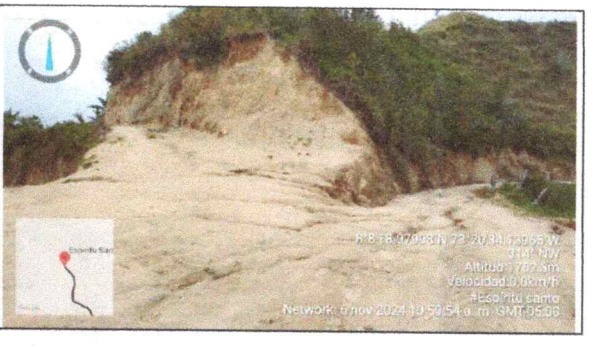



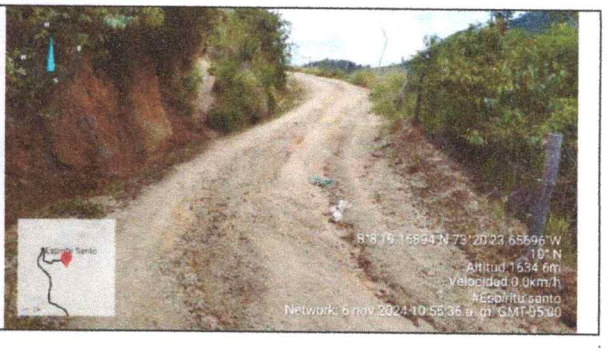


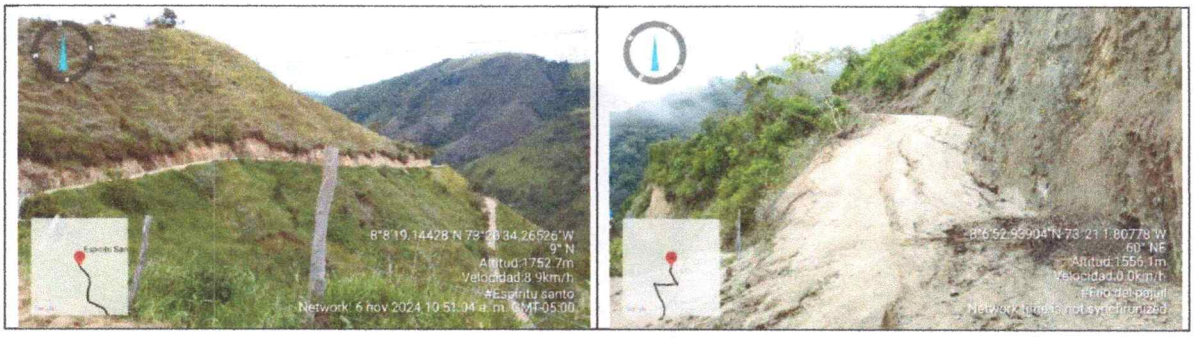


ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO ESPIRITU SANTO
VEREDA FILO DEL PAJUIL




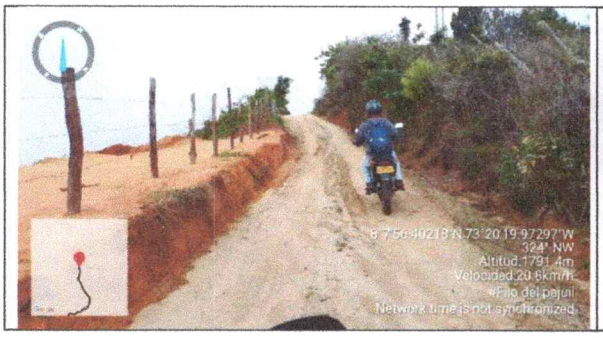




8°7'56.40218"N 73°20'19.97297"W
324° NW
Altitud:1791.4m
Velocidad:20.8km/h
#Filo del pajuil
Network time is not synchronized

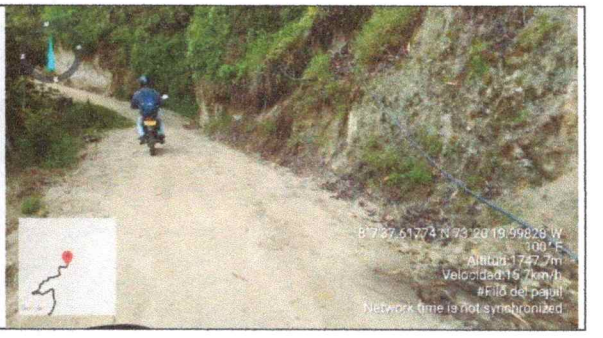
8°7'57.61774"N 73°20'19.99826"W
109° E
Altitud:1747.7m
Velocidad:19.7km/h
#Filo del pajuil
Network time is not synchronized


8°7'4.32721"N 73°20'52.91391"W
177° S
Altitud:1643.4m
Velocidad:0.0km/h
#Filo del pajuil
Network time is not synchronized

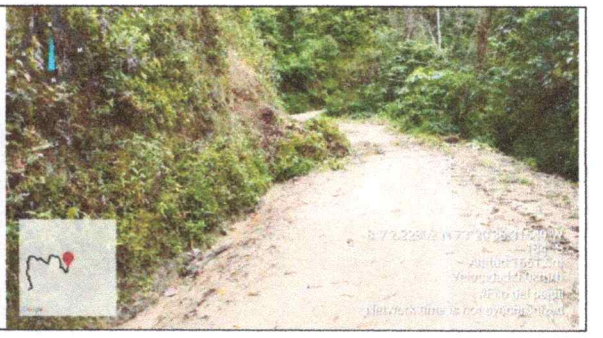


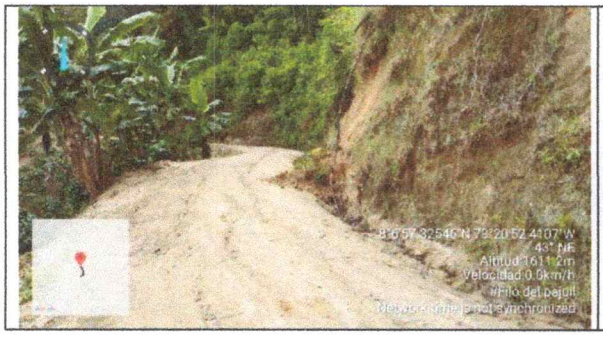
8°6'57.32546"N 73°20'52.44007"W
43° NE
Altitud:1611.2m
Velocidad:0.0km/h
#Filo del pajuil
Network time is not synchronized

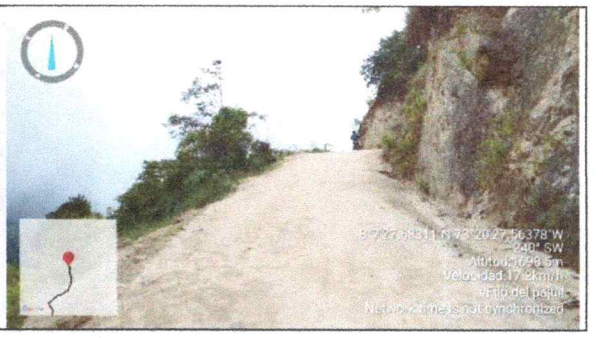



ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO ESPIRITU SANTO
VEREDA SINUGA




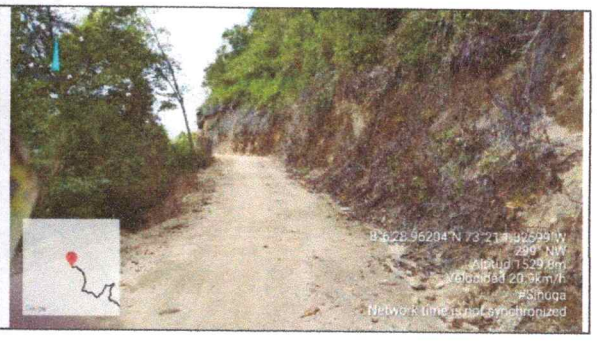




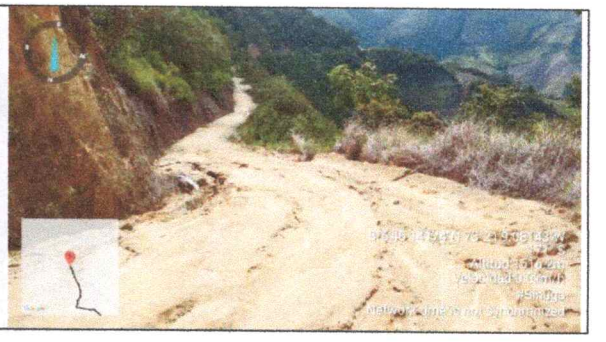

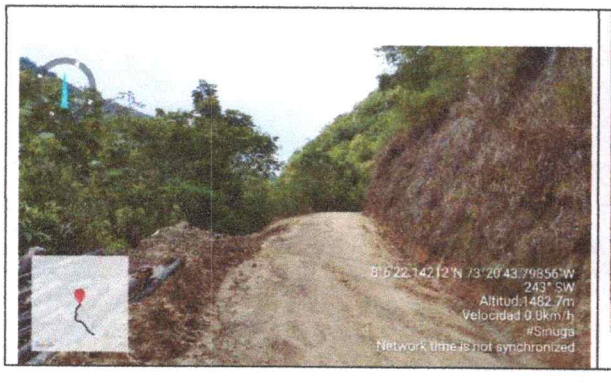

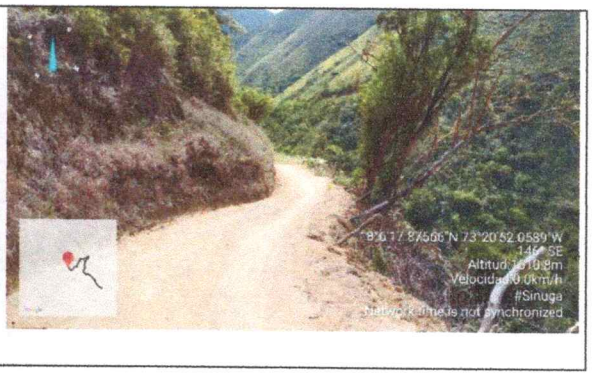





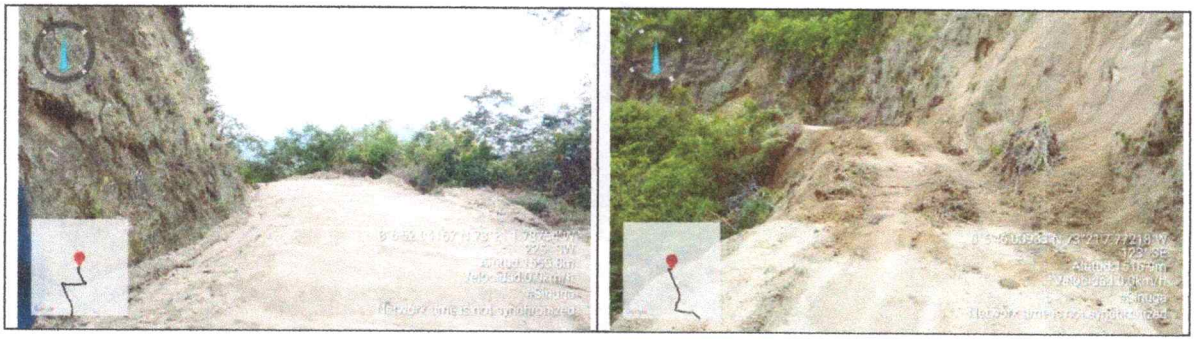

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO MARIQUITA VEREDA LA CORDILLERAM – LA PACHA

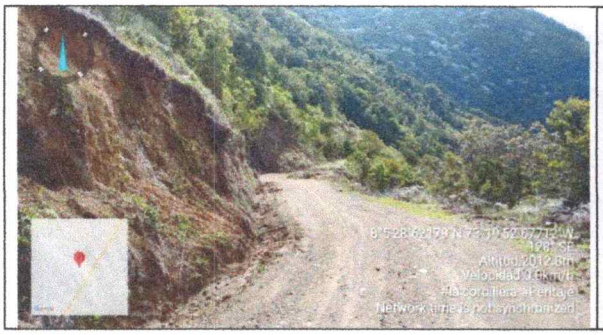



8°5'28.67179"N 73°19'52.67771"W
178° SE
Altitud:2012.8m
Velocidad:0.0km/h
#la cordillera #Peritaje
Network time is not synchronized

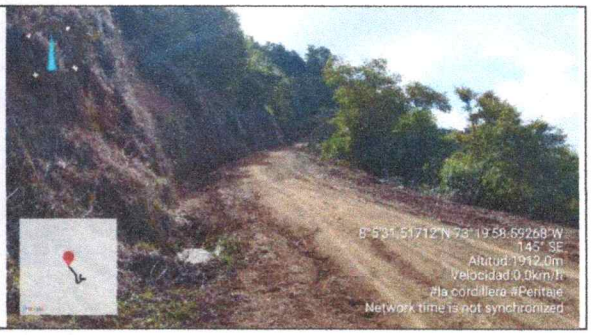
8°5'31.51712"N 73°19'58.59268"W
145° SE
Altitud:1912.0m
Velocidad:0.0km/h
#la cordillera #Peritaje
Network time is not synchronized



8°5'34.71413"N 73°19'54.86873"W
79° E
Altitud:1943.9m
Velocidad:0.0km/h
#la cordillera #Peritaje
Network time is not synchronized


8°5'33.87766"N 73°19'47.48092"W
192° E
Altitud:2036.1m
Velocidad:0.0km/h
#la cordillera #Peritaje
Network: 6 nov 2024 8:52:52 a. m. GMT-05:00



8°5'46.68934"N 73°19'38.94242"W
193° S
Altitud:2006.5m
Velocidad:0.0km/h
#la cordillera #Peritaje
Network time is not synchronized

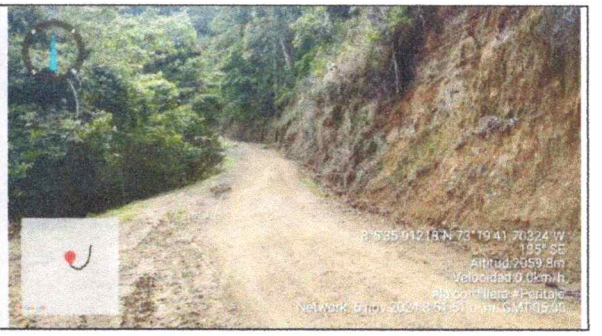

8°5'35.91218"N 73°19'41.70324"W
135° SE
Altitud:2059.8m
Velocidad:0.0km/h
#la cordillera #Peritaje
Network: 6 nov 2024 8:51:51 a. m. GMT-05:00


8°5'35.92244"N 73°19'41.72736"W
258° W
Altitud:2060.6m
Velocidad:0.0km/h
#la cordillera #Peritaje
Network: 6 nov 2024 8:51:56 a. m. GMT-05:00

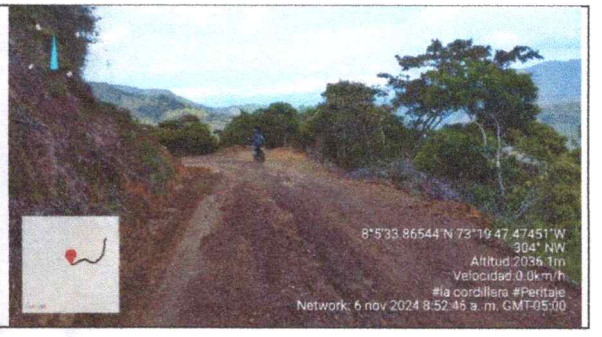

8°5'33.86544"N 73°19'47.47451"W
304° NW
Altitud:2036.1m
Velocidad:0.0km/h
#la cordillera #Peritaje
Network: 6 nov 2024 8:52:46 a. m. GMT-05:00


ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO MARIQUITA
VEREDA SAN FRANCISCO

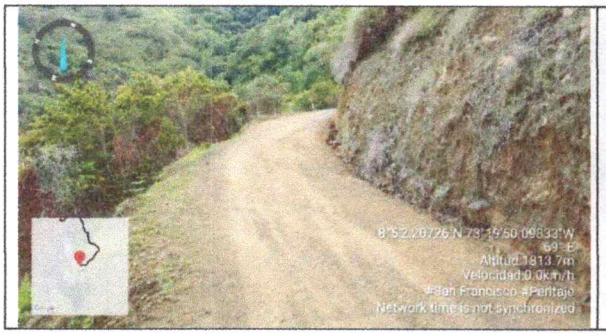


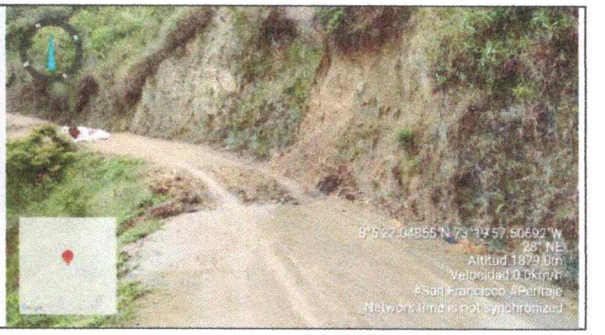





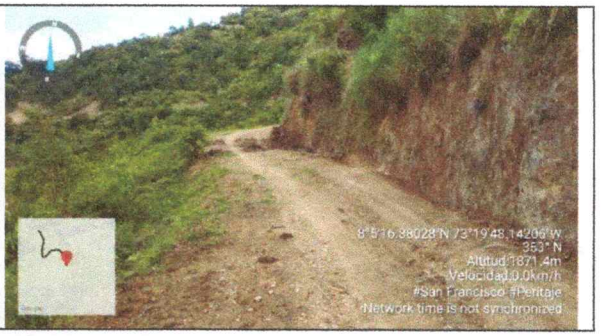

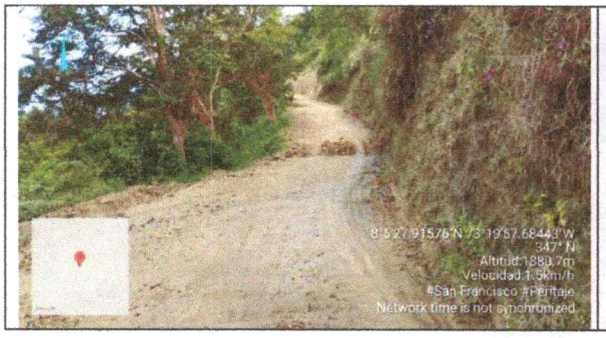

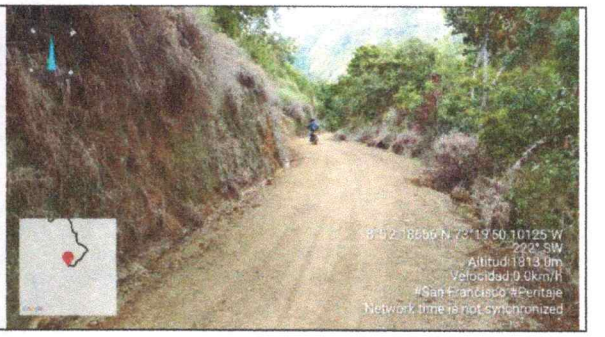


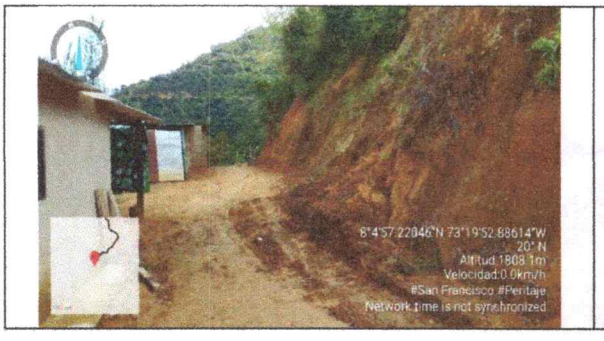


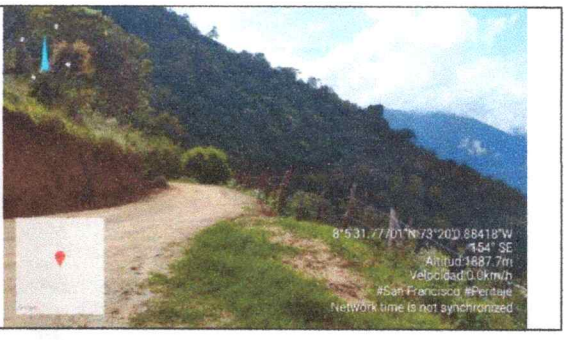



ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO MARIQUITA
VEREDA FILO DEL CORDON

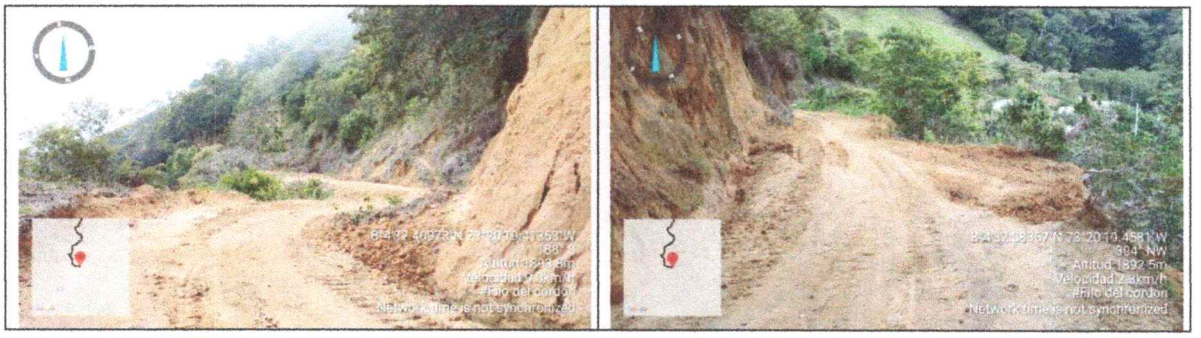

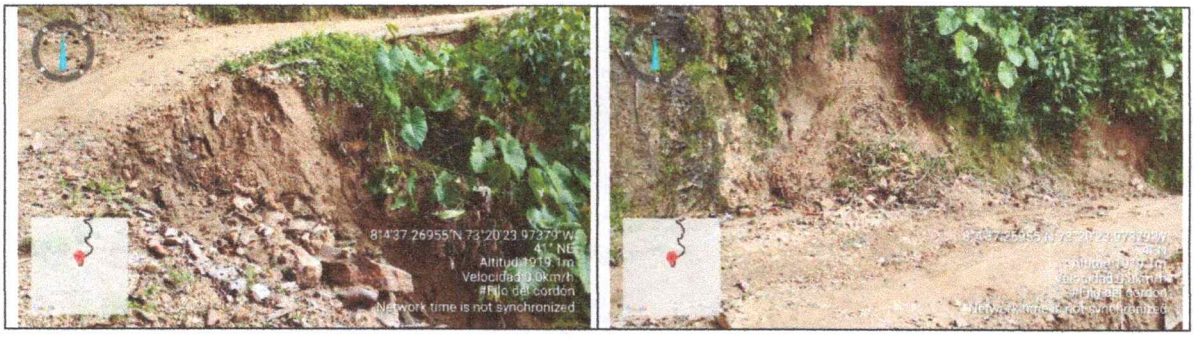












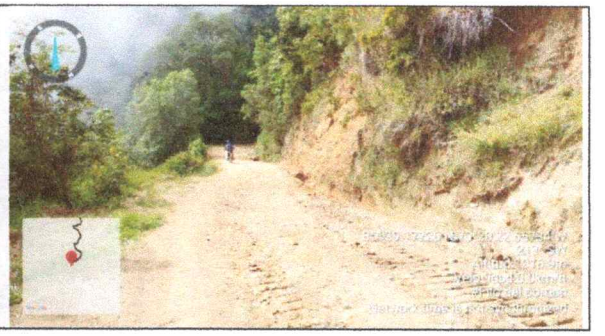


ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO MARIQUITA VEREDA LA PACHA

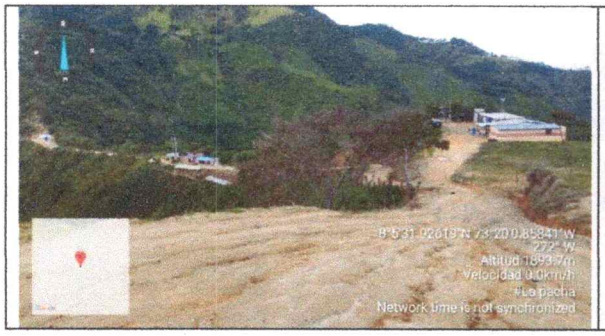

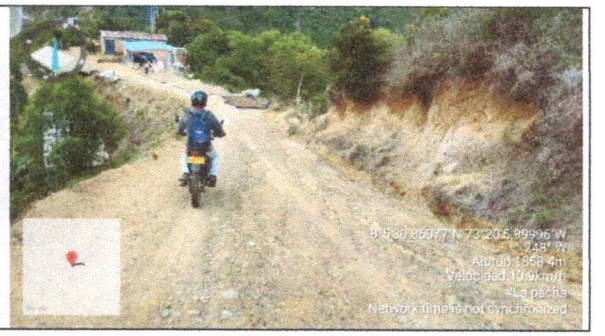





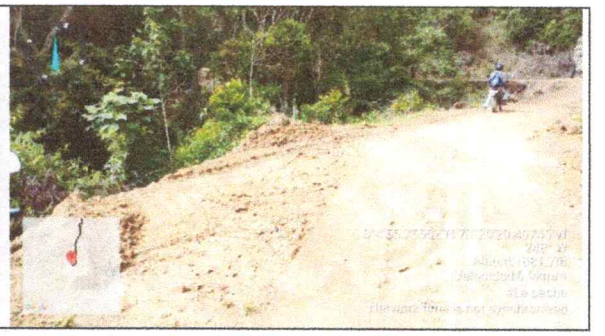




8°5'0.77305"N 73°20'18.5676"W
11° N
Altitud:1866.1m
Velocidad:0.0km/h
#La pacha
Network time is not aynchronized
8°5'6.47605"N 73°20'16.21268"W
198° S
Altitud:1842.0m
Velocidad:0.0km/h
#La pacha
Network time is not aynchronized
8°5'6.49004"N 73°20'15.1916"W
55° NE
Altitud:1841.8m
Velocidad:0.0km/h
#La pacha
Network time is not aynchronized
8°5'7.15"N 73°20'20.3982"W
69° E
Altitud:1892.1m
Velocidad:1.0km/h
#La pacha


ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO AGUA DE LA VIRGEN
VEREDA SAN AGUSTIN

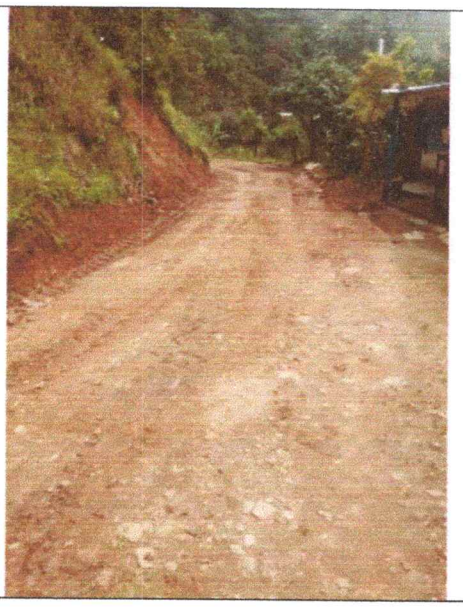


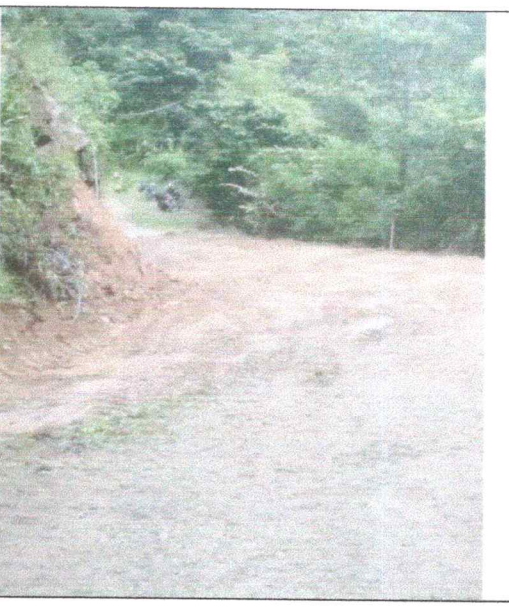


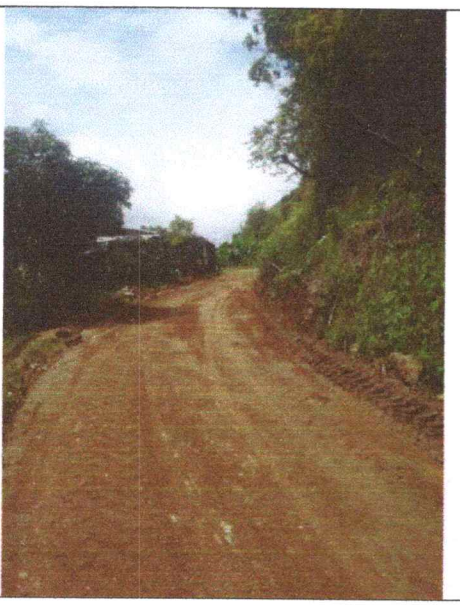


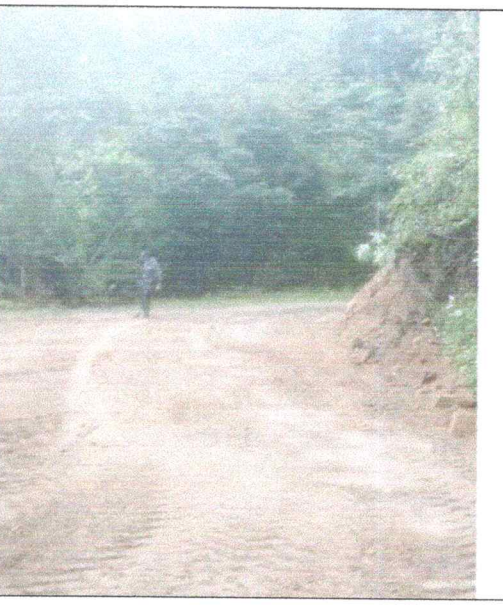

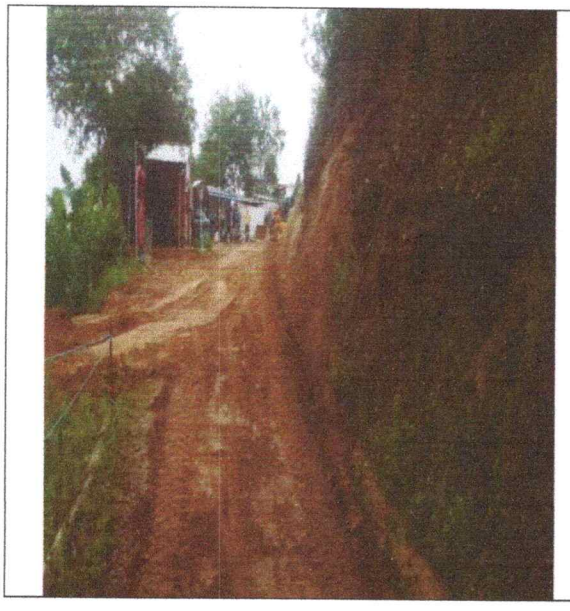

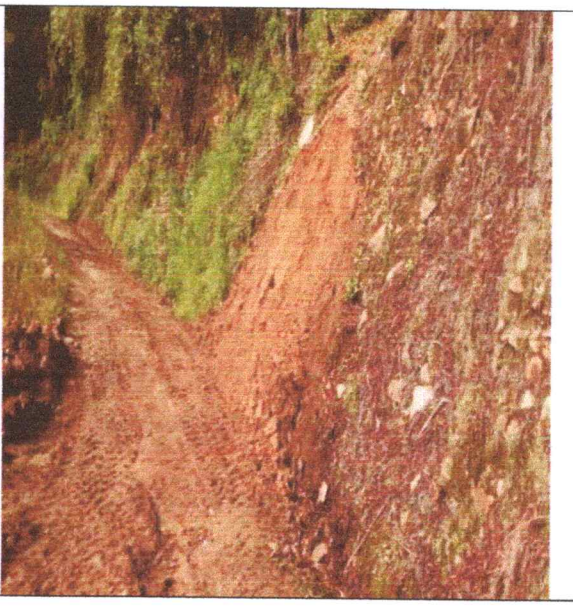

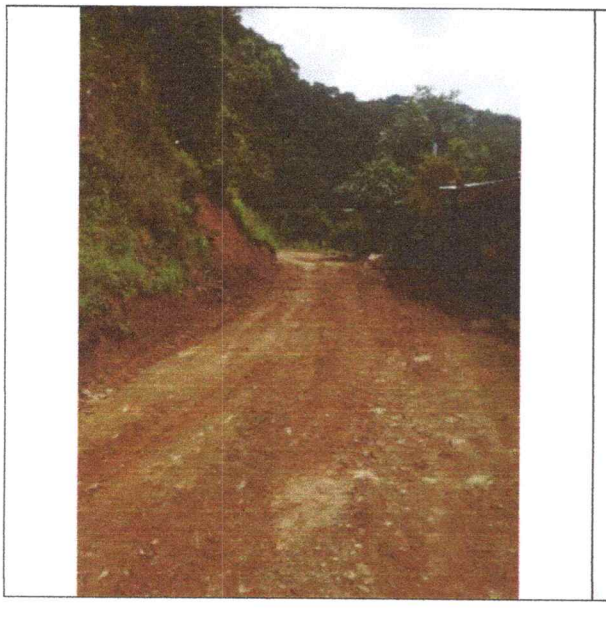

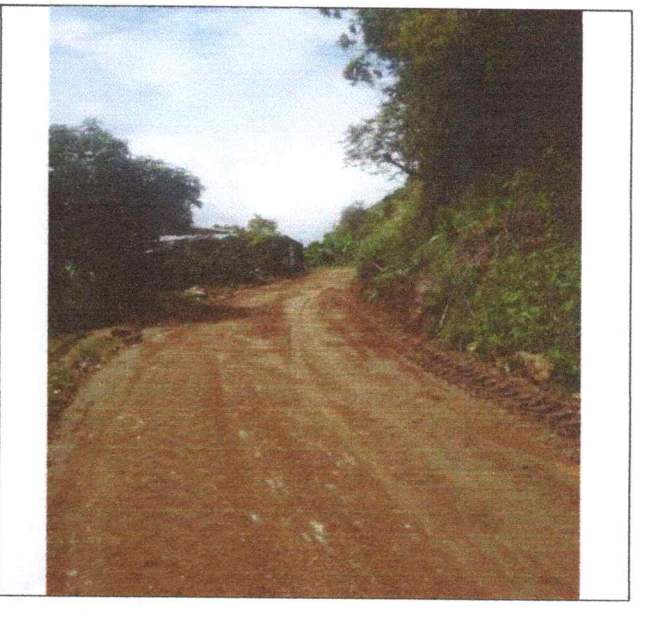

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO AGUA DE LA VIRGEN
VEREDA NUEVO AMANECER










ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO AGUA DE LA VIRGEN
VEREDA ALTO DEL LUCERO
















ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO AGUA DE LA VIRGEN
VEREDA SAN PEDRO

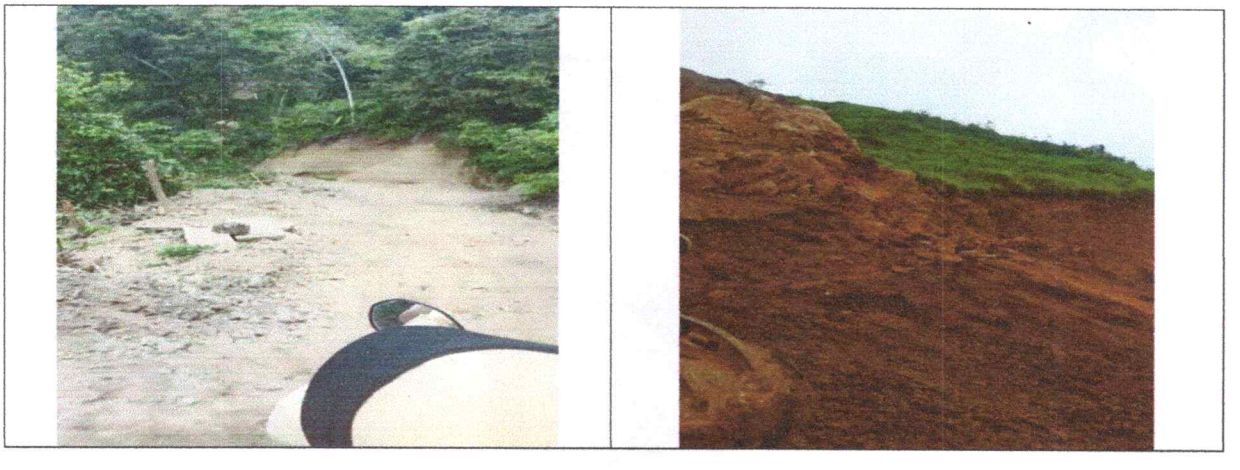






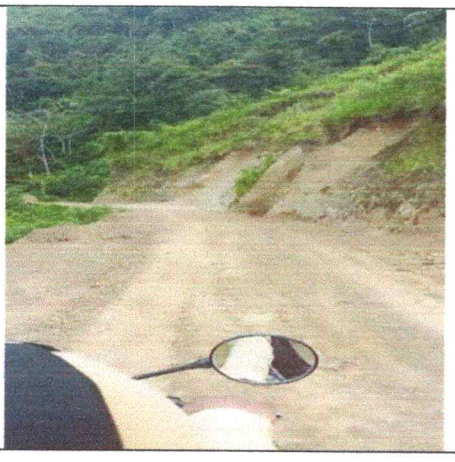

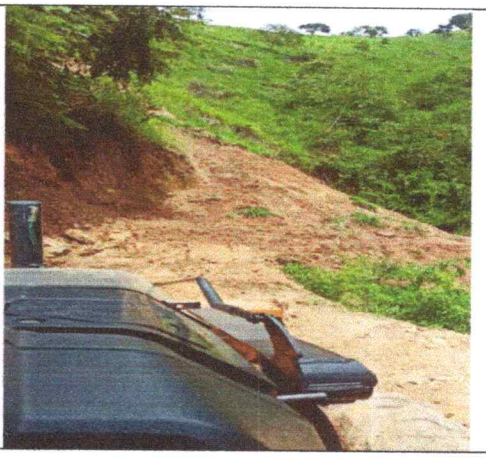




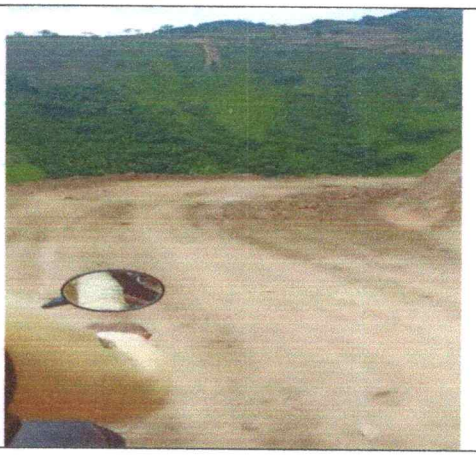


ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO CORREGIMIENTO AGUA DE LA VIRGEN
VEREDA PAPAMITOS



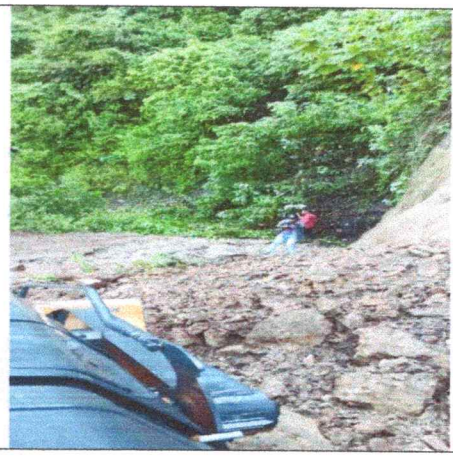



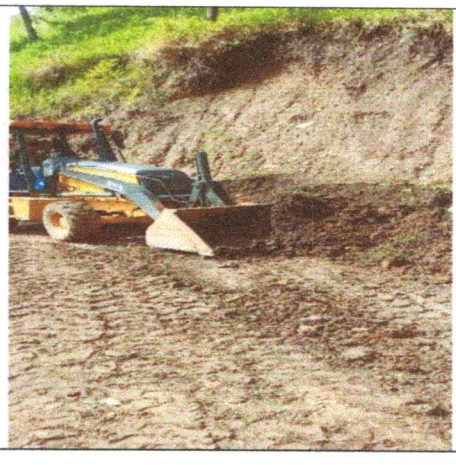


DEERE

