Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

**Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:**
**Rad No. 2024-25000-032409-3**
2024-12-10 17:43 -RIESGO
Destino: 11400
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO IMAR
Folios: 150
Anexos: INFORME DE ACTIVIDADES

**SGRD-25000**

San José de Cúcuta,

Doctor
**ADRIANA BOADA ARGUELLO**
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaria de hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander

**REFERENCIA: TRAMITE DE PAGÓ** **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** quien se identifica con NIT **901.266.624-6,** la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($296.346.405,00)** por concepto de Acta N°2 con fecha de 10 de diciembre de 2024, contrato RE-SGRD-01885-2024, suscrito el 30 DE AGOSTO 2024, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024, con registro presupuestal N°00000072 del 30 de agosto de 2024, fuente de financiación 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Atentamente,

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretaria de Despacho
Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres

| Trazabilidad | Nombre | Cargo | Firma / fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | **Paola Ramírez Montañez** | **Ingeniera Civil Contratista** | |
| Revisión jurídica: | **Marlym Jhoana Montoya Novoa** | **Contratista** | |
| Aprobación Jurídica: | **Marlym Jhoana Montoya Novoa** | **Contratista** | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

# ACTA PARCIAL #3

# CONTRATO DE OBRA No. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

## OBJETO

**CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.**

## CONTRATISTA:

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S**

## PERIODO

**06 DE NOVIEMBRE DE 2024 A 10 DE DICIEMBRE DE 2024**

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

# 1. FACTURA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

# IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S

**NIT : 901.266.624-6 Responsable de IVA**
Dirección : Calle 12 #4-47 Ofic 33 CC Internacional
Telefonos : 5710503
Email : ingimarvacca@hotmail.com
Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

Resolución de Facturación N° 18764081192537. Numeración Autorizada Del IV 70 Hasta IV 200 Fecha 08/10/2024 Vigencia 12 Meses 08/10/2025

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **IV - 84**

**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
**NIT ó C.C:** 900978341
**DIRECCION:**
**Ciudad:** CUCUTA
**Telefono:**
**EMAIL:**
**VENDEDOR :** VARIOS

**FECHA Y HORA EMISION**
10/12/2024 - 10:35:07 a. m.
**Forma de Pago:** CONTADO
**Fecha Vencimiento:**

| CANT. | DESCRIPCION | BOD | UND | IVA | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | COSTO DIRECTO | | UND | 0 | 224,112,619.00 | 224,112,619.00 |
| 1.00 | ADMINISTRACION 25% | | UND | 0 | 56,028,155.00 | 56,028,155.00 |
| 1.00 | IMPREVISTOS 0.5% | | UND | 0 | 1,120,563.00 | 1,120,563.00 |
| 1.00 | UTILIDAD 4.5% | | UND | 0 | 10,085,068.00 | 10,085,068.00 |
| 1.00 | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL | | UND | 0 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

OBSERVACIONES : ACTA N°3 CONSTRRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO,MUNICIPIO DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CLAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO001287 DEL 06 DE JUNO DE 2024

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO Pesos

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 296,346,405.00 |
| **DESCUENTO** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **RETE. FTE.** | 0.00 |
| **TOTAL** | **296,346,405.00** |

CUFE:

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 772 al 779 del Codigo de Comercio. Causará intereses a la tasa maxima legal vigente, mensual o fracción a partir del vencimiento. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita y acepta el valor estipulado en la misma. Una vez entregada la mercancia a satisfacción del cliente no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Fecha:

FIRMA Y SELLO EMPRESA

CONSTRUCTORES S.A.S

# 2. AUTORIZACION DESCUENTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL 2%

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

San José de Cúcuta, 10 de diciembre de 2024

Señores
**TESORERIA DEPARTAMENTAL**
San José de Cúcuta

REFERENCIA: RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

Asunto: **Autorización Descuento Estampilla 2%**

El presente tiene como fin autorizar por medio de esta notificación se descuente el 2% correspondiente a las estampillas departamentales y descuentos de ley de la referencia a la factura de la referencia, por concepto Acta Parcial No. 03 de fecha 10 de diciembre de 2024

Sin otro particular

**IVM CONSTRUCTORES SAS**
**NIT 901.266.624-6**
**R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
**CC. 88.279.674**
Contratista de Obra.

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

# 3. CERTIFICACION BANCARIA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

DAVIVIENDA

## A QUIEN INTERESE

CUCUTA 2022/08/26

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS con Nit número 9012666246 de CUCUTA-NORTE DE SANTANDER posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

| | |
|---|---|
| Número | 108969964056 |
| Fecha Apertura | 2022/08/26 |

Cordialmente,

DAVIVIENDA 660-OF. PRINCIPAL CUCUTA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

CONSTRUCTORES S.A.S

# 4. RUT

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 6 2 4 | 6 | Impuestos de Cúcuta 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO | IVM CONSTRUCTORES SAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Norte de Santander 5 4 | Cúcuta 0 0 1 |

41. Dirección principal
MODULO 4 SEC NUEVA SEXTA LC 21

42. Correo electrónico ivmconstructoressas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 5 2 0 7 2 0 3 1 | 3 2 2 9 1 0 1 7 8 1 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 2 0 | 2 0 2 4 0 5 3 0 | 4 2 1 0 | 2 0 1 9 0 3 1 5 | 0 8 1 1 | 0 9 9 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 30 / 14 : 38: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VACCA MACHADO IMAR ORLANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 30-05-2024 02:44:56PM

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 6 2 4 | 6 | Impuestos de Cúcuta 7 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 9 0 3 0 1 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 9 0 3 1 9 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 3 4 6 1 9 0 | |
| 78. Departamento | 5 4 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 9 0 3 1 9 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 6 2 4 | 6 | Impuestos de Cúcuta | 7 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 9 0 3 1 9 | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 8 8 2 7 9 6 7 4 | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| VACCA | MACHADO | IMAR | ORLANDO |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
| | | | |
| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
| | | | |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141043792596

(415)7707212489984(8020) 000014104379259 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 6 6 6 2 4 | 6 | Impuestos de Cúcuta | 7 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 9 1 1 6 2 6 9 3 | 0 | 1 9 7 1 5 6 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GERARDINO | SALCEDO | FRANKI | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 3 0 6 3 0 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 6 0 4 4 7 4 7 7 | 7 | 2 2 0 7 3 5 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MONSALVE | CHAUSTRE | ERIKA | LORENA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 0 0 8 0 1 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSTRUCTORES S.A.S

# 5. COPIA DEL CONTRATO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6692624 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 2 días de tiempo transcurrido *(28/08/2024 7:31:44 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | RE-SGRD-01885-2024 |
| **Objeto del contrato** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Si ☑No |
| **Duración del contrato** | 4 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 28/12/2024 11:59 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Si ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 29/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 29/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Si ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Si ☑No * |
| **Reversión** | ☐Si ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

IVM CONSTRUCTORES SAS

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901266624

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | Banco de Bogotá | Ahorros | 303285241 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**
*Aprobado por:* Imar Orlando Vacca Machado *Fecha de aprobación:* 29/08/2024 9:55:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**
*Aprobado por:* Willian Vera Arias *Fecha de aprobación:* 30/08/2024 9:46:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Si ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Si ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Si ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Si ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de**

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 28/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(29/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 28/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 16 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 29/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(2/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

## Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6692624
Proveedor IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.
Código postal

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| Latitud: | | | |
| Longitud: | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE CUCUTILLA | COLOMBIA > Norte de Santander > Cucutilla |

1 CO1.PCCNTR.6692624

| | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| | Precio total estimado: 1.499.910.681,00 / Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 1.499.000.749,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72141107 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR EL GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 1287 DEL 6 DE | 1,00 | UN | 1.499.910.681,00 | 1.499.000.749,00 | 1.499.910.681,00 | 1.499.000.749,00 |

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 23 horas de tiempo transcurrido (29/08/2024 9:55:29 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | ANALISIS DEL SECTOR PUENTE CUCUTILLA 30 07 24.pdf | ANALISIS DEL SECTOR PUENTE CUCUTILLA 30 07 24.pdf | (detalle) |
| ☐ | ESTUDIO DE OPORTUNIDAD PUENTE CUCUTILLA.pdf | ESTUDIO DE OPORTUNIDAD PUENTE CUCUTILLA.pdf | (detalle) |
| ☐ | CDP 00000079 PUENTE CUCUTILLA.pdf | CDP 00000079 PUENTE CUCUTILLA.pdf | (detalle) |
| ☐ | ANEXO 1 CLAUSULADO GENERAL.pdf | ANEXO 1 CLAUSULADO GENERAL.pdf | (detalle) |
| ☐ | ANEXO 2 CLAUSULADO ESPECIFICO CONTRATO DE OBRA RE-SGRD-01885-2024.pdf | ANEXO 2 CLAUSULADO ESPECIFICO CONTRATO DE OBRA RE-SGRD-01885-2024.pdf | (detalle) |
| ☐ | DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024 CALAMIDAD PUBLICA.pdf | DECRETO 001287 DEL 06 JUNIO 2024 CALAMIDAD PUBLICA.pdf | (detalle) |
| ☐ | EVALUACION PUENTE CUCUTILLA VF.pdf | EVALUACION PUENTE CUCUTILLA VF.pdf | (detalle) |
| ☐ | RESOLUCION ADJUDICACION RE SGRD 01885 2024.pdf | RESOLUCION ADJUDICACION RE SGRD 01885 2024.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Willian Vera Arias — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 88158521 — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Willian Vera Arias | 30/08/2024 9:46:00 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito | Willian Vera Arias |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Si ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| Presupuesto General de la Nación - PGN | ☐ Si ☑ No * | |
| Sistema General de Participaciones - SGP | ☐ Si ☑ No * | |
| Sistema General de Regalías - SGR | ☐ Si ☑ No * | |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) | ☑ Si ☐ No * | 1.499.000.749 |
| Recursos de Crédito | ☐ Si ☑ No * | |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) | ☐ Si ☑ No * | |
| | Total | 1.499.000.749 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2021004540151 | 2024 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Si ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 00000079 | CDP | No se ha iniciado | | 1.499.910.681 COP | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP**
**Saldo de vigencias futuras**
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**
**Saldo de compromisos AVF**

CONSTRUCTORES S.A.S

# ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES #1

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-04 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 04/03/2024 | VERSIÓN 3 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 1 de 2 | |

**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1**

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | **28 DE OCTUBRE DE 2024** |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **CONTRATO No. - FECHA** | RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |
| **CONTRATISTA** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS |
| **C.C. o N.I.T.** | 901.266.624-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO |
| **C.C.** | 88.279.674 DE OCAÑA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749 |
| **PLAZO O DURACIÓN** | Cuatro (04) Meses |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de desig) | WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024 |
| **INTERVENTOR** (Acto administrativo y fecha de desg) | No Aplica |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | N.A |
| **ACTA DE REINICIO** | N.A |
| **FECHA DE TERMINACION** | 10 DE ENERO DE 2025 |
| **ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO** | No Aplica |
| **ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES** | ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 |

En San José de Cúcuta el 28 de octubre de 2024, en las oficinas de la Secretaría para la Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: WILLIAM VERA ARIAS, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo No Aplica, e IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS. Representada Legalmente por IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Contratista, con el fin de acordar la modificación de las cantidades de obra No. 01 del contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-04 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 04/03/2024 | VERSIÓN 3 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 2 de 2 | |

**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No.1**

Una vez finalizada la revisión a los diseños iniciales y ejecutada la localización y replanteo de las estructuras que componen la obra, se evidenció la necesidad de realizar un ajuste de mayores y menores cantidades con respecto a las inicialmente contratadas, teniendo en cuenta las condiciones encontradas en campo con respecto a la necesidad de ampliación del paso provisional, para facilitar la movilidad de los vehículos que por allí transitan sin que la ejecución de las actividades constructivas impidan el paso o que se ponga en riesgo la integridad de los trabajadores de la obra, adicionalmente dadas las condiciones del terreno se hace necesario aumentar la cantidad de días en el manejo de aguas necesario para la ejecución de las demás actividades constructivas.

Teniendo en cuenta lo anotado en las consideraciones anteriores, las partes establecen la modificación de cantidades del contrato en referencia, contenidas en el Anexo No. 01, que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
NIT 901.266.624-6
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista de obra

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 AL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1

| CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | FECHA DEL ACTA | 28/10/2024 |
|---|---|---|

| CONDICIONES DEL CONTRATO INCIAL | | | | | | MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 28 DE OCTUBRE DE 2024 | | | CONTRATODEL CONTRATO MODIFICADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT | VR. UNITARIO | V.R PARCIAL | +- | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL |
| 1.0 | **PUENTE VEHICULAR** | | | | | | | | | |
| 1,01 | Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría) | M2 | 285,36 | $ 6.781,00 | $1.935.026,00 | | | | 285,36 | $ 1.935.026,00 |
| 1,02 | Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | M3 | 1376,88 | $ 32.969,00 | $45.394.357,00 | + | 494,37 | $ 16.298.884,53 | 1.871,25 | $ 61.693.241,00 |
| 1,03 | Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm² | M3 | 38,35 | $ 748.682,00 | $28.711.955,00 | | | | 38,35 | $ 28.711.955,00 |
| 1,04 | Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 89,49 | $ 1.419.525,00 | $127.033.292,00 | | | | 89,49 | $ 127.033.292,00 |
| 1,05 | Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 94,44 | $ 1.519.012,00 | $143.455.493,00 | | | | 94,44 | $ 143.455.493,00 |
| 1,06 | Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | M3 | 34,83 | $ 1.419.525,00 | $49.442.056,00 | | | | 34,83 | $ 49.442.056,00 |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 16253,02 | $ 10.385,00 | $168.787.613,00 | | | | 16.253,02 | $ 168.787.613,00 |
| 1,08 | Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm. | M3 | 1004,60 | $ 42.073,00 | $42.266.536,00 | | | | 1.004,60 | $ 42.266.536,00 |
| 1,09 | Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm) | UND | 4,00 | $ 2.311.720,00 | $9.246.880,00 | | | | 4,00 | $ 9.246.880,00 |
| 1,10 | Junta de dilatacion con angulo UPN 160 | M | 9,80 | $ 444.040,00 | $4.351.592,00 | | | | 9,80 | $ 4.351.592,00 |
| 1,11 | Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm² | M3 | 8,82 | $ 1.419.525,00 | $12.520.211,00 | | | | 8,82 | $ 12.520.211,00 |
| 1,12 | Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m) | UND | 4,00 | $ 356.976,00 | $1.427.904,00 | | | | 4,00 | $ 1.427.904,00 |
| 1,13 | Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje | M | 32,40 | $ 722.301,00 | $23.402.552,00 | | | | 32,40 | $ 23.402.552,00 |
| 1,14 | Base granular (INV. 330.1) | M3 | 90,00 | $ 286.800,00 | $25.812.000,00 | | | | 90,00 | $ 25.812.000,00 |
| 1,15 | Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m | M3 | 60,00 | $ 1.419.525,00 | $85.171.500,00 | | | | 60,00 | $ 85.171.500,00 |
| 1,16 | Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1) | M | 154,00 | $ 6.730,00 | $1.036.420,00 | | | | 154,00 | $ 1.036.420,00 |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 3047,93 | $ 39.448,00 | $120.234.743,00 | - | 89,96 | $ 3.548.677,63 | 2.957,97 | $ 116.686.065,00 |
| 1,18 | Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada) | M | 134,00 | $ 42.789,00 | $5.733.726,00 | | | | 134,00 | $ 5.733.726,00 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIA** | | | | | | | | | |
| 1,19 | Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2" | M | 60,00 | $ 156.008,00 | $9.360.480,00 | | | | 60,00 | $ 9.360.480,00 |

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 AL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1

| CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | FECHA DEL ACTA | 28/10/2024 |
|---|---|---|

| CONDICIONES DEL CONTRATO INCIAL | | | | | | MODIFICACION DE CANTIDADES No. 1 28 DE OCTUBRE DE 2024 | | | CONTRATODEL CONTRATO MODIFICADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT | VR. UNITARIO | V.R PARCIAL | +- | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | dia | 60,00 | $ 538.226,00 | $32.293.560,00 | + | 18,00 | $ 9.688.068,00 | 78,00 | $ 41.981.628,00 |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion | M³ | 840,00 | $ 48.190,00 | $40.479.600,00 | | | | 840,00 | $ 40.479.600,00 |
| 1,22 | Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional ) | M³ | 1600,00 | $ 32.411,00 | $51.857.600,00 | - | 406,67 | $ 13.180.581,37 | 1.193,33 | $ 38.677.019,00 |
| 1,23 | Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal) | M² | 117,60 | $ 772.005,00 | $90.787.788,00 | | | | 117,60 | $ 90.787.788,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ***Subtotal*** | ***$1.120.742.884,00*** | | | | | **$ 1.130.000.577,00** |
| | | | | | | | | | | |
| | ***COSTO DIRECTO DE LA OBRA*** | | | | **$ 1.120.742.884,00** | | | | | ***$ 1.130.000.577,00*** |
| | ADMINISTRACIÓN | | | 25,00% | $ 280.185.721,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 282.500.144,00 |
| | IMPREVISTOS | | | 0,50% | $ 5.603.714,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 5.650.003,00 |
| | UTILIDAD | | | 4,50% | $ 50.433.430,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 50.850.026,00 |
| | ***COSTO INDIRECTO DE LA OBRA*** | | | | **$ 336.222.865,00** | | | | | ***$ 339.000.173,00*** |
| | SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE | | | | **$ 12.035.000,00** | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL | | | | **$ 30.000.000,00** | | | | | **$ 30.000.000,00** |
| | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO** | | | | **$ 1.499.000.749,00** | | | | | **$ 1.499.000.749,00** |

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
**R/L DE IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S**
**CONTRATISTA**

**WILLIAM VERA ARIAS**
**SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**
VoBo Ordenador del Gasto - Supervisor

# 6. POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

# POLIZAS INICIALES

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

# ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

| GENERALIDADES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO / CONVENIO N° Y FECHA: | RE-SGRD-01885-2024 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024 | | | |
| VALOR INICIAL (En números): | $ 1.499.000.749 | | | |
| PLAZO: | **4 Meses** | | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | No. 00000079 DEL 26 JULIO 2024 | | | |
| GARANTÍAS: | AMPAROS INICIALES: | (%) | AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello). | (%) |
| Garantía de seriedad del ofrecimiento | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | | | | |
| Pago anticipado. | | | | |
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal. | X | 10 | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales. | X | 5 | | |
| Estabilidad de la obra. | X | 10 | | |
| Calidad de los bienes y equipos suministrados. | | | | |
| Correcto funcionamiento de los equipos. | | | | |
| Calidad del servicio. | | | | |
| Provisión de repuestos y accesorios. | | | | |
| Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hay pactado en el contrato. | | | | |
| Responsabilidad civil extra contractual. | X | 260 SMMLV | | |
| Otros amparos. | | | | |
| MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos) | | | | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello) | | | | |
| VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello) | | | | |
| TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello) | | | | |
| VALOR TOTAL (En números): | $ 1.499.000.749 | | | |
| ASEGURADORA: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | |
| POLIZA DE GARANTIA CUMPLIMIENTO N°: | No. 21-44-101449740 Anexo No.0 | | | |
| POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°: | No. 21-40-101238693 Anexo No.0 | | | |
| VIGENCIA RCivilextracontr. (dd/mm/aa): | 29/08/2024 al 29/12/2029 | VIGENCIA RCumplimiento. (dd/mm/aa): | 29/08/2024 al 29/12/2024 | |

En San José de Cúcuta, a los 09 días del mes de septiembre 2024, en la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamento Norte de Santander, se reunieron los suscritos: **WILLIAM VERA ARIAS**, Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamento Norte de Santander y **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** Con C.C. No. **88.279.674**; como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En constancia firman, a los nueve (09) días de septiembre de 2024.

POR EL DEPARTAMENTO

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

POR EL CONTRATISTA

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
Contratista
C.C. 91.523.850

Proyectó: Alejandro Suarez Villamizar – Asesor Jurídico Externo SGRD
Revisó: William Vera Arias – secretario SGRD

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101449740 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 08 | 2024 | 29 | 08 | 2024 | 00:00 | 29 | 12 | 2029 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | | NIT: 901.266.624-6 |
| DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | TELÉFONO: 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | NIT: 800.103.927-7 |
| DIRECCIÓN: AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | TELÉFONO 5710290 |
| ADICIONAL: | | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 29/08/2024 | 28/04/2025 | $149,991,068.10 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 29/08/2024 | 28/12/2027 | $74,995,534.05 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $149,991,068.10 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,749,151.00 | $ ******20,000.00 | $ *****526,138.00 | $ *********3,295,290.00 | $ ******374,977,670.25 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA MILENA CAMACHO TORRES | 163788 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

21-44-101449740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101238693 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 08 | 2024 | 29 | 08 | 2024 | 00:00 | 29 | 12 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | NIT: 901.266.624-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | NIT: 800.103.927-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710290 |

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LOS PERJUICIOS A TERCEROS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01685-2024 SUSCVRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 29/08/2024 | 29/12/2024 | $260,000,000.00 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****217,260.00 | $ *******3,000.00 | $ ******41,849.00 | $ **********262,109.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| SANDRA MILENA CAMACHO TORRES | 163788 | 100.00 |

| DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSTRUCTORES S.A.S

# POLIZAS ACTUALIZADAS
# ACTA DE INICIO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

# ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

| GENERALIDADES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA:** | **RE – SGRD – 01885 - 2024** | | | | |
| **VALOR INICIAL** (En números): | **$ 1.499.000.749** | | | | |
| **PLAZO TOTAL** | **Cuatro (04) Meses** | | | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | **No. 00000079 del 26 de julio de 2024** | | | | |
| **GARANTÍAS:** | **AMPAROS INICIALES:** | **(%)** | **AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).** | **(%)** | |
| Garantía de seriedad del ofrecimiento | | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | | | | | |
| Pago anticipado. | | | | | |
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal. | X | **10** | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales. | X | **5** | | | |
| Estabilidad de la obra. | X | **10** | | | |
| Calidad de los bienes y equipos suministrados. | | | | | |
| Correcto funcionamiento de los equipos. | | | | | |
| Calidad del servicio. | | | | | |
| Provisión de repuestos y accesorios. | | | | | |
| Pago de multas y cláusula penal pecuniaria cuando se han pactado en el contrato. | | | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual. | X | **260 SMMLV** | | | |
| Otros amparos. | | | | | |
| **MODIFICATORIOS Y ADICIONALES** (si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos) | | | | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | | |
| **VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | | |
| **TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | | |
| **VALOR TOTAL** (En números): | **$ 1.499.000.749** | | | | |
| **ASEGURADORA:** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A** | | | | |
| **-POLIZA DE GARANTIA Nº:** | No. 21-44-101449740 Anexo No.2 | | | | |
| **POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Nº:** | No. 21-40-101238693 Anexo No.2 | | | | |
| VIGENCIA G. (dd/mm/aa): | DEL 10/09/2024 a 10/01/2030 | **VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):** | DEL 10/09/2024 AL 10/01/2025 | | |

En San José de Cúcuta, a los 08 días del mes de octubre del año 2024, en La Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres, Departamento Norte de Santander, se reunieron Los suscritos: **WILLIAM VERA ARIAS,** Secretario para la Gestión Riesgo de Desastres, Departamento Norte de Santander y **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO con C.C No. 88.279.674** de Ocaña **R/L de IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S,** NIT **901.266.624-6**; actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En constancia firman, el 08 de octubre de 2024.

POR EL DEPARTAMENTO

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Nit 901.266.624-6**
**R/L. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
C.C. **88.279.674** de Ocaña.
Contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101449740 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2024 | 10 | 09 | 2024 | 00:00 | 10 | 01 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | NIT: 901.266.624-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | NIT: 800.103.927-7 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710290 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/09/2024 | 10/05/2025 | $149,991,068.10 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 10/09/2024 | 09/01/2028 | $74,995,534.05 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $149,991,068.10 | |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,749,151.00 | $ ******20,000.00 | $ *****526,138.00 | $ *********3,295,290.00 | $ ******374,977,670.25 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA MILENA CAMACHO TORRES | 163788 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101449740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101449740 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2024 | 10 | 09 | 2024 | 00:00 | 10 | 01 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | NIT: 901.266.624-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | NIT: 800.103.927-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710290 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,749,151.00 | $ ******20,000.00 | $ *****526,138.00 | $ *********3,295,290.00 | $ ******374,977,670.25 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA MILENA CAMACHO TORRES | 163788 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100513654825 5(3900)000003295290(96)20250910

REFERENCIA PAGO: 1100513654825-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101449740 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2024 | 10 | 09 | 2024 | 00:00 | 10 | 01 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | | NIT: 901.266.624-6 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | **CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | **TELÉFONO:** | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | NIT: 800.103.927-7 | |
| **DIRECCIÓN:** AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 | **CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | **TELÉFONO:** | 5710290 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101449740

**FIRMA AUTORIZADA: Josa Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101238693 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2024 | 10 | 09 | 2024 | 00:00 | 10 | 01 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | NIT: 901.266.624-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | NIT: 800.103.927-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710290 |

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LOS PERJUICIOS A TERCEROS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO DE OBRA NO RE-SGRD-01885-2024 SUSCVRITO ENTRE LAS PARTES Y CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 10/09/2024 | 10/01/2025 | $260,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****217,260.00 | $ *******3,000.00 | $ ******41,849.00 | $ **********262,109.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| SANDRA MILENA CAMACHO TORRES | 163788 | 100.00 |

| DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101238693 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2024 | 10 | 09 | 2024 | 00:00 | 10 | 01 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | NIT: 901.266.624-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710503 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | NIT: 800.103.927-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710290 |

BENEFICIARIO:

PSE GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****217,260.00 | $ *******3,000.00 | $ ******41,849.00 | $ **********262,109.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA MILENA CAMACHO TORRES | 163788 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100513654926O(3900)000000262109(96)20250910

REFERENCIA PAGO: 1100513654926-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101238693 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10 | 2024 | 10 | 09 | 2024 | 00:00 | 10 | 01 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. | IDENTIFICACIÓN | NIT: 901.266.624-6 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 4 - 47 OF 33 CC INTERNACIONAL | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | TELÉFONO: | 5710503 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | IDENTIFICACIÓN | NIT: 800.103.927-7 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: AVENIDA 5 ESQUINA ENTRE CALLE 13 Y 14 | CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | TELÉFONO: | 5710290 |

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-40-101238693

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSTRUCTORES S.A.S

# 7. COPIA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander

**FONDO DE RIESGOS**
**NIT : 800103927-7**

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 000079

Fecha: Jul-26/2024 1 - 1 **Area Admin/va:** 00 / GENERAL

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| UNIDAD EJECUTORA | CODIGO | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1,499,910,681.00 |

**Fuente Recurso:** 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
**Producto MGA:** 4503003 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
**Código BPIN:** 2021004540151 - APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
**Producto DANE:** 83329 - Otros servicios de Ingeniería en proyectos n.c.p.

**TOTALES** **1,499,910,681.00**

VIGENCIA: 2024
VALOR: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.

*SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:*

*FUNCIONARIO:* WILLIAM VERA ARIAS
*CARGO:* SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
*DEPENDENCIA:* SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
*DOCUMENTO DE SOLICITUD:* 2222

**ADRIANA BOADA ARGUELLO**
Profesional Especializado

**ELABORÓ:**
**IDALY ROMERO MANTILLA**

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORES S.A.S

# 8. COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL - RP

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

**Gobernación de Norte de Santander**

**FONDO DE RIESGOS**
**NIT : 800103927-7**

## REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000072

FECHA : ago-30/2024
A FAVOR DE : IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. NIT: 901266624-6
COMPROMISO : CONTRATO DE OBRA No.01885 DE 2024. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.
DISPONIBILIDAD : 00 000079 -- jul-26/2024
DEPENDENCIA : SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Nº. CONTRATO : 01885 DE 2024
TIPO CONTRATO : C.O - CONTRATO DE OBRA
DURACION : 4 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| UNIDAD EJECUTORA | CODIGO | NOMBRE CUENTA | DISPONIBILIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 000079 - jul-26/2024 | 1,499,000,749.00 |

**Fuente Recurso:** 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
**Producto MGA:** 4503003 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
**Código BPIN:** 2021004540151 - APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
**Producto DANE:** 83329 - Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.

**TOTALES** **1,499,000,749.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.

**ADRIANA BOADA ARGUELLO**
Profesional Especializado

**ELABORÓ:**
**IDALY ROMERO MANTILLA**

CONSTRUCTORES S.A.S

# 9. COPIA ACTA DE INICIO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-01 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 10/07/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 1 de 3 | |

| ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | 10 de septiembre de 2024 |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **CONTRATO No. - FECHA** | RE-SGRD-01885-2024, del 30 de agosto de 2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |
| **CONTRATISTA** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S. |
| **C.C. o N.I.T.** | 901.266.624-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO |
| **C.C.** | 88.279.624 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | 1.499.000.749 |
| **PLAZO O DURACIÓN** | 4 meses |
| **FORMA DE PAGO** | El valor del Contrato es de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 1.499.000.749) M/CTE** EL DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA la ejecución de las obras objeto del presente contrato según actas parciales y/o final de obra ejecutada, aprobadas por el supervisor y con el visto bueno del Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, previa presentación de los soportes respectivos. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de aportes en materia de seguridad social integral, y parafiscales para la realización de cada pago dentro del presente contrato de obra. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá a EL CONTRATISTA el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones y descuentos ordenados por las normas aplicables. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento Norte de Santander |
| **RUBRO** | 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00000079 del 26 de julio de 2024 |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de designación) | William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante memorando de |

**ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO**

| | |
|---|---|
| | designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024. |
| **INTERVENTOR** (Acto administrativo y fecha de designación) | No aplica. |

**2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

**2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO**

| REQUISITO | FECHA |
|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 30 de agosto de 2024 |
| **Registro Presupuestal** | N° 00000072 DEL 30 de agosto de 2024 |

**2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN**

| REQUISITO | | | |
|---|---|---|---|
| **Impuesto de timbre** | No Aplica | | |
| **Publicación Gaceta** | No Aplica | | |
| **Garantía Única.**<br><br>No. 21-44-101449740 Anexo No.0<br>Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha de Expedición: 30/08/2024<br>Fecha de aprobación: 10/09/2024 | Amparos | Valor Asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento del Contrato | $ 149.991.068,10 | 29/08/2024 al 28/04/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $ 74.995.534,05 | 29/08/2024 al 28/12/2027 |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 149.991.068,10 | Ampara 5 años |
| **Garantía Responsabilidad civil**<br><br>No. 21-40-101238693 Anexo No.0<br>Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha de Expedición: 30/08/2024<br>Fecha de aprobación: 10/09/2024 | Valor asegurado | Vigencia | |
| | $ 260.000.000 | 18/06/2024 al 18/08/2024 | |
| **Otros (según el contrato):** | | | |

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-01 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 10/07/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 3 de 3 | |

**ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO**

En San José de Cúcuta a los 10 dias del mes de septiembre 2024, en las oficinas de la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE RIESGO, se reunieron los suscritos a saber: **WILLIAM VERA ARIAS**, Ordenador del Gasto - Supervisor, interventor Interno NO APLICA, Interventor Externo NO APLICA, **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.**, con NIT 901.266.624-6; Representada Legalmente por **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 88.279.624, en calidad de Contratista, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

Se firma la presente por los que en ella intervienen.

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.**
NIT: 901.266.624-6
R/L. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C. 88.279.624
**Contratista**

***Nota 1:*** *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*
***Nota 2:*** *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

CONSTRUCTORES S.A.S

# 10. COPIA ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3 CON ANEXO 1

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

**ACTA DE PARCIAL No.3**

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | **10 DE DICIEMBRE DE 2024** |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No. - FECHA** | RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | |
| **CONTRATISTA** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS | | |
| **C.C. o N.I.T.** | 901.266.624-6 | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO | | |
| **C.C.** | 88.279.674 DE OCAÑA | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00000079 del 26 de julio de 2024 | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No. 00000072 del 30 de agosto de 2024 | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749 | | |
| **PLAZO O DURACIÓN** | Cuatro (04) Meses | | |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de desig) | WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024 | | |
| **INTERVENTOR** (Acto administrativo y fecha de desg) | No Aplica | | |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | N.A | | |
| **ACTA DE REINICIO** | N.A | | |
| **FECHA DE TERMINACION** | 10 DE ENERO DE 2025 | | |
| **Garantía Única.**<br>No. 21-44-101449740 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Vigencia** |
| | Cumplimiento del Contrato | $ 149.991.068,10 | 10/09/2024 al 10/05/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e | $ 74.995.534,05 | 10/09/2024 al 09/01/2028 |

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-03 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 27/07/2010 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 2 de 2 | |

**ACTA DE PARCIAL No.3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Indemnizaciones Laborales | | |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 149.991.068,10 | Cinco años, 0 meses y 0 días |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 21-40-101238693 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | **Amparos** | **Valor Asegurado** | Vigencia |
| | Predios , labores y operaciones | $ 260.000.000 | 10/09/2024 al 10/01/2025 |
| **ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO** | No Aplica | | |
| **ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES** | No Aplica | | |
| **ACTAS DE RECIBO PREVIAS** | ACTA PARCIAL No. 01 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| | ACTA PARCIAL No. 02 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | |
| **% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA** | 19,77% | | |
| **% EJECUTADO ACUMULADO** | 84,70% | | |
| **% DE TIEMPO TRANSCURRIDO** | 92 días trabajados / 123 Total días: 74,80% | | |

En San José de Cúcuta el 10 de diciembre de 2024, en las oficinas de la Secretaría para la Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: WILLIAM VERA ARIAS, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo No Aplica, e IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS. Representada Legalmente por IMAR ORLANDO VACCA MACHADO Contratista, con el fin de realizar Acta Parcial de Obra No. 3 al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
NIT 901.266.624-6
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Contratista de obra

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03 | FECHA DEL ACTA | 10/12/2024

CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

| CONDICIONES DEL CONTRATO INCIAL | | | | | | CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICADO | | ACTA PARCIAL No 1 | | ACTA PARCIAL No 2 | | ACTA PARCIAL No 3 | | EJECUTADO ACUMULADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT | VR. UNITARIO | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL |
| 1.0 | **PUENTE VEHICULAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría) | M2 | 285,36 | $ 6.781,00 | $1.935.026,00 | 285,36 | $ 1.935.026,00 | 285,36 | $ 1.935.026,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | | 285,36 | $ 1.935.026,00 | 0,00 | $ - |
| 1,02 | Excavación mecánica en material tipo grava ariciliosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | M3 | 1376,88 | $ 32.969,00 | $45.394.357,00 | 1.871,25 | $ 61.693.241,00 | 1.372,48 | $ 45.249.293,00 | 498,77 | $ 16.443.948,00 | 0,00 | | 1.871,25 | $ 61.693.241,00 | 0,00 | $ - |
| 1,03 | Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm² | M3 | 38,35 | $ 748.682,00 | $28.711.955,00 | 38,35 | $ 28.711.955,00 | 38,35 | $ 28.711.955,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | | 38,35 | $ 28.711.955,00 | 0,00 | $ - |
| 1,04 | Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 89,49 | $ 1.419.525,00 | $127.033.292,00 | 89,49 | $ 127.033.292,00 | | $ - | 89,49 | $ 127.033.292,00 | 0,00 | | 89,49 | $ 127.033.292,00 | 0,00 | $ - |
| 1,05 | Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | M3 | 94,44 | $ 1.519.012,00 | $143.455.493,00 | 94,44 | $ 143.455.493,00 | | $ - | 94,44 | $ 143.455.493,00 | 0,00 | | 94,44 | $ 143.455.493,00 | 0,00 | $ - |
| 1,06 | Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | M3 | 34,83 | $ 1.419.525,00 | $49.442.056,00 | 34,83 | $ 49.442.056,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 34,83 | $ 49.442.056,00 | 34,83 | $ 49.442.056,00 | 0,00 | $ - |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 16253,02 | $ 10.385,00 | $168.787.613,00 | 16.253,02 | $ 168.787.613,00 | 8.188,82 | $ 85.040.896,00 | 3.200,90 | $ 33.241.347,00 | 3.604,31 | $ 37.430.759,00 | 14.994,03 | $ 155.713.003,00 | 1.258,99 | $ 13.074.611,00 |
| 1,08 | Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm. | M3 | 1004,60 | $ 42.073,00 | $42.266.536,00 | 1.004,60 | $ 42.266.536,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 1.004,60 | $ 42.266.536,00 | 1.004,60 | $ 42.266.536,00 | 0,00 | $ - |
| 1,09 | Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm) | UND | 4,00 | $ 2.311.720,00 | $9.246.880,00 | 4,00 | $ 9.246.880,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 9.246.880,00 | 4,00 | $ 9.246.880,00 | 0,00 | $ - |
| 1,10 | Junta de dilatacion con angulo UPN 160 | M | 9,80 | $ 444.040,00 | $4.351.592,00 | 9,80 | $ 4.351.592,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 9,80 | $ 4.351.592,00 | 9,80 | $ 4.351.592,00 | 0,00 | $ - |
| 1,11 | Placa de aproximacion Concreto 4000 Psi, resistencia 210 Kg/cm² | M3 | 8,82 | $ 1.419.525,00 | $12.520.211,00 | 8,82 | $ 12.520.211,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 8,82 | $ 12.520.211,00 |
| 1,12 | Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m) | UND | 4,00 | $ 356.976,00 | $1.427.904,00 | 4,00 | $ 1.427.904,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 4,00 | $ 1.427.904,00 | 4,00 | $ 1.427.904,00 | 0,00 | $ - |
| 1,13 | Baranda en acero A-36 con tres Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=2.3 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje | M | 32,40 | $ 722.301,00 | $23.402.552,00 | 32,40 | $ 23.402.552,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 32,40 | $ 23.402.552,00 |
| 1,14 | Base granular (INV. 330.1) | M3 | 90,00 | $ 286.800,00 | $25.812.000,00 | 90,00 | $ 25.812.000,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 90,00 | $ 25.812.000,00 |
| 1,15 | Losa de pavimento en Concreto resistencia 4500 psi e=0.20 m | M3 | 60,00 | $ 1.419.525,00 | $85.171.500,00 | 60,00 | $ 85.171.500,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 60,00 | $ 85.171.500,00 |
| 1,16 | Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1) | M | 154,00 | $ 6.730,00 | $1.036.420,00 | 154,00 | $ 1.036.420,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 154,00 | $ 1.036.420,00 |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 3047,93 | $ 39.448,00 | $120.234.743,00 | 2.957,97 | $ 116.686.065,00 | 2.829,94 | $ 111.635.631,00 | 128,03 | $ 5.050.434,00 | 89,96 | $ 3.548.678,00 | 3.047,93 | $ 120.234.743,00 | 0,00 | $ - |
| 1,18 | Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada) | M | 134,00 | $ 42.789,00 | $5.733.726,00 | 134,00 | $ 5.733.726,00 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 134,00 | $ 5.733.726,00 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,19 | Suministro e instalación de Geodrén tubular, zanja de 0.3 m x 0,8 m, incluye tubería de drenaje Hdpe ø4pulg y grava de 1/2" | M | 60,00 | $ 156.008,00 | $9.360.480,00 | 60,00 | $ 9.360.480,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 60,00 | $ 9.360.480,00 |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | dia | 60,00 | $ 538.226,00 | $32.293.560,00 | 78,00 | $ 41.981.628,00 | 29,00 | $ 15.608.554,00 | 29,00 | $ 15.608.554,00 | 20,00 | $ 10.764.520,00 | 78,00 | $ 41.981.628,00 | 0,00 | $ - |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion | M³ | 840,00 | $ 48.190,00 | $40.479.600,00 | 840,00 | $ 40.479.600,00 | 420,00 | $ 20.239.800,00 | 0,00 | $ - | 420,00 | $ 20.239.800,00 | 840,00 | $ 40.479.600,00 | 0,00 | $ - |
| 1,22 | Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional ) | M³ | 1600,00 | $ 32.411,00 | $51.857.600,00 | 1.193,33 | $ 38.677.019,00 | 800,00 | $ 25.928.800,00 | 393,33 | $ 12.748.219,00 | 0,00 | $ - | 1.193,33 | $ 38.677.019,00 | 0,00 | $ - |

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ANEXONo. 1 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03 | FECHA DEL ACTA | 10/12/2024

CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

| CONDICIONES DEL CONTRATO INCIAL | | | | | | CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICADO | | ACTA PARCIAL No 1 | | ACTA PARCIAL No 2 | | ACTA PARCIAL No 3 | | EJECUTADO ACUMULADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT | VR. UNITARIO | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL |
| 1,23 | Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal) | M² | 117,60 | $ 772.005,00 | $90.787.788,00 | 117,60 | $ 90.787.788,00 | | $ - | 58,80 | $ 45.393.894,00 | 58,80 | $ 45.393.894,00 | 117,60 | $ 90.787.788,00 | 0,00 | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ***Subtotal*** | ***$1.120.742.884,00*** | | **$ 1.130.000.577,00** | | **$ 334.349.955,00** | | **$ 398.975.181,00** | | **$224.112.619,00** | | **$ 957.437.756,00** | | **$ 172.562.821,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***COSTO DIRECTO DE LA OBRA*** | | | | **$ 1.120.742.884,00** | | ***$ 1.130.000.577,00*** | | ***$ 334.349.955,00*** | | **$ 398.975.181,00** | | **$224.112.619,00** | | ***$ 957.437.756,00*** | | ***$ 172.562.821,00*** |
| | ADMINISTRACIÓN | | 25,00% | | $ 280.185.721,00 | | $ 282.500.144,00 | | $ 83.587.489,00 | | $ 99.743.795,00 | | $56.028.155,00 | | $ 239.359.439,00 | | $ 43.140.705,00 |
| | IMPREVISTOS | | 0,50% | | $ 5.603.714,00 | | $ 5.650.003,00 | | $ 1.671.750,00 | | $ 1.994.876,00 | | $1.120.563,00 | | $ 4.787.189,00 | | $ 862.814,00 |
| | UTILIDAD | | 4,50% | | $ 50.433.430,00 | | $ 50.850.026,00 | | $ 15.045.748,00 | | $ 17.953.883,00 | | $10.085.068,00 | | $ 43.084.699,00 | | $ 7.765.327,00 |
| | ***COSTO INDIRECTO DE LA OBRA*** | | | | **$ 336.222.865,00** | | ***$ 339.000.173,00*** | | ***$ 100.304.987,00*** | | **$ 119.692.554,00** | | **$67.233.786,00** | | ***$ 287.231.327,00*** | | ***$ 51.768.845,00*** |
| | SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE | | | | **$ 12.035.000,00** | | | | $ - | | $ - | - | | | $ - | | |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL | | | | **$ 30.000.000,00** | | **$ 30.000.000,00** | | **$ 15.000.000,00** | | **$ 5.000.000,00** | | **$5.000.000,00** | | **$ 25.000.000,00** | | **$5.000.000,00** |
| | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO** | | | | **$ 1.499.000.749,00** | | **$ 1.499.000.749,00** | | **449.654.942,00** | | **$ 523.667.735,00** | | **$296.346.405,00** | | **1.269.669.083,00** | | **229.331.666,00** |
| | | | | | | | | | 30,00% | | 34,93% | | 19,77% | | 84,70% | | 15,30% |

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
**R/L DE IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S**
**CONTRATISTA**

**WILLIAM VERA ARIAS**
**SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**
VoBo Ordenador del Gasto - Supervisor

# 11. MEMORIAS DE CANTIDADES

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RESGO DE DESASTRES

| | FECHA DEL ACTA | 10/12/2024 |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No.RE-SGRD- 001885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | |

| PREACTA #3 - CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 3 PERIODO (06/11/2024 AL 10/12/2024) | | | | | EJECUTADO ACUMULADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL | CANT. | V.R PARCIAL |
| 1.0 | PUENTE VEHICULAR | | | | | | | |
| 1,06 | Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | M3 | 34,83 | $ 49.442.056,00 | 34,83 | $ 49.442.056,00 | 0,00 | $ - |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 3.604,31 | $ 37.430.759,00 | 14.994,03 | $ 155.713.002,00 | 1.258,99 | $ 13.074.611,00 |
| 1,08 | Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm. | M3 | 1.004,60 | $ 42.266.536,00 | 1.004,60 | $ 42.266.536,00 | 0,00 | $ - |
| 1,09 | Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm) | UND | 4,00 | $ 9.246.880,00 | 4,00 | $ 9.246.880,00 | 0,00 | $ - |
| 1,10 | Junta de dilatacion con angulo UPN 160 | M | 9,80 | $ 4.351.592,00 | 9,80 | $ 4.351.592,00 | 0,00 | $ - |
| 1,12 | Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m) | UND | 4,00 | $ 1.427.904,00 | 4,00 | $ 1.427.904,00 | 0,00 | $ - |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 89,96 | $ 3.548.678,00 | 3.047,93 | $ 120.234.743,00 | -89,96 | -$ 3.548.678,00 |
| | OBRAS COMPLEMENTARIA | | | | | | | |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | dia | 20,00 | $ 10.764.520,00 | 78,00 | $ 41.981.628,00 | 0,00 | $ - |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion | M³ | 420,00 | $ 20.239.800,00 | 840,00 | $ 40.479.600,00 | 0,00 | $ - |
| 1,23 | Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal) | M² | 58,80 | $ 45.393.894,00 | 117,60 | $ 90.787.788,00 | 0,00 | $ - |
| | | | | | | | | |
| | | | | **$ 224.112.619,00** | | **$ 957.437.755,00** | | **$ 172.562.822,00** |
| | | | | | | | | |
| | ***COSTO DIRECTO DE LA OBRA*** | | | ***$ 224.112.619,00*** | | ***$ 957.437.755,00*** | | ***$ 172.562.822,00*** |
| | ADMINISTRACIÓN | | | $ 56.028.155,00 | | $ 239.359.439,00 | | $ 43.140.706,00 |
| | IMPREVISTOS | | | $ 1.120.563,00 | | $ 4.787.189,00 | | $ 862.814,00 |
| | UTILIDAD | | | $ 10.085.068,00 | | $ 43.084.699,00 | | $ 7.765.327,00 |
| | ***COSTO INDIRECTO DE LA OBRA*** | | | ***$ 67.233.786,00*** | | ***$ 287.231.327,00*** | | ***$ 51.768.847,00*** |
| | SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE | | | $ - | | $ - | | $ - |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL | | | **$ 5.000.000,00** | | **$ 25.000.000,00** | | **$5.000.000,00** |
| | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO** | | | **296.346.405,00** | | **1.269.669.082,00** | | **229.331.668,00** |

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:


**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
**R/L DE IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S**
**CONTRATISTA**

**WILLIAM VERA ARIAS**
**SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**
VoBo Ordenador del Gasto - Supervisor

## MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 03 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 06/11/2024 AL 10/12/2024 |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | SUPERVISION | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | INTERVENTORIA | N.A |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,06 | Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | UNIDAD DE MEDIDA | M3 | UBICACIÓN | CUCUTILLA |

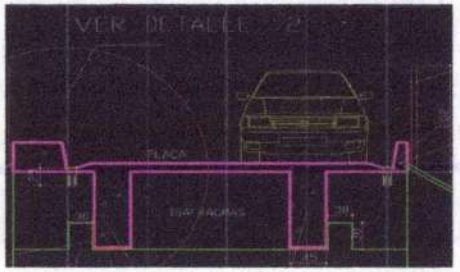


| DETALLE | Dimensiones | | | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | B(m) | L(m) | h (m) | | |
| Losa | 4,90 | 16,20 | 0,17 | 1,00 | 13,49 |
| Vigas diafragma | 0,25 | 4,90 | 0,78 | 3,00 | 2,87 |
| Vigas | 0,45 | 16,20 | 1,00 | 2,00 | 14,58 |
| Anden | 0,6 | 16,2 | 0,2 | 2,00 | 3,89 |
| | | | | Subtotal | 34,83 |
| | | | | Vienen | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 34,83 |

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA


Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor


# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 03 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 06/11/2024 AL 10/12/2024 |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | SUPERVISION | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | INTERVENTORIA | N.A |

| CAPITULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | UNIDAD | KG | UBICACIÓN | CUCUTILLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

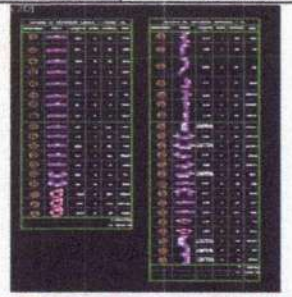



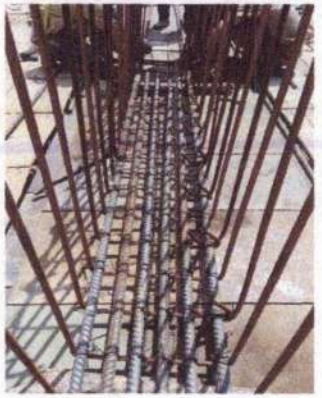



| DETALLE | Dimensiones Diámetro | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | # 4 | # 5 | # 7 | # 8 | Cant | |
| Kg / ml | 1,00 | 1,6 | 3,04 | 4 | (Und) | |
| 1A | | | | 12,00 | 12,00 | 576 |
| 1B | | | | 6,00 | 12,00 | 288 |
| 2 | | | | 12,00 | 12,00 | 576 |
| 3 | | | | 8,50 | 6,00 | 204 |
| 4 | 12,00 | | | | 8,00 | 96 |
| 5 | 6,00 | | | | 8,00 | 48 |
| 6 | | 12,00 | | | 4,00 | 76,8 |
| 7 | | 6,00 | | | 4,00 | 38,4 |
| 8 | 0,45 | | | | 108,00 | 48,6 |
| 9 | 4,80 | | | | 96,00 | 460,8 |
| 10 | 12,00 | | | | 55,00 | 660 |
| 10 | 5,50 | | | | 55,00 | 302,5 |
| 11 | 4,80 | | | | 6,00 | 28,8 |
| 12 | 3,00 | | | | 18,00 | 54 |
| 13 | | 3,00 | | | 6,00 | 28,8 |
| 27 | 1,20 | | | | 16,00 | 19,2 |
| E1 | 3,22 | | | | 104,00 | 334,88 |
| E2 | 1,97 | | | | 136,00 | 267,92 |
| E3 | 2,35 | | | | 15,00 | 35,25 |
| E4 | 1,45 | | | | 80,00 | 116 |
| E5 | | 1,85 | | | 30,00 | 88,8 |
| | | | | | | 3604,31 |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #3 | 3.604,31 |
| Vienen acta parcial #1 | 8.188,82 |
| Vienen acta parcial #2 | 3.200,90 |
| TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #1, #2 y #3 | 14.994,03 |

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
EL IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR


Firma:

WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

| Gobernación de Norte de Santander | MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES | IMAR CONTRATISTAS S.A.S |
|---|---|---|

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 03 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 06/11/2024 AL 10/12/2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | | | | SUPERVISION | WILLIAM VERA ARIAS | | | |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | | | | INTERVENTORIA | N.A | | | |
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,08 | Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm. | UNIDAD DE MEDIDA | M3 | | UBICACIÓN | CUCUTILLA |

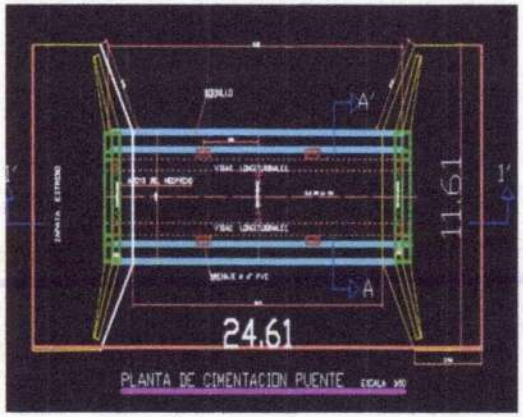


| DETALLE | Dimensiones V (m3) | | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cimentación del puente | 1.022,40 | 1 | | 1.022,40 |
| Excavaciones de sobreanchos | 204,48 | 1 | | 204,48 |
| Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes | 38,35 | -1 | | -38,35 |
| Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi | 89,49 | -1 | | -89,49 |
| Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | 94,44 | -1 | | -94,44 |
| Subtotal | | | | 1.004,60 |
| Vienen | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 1.004,60 |

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA


Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

| Gobernación de Norte de Santander | MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES | |
|---|---|---|

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 03 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 06/11/2024 AL 10/12/2024 |
|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | SUPERVISION | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | INTERVENTORIA | N.A |

| CAPITULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,09 | Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm) | UNIDAD DE MEDIDA | UND | UBICACIÓN | CUCUTILLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| DETALLE | Dimensiones | | | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | B(m) | L(m) | H(m) | | |
| En total son 4 apoyos | | | | | 4,00 |
| Subtotal | | | | | 4,00 |
| Vienen | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 4,00 |

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
EL IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR


Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | **ACTA PARCIAL No. 03** | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE:** | **06/11/2024 AL 10/12/2024** |
| **OBJETO** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-01885-2024 | SUPERVISION | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | INTERVENTORIA | N.A |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO** | PUENTE VEHICULAR | **ITEM** | **1,10** | Junta de dilatacion con angulo UPN 160 | **UNIDAD DE MEDIDA** | M | **UBICACIÓN** | **CUCUTILLA** |

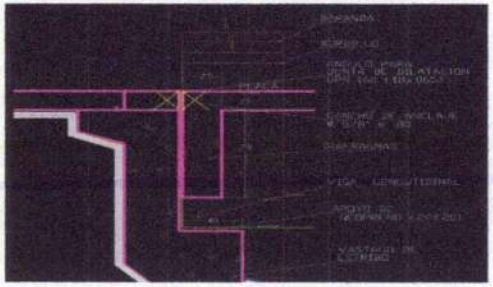

| DETALLE | Dimensiones B(m) | L(m) | H(m) | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Junta de dilatacion entrada en losa de aproximacion** | | 4,90 | | 1,00 | **4,90** |
| **Junta de dilatacion salida en losa de aproximacion** | | 4,90 | | 1,00 | **4,90** |
| **El elemento de la superestructura debe ser flexible al movimiento de los vehículos en la entrada y salida de la loza de aproximacion, el cual el angulo permite dilatar como una fisura inducida evitando la dilatacion de losa** | | | | | |
| **Subtotal** | | | | | **9,80** |
| **Vienen** | | | | | **0,00** |
| **TOTAL** | | | | | **9,80** |

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR


Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 03 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 06/11/2024 AL 10/12/2024 |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | SUPERVISION | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | INTERVENTORIA | N.A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,12 | Drenaje en Tuberia PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m) | UNIDAD DE MEDIDA | UND | UBICACIÓN: CUCUTILLA |

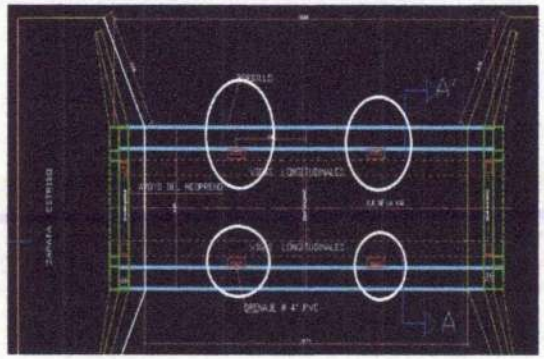


| DETALLE | Dimensiones B(m) | L(m) | H(m) | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tuberia de drenaje embebida en la losa** | | | | 4,00 | **4,00** |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **4,00** |
| **Vienen** | **0,00** |
| **TOTAL** | **4,00** |

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Rep. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IMA CONSTRUCTORES S.A.S

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 03 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 06/11/2024 AL 10/12/2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | | | SUPERVISION | | WILLIAM VERA ARIAS | | |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | | | INTERVENTORIA | | N.A | | |
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | UNIDAD DE MEDIDA | M3 | UBICACIÓN | CUCUTILLA |





| DETALLE | Dimensiones B(m) | L(m) | H(m) | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional ) | | | | | 1.871,25 |
| Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | | | | | 1.193,33 |
| fcator de expansión 1,3 | | | | | 3.983,95 |
| menos material seleccionado para rellenos | | | | | 1.004,60 |
| total cargue y retiro | | | | | 2.979,38 |
| menos cargue y retiro de material cobrado en acta parcial 1 | | | | | 2.829,94 |
| menos cargue y retiro de material cobrado acta parcial #2 | | | | | 128,03 |
| total a cobrar acta parcial #3 | | | | | 89,96 |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #3 | 89,96 |
| Vienen acta parcial #1 | 2.829,94 |
| Vienen acta parcial #2 | 128,03 |
| TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #1 , #2 y #3 | 3.047,93 |

Elaboró
EL CONTRATISTA

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IMM CONSTRUCTORES S.A.S

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 03 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 06/11/2024 AL 10/12/2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | | | | SUPERVISION | | WILLIAM VERA ARIAS | | |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | | | | INTERVENTORIA | | N.A | | |
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | UNIDAD DE MEDIDA | dia | UBICACIÓN | CUCUTILLA | |





| DETALLE | Dimensiones | | | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dias | | | | |
| **Manejo de aguas** | 20,00 | | | | **20,00** |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| **TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #2** | **20,00** |
| **Vienen acta parcial #1** | **29,00** |
| **Vienen acta parcial #2** | **29,00** |
| **TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #1, #2 y #3** | **78,00** |

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
**WILLIAM VERA ARIAS**
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

| Gobernación de Norte de Santander | MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES | IVM CONSTRUCTORES S.A.S |
|---|---|---|

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 03 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 06/11/2024 AL 10/12/2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL | | | | | | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | | | | SUPERVISION | | WILLIAM VERA ARIAS | |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | | | | INTERVENTORIA | | N.A | |
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion | UNIDAD DE MEDIDA | M³ | UBICACIÓN | CUCUTILLA |





| DETALLE | Dimensiones B(m) | L(m) | H(m) | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jarillon Provisional** | 5,00 | 10,50 | 4,00 | 2,00 | **420,00** |
| **TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #3** | | | | | **420,00** |
| **Vienen acta parcial #2** | | | | | **420,00** |
| **TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #2 Y #3** | | | | | **840,00** |

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
**WILLIAM VERA ARIAS**
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

# MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

IMA CONSTRUCTORES S.A.S

| SOPORTE DEL ACTA No. | ACTA PARCIAL No. 03 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE: | 06/11/2024 AL 10/12/2024 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | | |
| CONTRATO No. | RE-SGRD-01885-2024 | | | SUPERVISION | | WILLIAM VERA ARIAS | | |
| CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | | | INTERVENTORIA | | N.A | | |
| CAPÍTULO | PUENTE VEHICULAR | ITEM | 1,23 | Obra falsa de la super estructura (Formaleta temporal) | UNIDAD DE MEDIDA | M² | UBICACIÓN | CUCUTILLA |







| DETALLE | Dimensiones | | | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | B(m) | L(m) | H(m) | | |
| | | | | | |
| Obra falsa | 7,00 | 8,40 | | | 58,80 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A COBRAR ACTA PARCIAL #3 | 58,80 |
| Vienen acta parcial #2 | 58,80 |
| TOTAL ACUMULADO ACTAS PARCIALES #2 Y #3 | 117,60 |

OBSERVACIONES:

Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma:
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
R.L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

Avaló
EL SUPERVISOR

Firma:
WILLIAM VERA ARIAS
SECRETARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ordenador del Gasto - Supervisor

CONSTRUCTORES S.A.S

# 12. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

En mi calidad de Revisor fiscal - Contador Público Titulado con Tarjeta Profesional No. 197156-T emitida por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA**

QUE: El Sr. **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía N° 88.279.674 representante legal de la empresa **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS** identificado con NIT 901.266.624-6, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social según el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002 y Ley 828 de 2003 y se encuentra al día a la fecha del presente documento, en cuanto a salud, riesgos laborales pensiones y aportes a cajas de compensación para el contrato RE-SGRD-01885-2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

Se expide a los ocho (10) días del mes de diciembre de 2024 a solicitud del interesado

FRANKI GERARDINO SALCEDO
REVISOR FISCAL
T.P. 197156-T
C.C 1.091.162.693



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.091.162.693
GERARDINO SALCEDO

APELLIDOS
FRANKI

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1990
TEORAMA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

21-ABR-2008 TEORAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

P-2509100-01140872-M-1091162693-20200605 0070862572A 1 9912306584

Escaneado con CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

197156-T

FRANKI
GERARDINO SALCEDO
C.C. 1091162693
RESOLUCION INSCRIPCION 1519 FECHA 14/11/2014
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 209425



189644

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Se advierte a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
a la Calle 26 No 13 - 19 Int. 401 Junta Central de
Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 0 B D 0 8 E 0 3 C D B 8 A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANKI GERARDINO SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091162693 de TEORAMA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 197156-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# RESUMEN PLANILLA PAGADA




## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 901731704 | 1 | CONSTRUCTORA INCONORT SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 54-673 | CARRERA 4 0E 42 | | 5760851 | | | CONSTRUCCIONINCOSAS@GMAIL.COM | | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 2024-12 | 31812150 | E | 2024-12-10 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.756.800 | 27.200 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 17 | 31812150 | 2024-12-03 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | PNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 5440698 | IBAÑEZ CONTRERAS PEDRO PABLO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 2 | CC 5440870 | IBAÑEZ CONTRERAS ISIDRO | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | COLPENSION ES-25-14 | 130.000 | 20.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 130.000 | 5.200 | COMFANORTE-CCF37 | 130.000 | 5.200 | 130.000 | 9.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 40.300 | S | 5429001 |
| 3 | CC 13492157 | PALENCIA RIVERA LUIS ORLANDO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | EPS-S COOSALUD-ESSC24 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 4 | CC 13492314 | BLANCO PARRA ASCENCION | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS043 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 5 | CC 88145288 | DARCIA MONCADA DANIEL | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 14 | 14 | 14 | 14 | COLPENSION ES-25-14 | 606.667 | 97.100 | 0 | 0 | COMFAORIENTE-CCFC50 | 606.667 | 24.300 | COMFANORTE-CCF37 | 606.667 | 24.300 | 606.667 | 42.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 188.000 | S | 5429001 |
| 6 | CC 88145764 | LIZCANO SUAREZ LORENZO | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIENTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 7 | CC 88145927 | LIZCANO SUAREZ MARCO ANTONIO | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | COLPENSION ES-25-14 | 433.334 | 69.400 | 0 | 0 | COMPENSAR EPS-EPS008 | 433.334 | 17.400 | COMFANORTE-CCF37 | 433.334 | 17.400 | 433.334 | 30.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 134.400 | S | 5429001 |
| 8 | CC 88233087 | COLLANTES CHAUSTRE JUAN RAMON | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | EPS-S COOSALUD-ESSC24 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 9 | CC 88240965 | SANCHEZ SANCHEZ ALEXANDER | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 10 | CC 88312157 | GELVES VALERO JOSE FERNEY | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 11 | CC 1005011574 | ORTEGA GELVES BRAYAN SNEYFFER | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIENTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 12 | CC 1005011706 | MONCADA ORTEGA CIRO ALFONSO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIENTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 13 | CC 1090507680 | CAICEDO GUTIERREZ VLADIMIR | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIENTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 14 | CC 1093412156 | GARCIA GELVES VICTOR DANILO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIENTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 15 | CC 1093412663 | PEREZ URBINA MIGUEL ALEXIS | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | PORVENIR-230301 | 433.334 | 69.400 | 0 | 0 | COMFAORIENTE-CCFC50 | 433.334 | 17.400 | COMFANORTE-CCF37 | 433.334 | 17.400 | 433.334 | 30.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 134.400 | S | 5429001 |
| 16 | CC 1093413878 | GARCIA GELVES JHOEDISON DEYMAR | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIENTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |
| 17 | CC 1093854518 | MENESES MENESES MIGUEL ANTONIO | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | COMFAORIENTE-CCFC50 | 1.300.000 | 52.000 | COMFANORTE-CCF37 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 5429001 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901731704 | 1 | CONSTRUCTORA INCONORT SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 54-673 | CARRERA 4 0E 42 | | 5760851 | | | CONSTRUCCIONINCOSAS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-11 | 2024-12 | 31812150 | E | 2024-12-10 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.756.800 | 27.200 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 17 | 31812150 | 2024-12-03 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 18.503.335 | 18.503.335 | 18.503.335 | 18.503.335 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 17 | 2.960.700 | 0 | 13.900 | 0 | 2.974.600 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 2 | 416.000 | 0 | 2.000 | 0 | 418.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 6 | 811.300 | 0 | 3.800 | 0 | 815.100 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 9 | 1.733.400 | 0 | 8.100 | 0 | 1.741.500 |
| EPS(Administradoras: 6) | | | | 17 | 740.300 | 0 | 3.700 | 0 | 744.000 |
| COMPENSAR-EPS | EPS008 | 860066942 | 7 | 1 | 17.400 | 0 | 100 | 0 | 17.500 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 1 | 52.000 | 0 | 300 | 0 | 52.300 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890500675 | 6 | 9 | 405.700 | 0 | 1.900 | 0 | 407.600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 1 | 52.000 | 0 | 300 | 0 | 52.300 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 3 | 109.200 | 0 | 600 | 0 | 109.800 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 2 | 104.000 | 0 | 500 | 0 | 104.500 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 17 | 1.288.300 | 0 | 6.100 | 0 | 1.294.400 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 17 | 1.288.300 | 0 | 6.100 | 0 | 1.294.400 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 17 | 740.300 | 0 | 3.500 | 0 | 743.800 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890500516 | 3 | 17 | 740.300 | 0 | 3.500 | 0 | 743.800 |
| Gran Total | | | | | 5.729.600 | 0 | 27.200 | 0 | 5.756.800 |



99

CONSTRUCTORES S.A.S

# 13. INFORME DE CONTRATISTA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

**INFORME PARCIAL DE OBRA**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No.03 DE OBRA DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024**

**PERIODO:** 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 A 10 DE DICIEMBRE DE 2024

**CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**

**OBJETO:** CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

**CONTRATISTA:**

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
**Nit. 901.266.624-6**
**R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO**
**C.C. No. 88.279.624 DE OCAÑA**

**CONTRATANTE:**

**SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**
**GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER**

**San José de Cúcuta – Norte de Santander**

**DICIEMBRE DE 2024**

CONSTRUCTORES S.A.S

# 1 RESUMEN EJECUTIVO

## 1.1 GENERALIDADES

**CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2022** CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

## DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto se llevará a cabo en la zona rural del municipio de Cucutilla, específicamente en la vía que comunica al municipio con la vía nacional de la ruta Pamplona - Bucaramanga. Actualmente la población de la zona rural y de la cabecera municipal se ve afectada en el desplazamiento, debido al colapso de un box Culvert, que por causa de las fuertes lluvias que hicieron presencia en esta zona geográfica se deterioró hasta ocasionar su colapso.

La siguiente imagen muestra la localización del municipio de Cucutilla en Colombia, y la ubicación de la obra

.

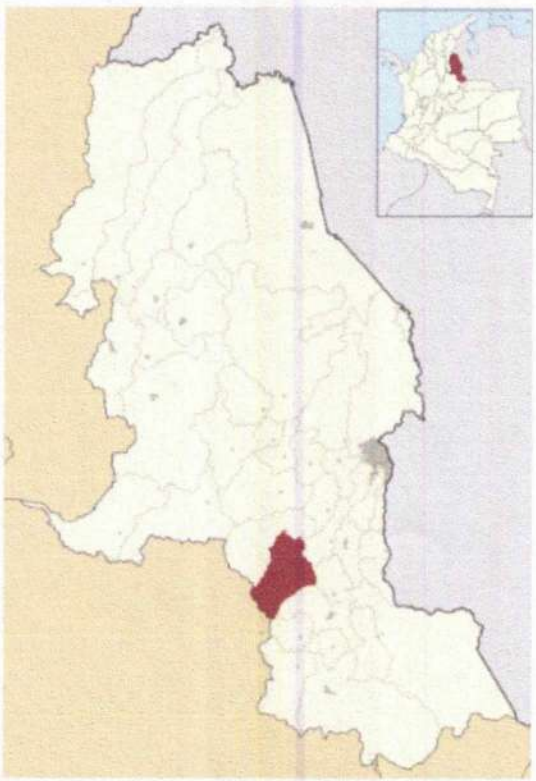


Ilustración No 1: *Localización de la obra a nivel Nacional y Departamental – fuente Wikipedia*




ilustración no 2: área de intervención del contrato de obra- fuente: consultoría

**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de obra de acuerdo con el término, valor, objeto, fechas importantes, etc.

Información Contractual **CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024** | OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 | |
| | VALOR CONTRATO | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.499.000.749,00) | |
| | CONTRATISTA | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS | **R/L** IMAR ORLANDO VACCA MACHADO |
| | NIT Y C.C. | **NIT.** 901-266-624-6 | **CC No.** 88.279.624 DE OCAÑA |
| | SUPERVISOR | WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024. | |
| | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | No. 00 000079 de Fecha 26 julio de 2024 | |

CONSTRUCTORES S.A.S

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 | PRESUPUESTAL CONTRATO PRINCIPAL | |
| | REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO PRINCIPAL | No.00 000072 de Fecha 30 de agosto de 2024 |
| | FECHA DE INICIO | 10 de septiembre de 2024 |
| | PLAZO PACTADO CONTRATO PRINCIPAL | Cuatro (04) Meses |
| | ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01: | No Aplica |
| | ACTA DE REINICIO No. 01: | No Aplica |
| | TIEMPO SUSPENDIDO: | No Aplica |
| | % EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA | 19,77% |
| | % EJECUTADO ACUMULADO | 84,70% |

**POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**A LA FIRMA DEL CONTRATO**

| | **Amparos** | **Valor asegurado** | **Vigencia** |
|---|---|---|---|
| **Garantía Única.**<br>No. 21-44-101449740 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 30/08/2024<br>Fecha de aprobación: 09/09/2024 | Cumplimiento del Contrato | $ 149.991.068,10 | 29/08/2024 al 28/04/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $ 74.995.534,05 | 29/08/2024 al 28/12/2027 |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 149.991.068,10 | Cinco años, 0 meses y 0 días |

| | | |
|---|---|---|
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 21-40-101238693 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 30/08/2024<br>Fecha de aprobación: 09/09/2024 | **Valor asegurado** | **Vigencia** |
| | $260.000.000 | 18/06/2024 al 18/08/2024 |

**A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Garantía Única.**<br>No. 21-44-101449740 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | **Amparos** | **Valor asegurado** | **Vigencia** |
| | Cumplimiento del Contrato | $ 149.991.068,10 | 10/09/2024 al 10/05/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $ 74.995.534,05 | 10/09/2024 al 09/01/2028 |
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 149.991.068,10 | Cinco años, 0 meses y 0 días |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 21-40-101238693 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | **Valor asegurado** | | **Vigencia** |
| | $260.000.000 | | 10/09/2024 al 10/01/2025 |

CONSTRUCTORES S.A.S

**ACTOS ADMINISTRATIVOS**

A continuación, se relacionan los actos administrativos del **CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**:

| ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA |
|---|---|
| ACTA DE INICIO | 10 Septiembre de 2024 |
| ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1 | 08 Octubre de 2024 |
| ACTA DE OBRA PARCIAL No. 2 | 05 Noviembre de 2024 |
| ACTA DE OBRA PARCIAL No. 3 | 10 Diciembre de 2024 |

**ASPECTOS FINANCIEROS**

Anticipos, Actas parciales y/o Acta Final

**ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA NO. RE-CDGRD- 04093-2022 SUSCRITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022**:

Para la ejecución de este contrato de obra no se contó con recursos de anticipo.

| Avance Financiero | Valor contractual | Parcial No. 1 | Parcial No. 2 | Parcial No. 3 | Valor restante por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ 1.499.000.749 | | - | - | |
| VALOR ACTA No. 1 | | $ 449.654.942,00 | | | |
| VALOR ACTA No. 2 | | | $523.667.735 | | |
| VALOR ACTA A COBRAR | | | | $296.346.405 | |
| Total | $ 1.499.000.749 | | - | - | $ 229.331.666,00 |

**ASPECTOS TECNICOS**

- **Actas de obra:**

A corte de este informe se proyecta el trámite Acta Parcial de Obra No. 03 De fecha 10 de diciembre de 2024 al Contrato de Obra No. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024, con las actividades ejecutadas a la fecha.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el desarrollo de la obra, para el periodo del **06 de noviembre de 2024 al 10 de diciembre de 2024**, se ejecutaron los siguientes ítems del contrato, sus cantidades y avances se describen en la tabla que se relaciona a continuación los cuales cumplieron con los requerimientos y exigencias solicitados por la supervisión.

CONSTRUCTORES S.A.S

| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | CANT. | V.R PARCIAL |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **PUENTE VEHICULAR** | | |
| 1,06 | Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | 34,83 | $ 49.442.056,00 |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | 3.604,31 | $ 37.430.759,00 |
| 1,08 | Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactación en capas de 30 cm. | 1.004,60 | $ 42.266.536,00 |
| 1,09 | Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm) | 4,00 | $ 9.246.880,00 |
| 1,10 | Junta de dilatación con Angulo UPN 160 | 9,80 | $ 4.351.592,00 |
| 1,12 | Drenaje en Tubería PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m) | 4,00 | $ 1.427.904,00 |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | 89,96 | $ 3.548.678,00 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIA** | | |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta eléctrica) | 20,00 | $ 10.764.520,00 |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación | 420,00 | $ 20.239.800,00 |
| 1,23 | Obra falsa de la súper estructura (Formaleta temporal) | 58,80 | $ 45.393.894,00 |
| | | | **$ 224.112.619,00** |
| ***COSTO DIRECTO DE LA OBRA*** | | | ***$ 224.112.619,00*** |
| ADMINISTRACIÓN | | | $ 56.028.155,00 |
| IMPREVISTOS | | | $ 1.120.563,00 |
| UTILIDAD | | | $ 10.085.068,00 |
| ***COSTO INDIRECTO DE LA OBRA*** | | | ***$ 67.233.786,00*** |
| SOLICITUD DE VISITA Y PERMISO OCUPACION DE CAUCE | | | **$ -** |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL | | | **$ 5.000.000,00** |
| **VALOR TOTAL DEL PROYECTO** | | | **$ 296.346.405,00** |

CONSTRUCTORES S.A.S

**DESCRIPCIÓN FINANCIERA EJECUTADA SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 03 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**

| Concepto: | Acta Parcial No.01 | Acta Parcial No.02 | Acta Parcial No.03 | Pendiente por ejecutar |
|---|---|---|---|---|
| Fecha: | 08 Agosto de 2024 | 05 noviembre de 2024 | 10 diciembre de 2024 | |
| Valor del contrato: | $ 1.499.000.749 | $ 1.499.000.749 | $ 1.499.000.749 | |
| Valor ejecutado según acta parcia | $ 449.654.942,00 | $523.667.735,0 | $ 296.346.405,00 | $ 229.331.668,00 |
| % de ejecución del acta: | 30,00 % | 34,93% | 19,77% | |
| % de ejecución acumulado a la fecha: | 30,00 % | 64,93% | 84,70% | 15,30% |

**AVANCE DE TIEMPO**

PLAZO DE EJECUCION : 4 Meses
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO : 92 Dias
AVANCE PORCENTUAL :**92 Dias trabajados / 123 Total Dias: 74,80 %**

**Manejo del personal para la obra**

La firma contratista hizo llegar cada una de las afiliaciones del personal que está en campo realizando las actividades y ejecutando los ítems del contrato.

**PERSONAL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024**

Se realizó cada una de las afiliaciones del personal y estas mismas afiliaciones fueron entregadas al supervisor del contrato.

En el desarrollo del contrato se realizó seguimiento permanente de los pagos al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, caja de compensación familiar y riesgos profesionales laborales) del personal que participó en la ejecución del contrato.

Se anexa el pago de seguridad social de los empleados y del contratista.

**MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA**

A corte de este informe el contratista contó con la siguiente maquinaria y equipos en obra:

CONSTRUCTORES S.A.S

- Rana, vibrador para concreto, Carmix, motobomba

**CONCLUSIONES**

El contratista cuenta con un avance de ejecución de obra acumulado a corte del 10 de diciembre de 2024 del 84,70%, en cuanto al tiempo estipulado para el desarrollo de las actividades constructivas derivadas del objeto contractual se encuentra en un 74,80% del tiempo contractual, dadas las condiciones climatológicas en la zona de ejecución del contrato debido al incremento en la precipitaciones, se ha visto afectado el normal desarrollo y ejecución de las actividades constructivas contractuales, esto debido a los ceses de trabajo que se han tenido que realizar a consecuencia de las lluvias.
El contratista mediante el presente informe soporta el pago de la presente Acta Parcial de Obra No. 03 de fecha 10 de diciembre de 2024 al Contrato de obra No. RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE OCTUBRE DE 2024 por valor: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 296.346.405,00)**

**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
**Nit.. 901266.624-6**
**R/L IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
**C.C. No. 88.279.624**
**CONTRATISTA**

CONSTRUCTORES S.A.S

# 14. INFORME DE SUPERVISION

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-12 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 24/10/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 1 de 13 | |

# INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| **FECHA :** | 10 de diciembre de 2024 |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **FECHA Y No DEL CONTRATO** | RE-SGRD- 01885-2022 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres |
| **CONTRATISTA** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S |
| **C.C. o N.I.T.** | 901-266-624-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO |
| **C.C** | 88.279.624 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749 |
| **VALOR ADICIONAL CONTRATO** | No Aplica |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento Norte de Santander |
| **PLAZO INICIAL** | Cuatro (04) Meses |
| **PLAZO ADICIONAL** | No Aplica |
| **PLAZO TOTAL** | Cuatro (04) Meses |
| **FORMA DE PAGO** | El valor del Contrato es de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $ 1.499.000.749,** EL DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA la ejecución de las obras objeto del presente contrato según actas parciales y/o final de obra ejecutada, aprobadas por el supervisor y con el visto bueno del Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, previa presentación de los soportes respectivos. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de aportes en materia de seguridad social integral, y parafiscales para la realización de cada pago dentro del presente contrato de obra. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá a EL CONTRATISTA el porcentaje que determinen las |

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| | leyes de orden público y hará las demás retenciones y descuentos ordenados por las normas aplicables. | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00 000079 del 26 de julio de 2024 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No.00 000072 de Fecha 30 de agosto de 2024 | |
| **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS – Secretario para la Gestión de Riesgo de Desastres, mediante memorando de designación de supervisión de fecha 10 de septiembre de 2024. | |
| **INTERVENTOR EXTERNO** | - | |
| **ACTA DE INICIO** | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | - | |
| **ACTA DE REINICIO** | - | |
| **ACTAS PARCIALES DE OBRAS** | - | **FECHA** |
| | ACTA PARCIAL DE OBRA #1 | 08 DE OCTUBRE DE 2024 |
| | ACTA PARCIAL DE OBRA #2 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| | ACTA PARCIAL DE OBRA #3 | 10 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **ACTAS DE MODIFICACIÓN** | ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES #1 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 | |
| **ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS** | No Aplica | |

**RELACIÓN DE GARANTÍAS**

| | **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Vigencia** |
|---|---|---|---|
| **Garantía Única.**<br>No. 21-44-101449740 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | Cumplimiento del Contrato | $ 149.991.068,10 | 10/09/2024 al 10/05/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $ 74.995.534,05 | 10/09/2024 al 09/01/2028 |

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 149.991.068,10 | Cinco años, 0 meses y 0 días |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 21-40-101238693 Anexo No.2<br>Aseguradora: Seguros del Estado S.A<br>Fecha de Expedición: 07/10/2024<br>Fecha de aprobación: 08/10/2024 | Amparos | Valor Asegurado | Vigencia |
| | Predios, labores y operaciones | $ 260.000.000 | 10/09/2024 al 10/01/2025 |

| 2. ESTADO FINANCIERO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **FECHA** | **VALOR ACTA** | **COMPROBANTE DE EGRESO** | **VALOR PAGADO** |
| **ACTA PARCIAL No. 1** | **08 DE OCTUBRE DE 2024** | $ 449.654.942,00 | | |
| **ACTA PARCIAL No. 2** | **05 DE NOVIEMBRE DE 2024** | $523.667.735,00 | | |
| **ACTA PARCIAL No. 3** | **10 DE DICIEMBRE DE 2024** | $296.346.405,00 | **EN TRAMITE** | |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 1.499.000.749 |
| ACTA PARCIAL No.01 DE FECHA 03 OCTUBRE DE 2024 | $ 449.654.942,00 |
| ACTA PARCIAL No.02 DE FECHA 05 NOVIEMBRE DE 2024 | $ 523.667.735,00 |
| ACTA PARCIAL No.03 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 | $296.346.405,00 |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **$** 229.331.668,00 |

## 3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Durante el periodo reportado en el presente informe se logró dar continuidad al proceso constructivo del puente mediante la ejecución de las actividades como lo son manejo de

aguas, las actividades del dragado; seguidamente luego de terminada la construcción de los estribos del puente se procedió a realizar las actividades constructivas relacionadas con la obra falsa para poder continuar con el proceso de construcción (armado de refuerzo y vaciado de concreto) de las vigas, los bordillos y las losa del puente, así mismo debido al incremento de las lluvias presentes en la zona fue necesario realizar nuevamente actividades de dragado y retiro de material de arrastre que traen consigo las aguas lluvias al lugar de ejecución del contrato por lo que también se realizaron actividades de retiro de material y el dragado.

Las obras ejecutadas durante el periodo reportado en acta parcial #3 que corresponde desde el 06 de noviembre de 2024 al 10 de diciembre de 2024 están descritas en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT. |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **PUENTE VEHICULAR** | | |
| 1,06 | Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | M3 | 34,83 |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 3.604,31 |
| 1,08 | Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactación en capas de 30 cm. | M3 | 1.004,60 |
| 1,09 | Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm) | UND | 4,00 |
| 1,10 | Junta de dilatación con ángulo UPN 160 | M | 9,80 |
| 1,12 | Drenaje en Tubería PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m) | UND | 4,00 |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 89,96 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIA** | | |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta eléctrica) | día | 20,00 |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación | $M^3$ | 420,00 |
| 1,23 | Obra falsa de la súper estructura (Formaleta temporal) | $M^2$ | 58,80 |

Alcanzando un porcentaje en ejecución de actividades constructivas contractuales durante el periodo reportado en el presente informe de periodo desde el 06 de noviembre de 2024 con corte al 10 de diciembre de 2024 de 19,77% lo que implica un acumulado de

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**

ejecución de obra desde la firma del acta de inicio a la fecha de corte 10 de diciembre de 2024 de un 84,70% en ejecución de obra en un tiempo transcurrido de 92 días lo que representa un 74,80% del tiempo contractualmente estipulado para la ejecución de la obra, dadas las condiciones de clima en la zona debido al incremento de las precipitaciones en la región la normal ejecución de las actividades constructivas se ha visto afectada debido a los ceses de trabajos que se han generado debido al aumento en frecuencia, intensidad y duración de las lluvias en el sector.

**ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO SEGÚN ACTA PARCIAL No.03 – 10 DICIEMBRE DE 2024**

## 4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo WILLIAN VERA ARIAS con cedula de ciudadanía No. 88.158.521 de Cúcuta en mi condición de ordenador del gasto (a) del contrato de Obra No RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2024, **CERTIFICO** que:

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO en calidad de Representante Legal de la IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del (objeto contractual) durante el período comprendido del **06 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024** y pagar es la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 296.346.405,00)** correspondiente al pago Acta Parcial No. 03 del contrato en referencia.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago)

Supervisor
**WILLIAM VERA ARIAS**
SECRETARIO SGRD

Contratista
**IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS**
R.L. IMAR ORLANDO VACCA MACHADO

| Trazabilidad | Nombre | Cargo | Firma / fecha |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | **Edgar Fabian Labrador Valcárcel** | **Ing. Civil Contratista** | **10-12-2024** |
| Revisión jurídica: | **Marlym Jhoana Montoya** | **Asesora Jurídica Externa** | **10-12-2024** |
| Aprobación Jurídica: | **Marlym Jhoana Montoya** | **Asesora Jurídica Externa** | **10-12-2024** |
| Revisión área técnica: | **William Vera Arias** | **Secretario SGRD** | **10-12-2024** |


Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

# INFORME DE SUPERVISION

**CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD- 01885-2024 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2022.**

**CONTRATISTA:** IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS.

**OBJETO:** CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

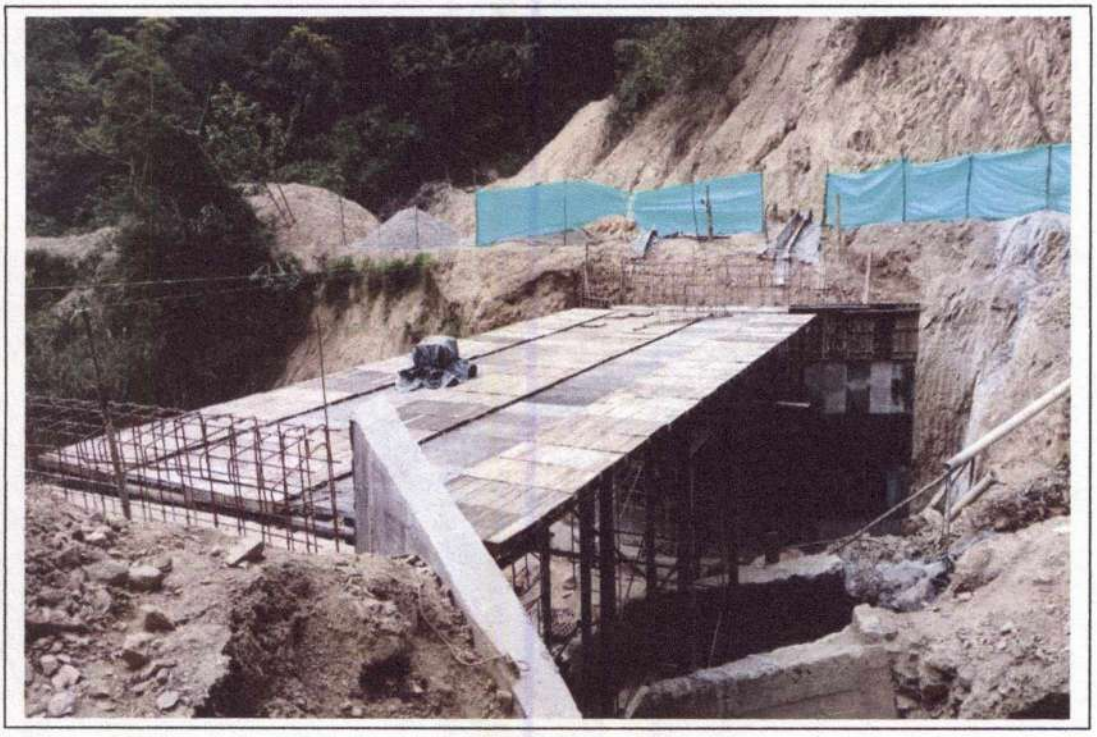

**PERIODO DE INFORME:** 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 A 10 DE DICIEMBRE DE 2024

DICIEMBRE DE 2024

## 1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de entrega del presente informe, se certifica como supervisor del Contrato que de acuerdo con la ejecución del contrato de obra N° RE-SGRD- 01885-2024, el contratista IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S, dio cumplimiento a las obligaciones contractuales a su cargo, mediante la ejecución de las actividades constructivas propias del contrato de obra.

## 2. ESTADO DE EJECUCIÓN

Durante el periodo reportado en el presente informe se logró dar continuidad al proceso constructivo del puente mediante la ejecución de las actividades como lo son manejo de aguas, las actividades del dragado; seguidamente luego de terminada la construcción de los estribos del puente se procedió a realizar las actividades constructivas relacionadas con la obra falsa para poder continuar con el proceso de construcción (armado de refuerzo y vaciado de concreto) de las vigas, los bordillos y las losa del puente, así mismo debido al incremento de las lluvias presentes en la zona fue necesario realizar nuevamente actividades de dragado y retiro de material de arrastre que traen consigo las aguas lluvias al lugar de ejecución del contrato por lo que también se realizaron actividades de retiro de material y el dragado.

Las obras ejecutadas durante el periodo reportado en acta parcial #3 que corresponde desde el 06 de noviembre de 2024 al 10 de diciembre de 2024 están descritas en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT. |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **PUENTE VEHICULAR** | | |
| 1,06 | Concreto para estructura del puente de resistencia 4000 Psi (Incluye vigas, diafragmas, losas, bordillos etc.....) | M3 | 34,83 |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 3.604,31 |
| 1,08 | Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavación, incluye compactación en capas de 30 cm. | M3 | 1.004,60 |
| 1,09 | Apoyo de Neopreno D=60 (0.99 m x 0.69 m x 125 mm) | UND | 4,00 |
| 1,10 | Junta de dilatación con ángulo UPN 160 | M | 9,80 |
| 1,12 | Drenaje en Tubería PVC RDE 21 de 4" L=0.50 m para Puentes (con rejilla 0.15 x 0.45 m) | UND | 4,00 |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 89,96 |

| | OBRAS COMPLEMENTARIA | | |
|---|---|---|---|
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta eléctrica) | día | 20,00 |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación | $M^3$ | 420,00 |
| 1,23 | Obra falsa de la súper estructura (Formaleta temporal) | $M^2$ | 58,80 |

Alcanzando un porcentaje en ejecución de actividades constructivas contractuales durante el periodo reportado en el presente informe de periodo desde el 06 de noviembre de 2024 con corte al 10 de diciembre de 2024 de 19,77% lo que implica un acumulado de ejecución de obra desde la firma del acta de inicio a la fecha de corte 10 de diciembre de 2024 de un 84,70% en ejecución de obra en un tiempo transcurrido de 92 días lo que representa un 74,80% del tiempo contractualmente estipulado para la ejecución de la obra, dadas las condiciones de clima en la zona debido al incremento de las precipitaciones en la región la normal ejecución de las actividades constructivas se ha visto afectada debido a los ceses de trabajos que se han generado debido al aumento en frecuencia, intensidad y duración de las lluvias en el sector.

# 15. BITACORA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

MIERCOLES 06 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:

- ING RESIDENTE (1)
- MAESTRO C/ALL (1)
- SST (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- SOLDADOR

H Y E:

- MOTOBOMBA
- TRONZADORA
- PULIDORA
- EQUIPO SOLDADURA.
- TALADRO ARBOL
- TALADRO MANUAL.
- H Y E MENOR

MATERIALES:

ACPM

- ARENA (8 M³) N=152052
- PLATINA 25 x 25 x 1/2"
- TORNILLO SIN FIN 1"
- ALAMBRE

CLIMA:

- SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS EN TARDE (2:00 PM - 3:00 PM)

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA
- SOLDADURA ELECTRICA
- REUNION LINEA VIDA Y ANTI
- PMT.
- CHARLA SEGURIDAD.

- JARILLON

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

Scanned with CamScanner

# JUEVES 07 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO G/RAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (10)
- ALMACENISTA (1)
- SOLDADOR (1)

## HYE:

- MOTOBOMBA.
- TRONZADORA.
- MEZCLADORA.
- EQUIPO SOLDADURA.
- TALADRO MANUAL
- TALADRO ANGULAR
- HYE MENOR

## MATERIALES:

- ARENA (10 M3) N= 152007
- TRITURADO (8 M3) N= 152008.
- PLATINA 25x25 x 1/2"
- TORNILLO SIN FIN 1"
- ALAMBRE

## CLIMA:

- SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN HORAS TARDE (1:00 PM - 4:00 PM)

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS LLUVIAS
- OBRA FALSA
- SOLDADURA ELECTRICA
- PMT.

## LOGISTICA

- CAMION.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINARON ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

Scanned with CamScanner

VIERNES 08 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL - OBRA

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/MAL (1)
- OFICIALES (8)
- AYUDANTES (3)
- SOLDADOR (1)
- ALMACENISTA (1)

HYE:

- MOTOBOMBA
- TRONZADORA
- EQUIPO SOLDADURA
- PULIDORA
- TALADRO ARBOL
- HYE MENOR
- TALADRO MANUAL

MATERIALES:

- ARENA (8 M³) N° 152011
- PLATINAS 25 x 25 x 1/2"
- TORNILLO SIN FIN 1"
- SOLDADURA 6013
- SOLDADURA 7018.

CLIMA:

- SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN HORAS TARDE (1:00 PM - 3:00 PM)

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA
- SOLDADURA ELECTRICA
- CORTE METAL TUB. 6" - 4"
- CHARLA SST.
- PMT

- JARILLON

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

Scanned with CamScanner

# SABADO 09 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 HR. SE INICIAN ACTIVIDADES.

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO S/MM (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- SOLDADOR (1)
- ALMACENISTA.

## H Y E:

- MOTOBOMBA.
- EQUIPO SOLDADURA
- TRONZADORA.
- PULIDORA
- TALADRO
- H Y E MENOR.

## MATERIALES:

- TUB. ACE. 6" - 4"
- SOLDADURA 6013 - 7018.
- DISCOS CORTE - PULIR.
- ANGULOS ACE. 2"x2"x1/4"

## CLIMA:

- SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES EN HORAS TARDE (2:00 PM - 5:00 PM)
- LLUVIAS FUERTES EN HORAS NOCHE (8:00 PM - 11:00 PM)

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA.
- SOLDADURA ELECTRICA.
- PMT.
- JAMILLON.

- SE PRESENTA DESBORDAMIENTO DE LA QUEBRADA QUEBRADITO. BAJO; CANCELANDO DESPLAZAMIENTO Y ACOPIO, ARRASTRE Y PAÑO EN JAMILLON, PONTALETA Y EQUIPO; Y PARALIZACION. DESLIZAMIENTOS DE LOS TALUDES ALTERNOS, PERPENDICULARES A LA VIA AFECTADA.

RESIDENTE OBRA

Scanned with CamScanner

# LUNES 11 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO CIVIL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- SOLDADOR (1)
- ANDACENSTA (1)

## HYE:

## MATERIALES:

## CLIMA:

- DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA (SAB-DOM) SE PRESENTAN DESLIZAMIENTOS QUE IMPIDEN PASO VEHICULAR Y PEATONAL (DERRUMBES EN EL KM 5.0 KM. 6.5 Y KM. 8.0)

## ACTIVIDADES:

- EN EL DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE LA OBRA VIA COCUYILLA - PAMPLONA SE ENCUENTRA DERRUMBE QUE OBSTRUYE POR COMPLETO EL PASO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL KM. 5.0. VEREDA CUESTA BLANCA. SE PROCEDE A INFORMAR A LAS AUTORIDADES LOCALES SOBRE LA SITUACION DE LAS VIAS.

SIN OTRO PARTICULAR SE REALIZA REGISTRO. TOMAS FOTOGRAFICAS AL SITIO DEL DERRUMBE. NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA.

RESIDENTE OBRA.

Scanned with CamScanner

# MARTES 12 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO 4/NAL (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- SOLDADOR (1)
- ALMACENISTA (1)

## H Y E:

## MATERIALES:

## CLIMA:

- SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN HORAS MAÑANA (11:0 AM - 1:0PM
- DERRUMBES EN LA VIA CUCUTILLA - PAMPLONA A LA ALTURA DEL KM. (12 KM) VEREDA GUAYABITO ALTO.
KM. (20 KM) VEREDA SAN MIGUEL.
KM (31 KM).

## ACTIVIDADES:

- SE REALIZA RECORRIDO DE LA VIA CUCUTILLA - PAMPLONA PARA REVISAR POSIBILIDAD DE PASO VEHICULAR Y/O PEATONAL, EN RECORRIDO SE ENCONTRO MUCHA DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD, PRESENCIA DE VARIOS DERRUMBAMIENTOS, NO SE REALIZARON ACTIVIDADES SE CANCELARON LOS TRANSPORTES DE MATERIALES HASTA NUEVA ORDEN.

SIN OTRO PARTICULAR SE REALIZA RECORRIDO Y OBSERVACION DE LAS VIAS.

RESIDENTE OBRA.

Scanned with CamScanner

# MIERCOLES 13 NOVIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES.

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE(1)
- SST(1)
- MAESTRO C/MA (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- SOLDADOR (1)
- ALMACENISTA (1)

## H Y E:

- MOTOBOMBA.
- EQUIPO SOLDADURA
- TALADRADORA.
- PULIDORA
- TALADRO ARBOL.
- RETROEXCAVADORA.
- H Y E MENOR

## MATERIALES:

- ACPM.
- PLANCHAS 20x20x1/2"
- SOLDADURA 6013-7018.
- TUB. PEAD. 6"
- TUB. PEAD. 4"
- ANGULO. 2"x2"x1/4

## CLIMA:

- SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN HORAS TARDE (1:00 PM - 4:00 PM).

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- LIMPIEZA Y ADECUACION DE VIA.
- OBRA PASA
- PMT.
- CHARLA SST.

-JARILLON

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

Scanned with CamScanner

# JUEVES 14 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/ALB (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- SOLDADOR (1)
- ALMACENISTA (1)

## H Y E:

- MOTOBOMBA
- PETROLEX CANADORA
- PULIDORA
- TROMPADORA
- TALADRO
- H Y E MENOR

## MATERIALES:

- ACPM
- SOLDADURA 6013-7018
- TUB. PEAD 6" - 4"
- ALAMBRE

## CLIMA:

- SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS AL MEDIO DIA (11:00 AM - 1:0 PM)

## ACTIVIDADES

- MANEJO AGUAS
- LIMPIEZA Y ADECUACION DE VIAS Y TALUDES
- DESEMPOMADO FORMALETA DE ESTRIBOS Y ALETAS
- OBRA FALSA.
- RELLENO SELECCIONADO.
- PMT.
- JARILLON.

SIENDO LAS 5:00 PM SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA SIN OTRO PARTICULAR.

RESIDENTE OBRA

Scanned with CamScanner

VIERNES 15 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- OFICIALES (8)
- AYUDANTES (3)
- SOLDADOR (1)
- OPERADOR (1)
- ALBAÑIL (1)

H Y E:

- MOTOSOLDA
- RETRO EXCAVADORA
- TRONADORA
- PULIDORA
- TALADRO
- EQUIPO SOLDADURA
- VIBRO COMPACTADOR

MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES
- PLATINAS 25 x 25 x 1/2"
- SOLDADURA ELECTRICA
- TUB. PEAF. 6" - 4"

CLIMA:

- SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (2:00 PM - 4:00 PM).

ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA
- RELLENO SELECCIONADO
- CHARLA SST
- PTT

- JARILLON

SIN OTRO PARTICULAR SE CONTINUARON ACTIVIDADES DEL DIA.

ING. RESIDENTE

Scanned with CamScanner

# SABADO 16 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- OFICIALES (3)
- MAESTRO C/M (1)
- AYUDANTES (8)
- SOLDADOR (1)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (2)

## H Y E:

- MOTOBOMBA.
- PETRO DESENGRASADOR.
- TRONZADORA.
- PULIDORA.
- TALADRO.
- EQUIPO SOLDADURA.
- VIBROCOMPACTADOR.
- H Y E MENOR.

## MATERIALES:

- ACPM.
- COSTALES
- PLATINAS 25 x 25 x 1/2"
- ANGULOS 2" x 2" x 1/4"
-

## CLIMA:

- SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS EN HORAS MAÑANA (9:0 AM - 11-0 AM)

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- JARILLON.
- OBRA FALSA.
- RELLENO SELECCIONADO.
- PTT.

- JARILLON.
- SE RECIBEN 300 BULTOS CEMENTO (GRIS SACOS 42.5 KG)

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINARON LAS ACTIVIDADES DE DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

Scanned with CamScanner

# LUNES 18 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/M (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- SOLDADOR (1)
- ALBAÑIL (1)
- CONDUCTOR (1)

## H Y E:

- MOTOBOMBA
- RETROEXCAVADORA
- VOLQUETA SAC-179
- EQUIPO SOLDADURA
- TRONZADORA
- PULIDORA
- TALADRO
- H Y E GENERAL

## MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES
- PLATINAS 25x25x 1/2"

## CUMA:

- HORAS EXTRAS EN HORAS TARDE Y NOCHE (3:00 PM - 6:00 PM) (9:0 PM - 11:59 PM)

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- OBRA FALSA
- RELLENO SELECCIONADO
- CHARLA SST
- PMT
- JARILLON

SIN OTRO MATERIAL SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

Scanned with CamScanner

# MARTES 19 NOVIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/RAC (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1).
- CONDUCTOR (1)
- OPERADOR (1)

## MATERIALES:

- ACPM.
- COSTALES
- TUB. PERF. 6" - 4"

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- SANEAMIENTO
- OBRA FALSA.
- RELLENO SELECCIONADO
- PMT.

## HYE:

(1) - MOTOBOMBA.
- MOTOBOMBA
(1) - VOLQUETA SAC-179.
- VIBROCOMPACTADORA
- PULIDORA
(1) TRONTADORA
- TALADRO
- HYE MENOR.

## CLIMA:

- LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (3:00 PM 5:00 PM)
- LLUVIAS FUERTES EN HORAS NOCHE (8:00 PM - 11:00 AM)

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA.

Scanned with CamScanner

# MIERCOLES 20 NOVIEMBRE 2024.

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/AUX (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- ALMACENISTA (1)
- OPERADOR (1)

## H Y E:

- MOTOBOMBA
- PETRO EXCAVADORA
- VOLQUETA
- VIBRO COMPACTADOR
- PLANTA
- TRAMO
- H Y E MENOR

## MATERIALES:

- ACPM
- COSTALES
- TUB. PEN. 6" - 4"
- SOLDADURA
- ANGULOS 2" x 2" x 1/4"
- DISCO PULIR - CORTE.

## CLIMA:

- SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN HORAS TARDE (2:00 PM - 4:00 PM)

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- VOLQUETA
- OBRA FALSA
- RELLENO SELECCIONADO
- SOLDADURA ELECTRICA.

- SE RECIBEN 150 BULTOS CEMENTO GRIS (MACOS 42.5 KG). REMISION #S96514.
- CHARLA SST
- PMT.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

Scanned with CamScanner

# JUEVES 21 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIARON ACTIVIDADES.

## PERSONAL OBRA:

- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO E/MM (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- SOLDADOR (1)
- OPERADOR (1)
- CONDUCTOR (1)
- ALMACENISTA (1)

## MATERIALES

- ACPM
- COSTALES
- MADERA
- PLATINAS
- FORMALETA.
- SOLDADURA ELECTRICA.

## ACTIVIDADES:

- MANEJO AGUAS
- JARILLON
- RELLENO SELECCIONADO
- SOLDADURA ELECTRICA.

## HYE:

- MOTOSOLDA.
- RETROEXCAVADORA
- VOLQUETA
- VIBROCOMPACTADOR
- PULIDORA
- TROMPADORA
- TALADRO MANUAL.
- EQUIPO SOLDADURA
- HYE MENOR.

## CUMA:

- SE PRESENTAN CHARLAS PROGRAMADAS EN HORAS TARDE (2:00 PM. - 4:00 PM)

-PMT.

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE OBRA

Scanned with CamScanner

VIERNES 22 NOVIEMBRE 2024

SIENDO LAS 7:00 AM SE INICIAN ACTIVIDADES

PERSONAL OBRA:
- ING. RESIDENTE (1)
- SST (1)
- MAESTRO C/OBRA (1)
- OFICIALES (3)
- AYUDANTES (8)
- OPERADOR (1)
- CONDUCTOR (1)
- ALMACENISTA (1)

H Y E:
- MOTOBOMBA
- MOTOEXCAVADORA
- VOLQUETA SAC-179
- VIBROCOMPACTADOR
- EQUIPO SOLDADURA
- TRONZADORA
- PULIDORA
- H Y E MENOR

MATERIALES:
- COSTALES
- ACPM
- PLATINAS 2"X2"X 1/2"
- TUB. PEAD. 6" - 4"
- SOLDADURA 6013-7018.

CLIMA:
- SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS EN HORAS TARDE (1:00 PM - 3:PM)

ACTIVIDADES:
- MANEJO AGUAS
- JARILLON
- OBRA FALSA
- PMT.
- CHARLA SEGURIDAD

SIN OTRO PARTICULAR SE CULMINAN ACTIVIDADES DEL DIA A LAS 5:00 PM

RESIDENTE OBRA.

Scanned with CamScanner

# 16. ENSAYOS DE LABORATORIO

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| | | |
|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S. / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024 | **INFORME DE RESULTADOS** | CÓDIGO: LA-H-038 |
| | **RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** | VERSIÓN: 07 / FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA INV E-410-13 | PÁGINA 1 DE 1 |


**Informe No.: OS3713-24-CC-01**

**PROYECTO*:** Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabito
**SOLICITANTE*:** Constructora Inconort S.A.S.
**CONTACTO*:** Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
**MATERIAL*:** Concreto Mezclado en Obra
**PROCEDENCIA*:** Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ)

**FECHA TOMA*:** 2024-11-20
**FECHA DE RECIBIDO:** 2024-12-06
**FECHA DE ENSAYO:** 2024-12-07
**FECHA DE INFORME:** 2024-12-09
**No. ORDEN:** OS-3713

| CILINDRO # | ELEMENTO* | D - DIÁMETRO (mm) | | | h - ALTURA (mm) | | | | ÁREA | PESO | DENSIDAD | SLUMP* | EDAD | CARGA MÁXIMA | | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | | | TIPO DE FALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D1 | D2 | Promedio | h1 | h2 | h3 | Promedio | (mm²) | (g) | (kg/m³) | cm | (Dias) | kN | kg | MPa | kg/cm² | PSI | |
| 1 | CONCRETO CICLÓPEO APOYO DE ZAPATA ESTRIBO MARGEN DERECHA - 21 MPA | 151,53 | 152,64 | 152,09 | 308,42 | 311,29 | 312,84 | 310,85 | 18166,1 | 12947 | 2290 | - | 17 | 474,4 | 48375 | 26,1 | 266,3 | 3787 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

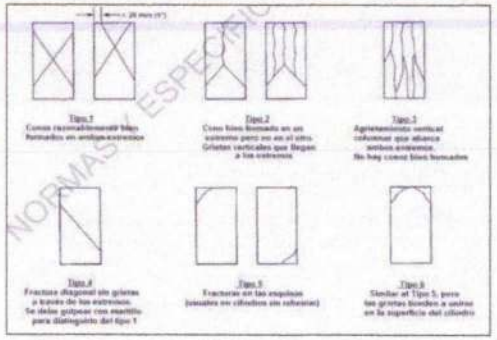


NORMAS Y ESPECIALIDADES

**TIPOS DE FALLA:**

**Tipo 1** Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
**Tipo 2** Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
**Tipo 3** Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
**Tipo 4** Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
**Tipo 5** Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
**Tipo 6** Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilidro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:**
Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:**
Cristian Agudelo R.
**Gerente**

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

| | | |
|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S. / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024 | **INFORME DE RESULTADOS** | CÓDIGO: LA-H-038 |
| | **RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** | VERSIÓN: 07 / FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA INV E-410-13 | PÁGINA 1 DE 1 |


**Informe No.: OS3713-24-CC-02**

**PROYECTO*:** Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabito
**SOLICITANTE*:** Constructora Inconort S.A.S.
**CONTACTO*:** Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
**MATERIAL*:** Concreto Mezclado en Obra
**PROCEDENCIA*:** Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ)

**FECHA TOMA*:** 2024-11-20
**FECHA DE RECIBIDO:** 2024-12-06
**FECHA DE ENSAYO:** 2024-12-07
**FECHA DE INFORME:** 2024-12-09
**No. ORDEN:** OS-3713

| CILINDRO # | ELEMENTO* | D - DIÁMETRO (mm) | | | h - ALTURA (mm) | | | | ÁREA | PESO | DENSIDAD | SLUMP* | EDAD | CARGA MÁXIMA | | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | | | TIPO DE FALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D1 | D2 | Promedio | h1 | h2 | h3 | Promedio | ($mm^2$) | (g) | ($kg/m^3$) | cm | (Días) | kN | kg | MPa | $kg/cm^2$ | PSI | |
| 1 | CONCRETO DE ZAPATA ESTRIBO MARGEN DERECHA - 28 MPA | 151,64 | 152,52 | 152,08 | 310,36 | 311,69 | 311,62 | 311,22 | 18164,9 | 13049 | 2310 | - | 17 | 521,8 | 53208 | 28,7 | 292,9 | 4166 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

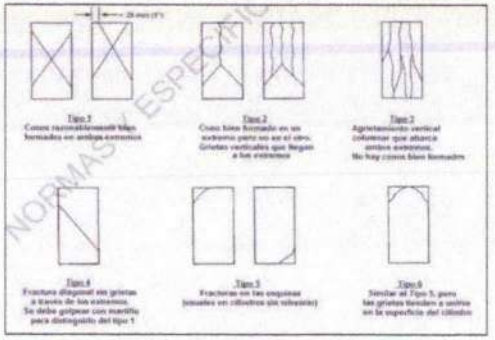


**TIPOS DE FALLA:**

**Tipo 1** Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
**Tipo 2** Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
**Tipo 3** Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
**Tipo 4** Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
**Tipo 5** Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
**Tipo 6** Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilidro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:**
Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:**
Cristian Agudelo R.
**Gerente**

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

| | | |
|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S. / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024 | **INFORME DE RESULTADOS** | CÓDIGO: LA-H-038 |
| | **RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO** | VERSIÓN: 07 / FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA INV E-410-13 | PÁGINA 1 DE 1 |


**Informe No.: OS3713-24-CC-03**

**PROYECTO*:** Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabito
**SOLICITANTE*:** Constructora Inconort S.A.S.
**CONTACTO*:** Imar Orlando Vacca Machado S.A.S.
**MATERIAL*:** Concreto Mezclado en Obra
**PROCEDENCIA*:** Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ)

**FECHA TOMA*:** 2024-11-20
**FECHA DE RECIBIDO:** 2024-12-06
**FECHA DE ENSAYO:** 2024-12-07
**FECHA DE INFORME:** 2024-12-09
**No. ORDEN:** OS-3713

| CILINDRO # | ELEMENTO* | D - DIÁMETRO (mm) | | | h - ALTURA (mm) | | | | ÁREA | PESO | DENSIDAD | SLUMP* | EDAD | CARGA MÁXIMA | | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | | | TIPO DE FALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D1 | D2 | Promedio | h1 | h2 | h3 | Promedio | ($mm^2$) | (g) | ($kg/m^3$) | cm | (Días) | kN | kg | MPa | $kg/cm^2$ | PSI | |
| 1 | CONCRETO CICLÓPEO APOYO DE ZAPATA ESTRIBO MARGEN IZQUIERDA - 21 MPA | 152,41 | 152,02 | 152,22 | 313,86 | 313,56 | 313,57 | 313,66 | 18197,2 | 13057 | 2290 | - | 17 | 475,3 | 48466 | 26,1 | 266,3 | 3788 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

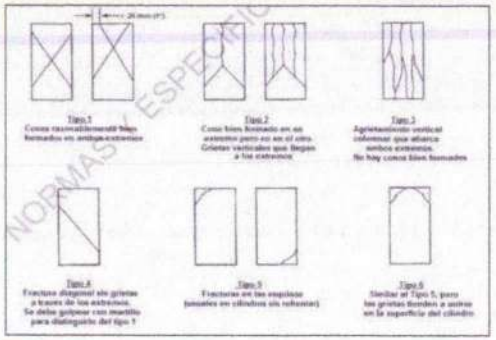


NORMAS Y ESPECIFICACIONES

**TIPOS DE FALLA:**

**Tipo 1** Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
**Tipo 2** Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
**Tipo 3** Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
**Tipo 4** Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
**Tipo 5** Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
**Tipo 6** Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilidro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:**
Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:**
Cristian Agudelo R.
**Gerente**

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe


| | | | |
|---|---|---|---|
| GEOTECNICAS DEL NORTE / ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 21-LAB-024 | INFORME DE RESULTADOS | CÓDIGO: LA-H-038 | |
| | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO | VERSIÓN: 07 | FECHA: 2024/06/25 |
| | NORMA INV E-410-13 | PÁGINA 1 DE 1 | |

**Informe No.: OS3713-24-CC-04**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO*:** | Construcción de Puente Vehicular en el Sector Guayabito | **FECHA TOMA*:** | 2024-11-20 |
| **SOLICITANTE*:** | Constructora Inconort S.A.S. | **FECHA DE RECIBIDO:** | 2024-12-06 |
| **CONTACTO*:** | Imar Orlando Vacca Machado S.A.S. | **FECHA DE ENSAYO:** | 2024-12-07 |
| **MATERIAL*:** | Concreto Mezclado en Obra | **FECHA DE INFORME:** | 2024-12-09 |
| **PROCEDENCIA*:** | Trituradora Concretos Y Triturados El Zulia S.A.S. - (CTZ) | **No. ORDEN:** | OS-3713 |

| CILINDRO # | ELEMENTO* | D - DIÁMETRO (mm) | | | h - ALTURA (mm) | | | | ÁREA | PESO | DENSIDAD | SLUMP* | EDAD | CARGA MÁXIMA | | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | | | TIPO DE FALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D1 | D2 | Promedio | h1 | h2 | h3 | Promedio | (mm²) | (g) | (kg/m³) | cm | (Días) | kN | kg | MPa | kg/cm² | PSI | |
| 1 | CONCRETO DE ZAPATA ESTRIBO MARGEN IZQUIERDA - 28 MPA | 152,24 | 152,12 | 152,18 | 313,59 | 313,45 | 313,60 | 313,55 | 18188,8 | 12711 | 2230 | - | 17 | 510,2 | 52025 | 28,1 | 286,0 | 4068 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**OBSERVACIONES:** No se presentan observaciones.

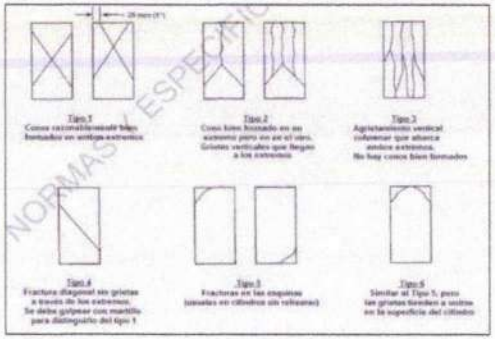


NORMAS ESPECIFICAS

**TIPOS DE FALLA:**

**Tipo 1** Conos razonablemente bien formados en ambos extremos.
**Tipo 2** Cono bien formado en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos
**Tipo 3** Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos, no hay conos bien formados.
**Tipo 4** Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1
**Tipo 5** Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrentar)
**Tipo 6** Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilidro.

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan a la muestra sometida al ensayo como fue recibida en el laboratorio y la información suministrada es responsabilidad del cliente (*).
GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente, incluida en este informe y que pueda afectar la validez de los resultados. Los ensayos fueron realizados en las instalaciones permanentes del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S. y este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio de GEOTÉCNICAS DEL NORTE S.A.S.

**Revisó:**
Gabriela Araque Lizarazo
**Director Técnico**

**Autorizó:**
Cristian Agudelo R.
**Gerente**

OFICINA - LABORATORIO: AV. GRANCOLOMBIA No. 4E 28 B. POPULAR, CÚCUTA - 5746312 - 350-6147123
E-MAIL: Administrativo@geotecnicasdelnorte.com
www.geotecnicasdelnorte.com

Fin del informe

CONSTRUCTORES S.A.S

# 17. COMITES DE OBRA

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

CONSTRUCTORES S.A.S

# COMITÉ DE OBRA No. 01

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 5 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 9 DE Septiembre de 2024 | Hora de inicio: 2:30 PM | Hora de finalización: 3:00 PM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Reunión previa al inicio de obra. Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.01 – comité previo al inicio de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.01

1. Indicaciones de requisitos previos al inicio de obra

## DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 02:30 pm en la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 1 del contrato No. RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024, detallando lo siguiente:

Dando inicio al primer comité de obra en representación de la Secretaria de Gestión del riesgo de desastres: Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), toma la palabra, dando como primera medida la bienvenida al contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, quien es representado en el presente comité por el Ing. Imar Orlando Vacca (director de obra).

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 2 de 5 | |

**ACTA DE REUNION**

El ingeniero William Vera Arias, indica al contratista que el fin del presente comité, es darle a conocer los requisitos previos al inicio de la obra y las actividades primarias que no solo corresponde a las actividades contractuales de obra, que también corresponden a actividades de orden administrativo que son requisitos para asegurar un correcto arranque del contrato de obra.

Se solicita al contratista que se debe realizar la socialización del proyecto, en esta reunión se debe dar a conocer a la comunidad la información general del contrato, ubicación , objeto contractual es importante que en la reunión se citen las personas pertenecientes a comunidades aledañas a la obra del municipio, se solicita sea realizada y coordinada con la Alcaldía municipal y se debe indicar a la secretaria para la gestión del riesgo de desastres fecha, lugar y hora de dicha reunión, así mismo se deben tomar registro fotográfico, levanta acta y recopilar listado y firmas de los asistentes.

Instalación de la valla, previo al inicio de las actividades constructivas se debe ubicar la valla informativa en la zona de ejecución de la obra, con la información básica de la obra, numero de contrato, objeto, nombre del contratista y nombre de la supervisión del contrato, con el logo de la gobernación y una foto del render del puente.

Es importante tener en cuenta que para dar inicio de obra el personal que allí ejecutará las actividades constructivas debe estar debidamente afiliado al sistema de seguridad social incluyendo, ARL, EPS, fondo de pensiones, caja de compensación y debe contar con su respectiva dotación y EPP´S necesarios.

Se aclara también al contratista que toda situación que se presente durante el desarrollo de la obra debe ser informada a la supervisión del contrato.

**ACTA DE REUNION**

El cobro del contrato se realizara mediante actas parciales para lo que deberán entregar los respectivos soportes y carteras topográficas que evidencien las actividades ejecutadas que serán cobradas en cada una de las actas de recibo parcial, igualmente deberán presentar un informe de contratista correspondiente al periodo cobrado en donde describan las actividades relacionadas en el acta, el reporte financiero del contrato, la información general del contrato, el control de garantías y el respectivo registro fotográfico.

Durante el desarrollo de la obra el contratista deberá llevar un libro de bitácora en donde registre día a día las actividades ejecutadas y los sucesos que en ella se presenten durante la jornada laboral.

Previo al inicio de las actividades constructivas propias del puente vehicular se deberá realizar los movimientos de tierra y adecuación del terreno con el ánimo de garantizar el paso provisional de los vehículos por la zona dado que no se puede dejar incomunicado el municipio con los municipios aledaños y con el resto del departamento.

El ingeniero William Vera Arias, pregunta al contratista de obra si tiene alguna duda o requerimiento antes del inicio del contrato, a lo que este responde que todo se encuentra claro y que ya cuenta con la planificación para realizar las actividades previas y el cumplimiento de los requisitos descritos en el presente comité

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

**CONTRATISTA**

1. El contratista deberá realizar socialización del contrato, deberá indicar a la supervisión fecha, hora y lugar.
2. Realizar la instalación de la valla informativa del contrato.
3. Previo a iniciar actividades constructivas realizar afiliación de los trabajadores.
4. Una vez realizada la socialización entregar copia del acta levantada en dicho evento.

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 4 de 5 | |

## ACTA DE REUNION

**SUPERVISION DEL CONTRATO**

1. Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la obra, suscribir acta de inicio



**CONCLUSIONES**

1. Se puede proceder a realizar el inicio de las actividades constructivas de la obra

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión: ---* |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS |  |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA | |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S |  |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 5 de 5 | |

**ACTA DE REUNION**

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CONSTRUCTORES S.A.S

# COMITÉ DE OBRA No. 02

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 20 de septiembre de 2024 | Hora de inicio: 3:00 PM | Hora de finalización: 3:50 PM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.02 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.02

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra

## DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 3:00 pm en la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 2 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024, detallando lo siguiente:

En representación de la Secretaria de Gestión del riesgo de desastres: Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra) y en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS.: Ing. Imar Orlando Vacca (director de obra)

Toma la palabra el supervisor designado, Ing. William Vera Arias, quien realiza el saludo y procede a dar la palabra al Ing. Imar Orlando Pérez para que informe respecto al avance en la ejecución de la obra.

El ing. Imar Orlando Vacca, toma la palabra, da el respectivo saludo y realiza una descripción del avance de obra a la fecha, informando sobre la ejecución del conjunto de actividades

**ACTA DE REUNION**

constructivas derivabas del objeto del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha se han desarrollado las siguientes actividades constructivas:

Durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio de actividades (10 de septiembre de 2024) y la fecha del presente comité (20 de septiembre de 2024) se dio inicio a la actividad de Replanteo y localización para puentes. Hecho que permitió identificar claramente el sitio a intervenir y la ubicación de cada una de las estructuras componentes del puente vehicular a construir, adicionalmente se realizaron los levantamientos topográficos(altimetría) de la zona con el estado inicial para poder llevar el control de lo excavado

Así mismo el contratista de obra informa que se dio inicio a la actividad de Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m, la cual actualmente se encuentra en ejecución realizando los cortes en los taludes descritos como lado Cucutilla y lado Pamplona, estos cortes necesarios para realizar la ampliación de la zona establecida como paso provisional de los vehículos.

Paralelo a las actividades de excavación se dio inicio a la actividad de manejo de aguas, y construcción del jarillon que permita ejecutar las demás actividades constructivas, estas dos actividades se encuentran actualmente en ejecución

Otra de las actividades que actualmente se encuentra en ejecución es la de dragado del cauce natural.

El contratista informa que cuenta con el proceso de compra de materiales e insumos necesarios para la obra ya listos para iniciar su traslado al sitio de la obra (acero, cemento y materiales pétreos), adicionalmente cuenta con un carmix, equipo con el cual se realizara el respectivo proceso de preparación del concreto según los diseños y las resistencias establecidas.

A la fecha no ha presentado ningún inconveniente pueda afectar el normal avance de la obra, por lo que su ejecución se está realizando de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.

El ingeniero William Vera, recuerda al contratista realizar el respectivo control de calidad de los materiales a emplear y verificar y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para ser implementadas en el desarrollo del contrato de obra.

Siendo las 3:50 pm se da por terminado el presente comité.

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 4 | |

**ACTA DE REUNION**

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

El contratista debe continuar con el normal desarrollo y ejecución de la obra.

Implementar el respectivo control de calidad de los materiales a emplear.

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de obra

**CONCLUSIONES**

1. Según la ejecución de actividades de constructivas ejecutadas a la fecha se observa el cumplimiento a lo programado en el cronograma de obra.

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: 20/09/2024 |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS | |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA | |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 4 de 4 | |

**ACTA DE REUNION**

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# COMITÉ DE OBRA No. 03

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 30 de septiembre de 2024 | Hora de inicio: 9:50:00 AM | Hora de finalización: 10:00 AM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.03 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.03

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra
2. Presentación y revisión preacta No. 01 de obra

## DESARROLLO DE LA REUNION

En las oficinas de la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 3 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

El Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), actuando en representación de la Secretaria para la gestión del riesgo de desastres toma la palabra dando el respectivo saludo y la bienvenida al presente comité, seguidamente solicita al contratista de obra información respecto al avance de obra a la fecha.

Hecho seguido toma la palabra el Ing. Imar Orlando Vacca en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, quien informa respecto al avance en la ejecución de la obra derivada del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha se han desarrollado las siguientes actividades constructivas:

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 2 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

A la fecha del presente comité (30 de septiembre de 2024) se ejecutó la actividad de excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m, realizando los cortes requeridos para la cimentación del puente vehicular. Esta actividad se desarrolla de forma paralela a su respectivo cargue y retiro del material excavado.

Así, mismo continúa la ejecución de las actividades de manejo de aguas, y construcción del jarillon que permiten ejecutar las demás actividades constructivas.

Otra de las actividades que actualmente se encuentra en ejecución es la de dragado del cauce natural.

Una vez finalizada la excavación para la cimentación del puente vehicular, se procedió a realizar el vaciado de concreto ciclópeo para base o fundación de puentes y posteriormente se dio inicio al armado del acero de refuerzo para la zarpa y los estribos del puente, el contratista aclara que ya se encuentra en obra todo el acero figurado necesario para la construcción del puente.

A la fecha no ha presentado ningún inconveniente pueda afectar el normal avance de la obra, por lo que su ejecución se está realizando de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.

El contratista presenta en comité la pre acta de obra No. 1 con sus respectivas memorias de cálculo y el informe No. 1 de actividades con su respectivo registro fotográfico esto con el fin de que sea revisada por la supervisión del contrato de obra para poder proceder a iniciar proceso de cobro mediante acta de recibo parcial No. 1 de las cantidades ejecutadas.

El ingeniero William Vera Arias, indica al contratista que se deben entregar adicionalmente todos los soportes de pago de seguridad social y que una vez se entregue toda la documentación que debe ser revisada se procederá a informar al contratista si es aprobada la pre acta o tienen algún tipo de observación que deba ser subsanada.

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité de obra #3

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

El contratista debe realizar la entregar todas las memorias de cálculo y soportes que evidencien la ejecución de las cantidades de obra plasmadas en la pre acta de obra No. 1

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

Entregar a la supervisión del contrato las planillas de pago de la seguridad social del personal que labora en obra

Por parte de la supervisión se genera el compromiso de revisar la pre acta No. 1 y sus memorias de cálculo una vez estas sean entregadas por el contratista en su totalidad

**CONCLUSIONES**

1. Según la ejecución de actividades de constructivas ejecutadas a la fecha se observa el cumplimiento a lo programado en el cronograma de obra.
2. El contratista solicita iniciar proceso de revisión de cantidades de obra ejecutadas para proceder a realizar el cobro de un acta de recibo parcial No, 01

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: 30/09/2024 |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 08/10/2024 |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS | |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA | |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 4 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

# COMITÉ DE OBRA No. 04

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 08 de octubre de 2024 | Hora de inicio: 8:10 AM | Hora de finalización: 9:00 AM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.04 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.04

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra
2. Aprobación acta de recibo No. 01 de obra.

## DESARROLLO DE LA REUNION

En las oficinas de la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 4 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

El Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), actuando en representación de la Secretaria para la gestión del riesgo de desastres toma la palabra dando el respectivo saludo y la bienvenida al presente comité, seguidamente solicita al contratista de obra información respecto al avance de obra a la fecha.

Hecho seguido toma la palabra el Ing. Imar Orlando Vacca en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, quien informa respecto al avance en la ejecución de la obra derivada del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha del presente comité se han desarrollado las siguientes actividades constructivas:

- Replanteo y localización para puentes

**ACTA DE REUNION**

- Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m (en ejecución)
- Concreto ciclópeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm².
- Acero de refuerzo Grado 60 (en ejecución)
- Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado (en ejecución)
- Manejo de aguas (en ejecución)
- Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación, (en ejecución)
- Dragado cauce natural (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional), (en ejecución)

Se presenta ante la supervisión del contrato la documentación requerida para el cobro del acta de recibo parcial con las subsanaciones solicitadas y todas las memorias de cálculo de las cantidades cobradas.

A la fecha se encuentran ejecutadas:

| ITEM | DESCRIPCIÓN O ACTIVIDAD | UND | CANT. |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **PUENTE VEHICULAR** | | |
| 1,01 | Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría) | M2 | 285,36 |
| 1,02 | Excavación mecánica en material tipo grava aricllosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | M3 | 1.372,48 |
| 1,03 | Concreto ciclopeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm² | M3 | 38,35 |
| 1,07 | Acero de refuerzo Grado 60 | KG | 8.188,82 |
| 1,17 | Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado | M3 | 2.829,94 |
| | **OBRAS COMPLEMENTARIA** | | |
| 1,20 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | dia | 29,00 |
| 1,21 | Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavacion | M³ | 420,00 |
| 1,22 | Dragado cauce natural (Ampliación de la seccion hidraulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la via provisional ) | M³ | 800,00 |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 4 | |

**ACTA DE REUNION**

A la fecha no ha presentado ningún inconveniente pueda afectar el normal avance de la obra, por lo que su ejecución se está realizando de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.

El contratista presenta en comité la pre acta de obra No. 1 con sus respectivas memorias de cálculo y el informe No. 1 de actividades con su respectivo registro fotográfico esto con el fin de que sea revisada por la supervisión del contrato de obra para poder proceder a iniciar proceso de cobro mediante acta de recibo parcial No. 1 de las cantidades ejecutadas.

El ingeniero William Vera Arias, indica al contratista que una vez revisada la documentación presentada, las cantidades de obra y sus respectivas memorias de cálculo se aprueba el acta de recibo parcial No. 1 para ser presentada e iniciar el proceso de cobro de la misma

Siendo las 10:00 am se da por terminado el comité de obra #4

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

Radicar el acta parcial No. 1

**CONCLUSIONES**

1. Se aprueba el acta parcial de obra No. 1 para iniciar proceso de cobro de las cantidades allí reportadas, las cuales ya fueron verificadas por la supervisión del contrato

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: 08/10/2024 |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 24/10/2024 |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS | |
|---|---|---|
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 4 de 4 | |

**ACTA DE REUNION**

| | | |
|---|---|---|
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA | |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |

# COMITÉ DE OBRA No. 05

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 24 DE OCTUBRE DE 2024 | Hora de inicio: 9:00 AM | Hora de finalización: 10:10 AM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.05 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.05

1. Solicitud de realizar modificación de cantidades de obra
2. Presentación balance de obra
3. Avance y seguimiento de ejecución de obra

## DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 90:00 am en la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 5 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024, detallando lo siguiente:

En representación de la Secretaria de Gestión del riesgo de desastres: Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra) y en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS.: Ing. Imar Orlando Vacca (director de obra)

Toma la palabra el supervisor designado, Ing. William Vera Arias, quien realiza el saludo y procede a dar la palabra al Ing. Imar Orlando Pérez para que informe respecto al avance en la ejecución de la obra y para que exponga los hechos que dan origen a la necesidad de realizar un acta de mayores y menores cantidades de obra con respecto a las cantidades inicialmente contractuales.

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 2 de 4 | |

**ACTA DE REUNION**

El ing. Imar Orlando Vacca, toma la palabra he informa que una vez revisados los diseños entregados para la construcción del puente vehicular y luego de realizadas las actividades de localización y replanteo, se dio inicio a la ejecución de la excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m y Dragado cauce natural (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional), durante el desarrollo de estas se evidencio la necesidad de realizar un ajuste de mayores y menores cantidades con respecto a las inicialmente contratadas dado que para dar cumplimiento a lo descrito en los diseños teniendo en cuenta las condiciones encontradas en campo con respecto a la necesidad de ampliación del paso provisional, para facilitar la movilidad de los vehículos que por allí transitan sin que la ejecución de las actividades constructivas impidan el paso o que se ponga en riesgo la integridad de los conductores, los vehículos y la vida de los trabajadores de la obra.

Así mismo con respecto a la actividad de dragado dadas las condiciones encontradas en campo se evidencio mediante el levantamiento topográfico una menor cantidad que la inicialmente contratada. Por ende, debido a la variación de las cantidades de excavación y de dragado se ven afectadas las cantidades de obra del cargue y retiro de material sobrante dando como resultado una menos cantidad a la inicialmente contratada.

Igualmente, durante la ejecución de las actividades constructivas del puente se requiere aumentar los días contractuales para la actividad de manejo de aguas, esto teniendo en cuenta que para la correcta ejecución de las actividades constructivas, así como para el tránsito de trabajadores, maquinaria y equipos y el aseguramiento de la integridad física de quienes intervienen en todo el proceso constructivo se requiere tener un control y manejo de estas aguas asegurando de esta manera que no afectaran el desarrollo y ejecución de las obras .

El contratista presenta a la supervisión del contrato los soportes y las carteras topográficas correspondientes a los levantamientos realizados en obra que contienen la información de los volúmenes de excavación que soportan la solicitud de modificación mediante ajuste de mayores y menores cantidades de obra

En cuanto al seguimiento de la obra, el ing Imar Orlando, realiza una descripción del avance de obra a la fecha, informando sobre la ejecución del conjunto de actividades constructivas derivabas del objeto del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha se han desarrollado las siguientes actividades constructivas:

- Replanteo y localización para puentes

**ACTA DE REUNION**

- Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m (en ejecución)
- Concreto ciclópeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm².
- Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi (en ejecución)
- Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi (en ejecución)
- Acero de refuerzo Grado 60 (en ejecución)
- Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado (en ejecución)
- Manejo de aguas (en ejecución)
- Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación, (en ejecución)
- Dragado cauce natural (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional), (en ejecución)

Por lo anteriormente descrito, el contratista presenta a la supervisión del contrato el balance en el que las modificaciones de las cantidades de obra no afectan el valor del mismo y solicita a la entidad contratante que dadas las necesidades presentadas en campo y requeridas para la correcta ejecución de la obra considere la suscripción del acta de modificación de cantidades mediante el ajuste de mayores y menores cantidades de obra, toda vez que esta no afecta el valor del mismo.

Una vez analizadas las causales expuestas por el contratista y revisados los soportes presentados en donde se evidencia la necesidad de variación de los volúmenes de excavación y las demás situaciones expuestas, así como revisado y verificado el balance de obra presentado, el ingeniero William Vera Arias, indica al contratista que se aprueba la modificación de cantidades No. 1 para el contrato de obra No. RE-SGRD- 01885-2024

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

Suscribir acta de modificación de cantidades No. 1 al contrato de obra RE-SGRD- 01885-2024

**CONCLUSIONES**

1. Se aprueba la suscripción de la modificación de cantidades de obra No. 1

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 4 de 4 | |

**ACTA DE REUNION**

2. según la ejecución de actividades de constructivas ejecutadas a la fecha se observa el cumplimiento a lo programado en el cronograma de obra.

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 01/11/2024 |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS | |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA | |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |

# COMITÉ DE OBRA No. 06

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 3 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 01 de noviembre de 2024 | Hora de inicio: 9:30 AM | Hora de finalización: 11:00 AM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.06 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.06

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra
2. Aprobación acta de recibo No. 02 de obra.

## DESARROLLO DE LA REUNION

En las oficinas de la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 6 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

El Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), actuando en representación de la Secretaria para la gestión del riesgo de desastres toma la palabra dando el respectivo saludo y la bienvenida al presente comité, seguidamente solicita al contratista de obra información respecto al avance de obra a la fecha.

Hecho seguido toma la palabra el Ing. Imar Orlando Vacca en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, quien informa respecto al avance en la ejecución de la obra derivada del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha del presente comité se han desarrollado las siguientes actividades constructivas:

- Replanteo y localización para puentes (ejecutada)
- Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramiento rocoso. Altura superior a 2 m (ejecutada)

**ACTA DE REUNION**

- Concreto ciclópeo para base o fundación de puentes resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm². (ejecutada)
- Zarpa en concreto para puentes de resistencia 4000 Psi (ejecutada)
- Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 4000 Psi (ejecutada)
- Acero de refuerzo Grado 60 ((ejecutada para zarpa y estribos)
- Cargue y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado ((ejecutada)
- Manejo de aguas (en ejecución)
- Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación, (en ejecución)
- Dragado cauce natural (Ampliación de la sección hidráulica aguas arriba, aguas abajo y retiro de la vía provisional), ((ejecutada)

Se presenta ante la supervisión del contrato la documentación requerida para el cobro del acta de recibo parcial con las subsanaciones solicitadas y todas las memorias de cálculo de las cantidades cobradas.

A la fecha no ha presentado ningún inconveniente pueda afectar el normal avance de la obra, por lo que su ejecución se está realizando de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.

El contratista presenta en comité la pre acta de obra No. 2 con sus respectivas memorias de cálculo y el informe No. 2 de actividades con su respectivo registro fotográfico esto con el fin de que sea revisada por la supervisión del contrato de obra para poder proceder a iniciar proceso de cobro mediante acta de recibo parcial No. 2 de las cantidades ejecutadas.

El ingeniero William Vera Arias, indica al contratista que una vez revisada la documentación presentada, las cantidades de obra y sus respectivas memorias de cálculo se aprueba el acta de recibo parcial No. 2 para ser presentada e iniciar el proceso de cobro de la misma

Siendo las 11:00 am se da por terminado el comité de obra #6

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

Radicar el acta parcial No. 2

**CONCLUSIONES**

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 3 | |


**ACTA DE REUNION**

1. Se aprueba el acta parcial de obra No. 2 para iniciar proceso de cobro de las cantidades allí reportadas, las cuales ya fueron verificadas por la supervisión del contrato

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 14/11/2024 |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS |  |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA |  |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | Firma |

CONSTRUCTORES S.A.S

# COMITÉ DE OBRA No. 07

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 3 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 14 de noviembre de 2024 | Hora de inicio: 2:30 PM | Hora de finalización: 3:15 PM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.07 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.07

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra

## DESARROLLO DE LA REUNION

En las oficinas de la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 7 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

El Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), actuando en representación de la Secretaria para la gestión del riesgo de desastres toma la palabra dando el respectivo saludo y la bienvenida al presente comité, seguidamente solicita al contratista de obra información respecto al avance de obra a la fecha.

Hecho seguido toma la palabra el Ing. Imar Orlando Vacca en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, quien informa respecto al avance en la ejecución de la obra derivada del contrato de obra No. RE-SGRD- 01885 de 2024, en el que a la fecha del presente comité y luego de ejecutadas las actividades preliminares y las correspondientes a las excavaciones y a los vaciados de concreto para las zarpas y estribos, en obra se continúan ejecutando las actividades de:

- Manejo de aguas (en ejecución)

**ACTA DE REUNION**

- Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación, (en ejecución)

Una vez terminada la construcción de los estribos se procedió a dar inicio a la instalación de obra falsa que nos permitirá dar continuidad al proceso constructivo de la losa del puente y los demás elementos estructurales del puente pendientes por construir.

Desde la primera semana de noviembre, el avance de las actividades constructivas que se están ejecutando se han visto afectadas por el incremento en las precipitaciones en la zona, hecho que nos ha obligado a realizar cese de actividades constructivas mientras se aseguran las zonas de trabajo para garantizar espacios aptos para la continuación de los procesos constructivos, luego de la presencia de lluvias es necesario ocupar la mano de obra en el retiro de material de arrastre de las aguas lluvias y se requiere dejar secar el terreno que se encuentra sobre saturado por la presencia de las aguas lluvias lo que no permite la normal movilidad del personal y el tránsito de materiales constructivos en la zona de trabajo.

Adicionalmente debido a las fuertes lluvias de estas dos semanas se ha requerido realizar más manejo de agua y la reposición y reconstrucción de sectores de jarillon ya que el aumento de las precipitaciones trae consigo un aumento significativo de caudal en el sector que se lleva o deterior el jarillo construido.

Se presenta ante la supervisión del contrato los avances de construcción de las actividades constructivas del puente y se da a conocer las afectaciones causadas a la normal ejecución de la obra por el incremento de las lluvias lo cual constituye un hecho ajenos a la voluntad del contratista.

Siendo las 3:15 pm se da por terminado el comité de obra #7

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

Continuar con el avance y proceso constructivo de la obra e informar cualquier hecho que afecte los avances del contrato de obra.

**CONCLUSIONES**


1. El contrato continua en su ejecución , se han presentado algunas afectaciones al rendimiento y avance de los procesos constructivo por causas ajenas a la voluntad del contratista solo por hecho imputables al aumento de las precipitaciones en la zona.

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 3 | |

**ACTA DE REUNION**

| | | |
|---|---|---|
| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: | |
| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 21/11/2024 |

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS |  Firma |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA |  Firma |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |

# COMITÉ DE OBRA No. 08

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 3 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 21 de noviembre de 2024 | Hora de inicio: 11:00 AM | Hora de finalización: 11:45 AM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.08 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.08

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra
2. Seguimiento a las afectaciones por aumento de precipitaciones en la zona.

## DESARROLLO DE LA REUNION

En las oficinas de la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 8 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

El Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), actuando en representación de la Secretaria para la gestión del riesgo de desastres toma la palabra dando el respectivo saludo y la bienvenida al presente comité, seguidamente solicita al contratista de obra información respecto al avance de obra a la fecha.

Hecho seguido toma la palabra el Ing. Imar Orlando Vacca en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, quien informa que debido a que continúan presentándose en la zona lluvias de manera constante, el rendimiento en el proceso constructivo de las obras derivadas del contrato RE-SGRD- 01885-2024, no ha sido el programado para su ejecución, esto debido a la necesidad de realizar cese de labores dado que la lluvia no permite realizar ningún tipo de labor constructiva, adicionalmente una vez cesan las lluvias se debe esperar a que el suelo que se encuentra sobresaturado tenga un proceso de secado natural de tal manera que nos

**ACTA DE REUNION**

permita reiniciar las jornadas de trabajo, así mismo se debe emplear personal de la obra para realizar el retiro de escombros y material de arrastre que traen consigo el crecimiento del caudal de las aguas que circulan por el sector de intervención y construcción del puente, lo que nos ha obligado a realizar un mayor manejo de aguas y la reconstrucción de sectores del jarillon que por el crecimiento del caudal y la fuerza de las aguas debido a las fuertes lluvias, ha sido arrastrado generando el reproceso constructivo del jarillon para poder realizar actividades constructivas .

Así mismo, se ha requerido realizar nuevamente dragado para el retiro de todo el material de arrastre depositado por la creciente de agua provocado por las fuertes precipitaciones presentadas en la zona.

Respecto al avance en la ejecución de la obra derivada del contrato de obra No. RE-SGRD-01885 de 2024, tal como se mencionó en el párrafo anterior se continúan ejecutando las actividades de:

- Manejo de aguas (en ejecución)
- Jarillon provisional empacado en sacos, rellenos con material propio de la excavación, (en ejecución)

Así mismo, se continúa en la construcción e instalación de obra falsa que nos permitirá dar continuidad al proceso constructivo del montaje de las vigas, la construcción de la losa del puente y los demás elementos estructurales del puente pendientes por construir, pero el rendimiento en el avance de esta fase constructiva del puente no ha sido el programado por hechos ajenos a la voluntad y responsabilidad del contratista ya que estos bajos rendimientos son hechos imputable únicamente a causas naturales caso fortuito por la presencia y aumento en las precipitaciones en la región que desde la primera semana de noviembre se vienen presentando en el departamento y por ende en el municipio de cucutilla.

Se presenta ante la supervisión del contrato los avances de construcción de las actividades constructivas del puente y se reitera la situación presentada en la ejecución del contrato de obra por las afectaciones causadas a la normal ejecución de la obra por el incremento de las lluvias.

Siendo las 11:45 am se da por terminado el comité de obra #8

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 3 de 3 | |

**ACTA DE REUNION**

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

Continuar con el avance y proceso constructivo de la obra

Presenta oficio donde se informe respecto a las afectaciones causadas por las lluvias

**CONCLUSIONES**

1. El contrato continúa en su ejecución, se continúan presentado algunas afectaciones al rendimiento y avance de los procesos constructivo por causas ajenas a la voluntad del contratista solo por hecho imputables al aumento de las precipitaciones en la zona.

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* 28/11/2024 |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS | |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA | |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | Firma |

# COMITÉ DE OBRA No. 09

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 4 | |

## ACTA DE REUNION

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 28 de noviembre de 2024 | Hora de inicio: 9:10 AM | Hora de finalización: 09:55 AM |
| Lugar: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | Responsable de la reunión: Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD | |
| Tipo de Reunión: Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de Obra Contrato de Obra RE-SGRD- 01885-2024 | | Comité Obra No.09 – seguimiento de obra – |

## TEMAS POR TRATAR

Comité Obra No.09

1. Avance y seguimiento de ejecución de obra
2. Seguimiento a las afectaciones por aumento de precipitaciones en la zona.

## DESARROLLO DE LA REUNION

En las oficinas de la Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres - SGRD se da inicio al comité de obra No. 9 del RE-SGRD- 01885-2024, Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO, MUNICIPIO DE CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.

El Ing. William Vera Arias (supervisor designado del contrato de obra), actuando en representación de la Secretaria para la gestión del riesgo de desastres toma la palabra dando el respectivo saludo y la bienvenida al presente comité, seguidamente solicita al contratista de obra información respecto al avance de obra a la fecha, adicionalmente el Ingeniero William Vera reitera al contratista la importancia de realizar los trabajos bajo los estándares de calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas propias de la obra.

| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 2 de 4 | |

**ACTA DE REUNION**

A lo que el Ing. Imar Orlando Vacca en representación del contratista de obra IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S – IVM CONSTRUCCIONES S.AS, informa la ejecución de las actividades constructivas a la fecha se han realizado dando cumplimiento a la normativa vigente y cada proceso constructivo se ha realizado bajo los estándares de calidad de tal manera que se puede garantizar el aseguramiento de la calidad del proyecto, previo al inicio de las actividades de preparación y vaciado concreto se realizó un diseño de mezcla para las resistencias requeridas de los concretos y en obra se cuenta con un carmix que realiza la preparación del concreto según las dosificaciones arrojas por los diseños de mezcla y según la resistencia del concreto a utilizar, adicionalmente con el ánimo de evidenciar el aseguramiento de la calidad se toman muestras del concreto preparado para realizar los respectivos ensayos de resistencia a los 7, 14 y 28 días verificando así el cumplimiento de las especificaciones requeridas en el concreto empleado en obra. En cuento a los aceros empleados se solicitó al proveedor los certificados de calidad de los mismos.

En cuanto al avance de obra el ingeniero Imar Orlando Vacca, informa nuevamente a la supervisión del contrato que el avance programado para la ejecución de las actividades constructivas continúa siendo afectado por la fuerte temporada de lluvias que se está presentando en la zona, tal cual como se informó en el comité anterior desde principios del mes de noviembre el incremento en las precipitaciones en la zona ha impedido que las actividades de obra se realicen con los rendimientos de avance esperados y adicionalmente ha generado daños en actividades ya ejecutadas como en la construcción de jarillones los cuales han tenido que ser reconformados casi en su totalidad debido a la fuerzas de las aguas que por el aumento del volumen debido a las precipitaciones han destruido y arrastrado la mayor parte de jarillon de la obra llevándolo aguas abajo, así mismo sucede con la actividad de dragado que ha sido necesaria realizarla nuevamente para retirar del espacio de la obra todo el material de arrastre que trae consigo el aumento del caudal de las aguas que por allí fluyen hecho generado por el aumento de las precipitaciones, con respecto

**ACTA DE REUNION**

al manejo de aguas es una actividad de ejecución diaria dado el aumento del caudal de agua producto de las precipitaciones presentadas en la zona.

Sumado a lo anterior se requiere de personal para realizar reacomodamiento de la zona de trabajo, así como esperar que el suelo sobresaturado por las lluvias tenga un tiempo de secado natural que permita el transito tanto de obreros como de equipos y materiales de forma segura dentro del área de ejecución de las actividades constructivas del puente.

Actualmente se continúan ejecutando las actividades de instalación y construcción de las obras falsas que nos permitirá dar continuidad al proceso constructivo del montaje de las vigas, la construcción de la losa del puente y los demás elementos estructurales del puente pendientes por construir,

Se presenta ante la supervisión del contrato los avances de construcción de las actividades constructivas del puente y se reitera la situación presentada en la ejecución del contrato de obra por las afectaciones causadas a la normal ejecución de la obra por el incremento de las lluvias.

Siendo las 09:55 am se da por terminado el comité de obra #9

**COMPROMISOS y CONCLUSIONES**

**COMPROMISO**

Continuar con el avance y proceso constructivo de la obra

**CONCLUSIONES**

1. El contrato continúa en su ejecución, se continúan presentado algunas afectaciones al rendimiento y avance de los procesos constructivo por causas ajenas a la voluntad del contratista solo por hecho imputables al aumento de las precipitaciones en la zona.



| Gobernación de Norte de Santander<br>SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | MACROPROCESO ESTRATEGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 4 de 4 | |

**ACTA DE REUNION**

| ANEXOS SI ( ) NO ( ) | Fecha de aprobación del acta: |
|---|---|

| *Elaboró: Ing. Paola Ramírez Montañez – Apoyo Supervisión* | *Revisó: Ing. William Vera Arias, Secretario SGRD* | *Próxima Reunión:* |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por quienes intervinieron:*

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | WILLIAM VERA ARIAS | <br>Firma |
| En Representación de | SECRETARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | IMAR ORLANDO VACCA | <br>Firma |
| En Representación de | IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |

# IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S

**NIT : 901.266.624-6 Responsable de IVA**

Dirección : Calle 12 #4-47 Ofic 33 CC Internacional
Telefonos : 5710503
Email : ingimarvacca@hotmail.com
Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

Resolución de Facturación N° 18764081192537. Numeración Autorizada Del IV 70 Hasta IV 200 Fecha 08/10/2024 Vigencia 12 Meses 08/10/2025

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **IV - 86**

**CLIENTE :** FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
**NIT ó C.C:** 900978341
**DIRECCION:**
**Ciudad:** CUCUTA
**Telefono:**
**EMAIL:**
**VENDEDOR :** VARIOS

**FECHA Y HORA EMISION**
11/12/2024 - 8:58:48 a. m.

**Forma de Pago:** CONTADO
**Fecha Vencimiento:**

| CANT. | DESCRIPCION | BOD | UND | IVA | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | COSTO DIRECTO | | UND | 0 | 224,112,619.00 | 224,112,619.00 |
| 1.00 | ADMINISTRACION 25% | | UND | 0 | 56,028,155.00 | 56,028,155.00 |
| 1.00 | IMPREVISTOS 0.5% | | UND | 0 | 1,120,563.00 | 1,120,563.00 |
| 1.00 | UTILIDAD 4.5% | | UND | 0 | 10,085,068.00 | 10,085,068.00 |
| 1.00 | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION TEMPORAL | | UND | 0 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

OBSERVACIONES : ACTA N°3 CONSTRRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR GUAYABITO,MUNICIPIO DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CLAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO001287 DEL 06 DE JUNO DE 2024

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO Pesos

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 296,346,405.00 |
| **DESCUENTO** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **RETE. FTE.** | 0.00 |
| **TOTAL** | **296,346,405.00** |

CUFE:2be64be002b023ee8ec142a466969e084c4901229b1f75a292835327c1342d344192a05d15abf27df179acb650dc46fe

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 772 al 779 del Codigo de Comercio. Causará intereses a la tasa maxima legal vigente, mensual o fracción a partir del vencimiento. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita y acepta el valor estipulado en la misma. Una vez entregada la mercancia a satisfacción del cliente no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Fecha:

FIRMA Y SELLO EMPRESA
