Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SDGR-025000

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2024-25000-032139-3
2024-12-10 10:29 -RIESGO
Destino: 11400
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: TRAMITE DE PAGO ALBE
Folios: 56
Anexos: DOCUMENTOS

San José de Cúcuta,

Doctora

ADRIANA BOADA ARGUELLO

Profesional especializado, Grado 10

Área de Presupuesto

Secretaria de Hacienda Departamental

Gobernación de Norte de Santander

REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO.** **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la secretaria de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO, se identifica con **C.C.: No. 8 8. 1 4 1. 5 4 7,** CONTRATISTA la suma de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON DOS CENTAVOS MTC**PORCONCEPTO CONTRATO N° RE-SGRD-03405-2024, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

Cordialmente,

WILLIAM VERA ARIAS

Secretaria Departamental de Gestión de Riesgos

Espacio para
Logo Corporativo

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
NIT 88.141.547-1
CALLE 7 26-34 BRR LLANADAS
Tel: 3136907332
Ocaña - Colombia
albeirosea@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FIAA 29

Señores	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
NIT	800.103.927-7	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	AV 5 CLL 13 Y 14	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2024, 15:30
Expedición	09/12/2024, 15:37
Vencimiento	09/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024	1.00	108,569,813.86	0 %	0.00	108,569,813.86
2	ADMINISTRACION 24%	1.00	26,056,755.33	0 %	0.00	26,056,755.33
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	1,085,698.14	0 %	0.00	1,085,698.14
4	UTILIDAD 5%	1.00	5,428,490.69	0 %	0.00	5,428,490.69

Total items: 4

Total Bruto	141,140,758.02
Total a Pagar	141,140,758.02

Valor en Letras: Ciento cuarenta y un millones ciento cuarenta mil setecientos cincuenta y ocho pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 141,140,758.02

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075695925 aprobado en 20240724 prefijo FIAA desde el número 23 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: e6f670719855bf10b4abafd8d66b54b070bc5661b8b9ce4844ac132d82e518d641a2b47397032fee0eae248d59f4d22d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

OCANA, NORTE DE SANTANDER,
COLOMBIA,
A quién interese

25/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO** con **Cédula de Ciudadanía** número **88141547**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488423363958**
Fecha de apertura	**26/08/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 12	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

FECHA :	9 diciembre 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. o N.I.T.	8 8. 1 4 1. 5 4 7
REPRESENTANTE LEGAL	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
N.I.T	8 8. 1 4 1 .5 4 7
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00)
VALOR ADICIONAL CONTRATO	No Aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento Norte de Santander
PLAZO INICIAL	60 Dias
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, realizó los análisis de precios unitarios de las obras requeridas, fijándose como valor total para el contrato a ejecutar la suma de CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00), Valor que será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la prestación de los respectivos soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000095 de Fecha 16 septiembre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.00 000136 de Fecha 1 noviembre 2024
SUPERVISOR	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 6 de noviembre de 2024
INTERVENTOR EXTERNO	-
ACTA DE INICIO	6 de noviembre de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	-
ACTA DE REINICIO	-

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

ACTAS PARCIALES DE OBRAS ACTAS DE MODIFICACIÓN	-	**FECHA**
ACTAS DE MODIFICACIÓN ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	**NA**	**FECHA**
RELACIÓN DE GARANTÍAS		

Garantía Única. No. 56-44-101008829 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	$ 49.813.674.70	01/11/2024 al 30/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$24.906.837.35	01/11/2024 al 31/12/2027
	Estabilidad y calidad de obra	$ 149.441.024.10	1 AÑO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 56-40-101003860 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Valor asegurado		Vigencia
	$ 260.000.000		01/11/2024 hasta 31/12/2024

2. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR PAGADO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 498.136.747,00
ACTA PARCIAL 1	$ 242.522.869,07
ACTA PARCIAL 2	$ 141.140.758,02
SALDO POR EJECUTAR	$ 114. 473119,9

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 12	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA DEL 9 DICIEMBRE 2024

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO
Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo WILLIAM ARIAS VERA con cedula de ciudadanía No. 88.158.521 de pamplona en mi condición de ordenador del gasto (a) del contrato de Obra RE-SGRD-03405-2024, **CERTIFICO** que:

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO, en calidad de Contratista, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del (objeto contractual) durante el período comprendido del **26 NOVIEMBRE AL 9 DICIEMBRE 2024 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024**
El valor a reconocer y pagar es la suma de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON DOS CENTAVOS MTC** correspondiente al pago Acta Recibo PARCIAL 2 , del contrato en referencia.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago)

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

LUIS FERNANDO BARON ORTIZ
C.C. 1.090.455.569
Contratista apoyo supervisión

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	**Luis Fernando Barón Ortiz**	**Contratista**	
Revisión jurídica:	**Marlym Jhoana Montoya**	**Asesora Jurídica Externa**	
Aprobación Jurídica:	**Marlym Jhoana Montoya**	**Asesora Jurídica Externa**	
Revisión área técnica:	**William Vera Arias**	**Secretario SGRD**	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

SEGUIMIENTO DE OBRA

Como ordenadores del gasto y supervisores de la obra se realiza seguimiento constante a cada una de las actividades que se han venido desarrollando dentro del contrato RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024, cuyo objeto es, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024, el cual se pudo observar lo siguiente:

- durante la semana 4 comprendida del 25 de noviembre al 30 de noviembre del 2024 se llevó a cabo el 100% de la actividad de rocería y limpieza en los sectores de palmarito, la quina, y la teja en el corredor vial que comunica a teorama con san Calixto, al mismo tiempo se vienen adelantando constatan trabajos de perfilado cuneteo y adición de material en 325 ml que se requerían por la presencia de cárcavas de gran magnitud, también se verifican trabajos en el sector entre la pelota y potrero grande, donde se realizaron trabajos de rocería en cerca de 3 km y medio, y a la par se vienen adelantando las labores de mantenimiento vial.
- El día 25 en horas de la noche mediante el grupo de enlaces departamental fuimos notificado de un derrumbe que se presentó en la vía que conduce al municipio de san Calixto, se procedió a llamar al contratista para que por medio de la maquinaria amarilla se pudiera habilitar la vía a la brevedad lo que nos notifica que la intervención se realiza el 26 de noviembre en las primeras horas de la mañana una vez la maquina llegue a sitio

- Durante la semana 5 del 2 de diciembre al 7 de diciembre del 2024 se continúa realizando seguimiento a los trabajos que se realizan en los sectores de palmarito y la teja con las labores de perfilado y cuneteo y adición de material para la conformación de la vía, de igual forma se verifican las labores en el sector de potrero grande donde se vienen adelantando acciones de conformación de vía.

A continuación, se anexa registro fotográfico de las actividades que se vienen desarrollando dentro del contrato:


INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA


REGISTRO FOTOGRAFICO


CORREDOR VIAL SAN CALIXTO - TEORAMA

1. ROCERIA Y LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL



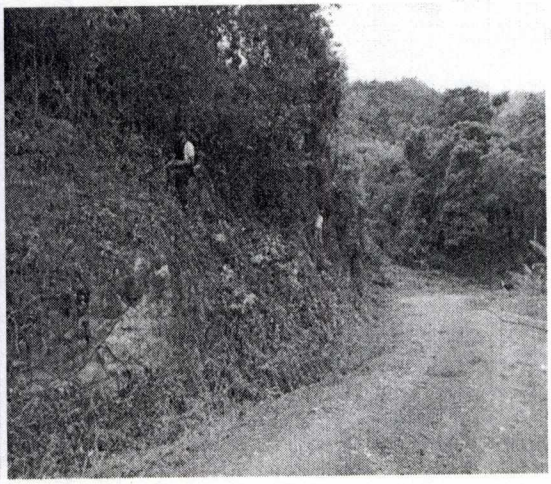


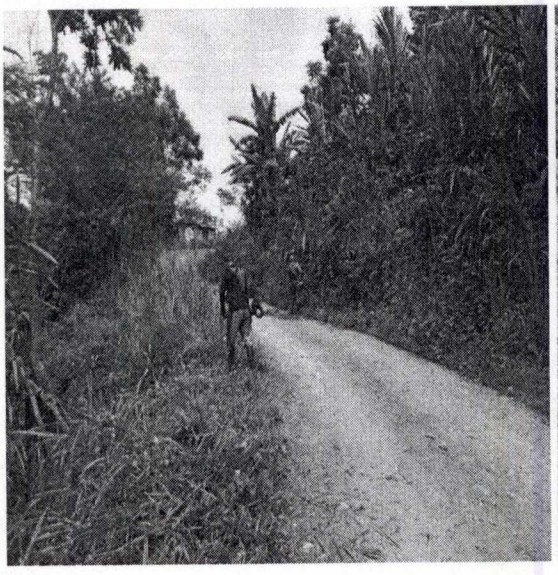


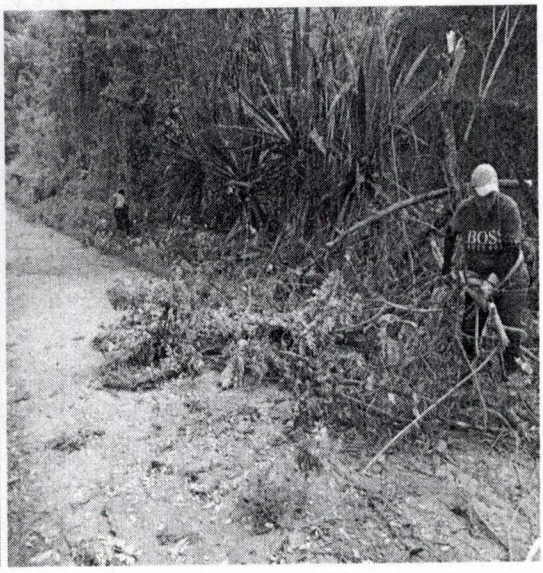



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

2. MEJORAMIENTO DE CALZADA AGREGANDO MATERIAL

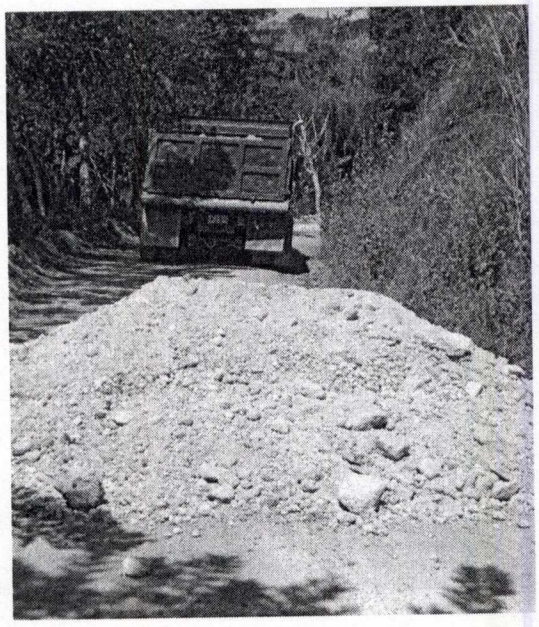


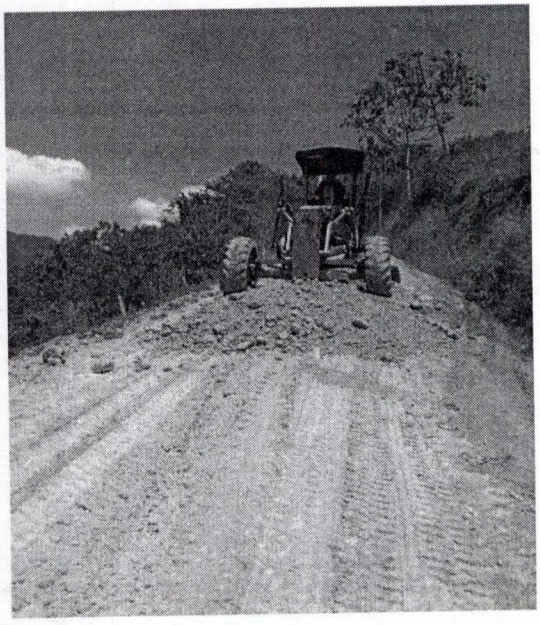


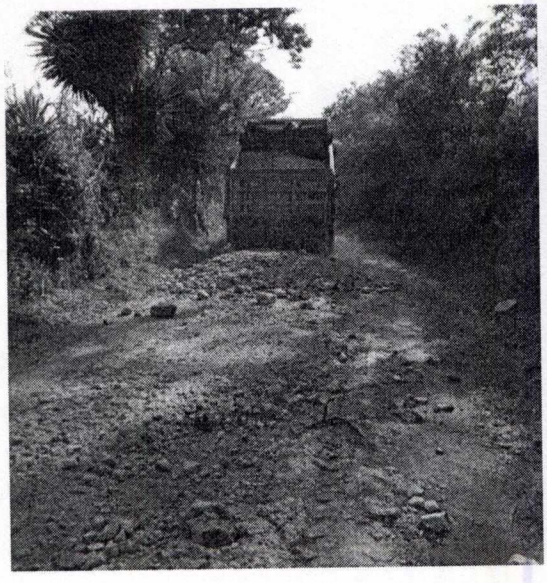

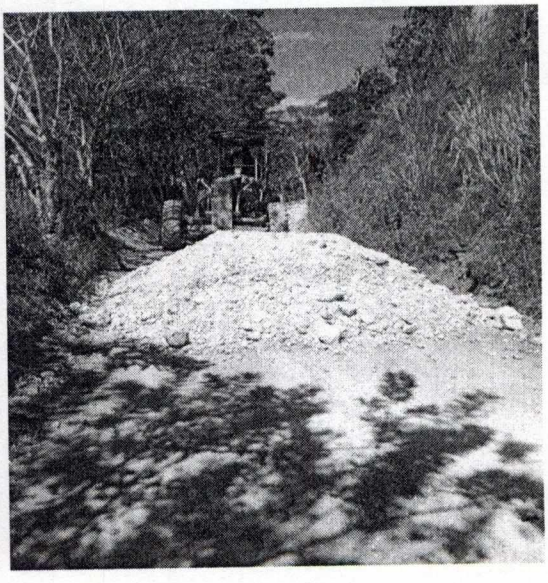

3. CONFORMACION DE CALZADA CON MOTONIVELADORA

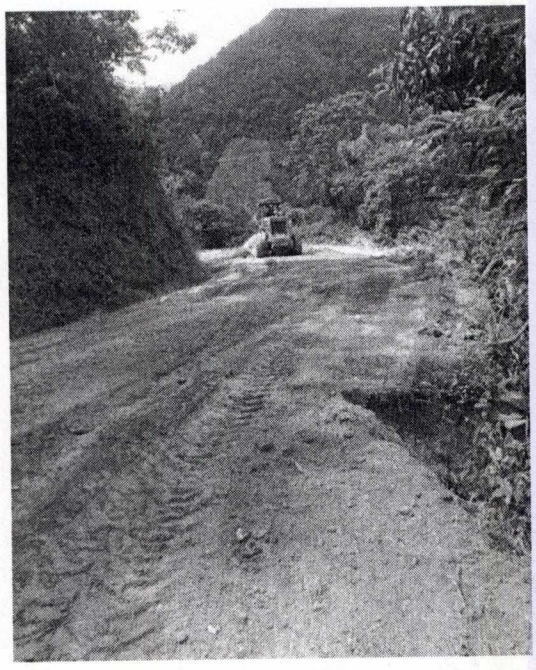

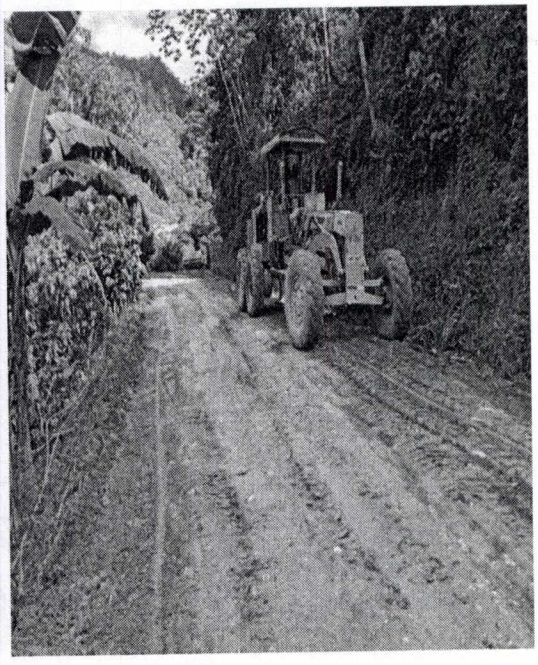






CORREDOR VIAL HACARI- SAN CALIXTO


1. ROCERIA Y LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL

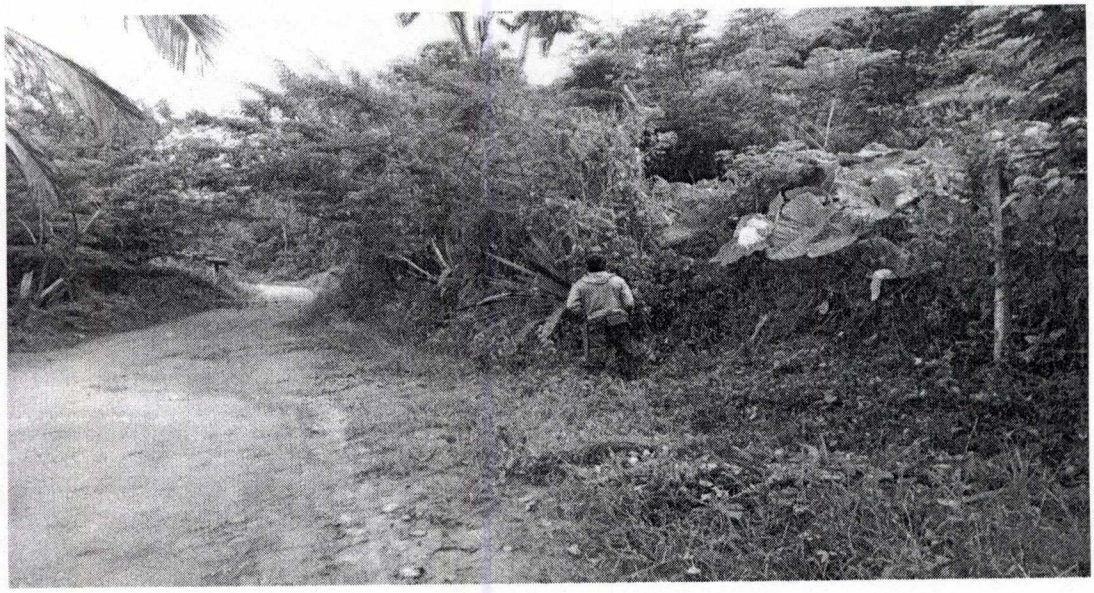







2. MEJORAMIENTO DE CALZADA AGREGANDO MATERIAL

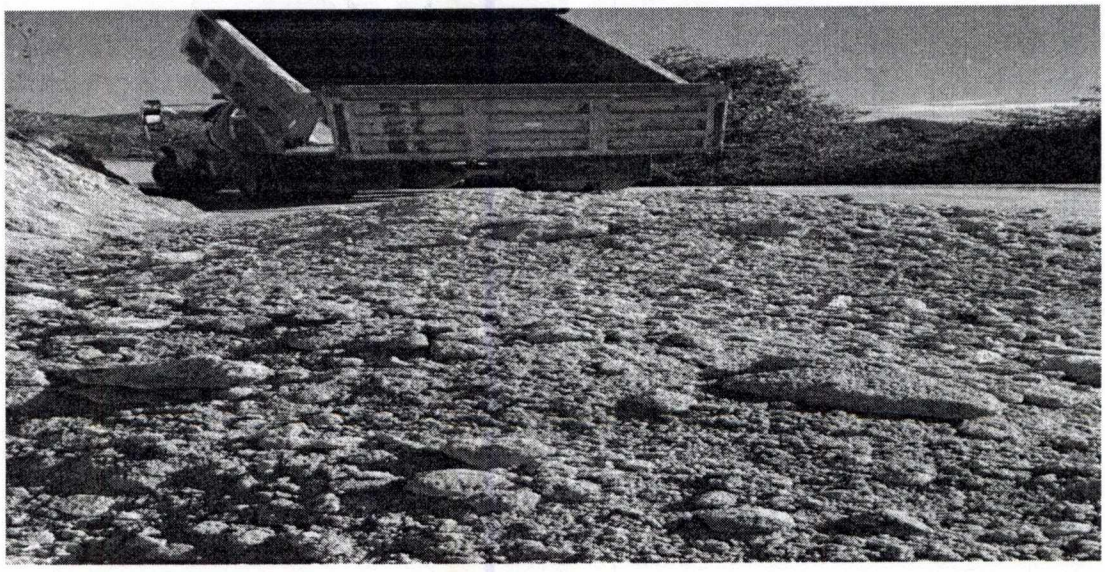


INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

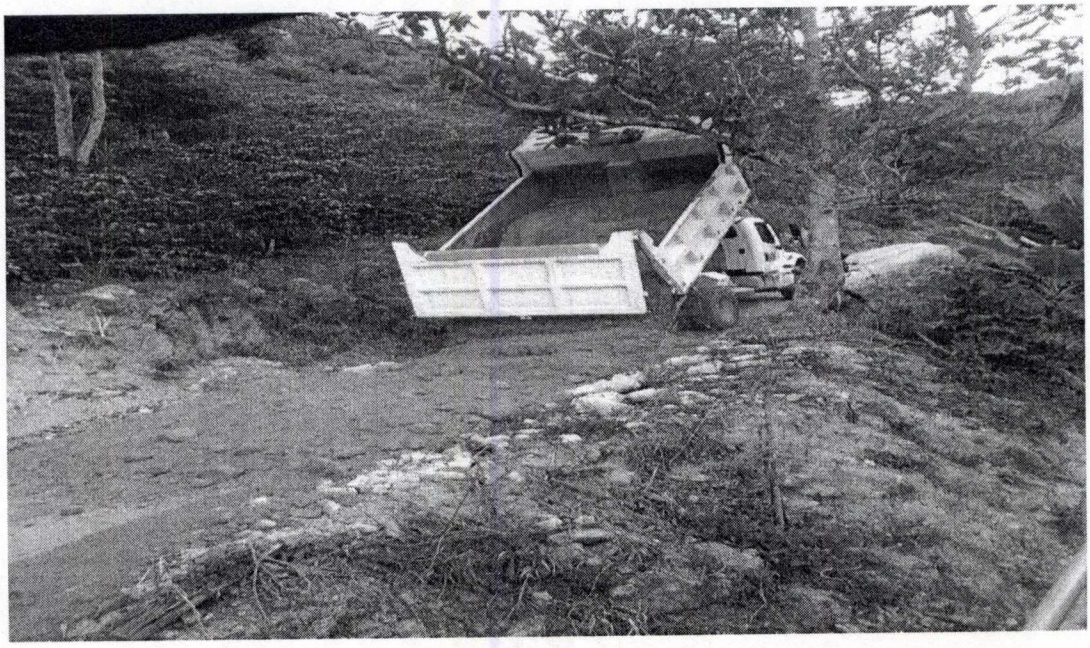

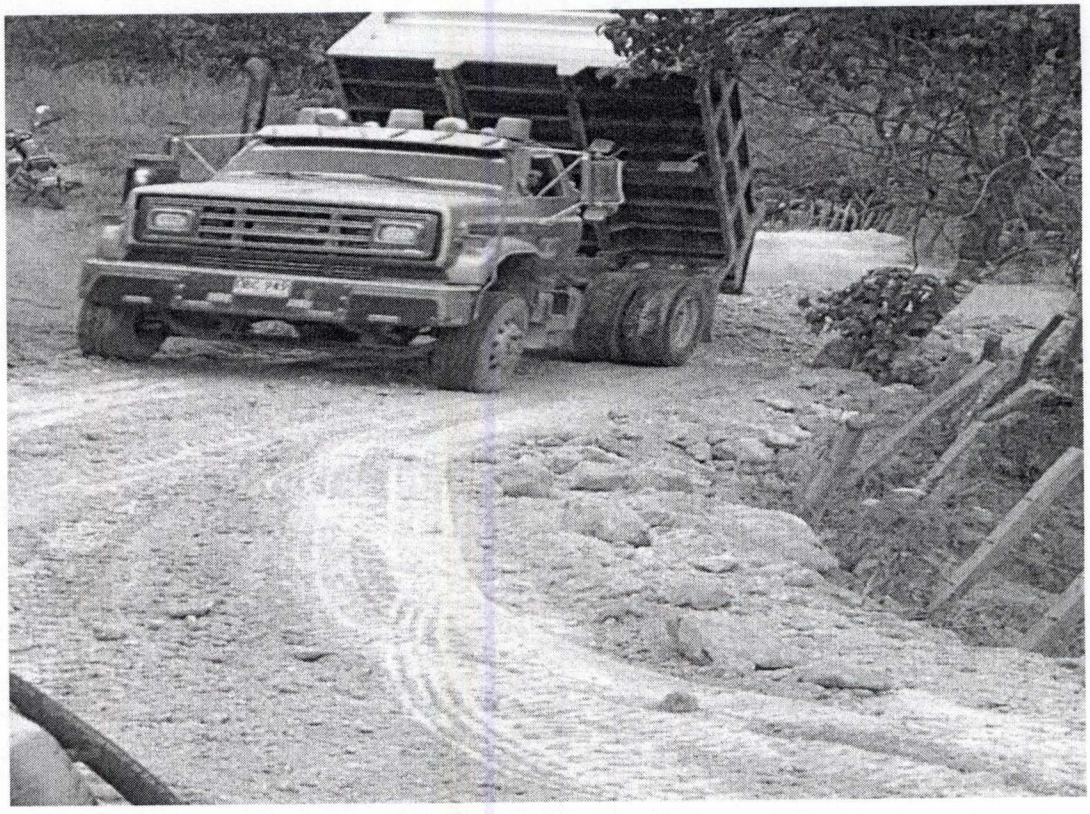

3. CONFORMACION DE CALZADA CON MOTNIVELADORA

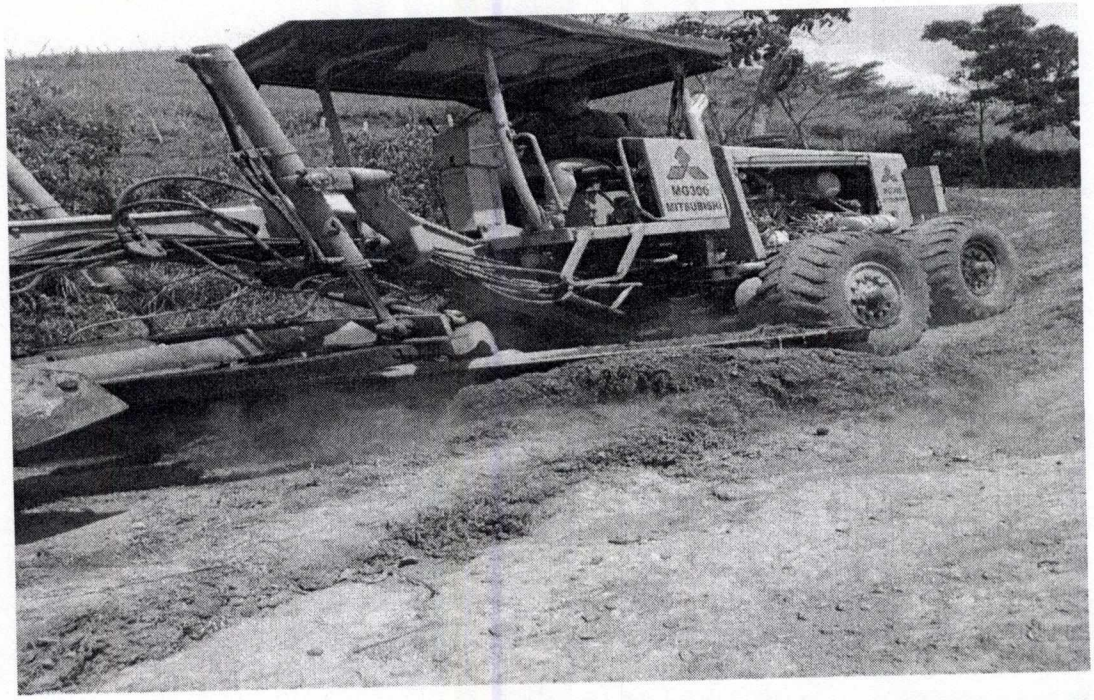



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA





INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONES

De acuerdo Al seguimiento que se le viene realizando al contrato RE-SGRD-03405, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024¨ por un valor económico de CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00, el avance esta dentro de los tiempos estipulados para la ejecución del contrato, se le ha realizado la salvedad al contratista de dejar paz y salvo cualquier vínculo laboral con las personas que trabajan u hacen parte de la ejecución del contrato ya que nosotros como gobernación no tenemos responsabilidad con terceros y es de suma importancia esto. Así mismo buscar realizar las actividades que se encuentran por ejecutar en el menor tiempo posible para dar tranquilidad a los pobladores de la zona ya que este corredor vial es de vital importancia para el desarrollo social y económico de toda la comunidad.

Para esta acta de cobro numero 2 se aprobó el acta de modificación de cantidades evaluando y teniendo en cuenta el rubro presupuestal inicial que no sufriera ninguna alteración ya que no estaba contemplado ningún adicional para la ejecución de este contrato por ende las modificaciones de cantidades que se realizaron están sujetas al valor inicial.

Se solicita al contratista realizar una reunión una vez terminada el 100 % de la obra con los pobladores de la zona para así tener un acta de satisfacción de ellos y dar paso a la liquidación mutua del contrato.

Como supervisores y ordenadores del gasto es importante llevar a cabalidad todas y cada una de las actividades contempladas dentro del mismo, realizando seguimiento y análisis a los datos suministrados por el contratista en las memorias de calculo presentadas en la presente acta, dejando como constancia que dichos trabajos se han venido realizando con la mejor disposición y estando dentro de los plazos contemplados inicialmente.

Para el día 11 de diciembre se tiene contemplado realizar visita a campo para analizar el estado de avance de la obra e ir definiendo el comité de obra final y entrega de la misma

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88141547		SEPULVEDA AREVALO ALBEIRO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	CALLE 10 14-01 CENTRO	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5626728	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1000000863	9477957247	E	2024/12/11	2024/11/27	BANCO DE BOGOTA	0	$2,415,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEDE PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (6 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
1	CC	1063618665	ALBA CARLOS		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1003091979	ALBA EDGAR		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	4984369	ALDANA JUAN		X																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	77132934	ANGARITA RODOLFO		X																231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	1064840973	ARIAS WILSON		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	13175720	ASCANIO JESUS		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total			**Afiliados(6)**																				$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88141547		SEPULVEDA AREVALO ALBEIRO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	CALLE 10 14-01 CENTRO	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5626728	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1000000863	9477957247	E	2024/12/11	2024/11/27	BANCO DE BOGOTA	0	$2,415,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$543,000	$0	$0	$543,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$543,000	$0	$0	$543,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$312,000	$0	$0	$312,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$312,000	$0	$0	$312,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$312,000	$0	$0	$312,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				6	$2,415,000	$0	$0	$2,415,000

San jose de cucuta 9 de diciembre 2024

Señores

Cúcuta –Norte de Santander, Información del Proceso: **MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA-SAN CALIXTO-HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.**

Respetados señores:

El suscrito Revisor Fiscal EDWARD PERDOMO BERMUDEZ, hace CONSTAR que Albeiro Sepúlveda Arévalo, con cédula de ciudadanía o NIT 88.141.547, se encuentra a la fecha de este documento, y durante los últimos seis (6) meses, al día con sus aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con: las Cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

EDWARD PERDOMO BERMUDEZ
Cédula de ciudadanía No. 1.091.668.240 de Ocaña
Matricula Profesional No. **T.P. 309888- T**

18

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

309888-T



EDWARD
PERDOMO BERMUDEZ
C.C. 1091668240
RES. INSCRIPCION 193 DEL 30/05/2023
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

359329 36328

F.E 18-11-2024

CERTIFICADO PARAFISCALES
NOV-2024
ABERO SEPULVEDA AREVALO

220341/0522

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

F.E 18-11-2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.091.668.240**

PERDOMO BERMUDEZ

APELLIDOS

EDWARD

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUL-1992**

CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

17-SEP-2010 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2506100-00743843-M-1091668240-20150906 **0046**256126A 1 6983555216

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 4 6 4 D 2 B 0 8 6 9 B A 1 7 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDWARD PERDOMO BERMUDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091668240 de OCAÑA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 309888-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

San José de Cúcuta, 9 diciembre de 2024

Señores
TESORERIA DEPARTAMENTAL
San José de Cúcuta

REFERENCIA: ° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DEL NOVIEMBRE DE 2024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

Asunto: Autorización Descuento Estampilla

El presente tiene como fin autorizar por medio de esta notificación se descuente el porcentaje % correspondiente a las estampillas departamentales y descuentos de ley de la referencia a la factura de la referencia, por concepto Acta Parcial No. 02 de fecha 9 de diciembre 2024

Sin otro particular,

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. 8 8. 1 4 1. 5 4 7
CONTRATISTA

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 1 de 7	

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 4 de DICIEMBRE de 2024	Hora de inicio: 8:00 AM	Hora de finalización: 9:00 AM
Lugar: presencial	Responsable de la reunión: SGRD	
Tipo de Reunión: comité de obra del contrato RE-SGRD-03405-2024		Acta No 02

TEMAS A TRATAR

1. Avance de la obra para el mantenimiento de corredor vial
2. Imprevistos presentados durante la ejecución
3. Mayores y menores de obra

DESARROLLO COMITÉ DE OBRA

En el Municipio de san Calixto, Departamento Norte de Santander a los 4 días del mes de Diciembre de 2024, en las oficinas del CEGIRD FRONTERIZO, se realizo un comité obra para evaluar el estado de avance de obra del contrato RE-SGRD-03405, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024¨ por un valor económico de CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00y un plazo de ejecución de 60 DIAS, en los que hicieron presencia el ingeniero Fernando barón Ortiz apoyo a la secretaria de gestión de riesgo departamental, el ingeniero Fabián labrador de la secretaria gestión del riesgo departamental, el señor Albeiro Sepúlveda contratista encargado de la obra en mención.

A continuación generalidades

CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD-03405-2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. o N.I.T.	88.141.547

ACTA DE REUNIÓN

REPRESENTANTE LEGAL	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C.	88.141.547
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00)
PLAZO O DURACIÓN	60 DIAS
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, realizó los análisis de precios unitarios de las obras requeridas, fijándose como valor total para el contrato a ejecutar la suma de CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00), Valor que será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la prestación de los respectivos soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000095 de Fecha 16 septiembre de 2024

ACTA DE REUNIÓN

SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 5 de noviembre de 2024
INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO

REQUISITO	FECHA
Fecha de suscripción	1 Noviembre de 2024
Registro Presupuestal	No.00 000136 de Fecha 1 noviembre 2024

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

REQUISITO	FECHA		
Impuesto de timbre	No Aplica		
Publicación Gaceta	No Aplica		
Garantía Única. No. 56-44-101008829 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	$ 49.813.674.70	01/11/2024 al 30/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$24.906.837.35	01/11/2024 al 31/12/2027
	Estabilidad y calidad de obra	$74,295,552.70	5 AÑOS
	Valor asegurado	Vigencia	

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 4 de 7	

ACTA DE REUNIÓN

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 56-40-101003860 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	$ 260.000.000	01/11/2024 hasta 01/01/2025

El ingeniero LUIS FERNANDO BAON ORTIZ, toma la palabra solicitando al contratista realice un balance del estado actual de la obra, en que estado se encuentra, cual es el alcance y cuando se proyecta a llevar a cabo la ejecución total del proyecto.

Se le da la palabra al ingeniero Albeiro Sepúlveda y el manifiesta que el rendimiento durante las dos ultimas semanas no han sido los esperados debido a las precipitaciones que se estaban presentando en la zona ya que dificultaba el accionar de los bancos de maquinaria debido a las características de los materiales a usar, de la misma forma se encuentra el avance dentro de los limites establecidos pues la ejecución del contrato va en un 77 o 80% en un periodo de 33 dias lo que da un parte de tranquilidad teniendo en cuenta que esta por encima del valor estimado.

Actúalamente se vienen desarrollando trabajos con dos cuadrillas de tres maquinas cada una, conformado por motoniveladora, vibro compactador y pajarita, ubicado cada uno de ellos en los sectores entre teorama- san Calixto, sector palmarito y entre san Calixto-Hacarí sector potrero grande.

Se realizo un recorrido para evaluar las alcantarillas a intervenir con limpieza y retiro de capa vegetal de forma manual pero, se determina que no es necesario llevar a cabo esta actividad por el momento ya que las alcantarillas existentes se encuentran en buen estado debido a que mismos pobladores de la zona les hacen mantenimientos para evitar que se saturen y esto afecten las vías, de igual forma se determina que esta via va a seguir presentando deterioro constante ya que no cuenta con las obras de artes requeridas al momento de llevar a cabo la construcción de un trazado vial.

En cuanto a la ejecución del contrato al 100% manifiesta que si no se presenta algún imprevisto se tiene contemplado finalizar la obra en la semana entre el 16 al 21 de Diciembre del 2024, contando con las actas de satisfacción de la comunidad,


Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 5 de 7	

ACTA DE REUNIÓN

Toma la palabra el ingeniero Luis Fernando baron y recomienda al contratista realizar todos los pagos correspondiente a las personas que tengan o hayan tenido contacto directo en la ejeucion (operadores de maquinas u ayudantes), de la obra ya que la gobernación de norte de Santander no se hace responsable por deudas a terceros y los contactos que se tienen en campo son directamente con el contratista.
Toma la palabra el contratista y da la observación que cada actividad que se ha ido realizando se ha cancelado a la comunidad y que al momento de ejecutar el 100 % de la obra tendrá de respaldo paz y salvo con las personas que tiene laborando.

El ingeniero Luis Fernando baron solicita al ingeniero Albeiro sepulveda cual es el acta de mayores y menores para llevar a cabo las estas obras ya que son el resultado de la medición en el lugar de ejecución, y se garantizan para que cumplan con el objeto del contrato, con la calidad y el funcionamiento adecuados.
El ingeniero contratista presenta el acta de modificación de cantidades las cuales no generan ningún costo adicional al contrato en la cual no se realiza el ITEM 2.0 LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS, y por ende el recurso el cual es un monto de $4.602.258,00, sea destinado a actividades de remoción de derrumbes los cuales han aumentado su volumen por la inestabilidad de algunos taludes del corredor vial.

Se analiza el acta y se da claridad de la misma y se aprueba con consentimiento el ingeniero WILLIAM VERA ARIAS quien es el secretario departamental de gestión del riesgo y ordenador del gasto.

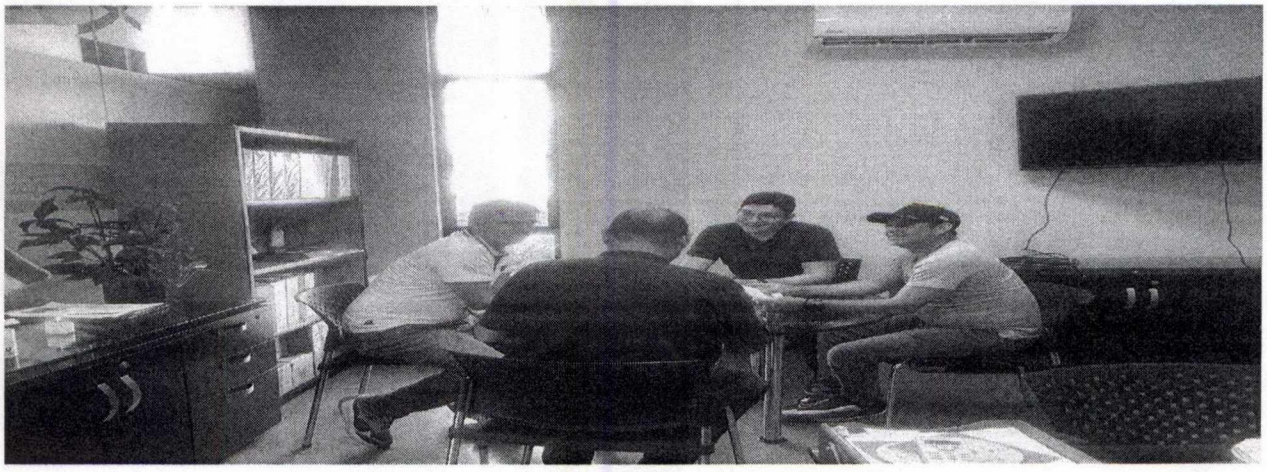

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 6 de 7	

ACTA DE REUNIÓN





Para finalizar el ingeniero contratista solicita un recorrido del corredor vial para evaluar lo que se ha intervenido y como se han llevado a cabo dichas actividades, puesto que por las precipitaciones y el trafico de la via puede verse afectado dichos trabajos por ser un terreno escarpado.

Por orden del ingeniero William vera el día 11 de diciembre del 2024 el ingeniero Fernando barón se desplazara a la zona a realizar el recorrido solicitado por el contratista

WILLIAM VERA ARIAS

Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres

Ordenador del Gasto - Supervisor

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO

C.C. 88.141.547

Contratista

LUIS FERNANDO BARON ORTIZ

ING. APOYO SECRETARIA DEPARTAMENTAL GESTION DEL RIESGO

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 7 de 7	

ACTA DE REUNIÓN

ANEXOS SI (X) NO ( ) - Balance	*Fecha de aprobación del acta:*

Elaboró: Luis Fernando Baron Ortiz– Contratista ✓	*Revisó:* ***William Vera Arias – Jefe de Oficina***	*Próxima Reunión:*

Una vez leída y aprobada la presente acta, se valida con quienes intervinieron:

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 27/07/10	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

FECHA DEL ACTA	9 diciembre del 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
NIT.	8 8. 1 4 1. 5 4 7
REPRESENTANTE LEGAL	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. o N.I. T	8 8. 1 4 1 .5 4 7
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000095 de Fecha 16 septiembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00)
PLAZO O DURACIÓN	60 DIAS
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 6 de noviembre de 2024
INTERVENTOR	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	6 NOVIEMBRE 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN	-

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

ACTAS DE REINICIO	-		
FECHA DE TERMINACION	-		
Garantía Única. No. 56-44-101008829 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	$ 49.813.674.70	01/11/2024 al 30/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$24.906.837.35	01/11/2024 al 31/12/2027
	Estabilidad y calidad de obra	$ 149.441.024.10	1 AÑO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 56-40-101003860 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Valor asegurado		Vigencia
	$ 260.000.000		01/11/2024 hasta 31/12/2024
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	NO APLICA		
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	NO APLICA		
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	NO APLICA		
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	28 %		
% EJECUTADO ACUMULADO	77 %		
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	=33 Dias trabajados / 60 Total Días: 55 %		

En San José de Cúcuta el 9 días del mes de Diciembre de 2024, en las oficinas de la Secretaria Departamental de Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: **William Vera Arias**, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo NO APLICA, ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO C.C. 8 8. 1 4 1. 5 4 7 Como contratista, con el fin de

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

realizar **Acta Parcial de Obra No. 02** al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

ALBEIRO SEPÚLVEDA AREVALO
C.C. 88.141.547
Contratista

NGRD / Gobernación de Norte de Santander	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	MS-CC-CS-03 (ANEXO)
	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 2	FECHA DEL ACTA: 9-dic-24
	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE 2024	

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO													
1,0	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	22.156	$ 2.132,00	$ 47.235.783,76	8200,00	$ 17.482.400,00	13955,6	$ 29.753.383,76	22155,6	$ 47.235.784,00	100,00%	0,00	$ -
2,0	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS	UND	18,00	$ 255.681,00	$ 4.602.258,00		$ -	-		0,0	$ -	0,00%	18,00	$ 4.602.258,00
3,0	EXCAVACION MECANICA	M3	248,83	$ 12.394,00	$ 3.084.009,81	248,83	$ 3.084.009,81			248,8	$ 3.084.010,00	100,00%	0,00	$ -
4,0	MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL DE AFIRMADO	M3	1.664,00	$ 58.952,00	$ 98.096.128,00	968,4	$ 57.088.350,22	286	$ 16.860.272,00	1254,4	$ 73.948.622,00	75,38%	409,61	$ 24.147.505,78
5,0	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MOTONIVELADORA	M3	41,00	$ 3.769.970,00	$ 154.568.770,00	16,70	$ 62.973.353,13	13,8	$ 52.099.883,10	30,5	$ 115.073.236,00	74,45%	10,48	$ 39.495.533,76
6,0	TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA	M3/KM	23.288,30	$ 2.757,00	$ 64.205.843,10	14593,14	$ 40.233.279,97	3575	$ 9.856.275,00	18168,1	$ 50.089.555,00	78,01%	5120,16	$ 14.116.288,13
7,0	TRANSPORTE CAMABAJA	KM	360,00	$ 31.637,00	$ 11.389.320,00	180,00	$ 5.694.660,00			180,0	$ 5.694.660,00	50,00%	180,00	$ 5.694.660,00
	COSTO DIRECTO				$ 383.182.112,67		$ 186.556.053,13		$ 108.569.813,86		$ 295.125.867,00			$ 88.056.245,68
	ADMINISTRACION	24%			$ 91.963.707,00		$ 44.773.452,75	24%	$ 26.056.755,33		$ 70.830.208			$ 21.133.499
	IMPREVISTO	1%			$ 3.831.821,13		$ 1.865.560,53	1%	$ 1.085.698,14		$ 2.951.258,67			$ 880.562
	UTILIDAD	5%			$ 19.159.106,00		$ 9.327.802,66	5%	$ 5.428.490,69		$ 14.756.293,35			$ 4.402.812,0
	COSTO TOTAL AIU				$ 114.954.634		$ 55.966.815,94		$ 32.570.944,16		$ 88.537.760,10			$ 26.416.873
	COSTO TOTAL				$ 498.136.747,0		$ 242.522.869,07	TOTAL	$ 141.140.758,02		$ 383.663.627,00			$ 114.473.119
	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2 DE 9 DICIEMBRE 2024					49%		28%		77%			23%	

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON DOS CENTAVOS MTC

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

R/L ZOBEIRO SEPULVEDA AREVALO
CONTRATISTA DE OBRA

WILLIAM VERA ARIAS
Ordenador del gasto

32


Gobernación de Norte de Santander

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N° 2	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**9-dic-24**
OBJETO	OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA OLA INVERNAL 2023, DE CONFORMIDAD CON EL RETORNO A LA NORMALIDAD ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 002623 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO.		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE 2024	**SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO		
ITEM **1,0**	ROCERIA Y LIMPIEZA	**UNIDAD**	m2

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO
		Long	Ancho	Altura			
corredor vial san calixto - hacari	labores de roceria y limpieza con una altura promedio de 2m	3500,00		2,00	7000,00	m2	7000,00
corredor vial san calixto teorama	labores de roceria y limpieza con una altura promedio de 2m	3478,00		2,00	6956,00	M2	6956,00
						TOTAL	13956,00

ESQUEMA

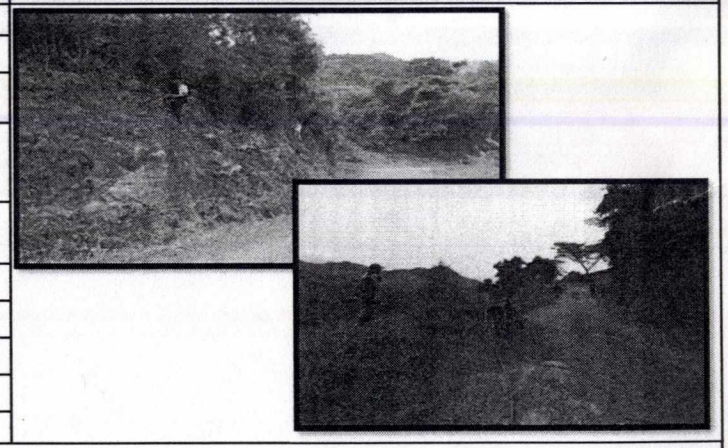

Firma:

Nombre: R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
CONTRATISTA DE OBRA

WILLIAM VERA ARIAS
SUPERVISOR


Gobernación de Norte de Santander

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N° 2	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**9-dic-24**
OBJETO	OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA OLA INVERNAL 2023, DE CONFORMIDAD CON EL RETORNO A LA NORMALIDAD ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 002623 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO.		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE 2024	**SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO		
ITEM	**4,0** MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL DE AFIRMADO	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO
		Long	Ancho	Altura			
corredor vial san calixto - hacari	CONFORMACION CALZADA	300,00	5,20	0,10		KM	156,00
corredor vial san calixto teorama	CONFORMACION CALZADA	250,0	5,20	0,10		KM	130,00
						TOTAL	286,00

ESQUEMA

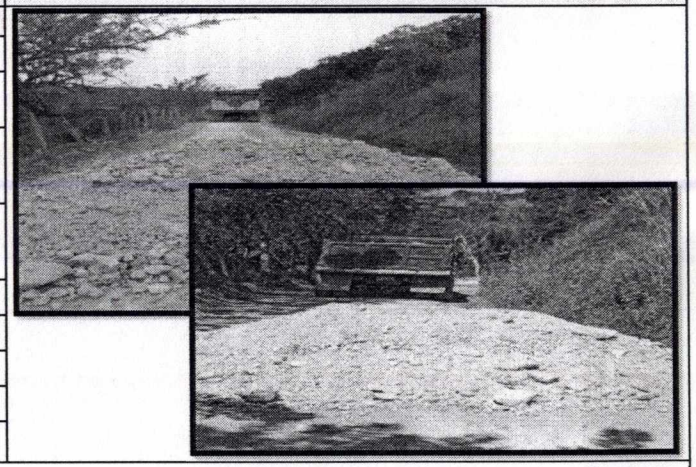

Firma:

Nombre: R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
CONTRATISTA DE OBRA


WILLIAM VERA ARIAS
SUPERVISOR

Gobernación de Norte de Santander

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N° 2	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**9-dic-24**
OBJETO	OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA OLA INVERNAL 2023, DE CONFORMIDAD CON EL RETORNO A LA NORMALIDAD ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 002623 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO.		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE 2024	**SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO		
ITEM **5,0**	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MOTONIVELADORA	**UNIDAD**	km

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Long	expa					
corredor vial san calixto - hacari	PERFILADO CUNETEO Y COMPACTADO	6,00				km	6,00	
corredor vial san calixto teorama	PERFILADO CUNETEO Y COMPACTADO	7,80				km	7,80	
					TOTAL		13,8	

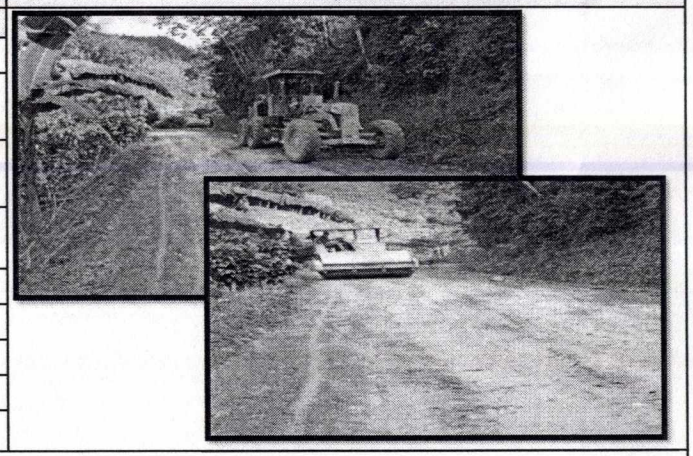

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
CONTRATISTA DE OBRA

WILLIAM VERA ARIAS
SUPERVISOR

35

Gobernación de Norte de Santander


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N° 2	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**9-dic-24**
OBJETO	OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA OLA INVERNAL 2023, DE CONFORMIDAD CON EL RETORNO A LA NORMALIDAD ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 002623 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO.		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE 2024	**SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO		

ITEM	**6,0**	TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA	**UNIDAD**	M3/KM

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			V. EXCAVA EXPA	DISTACIA	TOTAL
		VOLUMEN	Ancho	VOL PARC			ACUMULADO
corredor vial san calixto - hacari	MATERIAL CON VOLQUETA	182,00	1,25	227,50		10,00	2275,00
corredor vial san calixto teorama	MATERIAL CON VOLQUETA	104,00	1,25	130,00		10,00	1300,00
						TOTAL	3575,00

ESQUEMA

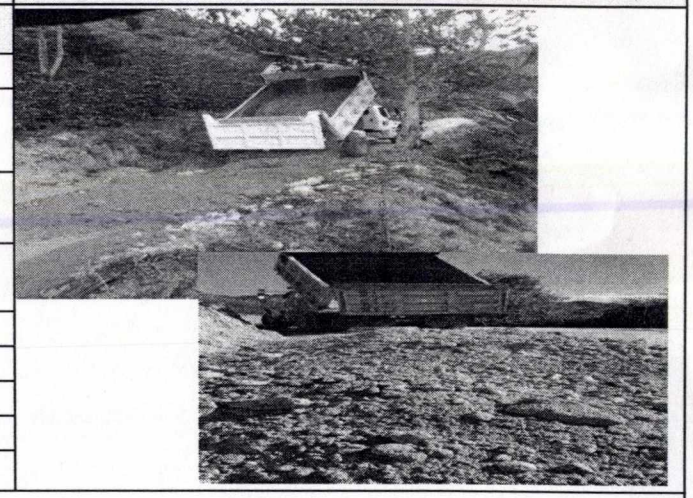

Firma:

Nombre: **R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO**
CONTRATISTA DE OBRA

WILLIAM VERA ARIAS
SUPERVISOR

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-04	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 28/05/18	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA MODIFICATORIA No. 1

FECHA DEL ACTA	4 DE DICIEMBRE 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. o N.I.T.	8 8. 1 4 1. 5 4 7
REPRESENTANTE	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
N.I.T O CC	8 8. 1 4 1 .5 4 7
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00)
PLAZO O DURACIÓN	60 DIAS
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	-
VALOR ACTA DE MODIFICACIÓN No 1	-
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	-
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 6 de noviembre de 2024
INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	6 de noviembre 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N/A
ACTAS DE MODIFICACIÓN	ACTA MOCIFICATORIA No 1

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaria Departamental para la gestión del Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: **WILLIAM VERA ARIAS**, Ordenador del Gasto por delegación – Secretaria Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, **LUIS FERNANDO BARON ORTIZ** apoyo a la supervisor y contratista **ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO C.C.** 8 8. 1 4 1 .5 4 7, con el fin de acordar EL ACTA MODIFICATORIA No 1 del contrato de obra en referencia, previas las siguientes

ACTA
MODIFICATORIA No. 1

consideraciones:

Se hizo necesario modificar aspectos técnicos y/o constructivos de la oba, con el fin de adaptarlo a las condiciones en el sitio a intervenir, así como darle mayor alcance al proyecto. Estos aspectos técnicos están orientados a garantizar una mayor estabilidad de la misma, debido a que las obras de arte u alcantarillas que se encuentran en la zona están en buen estado y no requieren mantenimiento por el momento, de la misma manera la comunidad manifiesta que ellos retiran capa vegetal que se deposita en estas estructuras para garantizar el flujo de agua lluvias y escorrentías que se presentan en la zona. Es importante aclarar que durante el recorrido de este corredor vial se presenta una falencia en la vía ya que no cuenta con las alcantarillas necesarias según diseños de vías y que esto genera un desgaste acelerado a la vía teniendo encuentra las condiciones climáticas de este sector.

Debido a las precipitaciones que se han estado presentando en la zona y a la inestabilidad de los taludes de este corredor vial se es necesario aumentar cantidades de excavación mecánica para lograr el retiro de derrumbes y así garantizar la transitabilidad y el buen uso de este eje vial de orden secundario,

se modifican las cantidades de obra como parece a continuación los cuales en el balance general no modifican el valor del contrato.

Teniendo en cuenta lo anotado en las consideraciones anteriores, las partes establecen y aprueban el cambio en el contrato en referencia,

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

WILLIAM VERA ARIAS
Ordenador del Gasto

LUIS FERNANDO BARON ORTIZ
SUPERVISOR

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
Contratista

Gobernación de Norte de Santander

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

ACTA No. 1 DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
CONTRATISTA : ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
INTERVENTOR: SECRETARIA DEPARTAMENTAL GESTION DEL RIESGO

CONTRATO No. **RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024**

Mediante la presente Acta,WILLIAM ARIAS VERA, Secretario Departamental para la Gestion del Riesgo, ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO, Representante Legal Contratista y LUIS FERNANDO BARON ORTIZ Apoyo a la Supervirsion SDGRD del contrato, dejan constancia de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia cuatro (4) del mes de Diciembre del año 2024, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			BALANCE No 1 CANTIDADES		BALANCE No 1 VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	22155,62	2.132,00	47.235.783,76			-	-	22.155,62	47.235.783,76
2.1	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS	UND	18,00	255.681,00	4.602.258,00		18,00	-	4.602.258,00	-	-
2.2	EXCAVACION MECANICA	M3	248,83	12.394,00	3.084.009,81	371,33		4.602.258,00	-	620,16	7.686.268,81
2.3	MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL DE AF	M3	1664,00	58.952,00	98.096.128,00			-	-	1.664,00	98.096.128,00
2.4	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MOTONIVELADORA	M3	41,00	3.769.970,00	154.568.770,00				-	41,00	154.568.770,00
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA	M3/KM	23288,30	2.757,00	64.205.843,10					23.288,30	64.205.843,10
3.1	TRANSPORTE CAMABAJA	KM	360,00	31.637,00	11.389.320,00			-	-	360,00	11.389.320,00
COSTOS DIRECTOS					383.182.112,67			4.602.258,00	4.602.258,00		383.182.113,67
	ADMINISTRACIÓN		24%		91.963.707,00			1.104.541,92	1.104.541,92		91.963.707,00
	IMPREVISTOS		1%		3.831.821,13			46.022,58	46.022,58		3.831.821,13
	UTILIDAD		5%		19.159.106,00			230.112,90	230.112,90		19.159.106,00
COSTOS INDIRECTOS					114.954.634,13			1.380.677,40	1.380.677,40		114.954.634,13
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					498.136.747			4.602.258,00	4.602.258,00		498.136.747,00
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS											

EL CONTRATISTA:

Firma:
Contratista: ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO

4/12/2024
FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: WILLIAM ARIAS VERA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
Ordenador del Gasto

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO BARON ORTIZ
INGENIERO SUPERVISOR CDGRD
CDGRD

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

INFORME DE OBRA

FECHA 9 DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO: 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONTRATO DE OBRA N°. RE-SGRD-03405-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
NIT: 8 8. 1 4 1. 5 4 7

CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARIA DEPARTAMENTAL PARA LA GESION DEL RIESGO DE DESASTRES

SAN JOSÉ DE CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER

2024

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO .

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. o N.I.T.	8 8. 1 4 1. 5 4 7
REPRESENTANTE LEGAL	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C.	8 8. 1 4 1 .5 4 7
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00)
PLAZO O DURACIÓN	60 DIAS
FORMA DE PAGO	Se realizara mediante pagos parciales, previa presentación de acta de recibo parcial, memorias de cantidades, factura correspondiente y demás documentos requeridos.

GARANTIAS Y AMPAROS DEL CONTRATO.

	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
Garantía Única. No. 56-44-101008829 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Cumplimiento del Contrato	$ 49.813.674.70	01/11/2024 al 30/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$24.906.837.35	01/11/2024 al 31/12/2027
	Estabilidad y calidad de obra	$ 149.441.024.10	1 AÑO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 56-40-101003860 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
			01/11/2024 hasta 31/12/2024
	Predios labores y operaciones	$ 260.000.000	

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

DESCRIPCION DE AVANCE DE OBRA.

El presente informe tiene como porposito dar a canococer el avance de obra que se lleva adelantando en el contrato RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024, cuyo objeto tiene como fin la atencion y mantenimientos a puntos críticos del corredor vial que conecta los municipios de Teorama-San Calixto- Hacari. Durante el periodo comprendido del 25 de noviembre del 2024 al 9 de Diciembre del 2024, se siguen adelantando aciones de roceria, perfilado, cuneteo, adicion de material y compactación de la via en mención. Durante este periodo de ejecución de las actividades que se describirán acontinuacion, se presentaron lluvias que generaron deslizamientos en algunos puntos los cuales ya se habían realizado trabajos, lo que ocasionaron un retroceso que se relizaron pero no aumentaron costo alguno al valor inicial del contrato ya que se contemplo dentro del valor establecido de imprevistos. De la misma forma en comuniciacion con el ingeniero Luis Fernando baron quien es el enlace de apoyo para la supervisión por parte de la secretaria departamental de gestión del riesgo, llevar a cabo un comité de obra para realizar un ajuste de cantidades mayores y menores al contrato en mención ya que el ITEM 2.0 LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS, no se requiere ejecutar y por ende el recurso el cual es un monto de $4.602.258,00, sea destinado a actividades de remoción de derrumbes los cuales han umentado su volumen por la inestabilidad de algunos taludes del corredor vial.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO		
1,0	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	$ 13.955,62
2,0	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS	UND	-
3,0	EXCAVACION MECANICA	M3	
4,0	MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL DE AFIRMADO	M3	$ 286,00
5,0	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MOTONIVELADORA	M3	$ 12,00
6,0	TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA	M3/KM	$ 6.063,30
7,0	TRANSPORTE CAMABAJA	KM	

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

Teniendo en cuenta las cantidades inicales con respecto a las presentadas actualmente el porcentaje de avance del acta parcial 2 es de un 28% y un avance general de 77 % ejecutado durante la fecha de inicio a dia de hoy 9 de diciembre, en un tiempo estimado de 33 dias sobre 60 lo que nos da un porcentaje 55 %.

1. AVANCE DE TIEMPO

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO: 33 dias / 60 dias

AVANCE PORCENTUAL: 55 %

Realizando una relación de avance de obra y tiempo de ejecución, nos encontramos dentro de los limites estableciodos dentro del contrato generando un avance considerable.

LAS ACTIVIDADES SE DESCRIBEN UNA A UNA EN LA SIGUIENTE TABLA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EJECUTADO	%
ROCERIA Y LIMPIEZA	22.156	100






ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EJECUTADO	%
CONFORMACION DE CALZADA CON MOTONIVELADORA	28,7	70,01%

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.



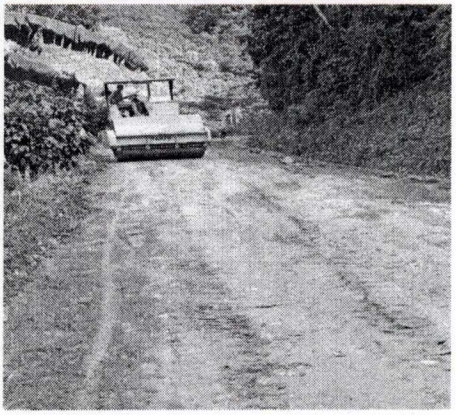


ACTIVIDAD	CANTIDAD	
MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL	EJECUTADO	%
	1254,4 M3	75,38%





ACTIVIDAD	CANTIDAD	
TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA	EJECUTADO	%
	20656,4	88,70%

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

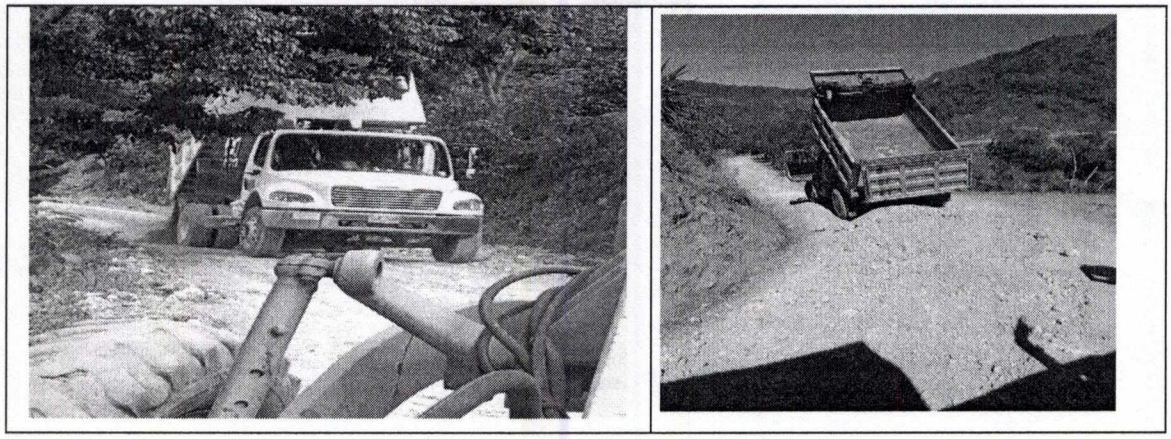

Descripción de trabajos realizados durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 9 diciembre 2024

- semana 4 que inicia el dia 26 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2024

se continúan con las labores de roceria sobre la via en los sectores de la quina, palmarito y la teja, asi mismo se llevan a cabo las actividades de confromacion de via, realizando labores con los escarificadores ya que en unos puntos se presenta terrenos duros con presencia de rocas que impiden el la nivelación de la via con la cuchilla. De igual forma se esta llevando a cabo labores de compactación una vez la motonivelaroda extienda el material se procede a realizar esta actividad, ya que un suelo compactado es menos susceptible a deformaciones y movimientos, lo que reduce el riesgo de hundimientos y grietas, y por ser una zona propicia a la presencia de lluvias se sella para evitar que se generen cárcavas que ocaciones retrocesos en los trabajos.

El dia 25 de noviembre en horas de la noche se presento un fuerte aguacero lo que ocasiono un derrumbe que obstruyo la via e impidió el paso a cualquier tipo de vehiculo, el dia 26 se de noviembre se procede a desplazar la pajarita y volqueta para realizar las labores de retiro de derrumbes y asi restablecer la comunicación de los municipios de teorama con san calixto.

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.







Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

- Semana 5 desde 2 diciembre hasta el 7 diciembre 2024

Durante esta semana se presenta un clima seco lo que nos ayudo a adelantar los trabajos de suministro de material afirmado para extender, sobre los puntos que se requerían en el sector de palmarito entre el municipio de san Calixto y teorama y asi llevar a cabo las actividades de conformación y compactación del mismo.

El segundo frente de trabajo que se ubica sobre hacari- san Calixto se encuentra adelantando acciones en los puntos compredidos entre la vereda la pelota que es jurisdicción del municipio de hacari y vereda potrero grande que pertenece a san Calixto.

2. ASPETOS HUMANOS

Para el presente contrato, se realizaron las correspondientes afiliaciones al sistema de seguridad social (riesgos laborales, salud y fondo de pensiones) del personal que participo en la ejecución de las actividades contractuales.
De igual manera, se superviso el uso de los elementos de protección personal de los trabajadores como mecanismo de prevención de eventos que pudiera afectar la integridad del talento humano que hace parte de la ejecución del contrato y se realizaron actividades periodicas de revisión de la maquinaria


Anexo. Planilla de Seguridad Social

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

REGISTRO FOTOGRAFICO


1. Roceria, se realizaron cerca de 3.5 km con una altura promedia de 2 metros en los sectores de la quina, palmarito y la teja. 3.5 en el sector de la pelota -potrero grande.



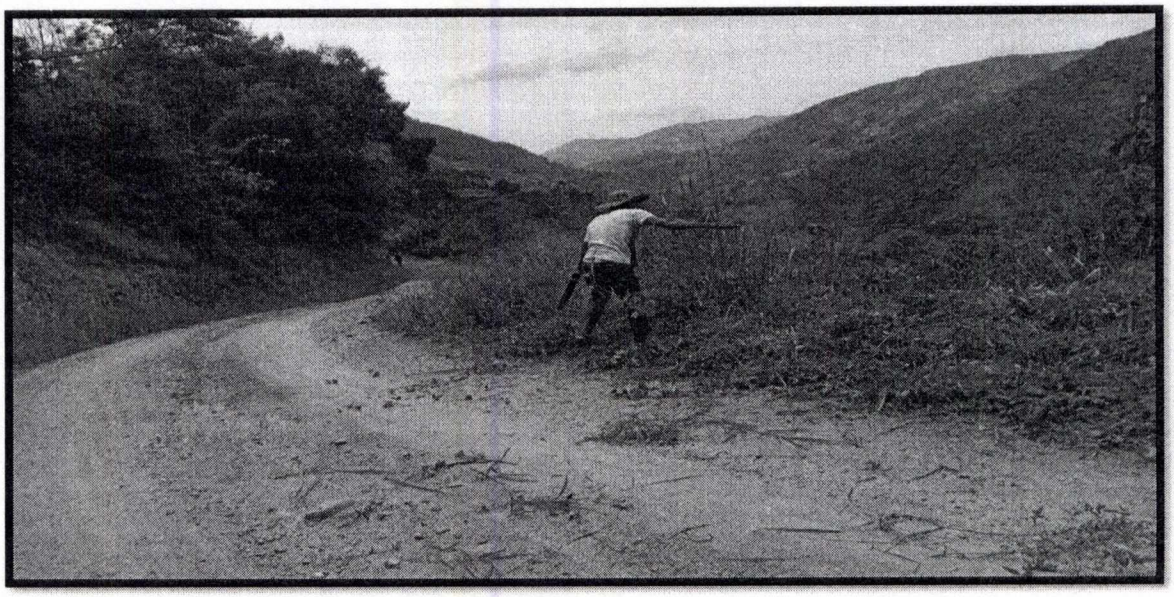

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

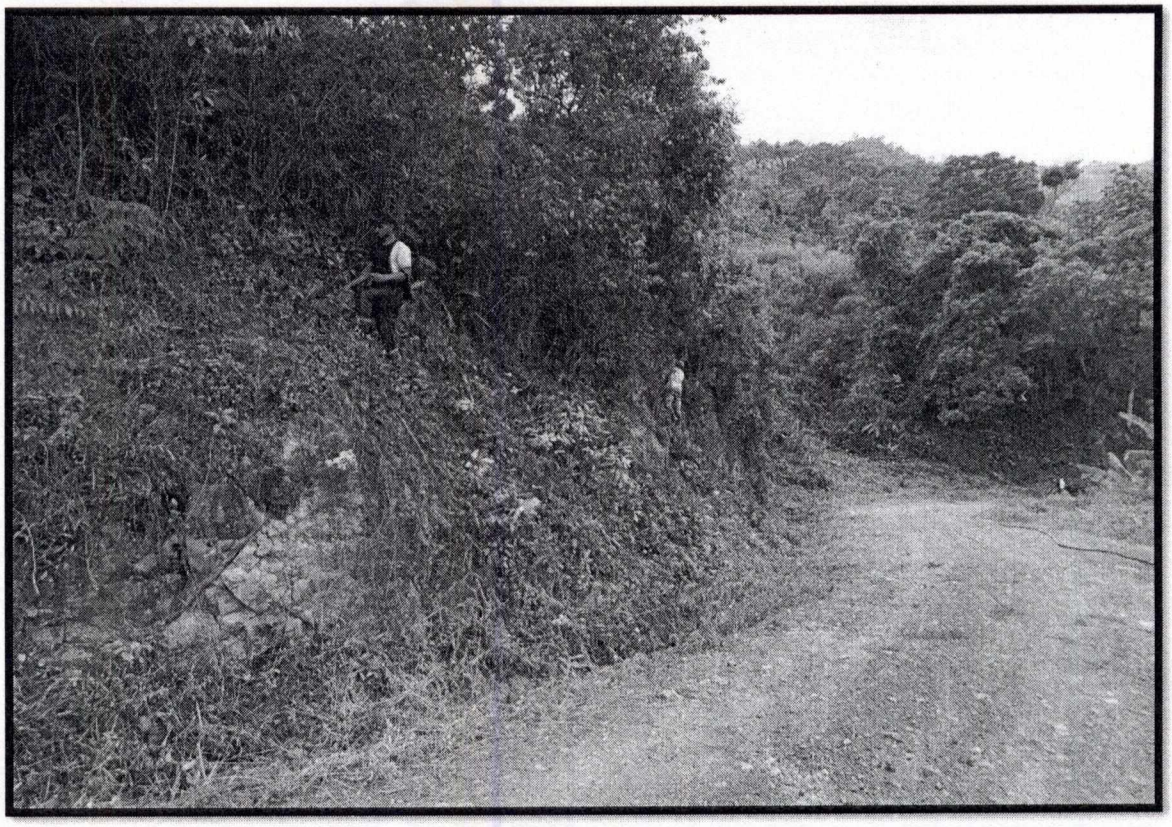



Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.


2. Mejoramiento de la calzada adicionando material de afirmado, la via presenta varios puntos críticos que requieren la instalación de material para llenar vacíos, extender con la motoniveladora y compactar para garantizar la estabilidad de la obra, se instalo material en una longitud de 550 metros lineales que requerían con un ancho de 5.20 y un espesor de 10 cm promedio entre la vereda la quina y palmarito.






Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

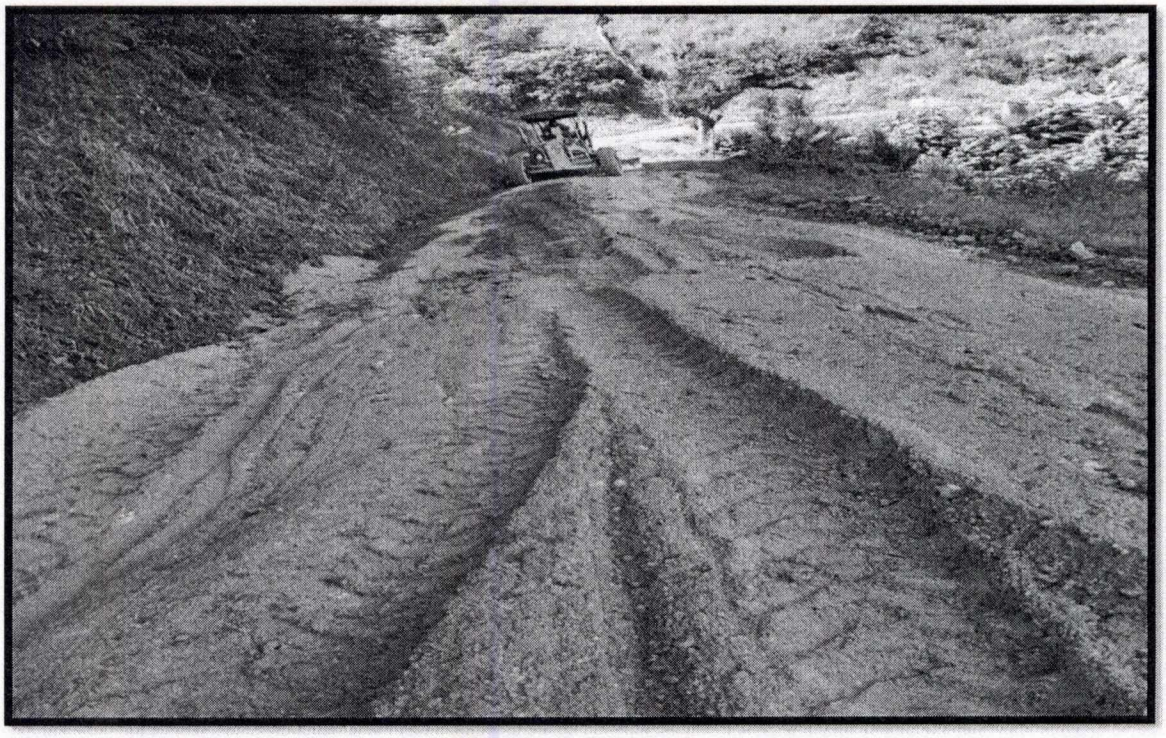

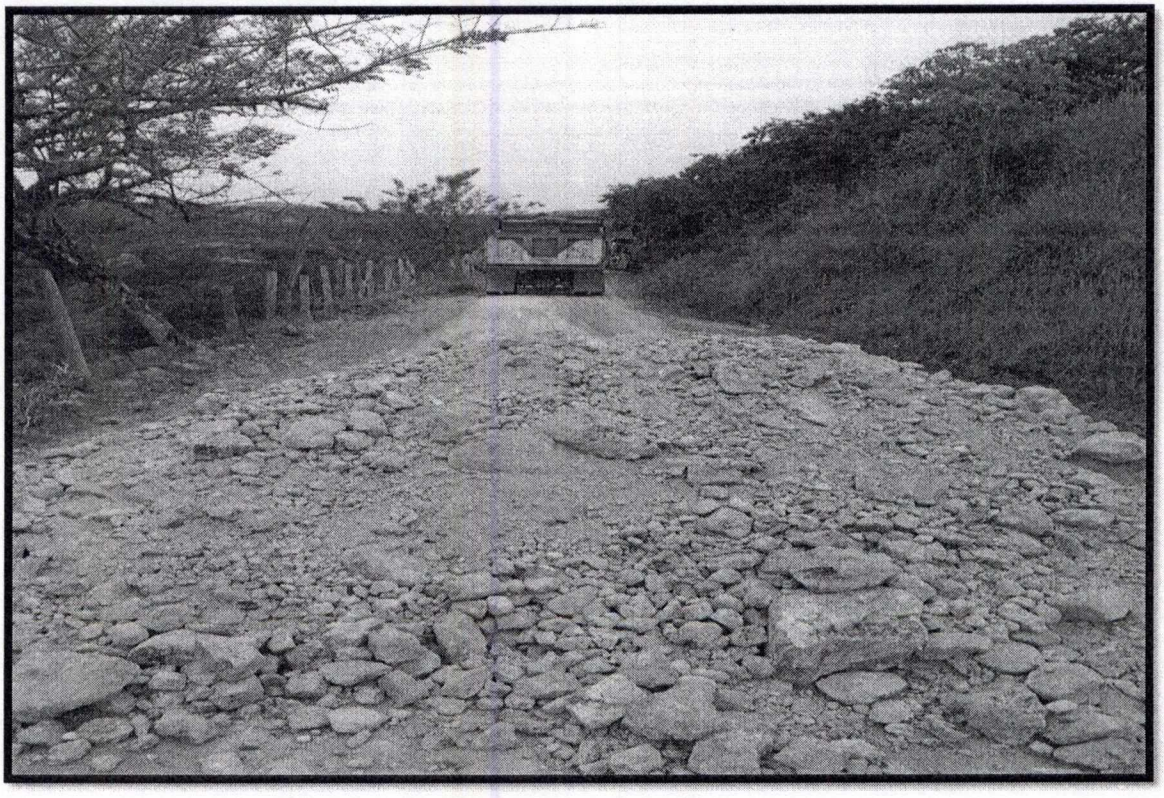

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.


3. Conformación de calzada con motoniveladora y virbrocompactador, se adelantan acciones a la par entre las vias de los municipios que une a teorama con san Calixto, y san Calixto con hacari.






Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

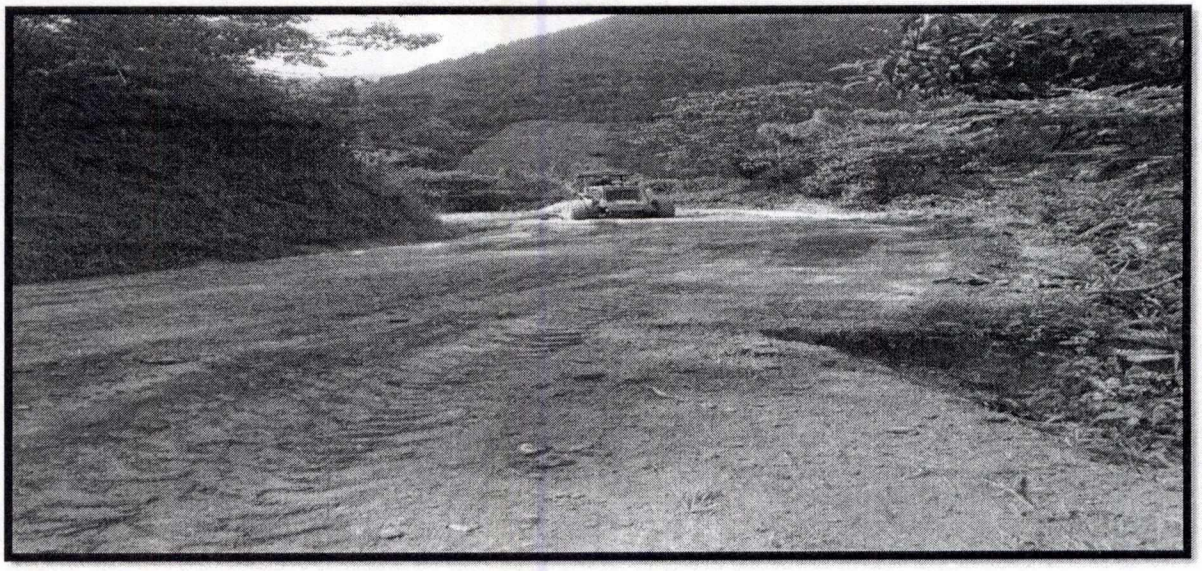

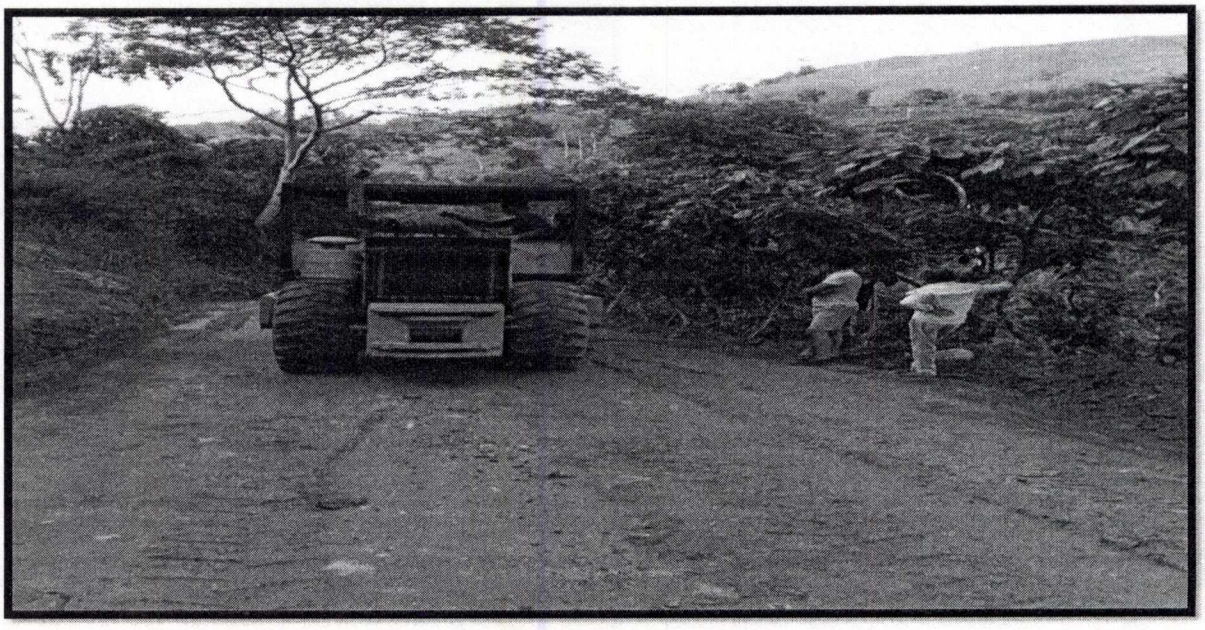

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. 88.141.54
CONTRATISTA

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

IMPREVISTOS

A continuación, se relaciona lo correspondiente al valor cobrado por imprevistos, y las actividades que se ejecutaron, ha de aclararse que estos no dan un mayor valor al contrato, pero que además de justificar lo cobrado se quiere dejar evidencia de lo realizado.

El ítem que se relaciona a continuación y que se encuentra consolidado en la tabla anexa a este documento, va debidamente soportado con su correspondiente análisis de precios unitarios APU, como con su memoria de cantidades. (aquellos que lo requieran).

Es de anotar que la actividad que se realizó es en pro del mejoramiento de la obra y de las zonas circundantes a ella, y se ha llevado a cabo con los mecanismos de seguridad necesarios y con información previa al secretario departamental de gestión del riesgos el ingeniero William Vera Arias y al ingeniero Fernando barón ingeniero apoyo a la secretaria departamental de gestión del riesgo durante su visita técnica al sitio de trabajo.

DESCRIPCION DE IMPREVISTOS.

El dia 25 de noviembre en horas de la noche se presento un fuerte aguacero lo que ocasiono un derrumbe que obstruyo la via e impidió el paso a cualquier tipo de vehiculo, el dia 26 se de noviembre se procede a desplazar la pajarita y volqueta para realizar las labores de retiro de derrumbes y asi restablecer la comunicación de los municipios de teorama con san calixto.





ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.



A continuación relaciono ítem y APU para retiro de derrumbes

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

IMPREVISTOS

CONTRATO DE OBRA RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024

MANTENIMIENTO E INTERVENSION CORREDOR VIAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO				
3,0	EXCAVACION MECANICA	M3	87,60	$ 12.394,00	$ 1.085.698,14

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM RETIRO DE DERRUMBES CON RETROCARGADOR SOBRE LLANTAS — **UNIDAD :** M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
COSTO DE OPERACIÓN RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP	Hora	78.000,00	50,00	1.560,00	
HERRAMIENTA MENOR (% S./M.O)			10,00	788,57	
				Sub-Total	2.348,57

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
1 Ayudante	$ 46.000,00	120,00%	55.200,00	7,00	7.885,71	
					Sub-Total	7.885,71
				Total Costo Directo		10.234,00

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. 88.141.54

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com
