
Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN NO. 3

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO DE ADMINISTRACION SI-031-2023

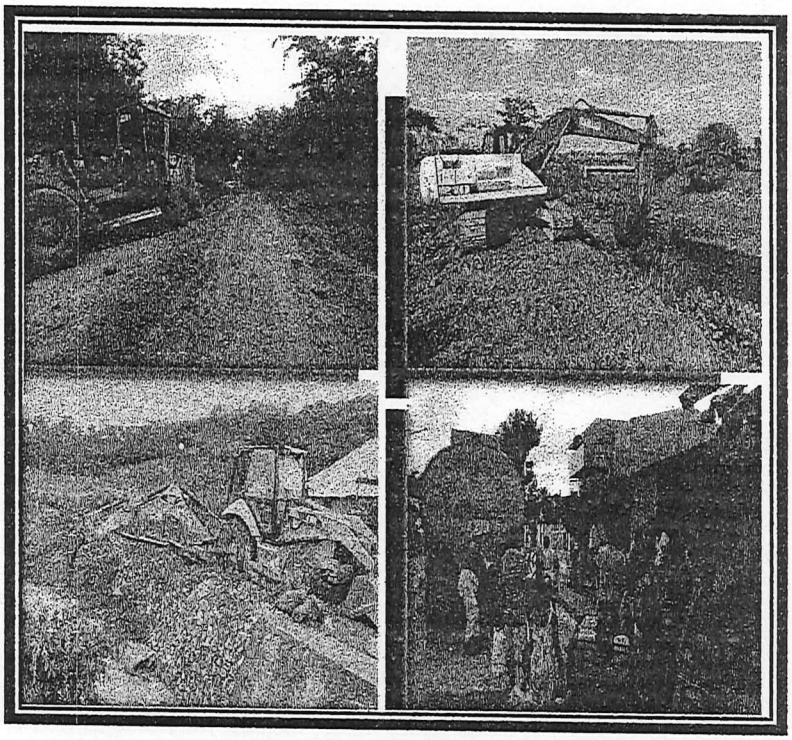

"ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, PARA MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA Y MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, EN VIRTUD DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL Nº 0282 DEL 2023 POR AFECTACIONES DE MOVIMIENTO DE MASA Y DESLIZAMIENTO DE SUELOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL VOLCÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA "

PERIODO: 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.

DICIEMBRE 2023

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION Y INTERVENTORIA. 5
3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONTRATO SI-031-2023 6
4. LISTADO DE MAQUINAS Y VEHICULOS PERTENECIENTES AL BANCO DE MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION 7
5. POLIZAS 8
6. INFORMACION FINANCIERA 9
7. DESARROLLO DE LOS CONTRATOS 9
COMUNICACIÓN 9
NO RADICADO 9
FECHA RADICADO 9
REMITENTE 9
DESTINATARIO 9
OBSERVACIONES 9
2053 9
19/09/2023 9
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 9
FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA 9
SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON RESPECTO A ACTA DE INICIO. 9
8. PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO DE ADMINISTRACION. 9
9. ANEXOS 10
10. INFORME TECNICO 10
11. OBSERVACIONES 11
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO 12

65

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El Departamento de Córdoba posee cerca de 6.980km de carreteras, distribuidas por su nivel de jerarquía en primarias, secundaria y terciarias, de acuerdo a su plan de desarrollo departamental; 574km corresponden a red vial primaria a cargo de la nación, 590km corresponden a red vial segundaria a cargo del Departamento de Córdoba, 5,816km corresponden a red vial terciaria de los cuales 959Km están a cargo del Instituto Nacional de Vías INVIAS y 4857Km están a cargo de los municipios.

El Departamento cuenta con siete (7) ejes principales, estos recorren todo el territorio departamental y se encargan de integrar los aspectos sociales, culturales, ambientales, turísticos, abarcando en su mayoría todo el departamento sin dejar ninguna población incomunicada con la cabecera que hace parte de dichos ejes. Estos ejes viales están conformados por vías secundarias y que a su vez tienen conectividad con vías terciarias municipales y departamentales. Según el plan vial departamental, Córdoba presenta déficit de vías que comunican las diferentes subregiones, como es la del Alto Sinú y San Jorge, zona que representa un auge en el desarrollo por la explotación de recursos minerales (Níquel y Carbón) y la hidroeléctrica de Urrá y en especial los cultivos de maracuyá, cacao y ganadería.

Es decir, con la priorización de las redes viales del departamento se garantizaría la ejecución de productos, sabiendo que Córdoba tiene gran variedad, siendo la carne, leche y el níquel los de mayor exportación, sin embargo, en cada uno de los municipios hay productos que identifican la economía de las regiones; Por tanto los ejes garantizan la ejecución de cada uno, podrán ser transportados y comercializados en otras ciudades, municipios y departamentos y con ello la población es servida por los estos tramos, mejorando la calidad de vida y, en general, la economía de todo el Departamento.

Debido a los diferentes sismos presentados en aguas del mar Caribe, presentados el pasado 24 de mayo de 2023, específicamente en la región fronteriza de Colombia y Panamá, los cuales se sintieron en gran parte del departamento de Córdoba, lo cual, sumado a las características geológicas propias de la zona, pudo ser un factor de gran relevancia en la generación de estos agrietamientos. Se generó en el municipio de Puerto Escondido, Córdoba, agrietamientos y fracturamiento de terreno, asociados a volcanismo de lodo; la CAR-CVS mediante concepto técnico GGR CT 2023 - 805, la CAR-CVS rindió Concepto Técnico de inspección y verificación a problemática de movimientos en masa y deslizamientos de suelos presentados en zona de influencia del volcán de lodo en jurisdicción del municipio de Puerto Escondido, departamento de Córdoba, dicho informe recomendó Hacer un monitoreo visual diario de las bocas de los volcanes de lodo, tanto de las que están activas como de las inactivas. Prestar especial atención a la aparición y formación de agrietamientos, formación de nuevas bocas, la disminución súbita del burbujeo (burbujas/minuto) o la expulsión violenta de gases y reporte de ruidos en el interior de la estructura volcánica de lodo. En razón de que el diapirismo de lodos es un fenómeno de deformación del terreno, se recomienda revisar la estabilidad de

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

viviendas e infraestructuras civiles localizadas en la cima y los flancos de los volcanes de lodo. Así mismo, es importante evaluar los riesgos de la infraestructura localizada en zonas con volcanismo de lodo y tomar medidas de mitigación o procurar su relocalización. Se recomienda evacuar a la comunidad que se encuentra en un radio de 500 m y en la zona más baja de la pendiente, la cual es vulnerable ante eventos de deslizamientos de tierra, estos albergues o zonas de reubicación deben estar ubicados en zonas seguras, alejadas de las actividades volcánicas y de deslizamientos. Establecer medios de comunicación preventiva, como la comunicación vía radio, telefónica y radiotelefónica, que permitan dar información pertinente frente al riesgo latente frente a la emisión de gases y lodos y la inestabilidad del suelo. Se recomienda evacuar a la comunidad que se encuentra en un radio de 500 m y en la zona más baja de la pendiente, la cual es vulnerable ante eventos de deslizamientos de tierra, estos albergues o zonas de reubicación deben estar ubicados en zonas seguras, alejadas de las actividades volcánicas y de deslizamientos. Establecer medios de comunicación preventiva, como la comunicación vía radio, telefónica y radiotelefónica, que permitan dar información pertinente frente al riesgo latente frente a la emisión de gases y lodos y la inestabilidad del suelo. por lo anterior se declaró situación de calamidad pública en el departamento de córdoba con ocasión a la problemática de movimientos en masa y deslizamientos de suelos presentados en zona de influencia del volcán de lodo en jurisdicción del Municipio De Puerto Escondido, Departamento De Córdoba

La Gobernación e Córdoba se vio en la necesidad de contratar la administración de un banco de maquinaria amarilla perteneciente al banco de máquinas de la gobernación de Córdoba, la cual bajo el proceso de contratación directa SI-031-2023, el cual inicio su ejecución el día 19 de septiembre de 2023 por el señor FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA identificado con cedula de ciudadanía N° 15.042.556 de Sahagún – Córdoba, el contrato de administración de maquinaria cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, PARA MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA Y MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, EN VIRTUD DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL Nº 0282 DEL 2023 POR AFECTACIONES DE MOVIMIENTO DE MASA Y DESLIZAMIENTO DE SUELOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL VOLCÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA " estipulándose un plazo de tres (3) meses, por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE. ($554.037.501 M/CTE.), contado su inicio de ejecución partir de la suscripción del acta de inicio.

El día diecinueve (19) día del mes de septiembre de 2023, se realiza la entrega de la maquinaria objeto de ejecución del contrato de administración, bajo acta de recibo de maquinaria y vehículo anexando ficha técnica de inspección de los mismos.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION Y INTERVENTORIA.

CONTRATO PARA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION DE CORDOBA

CONTRATO N°	SI-031-2023
OBJETO	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, PARA MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA Y MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, EN VIRTUD DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL Nº 0282 DEL 2023 POR AFECTACIONES DE MOVIMIENTO DE MASA Y DESLIZAMIENTO DE SUELOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL VOLCÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA	FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C. 15.042.556 de Sahagún Córdoba.
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE. ($554.037.501 M/CTE.)
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	18 DE DICIEMBRE DE 2023

Información básica contractual – Contrato De Administración de Maquinaria

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

3. PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL CONTRATO SI-031-2023

PRESUPUESTO CONTRATADO

A continuación, el presupuesto con referencia al contrato de administración:

Fidel Oviedo Macea
Ingeniero Civil

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

PRESUPUESTO CONTRATO SI-031-2023 "ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, PARA MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA Y MITIGACIÓN DE PUNTOS CRITICOS, EN VIRTUD DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL NO 0282 DEL 2023 POR AFECTACIONES DE MOVIMIENTO DE MASA Y DESLIZAMIENTO DE SUELOS EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL VOLCÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

DURACIÓN: 3,00 MESES

ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACIÓN	DURACIÓN (MES)	VR. MES	VR. TOTAL
A	COSTOS DE PERSONAL					
1	PERSONAL PROFESIONAL					
1.1	Ingeniero administrador y coordinador de maquinaria amarilla	1	25%	3,00	$ 4.421.250	$ 3.315.938,00
1.2	Inspector de operación y mantenimiento	1	100%	3,00	$ 4.421.250	$ 13.263.750,00
1.2	Inspector de obra civil	1	25%	3,00	$ 4.421.250	$ 3.315.938,00
	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL					$ 19.895.626,00
2	OPERARIOS Y CONDUCTORES					
2.1	Operario Motoniveladora	1	100%	3,00	$ 1.801.779	$ 5.405.337,00
2.2	Operario Vibrocompactador	1	100%	3,00	$ 1.801.779	$ 5.405.337,00
2.3	Operario Retroexcavadora sobre llantas	1	100%	3,00	$ 1.801.779	$ 5.405.337,00
2.4	Conductor Carrotanques	1	100%	3,00	$ 1.801.779	$ 5.405.337,00
2.5	Conductor Volquetas	2	100%	3,00	$ 1.801.779	$ 10.810.674,00
	COSTOS DE OPERARIOS Y CONDUCTORES					$ 32.432.022,00
3	PERSONAL TECNICO					
3.1	Tecnologo de reparación de maquinaria pesada	1	100%	3,00	$ 2.094.276	$ 6.282.828,00
3.2	Técnico auxiliar de maquinaria pesada	1	100%	3,00	$ 1.801.779	$ 5.405.337,00
	COSTOS DE PERSONAL TECNICO					$ 11.688.165,00
					SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL	$ 64.015.813,00
					FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2,20
A	TOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 140.834.789,00
B	COSTOS DE OPERACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR / UNITARIO	VR / TOTAL
4	COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN					$ 36.000.000,00
4.1	Alquiler de un vehiculo tipo PickUp modelo mínimo 2015, incluye conductor, peajes y combustible.		MES	3,00	$ 12.000.000	$ 36.000.000,00
5	COSTO SEÑALIZACIÓN, SEGUROS, CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO					$ 275.942.353,00
5.1	Implementación de plan de SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA e implementación de plan SST y PMA		MES	3,0	$ 5.500.000	$ 16.500.000
5.2	Combustibles, aceites, filtros, peajes para movimiento de maquinas y otros consumibles (Monto agotable según comprobantes)		UND	1,0	$ 135.236.089	$ 135.236.089
5.3	Suministro (Repuestos) y mano de obra de insumos para mantenimiento (Monto agotable según comprobantes).		UND	1,0	$ 124.206.264	$ 124.206.264
6	OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 3.600.000,00
6.1	Reproducción de documentos, informes, registros fotograficos, comunicaciones, etc		MES	3,00	$ 1.200.000	$ 3.600.000,00
B	TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN					$ 315.542.353,00
	ADMINISTRACIÓN (24%)					$ 75.730.165,00
	UTILIDAD (5%)					$ 15.777.118,00
	IMPREVISTOS (1%)					$ 3.155.424,00
	IVA (19%)					$ 2.997.652,00
	TOTAL (B)					$ 413.202.712,00
	TOTAL COSTOS (A+B)					$ 554.037.501,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

4. CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

A continuación, cantidades contractuales ejecutadas en el periodo en mención:

Fidel Oviedo Maceo
Ingeniero Civil

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO DE ADMINISTRACION SI-031-2023

CONTRATO DE ADMINISTRACION N°SI-031-2023 "ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, PARA GOBERNACION DE CORDOBA - FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA

PERIODO: DEL 19 DE SEPTIEMBRE HASTA 18 DE OCTUBRE DE 2023
DURACIÓN: 1,00 MESES

ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACIÓN	DURACIÓN (MES)	VR. MES	VR. TOTAL
A	COSTOS DE PERSONAL					
1	PERSONAL PROFESIONAL					
1,1	Ingeniero administrador y coordinador de maquinaria amarilla	1	25%	1,00	$ 4.421.250	$ 1.105.313,00
1,2	Inspector de operación y mantenimiento	1	100%	1,00	$ 4.421.250	$ 4.421.250,00
1,3	Inspector de obra civil	1	25%	1,00	$ 4.421.250	$ 1.105.313,00
	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL					$ 6.631.876,00
2	OPERARIOS Y CONDUCTORES					
2,1	Operario Motoniveladora	1	100%	1,00	$ 1.801.779	$ 1.801.779,00
2,2	Operario Vibrocompactador	1	100%	1,00	$ 1.801.779	$ 1.801.779,00
2,3	Operario Retroexcavadora sobre llantas	1	100%	1,00	$ 1.801.779	$ 1.801.779,00
2,4	Conductor Carrotanques	1	100%	1,00	$ 1.801.779	$ 1.801.779,00
2,5	Conductor Volquetas	2	100%	1,00	$ 1.801.779	$ 3.603.558,00
	COSTOS DE OPERARIOS Y CONDUCTORES					$ 10.810.674,00
3	PERSONAL TECNICO					
3,1	Tecnologo de reparación de maquinaria pesada	1	100%	1,00	$ 2.094.276	$ 2.094.276,00
3,2	Técnico auditor de maquinaria pesada	1	100%	1,00	$ 1.801.779	$ 1.801.779,00
	COSTOS DE PERSONAL TECNICO					$ 3.896.055,00
					SUBTOTAL COSTO DEL PERSONAL	$ 21.338.805,00
					FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2,20
A	TOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 46.944.931,00
B	COSTOS DE OPERACIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VR / UNITARIO	VR / TOTAL
4	COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN					$ 12.000.000,00
4,1	Alquiler de un vehículo tipo PickUp modelo mínimo 2015, incluya conductor,		MES	1,00	$ 12.000.000	$ 12.000.000,00
5	COSTO SEÑALIZACIÓN, SEGUROS, CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO					$ 101.835.982,00
5,1	Implementación de plan de SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA		MES	1,0	$ 5.500.000	$ 5.500.000
5,2	Combustibles, aceites, filtros, peajes para movimiento de maquinas y otros		UND	1,0	$ 49.361.173	$ 49.361.173
5,3	Suministro (Repuestos) y mano de obra de insumos para mantenimiento (Monto		UND	1,0	$ 46.974.809	$ 46.974.809
6	OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 1.200.000,00
6,1	Reproducción de documentos, informes, registros fotograficos, comunicaciones,		MES	1,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000,00
B	TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN					$ 119.035.982,00
	ADMINISTRACIÓN (24%)					$ 27.608.636,00
	UTILIDAD (5%)					$ 5.751.799,00
	IMPREVISTOS (1%)					$ 1.150.360,00
	IVA (19%)					$ 1.092.842,00
	TOTAL (B)					$ 150.639.619,00
	TOTAL COSTOS (A+B)					$ 197.584.550,00

5. LISTADO DE MAQUINAS Y VEHICULOS PERTENECIENTES AL BANCO DE MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION

A continuación, listado de las maquinas entregas el 19 de septiembre de 2023, para la ejecución del contrato de administración de maquinaria:

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

MAQUINARIA PERTENECIENTE AL BANCO DE MAQUINAS DE LA GOBERNACION DE CORDOBA

No	TIPO DE MAQUINA	PLACA	MARCA	MODELO	LINEA	COLOR	NUMERO DE SERIE	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS
1	CAMION-CARROCERIA:TANQUE	OCM 672	CHEVROLET	2015	FVZ	BLANCO	9GDFVZ34BF8003085	6HK1-655507	9GDFVZ34BF8003085
2	MOTONIVELADORA	MC003314	CATERPILLAR	2013	120K	AMARILLO	CAT0120KCSZN01668	KMK5083	N/A
3	RETROEXCAVADORA SOBRE RODADURA	MC006980	CATERPILLAR	2013	416E	AMARILLO	CAT0416DHMFGC8547	G4D48382	N/A
4	VIBROCOMPACTADOR	MC006980	BOMAG	2013	BW177DH-4	AMARILLO	101584101055	11495548	101584101055
5	VOLQUETA	OCM 666	CHEVROLET	2013	FTR	BLANCO	9GDFTR34ED8003094	6HK1-652756	9GDFTR34ED8003094
6	VOLQUETA	OCM 669	CHEVROLET	2013	FTR	BLANCO	9GDFTR34ED8003094	6HK1-652756	9GDFTR34ED8003094

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

6. POLIZAS

CONTRATO DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA N° SI-031-2023

La siguiente tabla presenta la información de los amparos y montos que cubren las garantías de las pólizas del contrato SI-031-2023y actualizaciones con respecto al acta de inicio que constituyo el contratista con la aseguradora.

CONDICIONES DE CONTRATO DE ADMINISTRACION					
TOMADOR: FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA			ASEGURADO: GOBERNACION DE CÓRDOBA.		
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	N° POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*53-44-101028268*	11/09/2023	30/06/2024	$ 55.403.750,10
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*53-44-101028268*	11/09/2023	30/06/2024	$ 166.211.250,30
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*53-44-101028268*	11/09/2023	31/12/2026	$ 55.403.750,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*53-44-101028268*	11/09/2023	30/06/2024	$ 55.403.750,10
RESPONSABILIDAD CIVIL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*53-40-101009295*	11/09/2023	11/12/2023	$ 232.000.000,00

CONDICIONES DE ACTA DE INICIO					
TOMADOR: FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA			ASEGURADO: GOBERNACION DE CÓRDOBA.		
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	N° POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*53-44-101028268*	19/09/2023	08/07/2024	$ 55.403.750,10
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*53-44-101028268*	19/09/2023	08/07/2024	$ 166.211.250,30
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*53-44-101028268*	19/09/2023	08/01/2027	$ 55.403.750,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*53-44-101028268*	19/09/2023	08/07/2024	$ 55.403.750,10
RESPONSABILIDAD CIVIL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*53-40-101009295*	19/12/2023	19/12/2023	$ 232.000.000,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

7. INFORMACION FINANCIERA

CONTRATO DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA

Valor del contrato de administración corresponde a la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE. ($554.037.501 M/CTE.)

En el presente periodo comprendido entre 19 de noviembre de 2023 hasta el 18 de diciembre de 2023, en la Gobernación de Córdoba se tramito pago al contratista, relacionado a continuación:

CONCEPTO DE PAGO	VALOR	FECHA	VALOR CANCELADO	SALDO
PAGO ANTICIPADO 30% VALOR DEL CONTRATO	$166,211,250,00	29 SEPTIEMBRE 2023	$166,211,250,00	$ 387.826.251,00

8. DESARROLLO DE LOS CONTRATOS

COMUNICACIÓN				
No RADICADO	FECHA RADICADO	REMITENTE	DESTINATARIO	OBSERVACIONES
2053	19/09/2023	Secretaria De Infraestructura	Fidel Antonio Oviedo Macea	Solicitud de actualización de pólizas con respecto a acta de inicio.

9. PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO DE ADMINISTRACION.

De acuerdo al informe mensual N°3 presentado por el contratista y verificado por la supervisión de contrato, el avance del contrato para la Administración del banco de maquinarias del Departamento de Córdoba, comprendido entre el 19 de noviembre de 2023 hasta el 18 de diciembre del 2023 es:

CONTRATO PARA LA ADMINISTRACION DE LA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA					
AVANCE	VALOR ACTA	%	VALOR ACOMULADO	% ACOMULADO	% PROGRAMADO
19/09/2023 HASTA 18/10/2023	$174.980.988,00	31.58	$174.980.988,00	31.58	33.33
19/10/2023 HASTA 18/11/2023	$181.471.963,00	32.75	$356.452.951,00	64.33	66.66

72

19/11/2023 HASTA 18/12/2023	$197.584.550,00	35.67	$554.037.501,00	100	100

10. ANEXOS

Toda la información que plasmada en este informe esta soportada con los informes que están en las carpetas de los expedientes del contratista y supervisión para la administración de la maquinaria del Departamento de Córdoba.

11. INFORME TECNICO

En el periodo comprendido entre 18 de noviembre de 2023 hasta el 19 de diciembre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó entrega de 6 máquinas y vehículos pertenecientes al banco de máquinas de la gobernación de córdoba, por parte de la gobernación de córdoba para la ejecución del contrato de administración de maquinaria.
- Se realizó supervisión a los mantenimientos preventivos y correctivos (cambio de aceite de motor – transmisiones y sus respectivos filtros, cambio de transmisiones a volquetas, cambio de llantas motoniveladora) previos para iniciar correctamente la ejecución del contrato.
- Carrotanque: OCM672 se realizó mantenimiento general, engrase general, lavado - reposición de soportes de motor cambio de volanta, sensor de caja, 4 llantas traccion 12R22.5.
- Motoniveladora: MC003314 se realizó mantenimiento general, engrase general, lavado.
- Retrocargadora: MC002206 se realizó inspección general, mantenimiento general, lavado, engrase - desmonte de brazo para mantenimiento y cambio de bujeria desmonte de radiador para mantenimiento preventivo mantenimiento bomba hidráulica relleno en soldadura a piezas de balde y brazo, cambio de turbo.
- Volqueta: OCM669 se realizó inspección general, mantenimiento general, lavado - válvula de freno válvula de recirculación de gases.
- Volqueta: ocm666 se realizó inspección general, mantenimiento general, lavado, engrase - 2 llantas direccionales 12R22.5 , cuerpo de aceleración, mantenimiento a toma fuerza para gato de levante de volqueta
- Vibro compactador: MC068980 se realizó inspección general, mantenimiento general, lavado, engrase.
- Se realizaron actividades para el mejoramiento de la Vía Del Sector El Planchón – intersección Variante De Carga (Desvió Cerro De La Cruz), interviniendo 0,8 km, esta intervención fue realizada desde el 19 de noviembre hasta el 29 de noviembre del 2023.
- Se realizaron actividades para el mejoramiento de la Vía Intersección Principal - Vía Hacia El Corregimiento El Silencio, interviniendo 2km, esta intervención se realizó desde el 30 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2023.
- Se realizaron actividades de suministro de agua potable a través de carro cisterna en la instalación de la Alcaldía Municipal 16.000 litros, en el Puesto de Policía 16.000 litros y en el casco urbano del municipio de Puerto Escondido 16.000 litros.


12. OBSERVACIONES

- El contratista en virtud a las actividades reportadas por la interventoría, el contrato suscrito tiene un avance físico del 35.67% ejecutado, lo cual representa un avance del 2.34% lo programado, dado lo anterior, teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución en los periodos anteriores la ejecución acumulada a la fecha de corte del presente informe corresponde al 100% de las actividades contractuales ejecutadas.
- La supervisión certifica que el personal propuesto está afiliado y al día al sistema de seguridad, salud y parafiscales para el periodo del presente.
- La supervisión en el periodo informado realizo labores de control de obligaciones del contratista de administración y manifestó que cumplió satisfactoriamente.

CILIA TOBIAS CARRASCAL
Supervisor

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se realizaron actividades para el mejoramiento de la Vía Del Sector El Planchón – intersección Variante De Carga (Desvió Cerro De La Cruz), interviniendo 0,8 km, esta intervención fue realizada desde el 19 de noviembre hasta el 29 de noviembre del 2023.

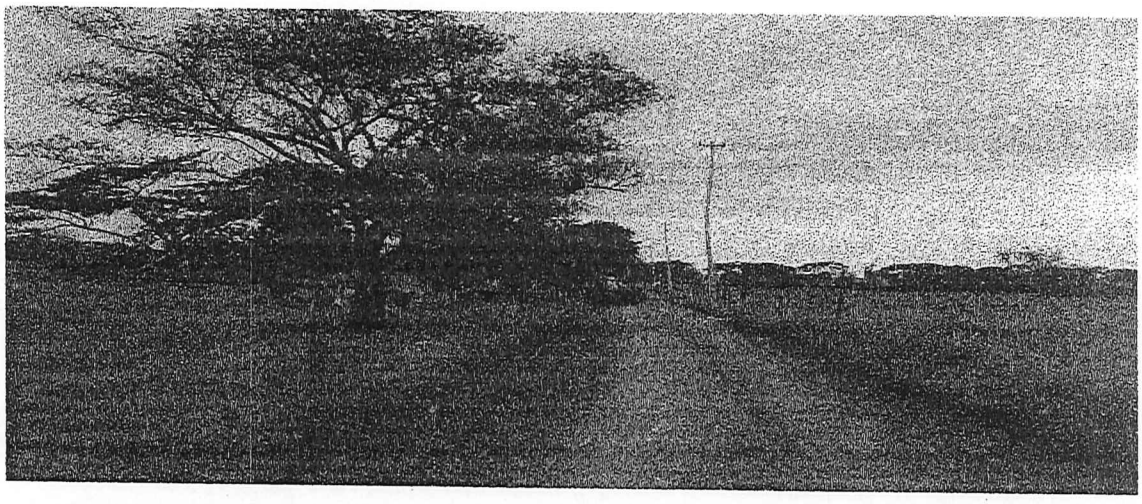




Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo





Se realizaron actividades para el mejoramiento de la Vía Intersección Principal - Vía Hacia El Corregimiento El Silencio, interviniendo 2km, esta intervención se realizó desde el 30 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2023.



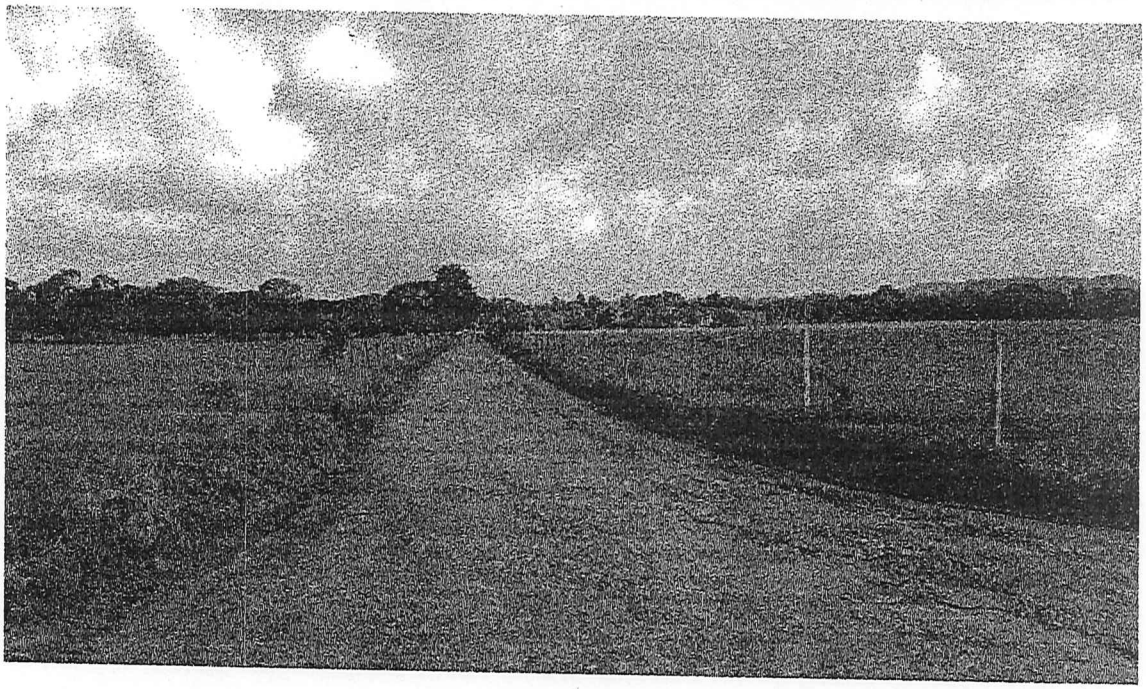

77






Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo




Se realizaron actividades de suministro de agua potable a través de carro cisterna en los siguientes lugares:


Alcaldía Municipal 16.000 litros

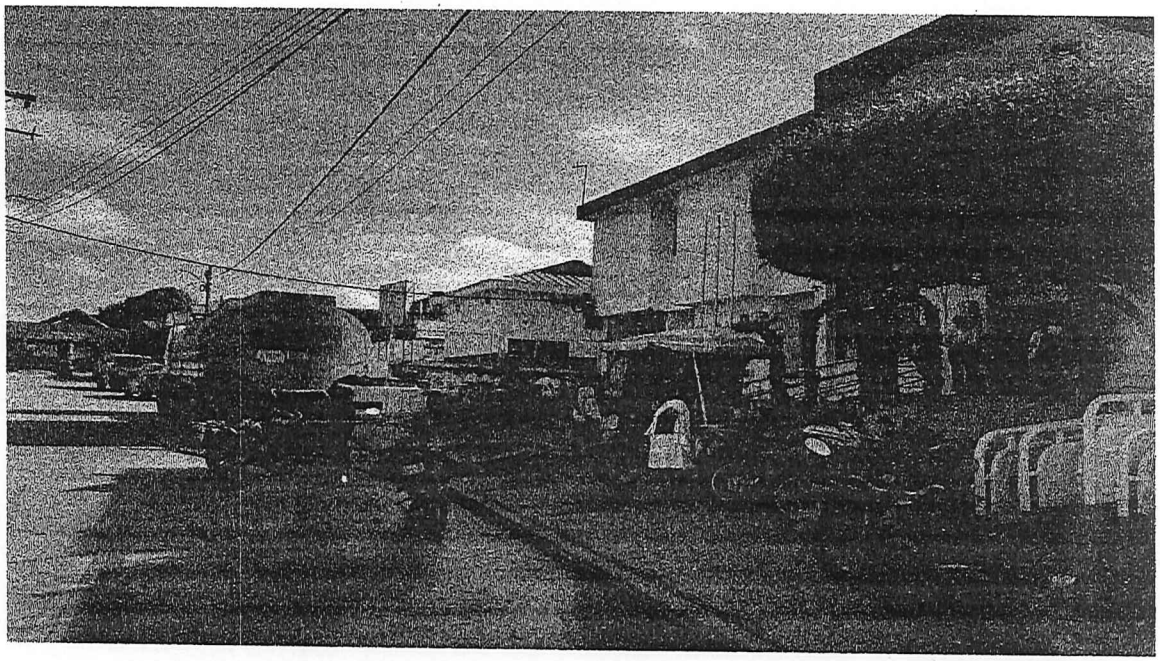


Puesto de Policía Municipal 16.000 litros

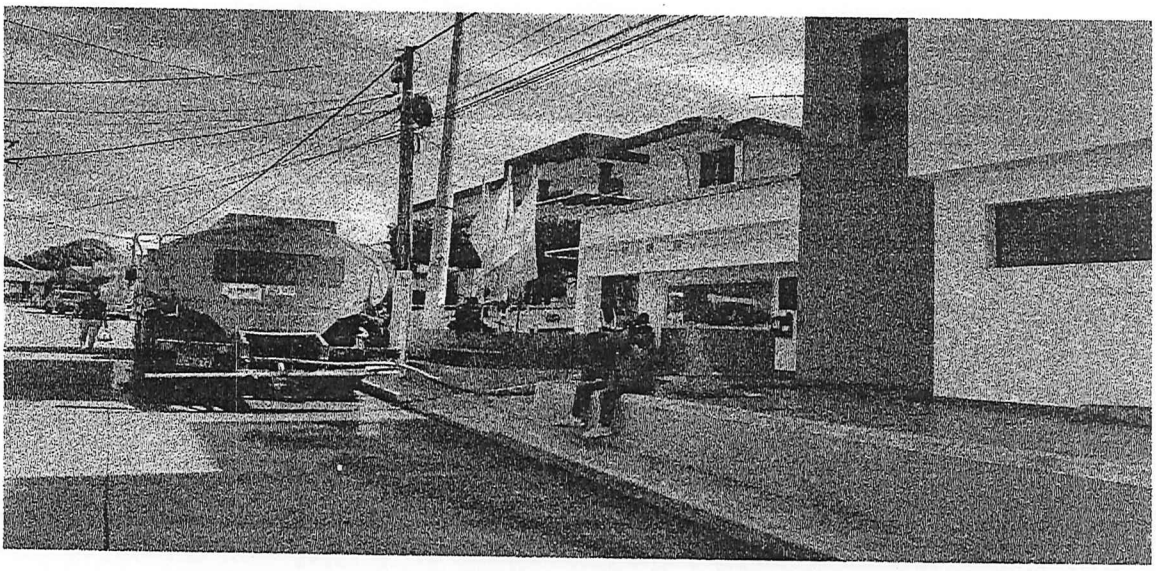


Zona urbana del municipio de Puerto Escondido 16.000 litros.

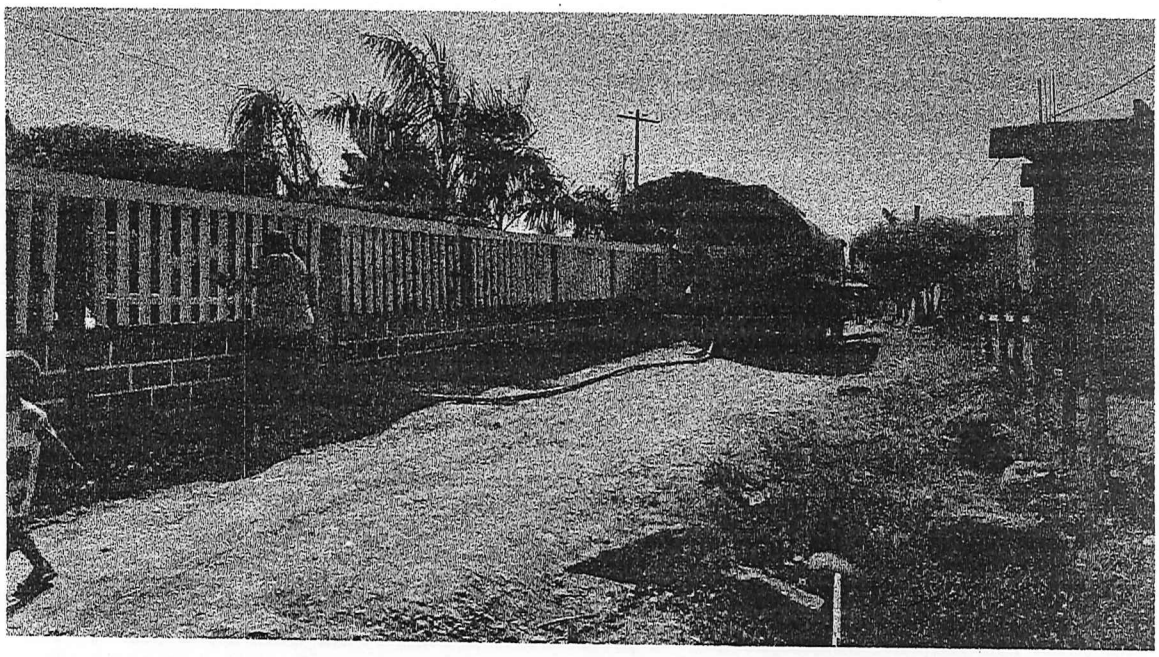

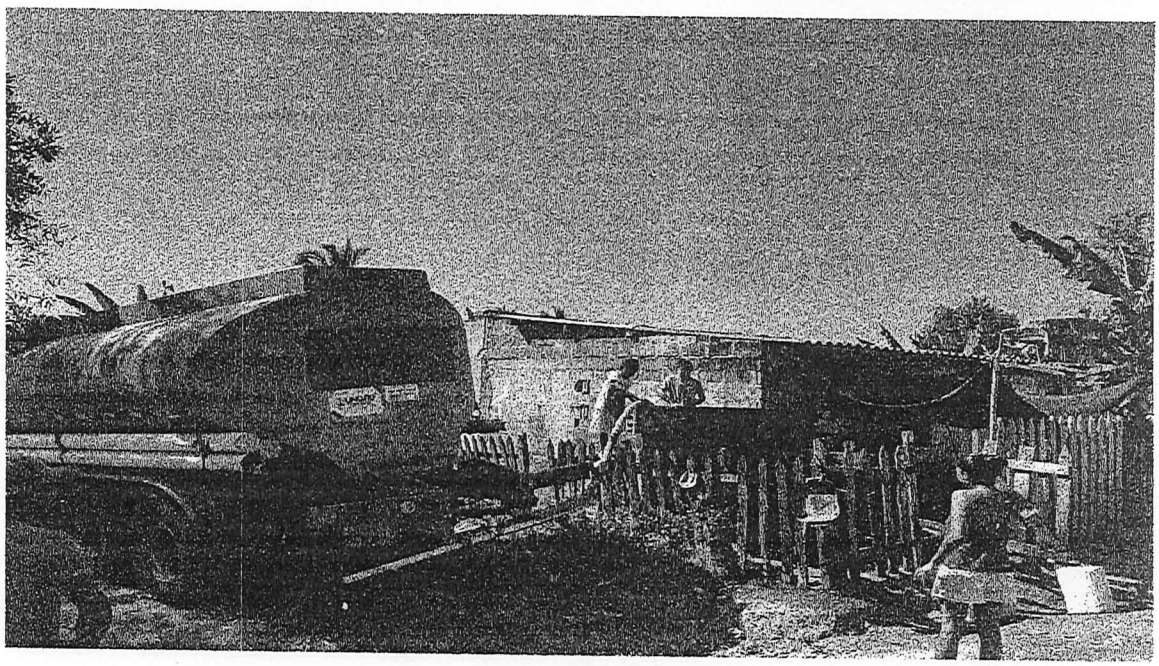


MANTENIMIENTO A MAQUINARIA AMARILLA

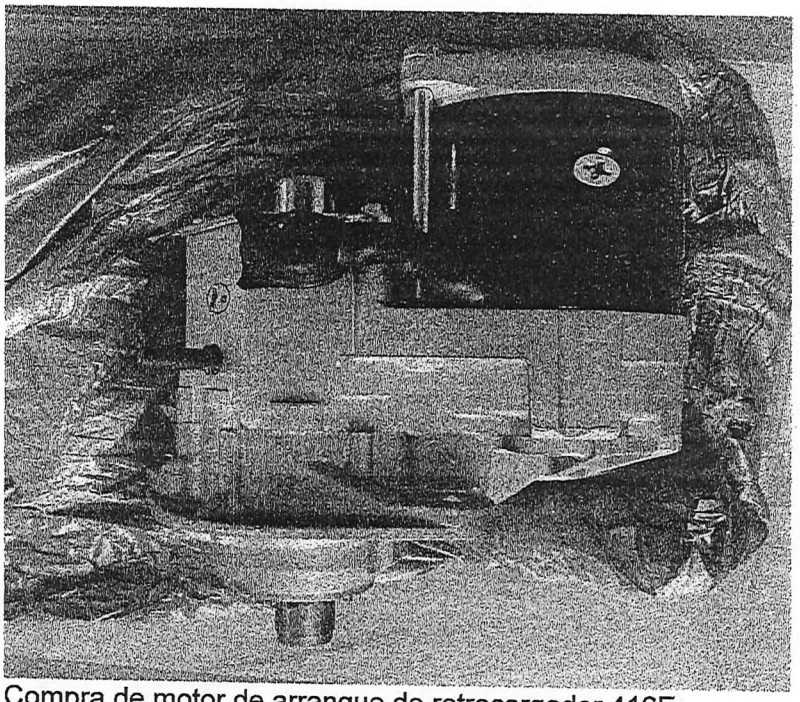


Compra de motor de arranque de retrocargador 416E




Compra de valvula EGR para recirculación de gases Volqueta OCM669

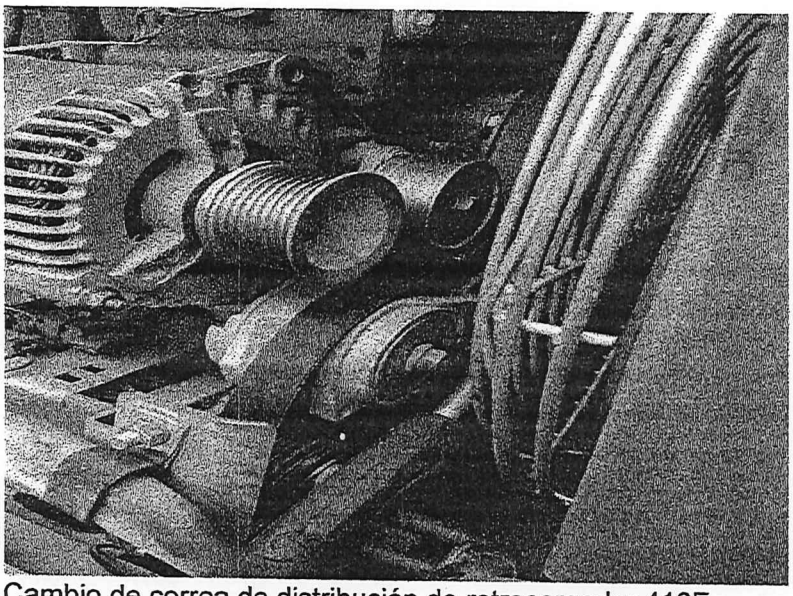


Cambio de correa de distribución de retrocargador 416E

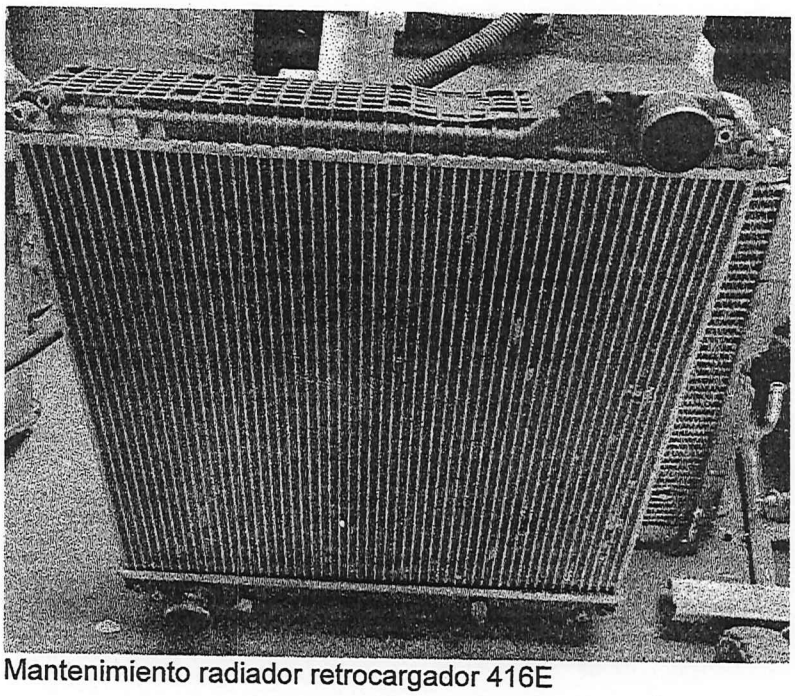


Mantenimiento radiador retrocargador 416E

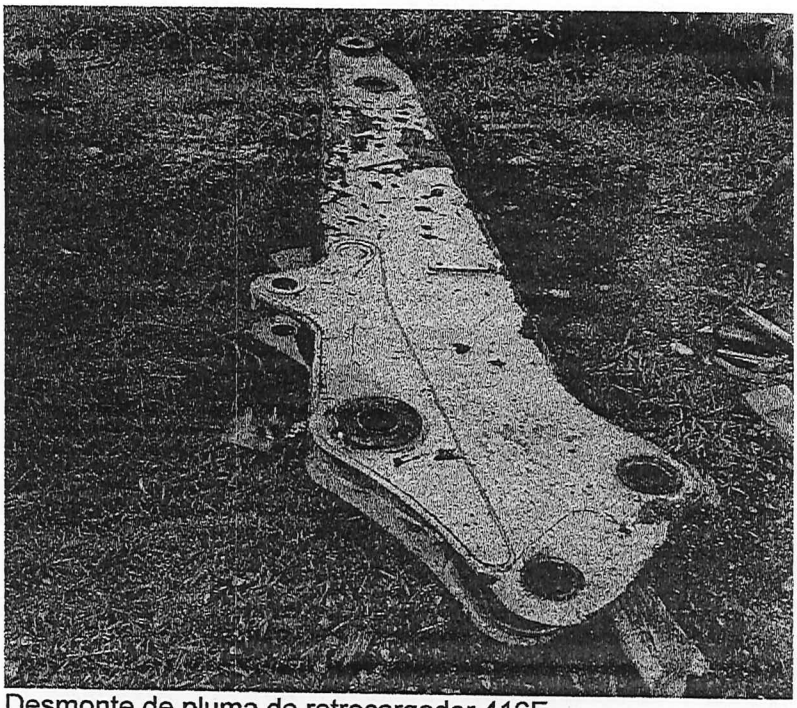


Desmonte de pluma de retrocargador 416E

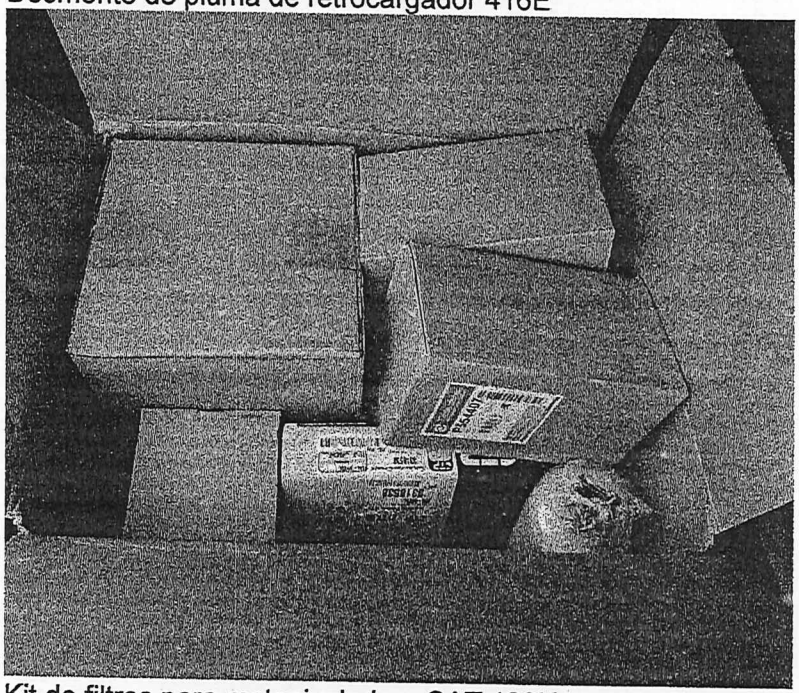


Kit de filtros para motoniveladora CAT 120K

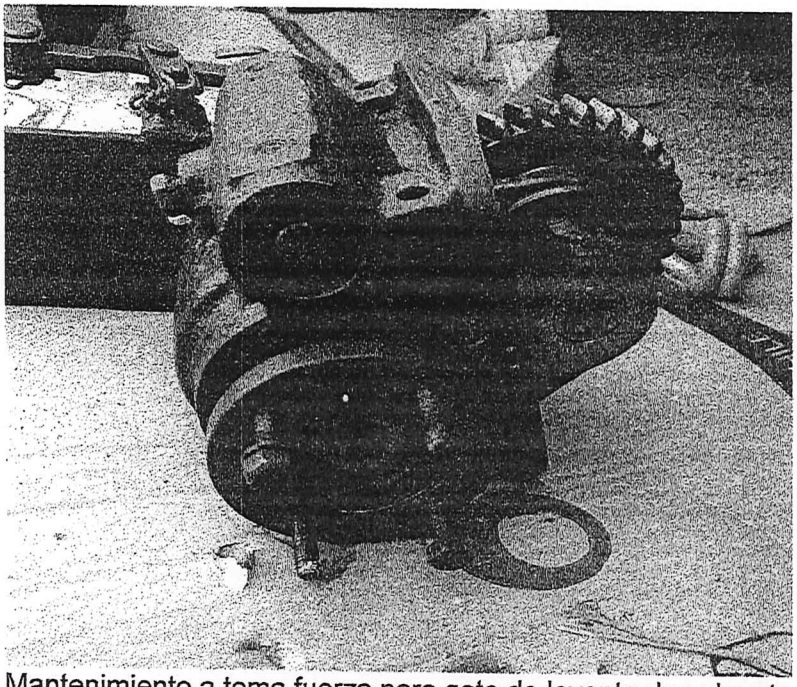


Mantenimiento a toma fuerza para gato de levante de volqueta OCM666

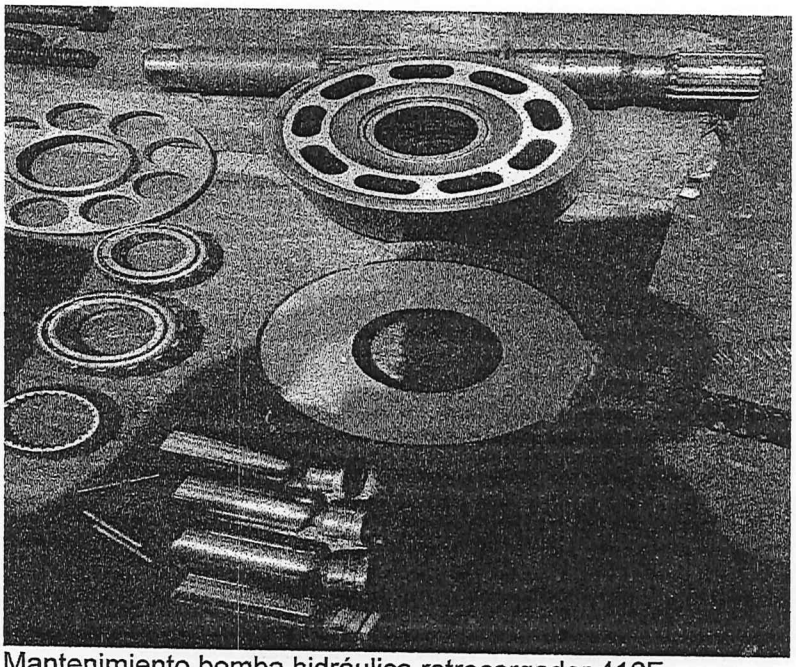


Mantenimiento bomba hidráulica retrocargador 416E

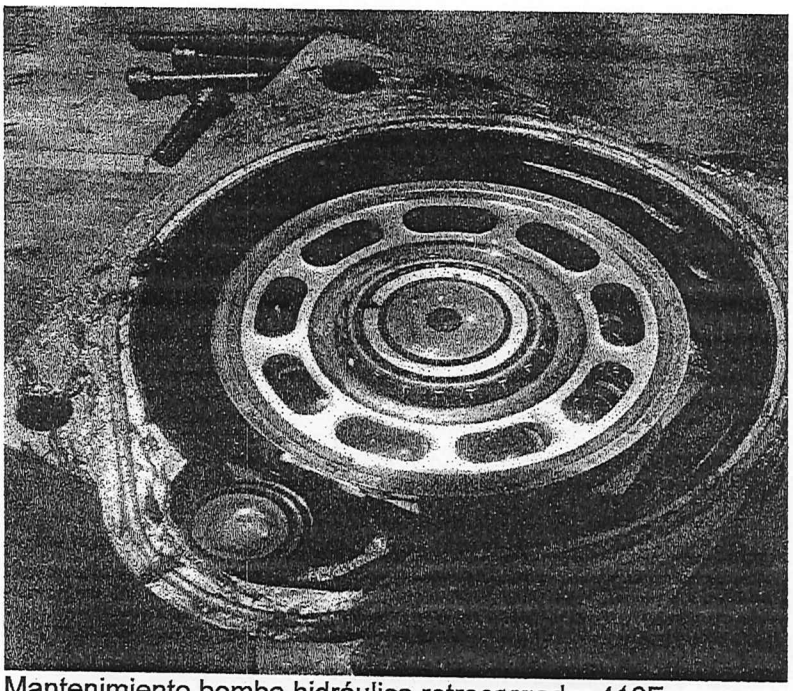

Mantenimiento bomba hidráulica retrocargador 416E

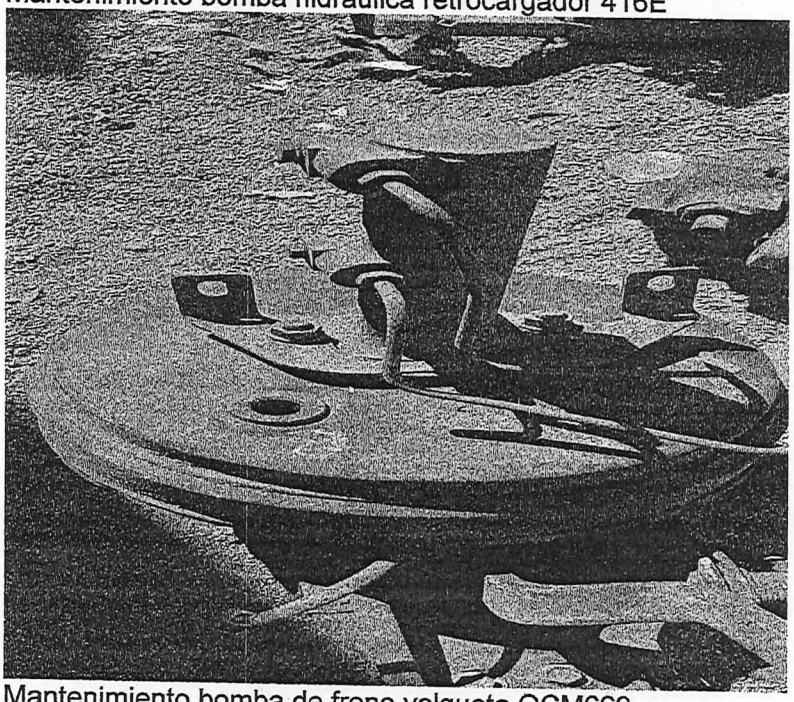

Mantenimiento bomba de freno volqueta OCM669

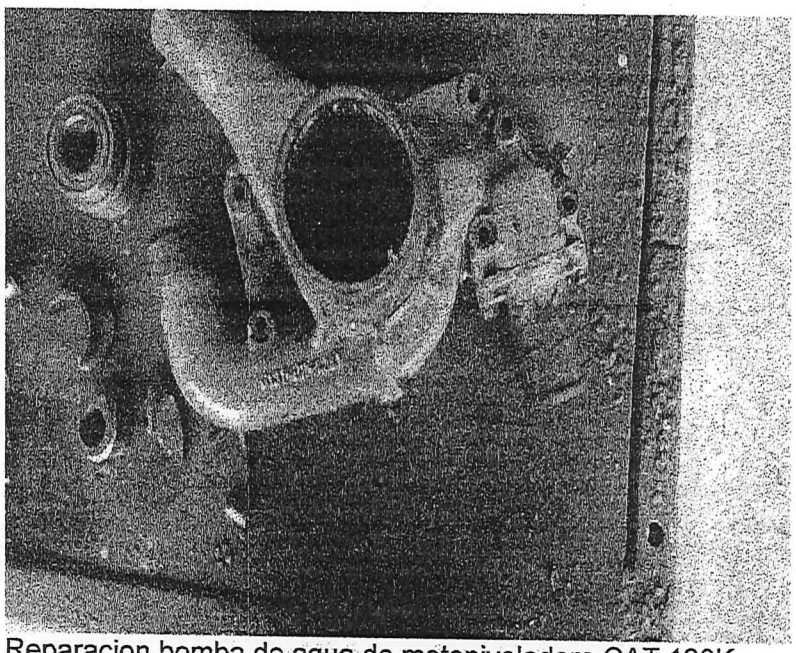


Reparacion bomba de agua de motoniveladora CAT 120K




Relleno en soldadura a rotulas de retrocargador 416E


Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

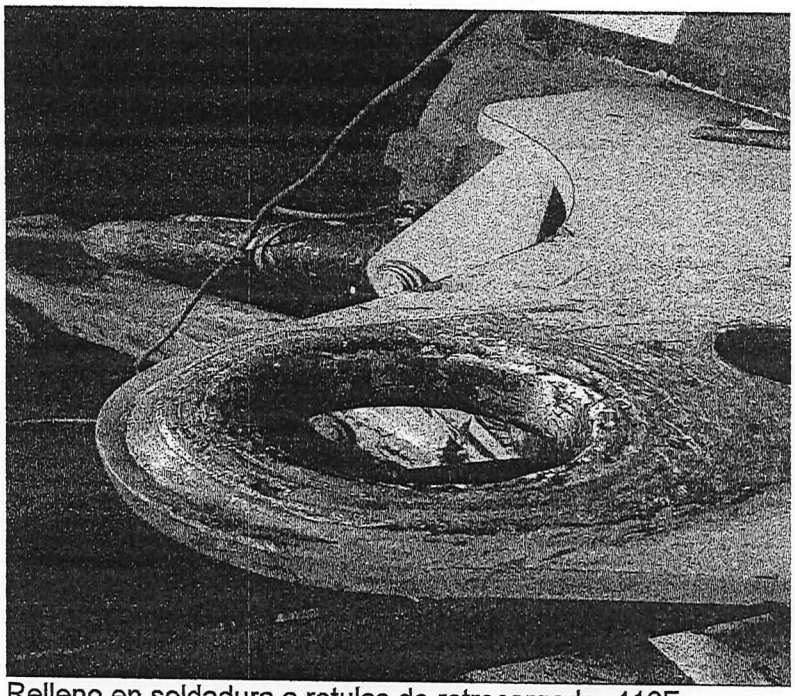


Relleno en soldadura a rotulas de retrocargador 416E

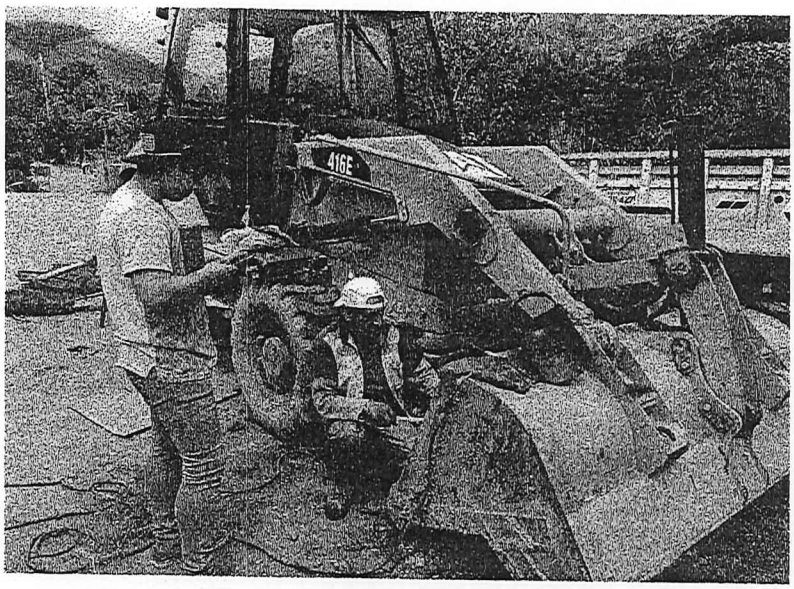

Gobernación de
Córdoba
Ahora le toca al pueblo

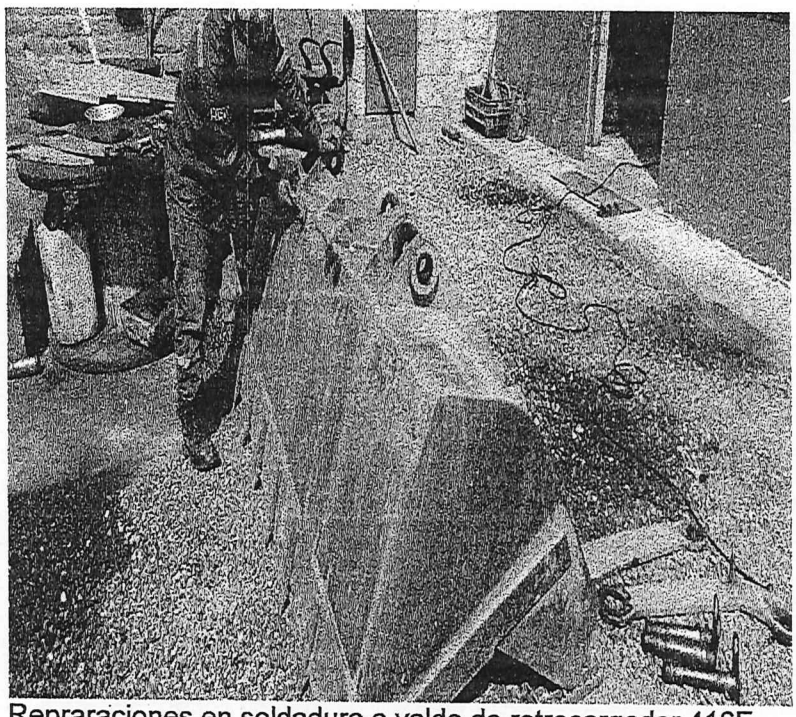

Repraraciones en soldadura a valde de retrocargador 416E

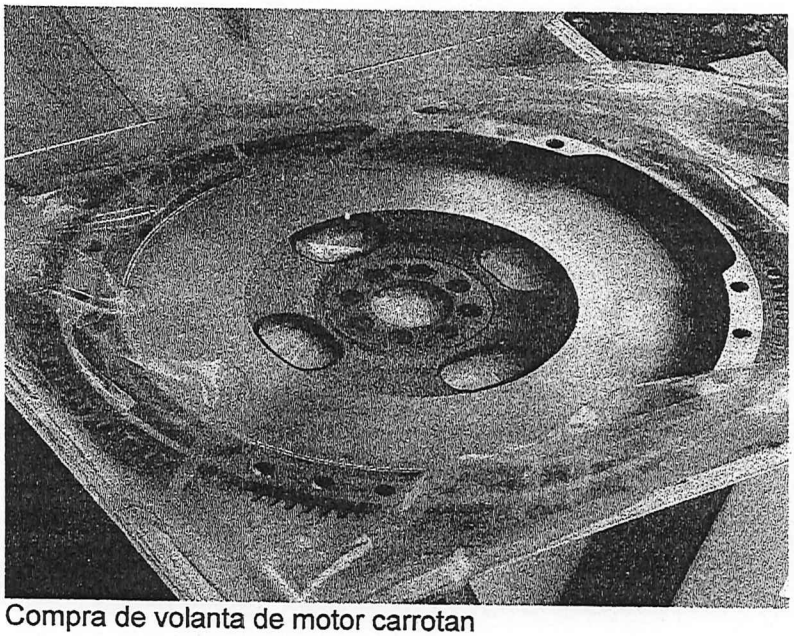

Compra de volanta de motor carrotan
