
PROGRAMACION PRORROGA


ID	Task Mod	ITEM	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
1			**REFORZAMIENTO HOGAR ICBF SEDE TUNJA**	**138,38 days**	**Fri 16/08/24**	**Thu 20/02/25**	
2			OBLIGACION CONTRACTUAL: REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR CONSULTORIA Y ENTIDAD	40 days	Mon 9/09/24	Fri 1/11/24	
3		1	**OBRAS PRELIMINARES**	**20 days**	**Fri 16/08/24**	**Thu 12/09/24**	
4		1.1	**ACTIVIDAD PRELIMINAR**	**20 days**	**Fri 16/08/24**	**Thu 12/09/24**	
5		1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	8 days	Fri 16/08/24	Tue 27/08/24	
6		1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERI	5 days	Fri 16/08/24	Thu 22/08/24	5FS-10 days
7		1.1.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	3 days	Thu 5/09/24	Tue 10/09/24	6FS+10 days
8		1.1.4	DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP	5 days	Sat 17/08/24	Fri 23/08/24	6SS+1 day
9		1.1.5	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUA	2 days	Sat 17/08/24	Tue 20/08/24	6SS+1 day
10		1.1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUAI	2 days	Fri 30/08/24	Tue 3/09/24	11SS+10 days
11		1.1.7	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	3 days	Sat 17/08/24	Wed 21/08/24	9FF+1 day
12		1.1.8	DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER	2 days	Thu 5/09/24	Mon 9/09/24	6SS+15 days
13		1.1.9	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 m	2 days	Fri 16/08/24	Mon 19/08/24	10FS-15 days
14		1.1.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	3 days	Sat 17/08/24	Wed 21/08/24	8SS
15		1.1.11	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO	3 days	Sat 17/08/24	Wed 21/08/24	8SS
16		1.1.12	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	3 days	Sat 17/08/24	Wed 21/08/24	8SS
17		1.1.13	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=	2 days	Mon 19/08/24	Wed 21/08/24	11SS+1 day
18		1.1.14	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENT	2 days	Wed 21/08/24	Fri 23/08/24	17
19		1.1.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	2 days	Fri 23/08/24	Tue 27/08/24	18SS+2 days
20		1.1.16	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELÉ	1 day	Wed 11/09/24	Thu 12/09/24	8SS+18 days
21		1.1.17	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA INCLUYE MATERIAL DE CUBIERTA	2 days	Fri 23/08/24	Tue 27/08/24	18SS+2 days
22		2	**EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS**	**56 days**	**Wed 4/09/24**	**Wed 20/11/24**	
23		2.1	**EXCAVACIONES**	**46 days**	**Wed 4/09/24**	**Wed 6/11/24**	
24		2.1.1	EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD	45 days	Wed 4/09/24	Tue 5/11/24	21SS+8 days
25		2.1.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTAD	45 days	Thu 5/09/24	Wed 6/11/24	24SS+1 day
26		2.2	**CARGUE Y DESCARGUE**	**50 days**	**Thu 12/09/24**	**Wed 20/11/24**	
27		2.2.1	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRA	50 days	Thu 12/09/24	Wed 20/11/24	4SS+20 days
28		3	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**	**79,38 days**	**Tue 5/11/24**	**Thu 20/02/25**	
29		3.1	**CONCRETOS**	**55 days**	**Tue 5/11/24**	**Fri 17/01/25**	
30		3.1.1	**CONCRETOS SIMPLES**	**10 days**	**Tue 5/11/24**	**Tue 19/11/24**	
31		3.1.1.1	CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 MPA (140KG/CM2)	10 days	Tue 5/11/24	Tue 19/11/24	24
32		3.1.2	**CONCRETOS ESTRUCTURALES**	**45 days**	**Tue 19/11/24**	**Fri 17/01/25**	
33		3.1.2.1	COLUMNAS 3500 PSI	30 days	Tue 19/11/24	Fri 27/12/24	31
34		3.1.2.2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	20 days	Tue 19/11/24	Sun 15/12/24	31

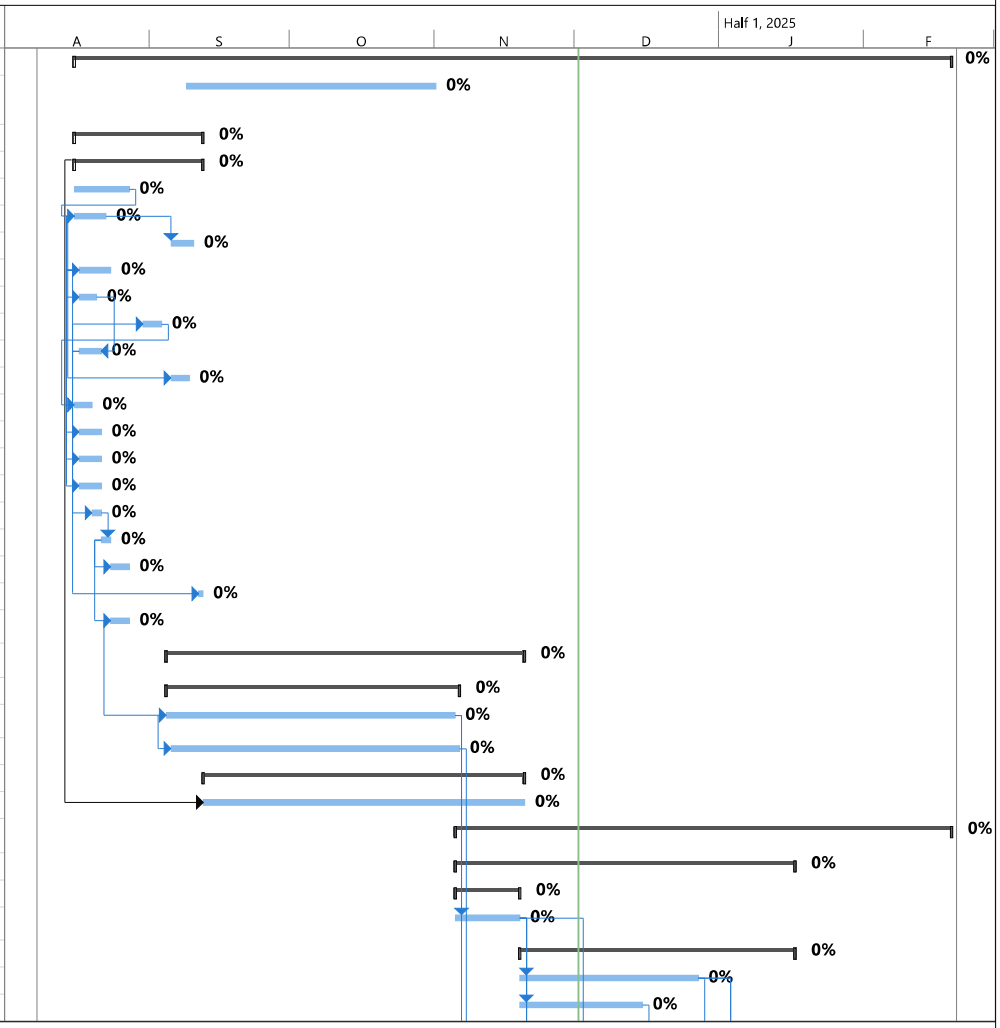

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

PROGRAMACION PRORROGA


ID	Task Mode	ITEM	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
35		3.1.2.3	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CON	15 days	Sun 15/12/24	Fri 3/01/25	34
36		3.1.2.4	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO D	10 days	Fri 3/01/25	Fri 17/01/25	35
37		3.1.2.5	VIGA CINTA 3500 PSI	20 days	Tue 19/11/24	Sun 15/12/24	31
38		3.1.2.6	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3500 PSI	30 days	Tue 19/11/24	Fri 27/12/24	31
39		3.1.2.7	MESONES EN CONCRETO DE 60 CM	15 days	Fri 27/12/24	Fri 17/01/25	38
40		3.1.2.8	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15	20 days	Tue 3/12/24	Fri 27/12/24	31FS+10 days
41		**3.2**	**ACERO**	**20 days**	**Tue 19/11/24**	**Sun 15/12/24**	
42		3.2.1	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	20 days	Tue 19/11/24	Sun 15/12/24	31
43		**4**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	**35 days**	**Sun 15/12/24**	**Thu 30/01/25**	
44		**4.1**	**ACOMETIDA HIDRÁULICA**	**1 day**	**Sun 15/12/24**	**Mon 16/12/24**	
45		4.1.1	ACOMETIDA Y MEDIDOR TOTALIZADOR 1/	1 day	Sun 15/12/24	Mon 16/12/24	42
46		**4.2**	**PUNTOS HIDRÁULICOS**	**5 days**	**Fri 24/01/25**	**Thu 30/01/25**	
47		4.2.1	PUNTO LAVAMANOS AF PARAL DE PISO 1.	5 days	Fri 24/01/25	Thu 30/01/25	42FS+30 days
48		4.2.2	PUNTO SANITARIO AHORRADOR PARAL D	5 days	Fri 24/01/25	Thu 30/01/25	42FS+30 days
49		4.2.3	PUNTO LAVAPLATOS AF/AC PARAL DE PI	5 days	Fri 24/01/25	Thu 30/01/25	42FS+30 days
50		4.2.4	PUNTO DUCHA AF/AC PARAL DE PISO 1/2	5 days	Fri 24/01/25	Thu 30/01/25	42FS+30 days
51		4.2.5	PUNTO LLAVE DE MANO 1/2"	5 days	Fri 24/01/25	Thu 30/01/25	42FS+30 days
52		4.2.6	DESMONTE PUNTO LAVAMANOS	5 days	Fri 24/01/25	Thu 30/01/25	42FS+30 days
53		4.2.7	DESMONTE PUNTO SANITARIO	5 days	Fri 24/01/25	Thu 30/01/25	42FS+30 days
54		**4.3**	**REDES DE AGUA FRÍA**	**2 days**	**Fri 3/01/25**	**Tue 7/01/25**	
55		4.3.1	TUBERÍA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2	2 days	Fri 3/01/25	Tue 7/01/25	33FS+5 days
56		4.3.2	ACCESORIOS PVC PRESIÓN 1/2 "	2 days	Fri 3/01/25	Tue 7/01/25	33FS+5 days
57		**4.4**	**REGISTROS Y MEDIDORES RED DE SUMINIS**	**3 days**	**Tue 28/01/25**	**Thu 30/01/25**	
58		4.4.1	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WH	3 days	Tue 28/01/25	Thu 30/01/25	47FS-3 days;48FS-3 d
59		4.4.2	MEDIDOR PARA AGUA 1/2 "	3 days	Tue 28/01/25	Thu 30/01/25	47FS-3 days;48FS-3 d
60		4.4.3	CAJA PARA 1 MEDIDOR (NO INCLUYE MED	3 days	Tue 28/01/25	Thu 30/01/25	47FS-3 days;48FS-3 d
61		**4.5**	**SALIDAS SANITARIAS**	**2 days**	**Fri 24/01/25**	**Mon 27/01/25**	
62		4.5.1	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2 "	2 days	Fri 24/01/25	Mon 27/01/25	68FS+4 days;69FS+4
63		4.5.2	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2 "	2 days	Fri 24/01/25	Mon 27/01/25	68FS+4 days;69FS+4
64		4.5.3	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4 "	2 days	Fri 24/01/25	Mon 27/01/25	68FS+4 days;69FS+4
65		4.5.4	SIFON DE PISO 2 "	2 days	Fri 24/01/25	Mon 27/01/25	68FS+4 days;69FS+4
66		4.5.5	SIFON DE PISO 4 "	2 days	Fri 24/01/25	Mon 27/01/25	68FS+4 days;69FS+4
67		**4.6**	**RED DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES**	**3 days**	**Wed 15/01/25**	**Mon 20/01/25**	
68		4.6.1	TUBERÍA PVC SANITARIA 2 "	3 days	Wed 15/01/25	Mon 20/01/25	55FS+6 days;56FS+6
69		4.6.2	TUBERÍA PVC SANITARIA 3 "	3 days	Wed 15/01/25	Mon 20/01/25	55FS+6 days;56FS+6
70		4.6.3	TUBERÍA PVC SANITARIA 4 "	3 days	Wed 15/01/25	Mon 20/01/25	55FS+6 days;56FS+6

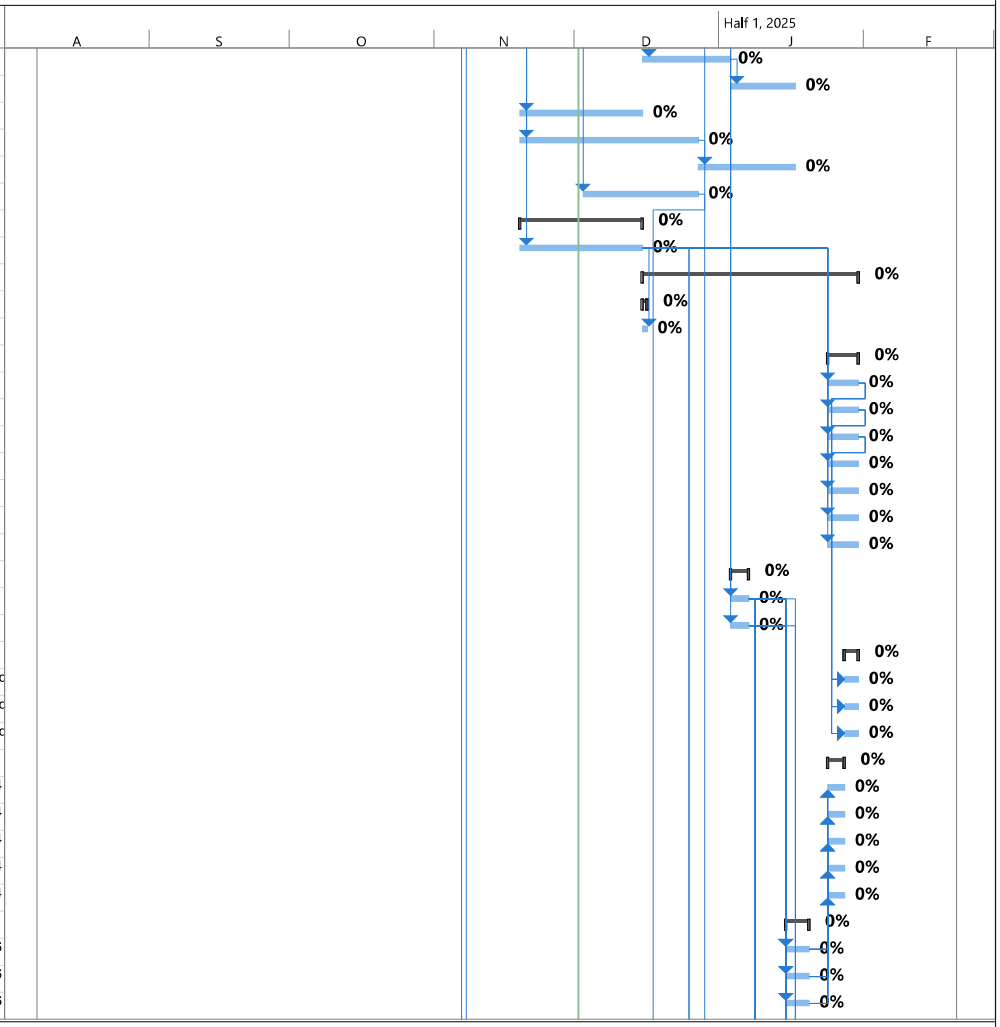

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

PROGRAMACION PRORROGA


ID	Task Mode	ITEM	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
71		4.6.4	ACCESORIO SANITARIO 2 "	3 days	Wed 15/01/25	Mon 20/01/25	55FS+6 days;56FS+6
72		4.6.5	ACCESORIO SANITARIO 3 "	3 days	Wed 15/01/25	Mon 20/01/25	55FS+6 days;56FS+6
73		4.6.6	ACCESORIO SANITARIO 4 "	3 days	Wed 15/01/25	Mon 20/01/25	55FS+6 days;56FS+6
74		**4.7**	**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDU**	**5 days**	**Fri 17/01/25**	**Fri 24/01/25**	
75		4.7.1	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O	5 days	Fri 17/01/25	Fri 24/01/25	55FS+8 days;56FS+8
76		**4.8**	**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**7 days**	**Wed 15/01/25**	**Fri 24/01/25**	
77		4.8.1	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O	7 days	Wed 15/01/25	Fri 24/01/25	55FS+6 days
78		**4.9**	**RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS**	**5 days**	**Wed 15/01/25**	**Wed 22/01/25**	
79		4.9.1	TUBERÍA PVC SANITARIA 4 "	5 days	Wed 15/01/25	Wed 22/01/25	55FS+6 days
80		4.9.2	ACCESORIO SANITARIO 4"	5 days	Wed 15/01/25	Wed 22/01/25	55FS+6 days
81		4.9.3	MORDAZA 20 CM 4"	5 days	Wed 15/01/25	Wed 22/01/25	55FS+6 days
82		**4.10**	**RED DE GAS**	**5 days**	**Tue 7/01/25**	**Tue 14/01/25**	
83		4.10.1	TUBERÍA COBRE GAS 1/2"	5 days	Tue 7/01/25	Tue 14/01/25	55
84		4.10.2	TUBERÍA COBRE GAS 3/4"	5 days	Tue 7/01/25	Tue 14/01/25	55
85		4.10.3	ACCESORIO COBRE GAS 1/2"	5 days	Tue 7/01/25	Tue 14/01/25	55
86		4.10.4	ACCESORIO COBRE GAS 3/4"	5 days	Tue 7/01/25	Tue 14/01/25	55
87		4.10.5	REGISTRO PARA GAS 1/2"	5 days	Tue 7/01/25	Tue 14/01/25	55
88		4.10.6	REGULADOR DE UNICA ETAPA DE 20 m3/h	5 days	Tue 7/01/25	Tue 14/01/25	55
89		4.10.7	MEDIDOR DE GAS (INCLUYE CARGO POR	5 days	Tue 7/01/25	Tue 14/01/25	55
90		4.10.8	DUCTO DE PARED SENCILLA CALIBRE 24	5 days	Tue 7/01/25	Tue 14/01/25	55
91		4.10.9	REJILLAS PARA VENTILACIÓN GAS NATUF	5 days	Tue 7/01/25	Tue 14/01/25	55
92		**4.11**	**PUNTOS DE GAS**	**3 days**	**Tue 7/01/25**	**Fri 10/01/25**	
93		4.11.1	PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2 EN COBRE	3 days	Tue 7/01/25	Fri 10/01/25	55
94		**4.12**	**MONTAJE DE APARATOS DE GAS**	**3 days**	**Tue 7/01/25**	**Fri 10/01/25**	
95		4.12.1	MONTAJE ESTUFA	3 days	Tue 7/01/25	Fri 10/01/25	55
96		**4.13**	**OBRAS EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**2 days**	**Tue 7/01/25**	**Thu 9/01/25**	
97		4.13.1	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL (	2 days	Tue 7/01/25	Thu 9/01/25	55
98		4.13.2	CAJAS DE INSPECCION AGUA LLUVIA 60 X	2 days	Tue 7/01/25	Thu 9/01/25	55
99		**4.14**	**PRUEBAS DE INSTALACIONES Y OTROS**	**2 days**	**Tue 7/01/25**	**Thu 9/01/25**	
100		4.14.1	PRUEBA HIDROSTÁTICA	2 days	Tue 7/01/25	Thu 9/01/25	55
101		4.14.2	PRUEBA HERMÉTICA	2 days	Tue 7/01/25	Thu 9/01/25	55
102		4.14.3	TANQUE PLASTICO 500 LT	2 days	Tue 7/01/25	Thu 9/01/25	55
103		**5**	**EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTI**	**79,38 days**	**Tue 5/11/24**	**Thu 20/02/25**	
104		**5.1**	**PISOS**	**30 days**	**Fri 20/12/24**	**Thu 30/01/25**	
105		5.1.1	AFINADO DE PISO	10 days	Wed 1/01/25	Wed 15/01/25	110SS+8 days
106		5.1.2	ACABADO DE PISO INSTITUCIONAL PORC	12 days	Wed 15/01/25	Thu 30/01/25	105

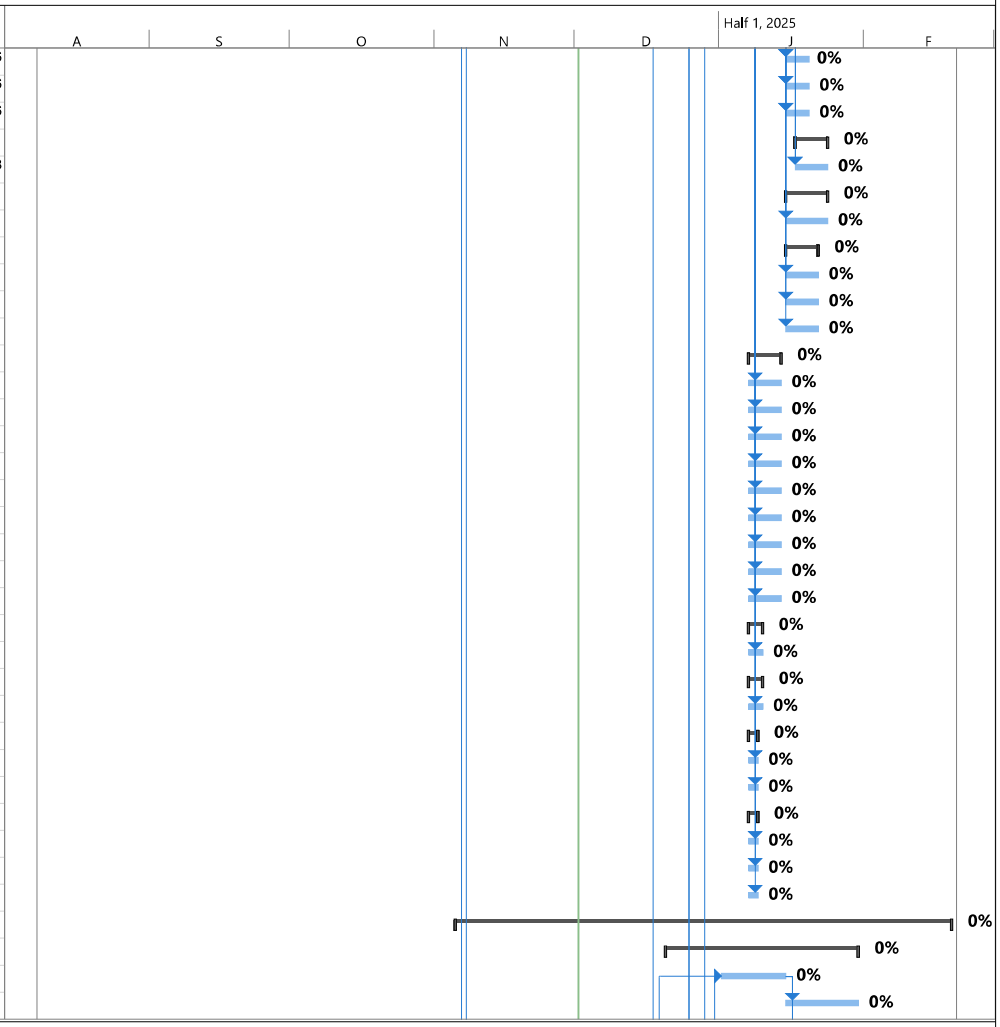

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

PROGRAMACION PRORROGA


ID	Task Mode	ITEM	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
107		5.1.3	ACABADO DEL PISO INSTITUCIONAL LINE/	20 days	Fri 3/01/25	Thu 30/01/25	105SS+2 days
108		5.1.4	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y	8 days	Wed 15/01/25	Sat 25/01/25	105
109		5.1.5	GUARDAESCOBA PISO INSTITUCIONAL CE	5 days	Wed 15/01/25	Wed 22/01/25	105
110		5.1.6	PLACA CONTRAPISO E =0.15	18 days	Fri 20/12/24	Wed 15/01/25	40FS-5 days
111		**5.2**	**MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES**	**20 days**	**Wed 25/12/24**	**Wed 22/01/25**	
112		5.2.1	MURO EXTERIORES EN LADRILLO	20 days	Wed 25/12/24	Wed 22/01/25	42FS+8 days
113		5.2.2	MURO EN BLOQUE HUECO NO. 5 CON MO	20 days	Wed 25/12/24	Wed 22/01/25	42FS+8 days
114		**5.3**	**FRISOS ENCHAPES Y ACABADOS**	**0 days**	**Wed 22/01/25**	**Wed 22/01/25**	
115		5.3.1	PAÑETE EN MORTERO E :1.5 CM	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	113
116		5.3.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	113
117		**5.4**	**CUBIERTA**	**30 days**	**Fri 27/12/24**	**Thu 6/02/25**	
118		5.4.1	ESTRUCTURA METÁLICA CORREAS, CERC	30 days	Fri 27/12/24	Thu 6/02/25	33
119		5.4.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	118FS-15 days
120		5.4.3	CUBIERTA TERMOACUSTICA TRASLUCIDA POLICARBONATO	20 days	Fri 10/01/25	Thu 6/02/25	118FS-20 days
121		5.4.4	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE	10 days	Fri 24/01/25	Thu 6/02/25	118FS-10 days
122		**5.5**	**PINTURA**	**33,88 days**	**Sat 7/12/24**	**Wed 22/01/25**	
123		5.5.1	PINTURA VINILO 3 MANOS PARA MUROS I	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	113
124		5.5.2	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	0 days	Sat 7/12/24	Sat 7/12/24	
125		5.5.3	PINTURA EPÓXICA	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	113
126		**5.6**	**CARPINTERÍA**	**0 days**	**Wed 22/01/25**	**Wed 22/01/25**	
127		5.6.1	PUERTA METALICA COLD ROLED C. 18, AN	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
128		5.6.2	PUERTA METALICA COLD ROLED C.18, BA	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
129		5.6.3	PUERTA METALICA COLD ROLED C.18 BAT	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
130		5.6.4	PUERTA MADERA SALONES 0,8 M	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
131		5.6.5	CERRADURA PARA PUERTAS	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
132		5.6.6	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " PA	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
133		5.6.7	VENTANA ALUMINIO	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
134		5.6.8	PUERTA VENTANA ALUMINIO	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
135		5.6.9	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
136		**5.7**	**EQUIPAMIENTO Y OTROS**	**0 days**	**Wed 22/01/25**	**Wed 22/01/25**	
137		5.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO I	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
138		5.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO I	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
139		5.7.3	BARRA MESON CON LAVAMANOS NO BAT	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
140		5.7.4	BARRA MESON CON LAVAMANOS (BATER	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
141		5.7.5	POCETA DE LAVADO EN MAMPOSTERÍA E	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123

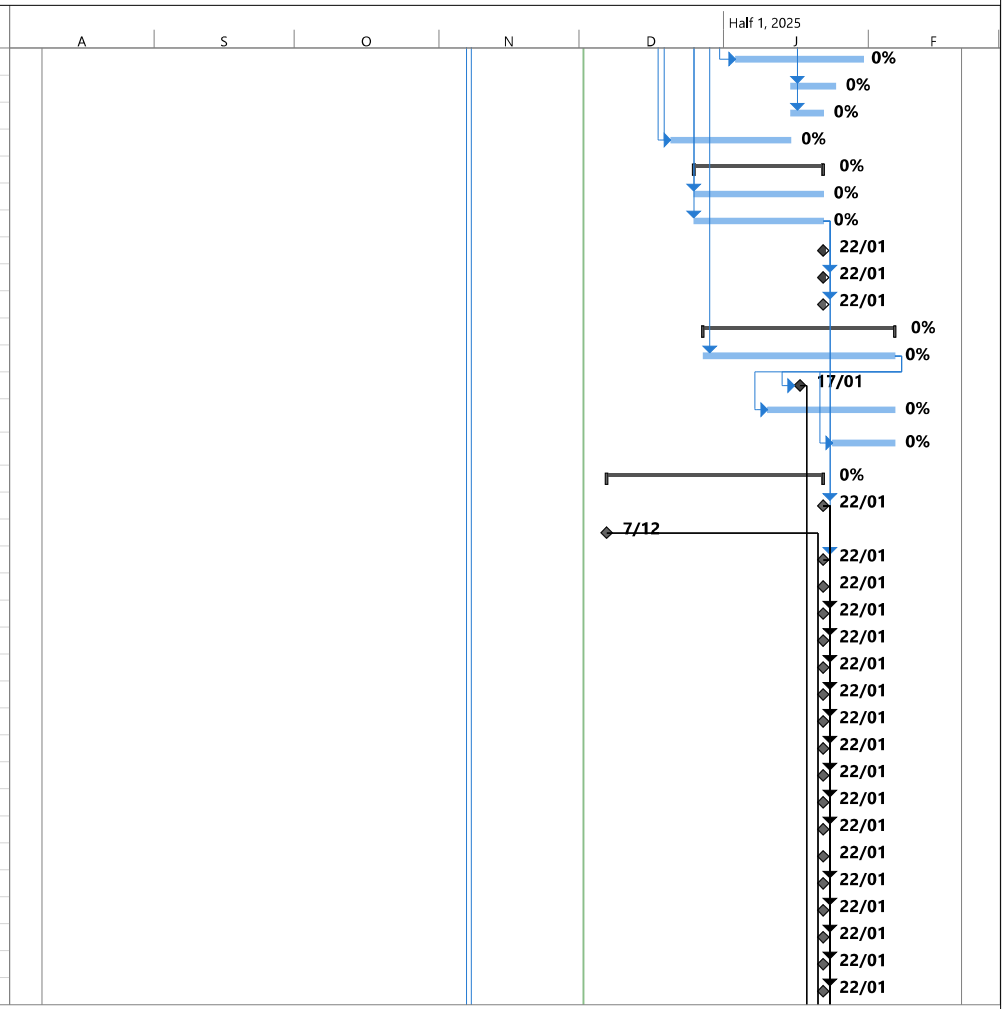

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

PROGRAMACION PRORROGA


ID	Task Mode	ITEM	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
142		5.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
143		5.7.7	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOX	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
144		5.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
145		5.7.9	ADOQUIN ECOLOGICO	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
146		**6**	**COMPONENTE ELÉCTRICO**	**79,38 days**	**Tue 5/11/24**	**Thu 20/02/25**	
147		**6.1**	**SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN EL**	**0 days**	**Wed 22/01/25**	**Wed 22/01/25**	
148		6.1.1	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE MON	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123;124;125
149		6.1.2	SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123;124;125
150		6.1.3	SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123;124;125
151		**6.2**	**TUBERÍA ELÉCTRICA**	**0 days**	**Fri 17/01/25**	**Fri 17/01/25**	
152		6.2.1	TUBERIA PVC 1/2 "	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	119
153		6.2.2	TUBERIA EMT 1 1/2 "	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	119
154		6.2.3	TUBERIA EMT 3/4"	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	119
155		**6.3**	**ILUMINACION**	**0 days**	**Fri 17/01/25**	**Fri 17/01/25**	
156		6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LE	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
157		6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA HAL	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
158		6.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA HAL	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
159		6.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCANDE	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
160		6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCANDE	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
161		6.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
162		6.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
163		6.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRU	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
164		6.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRU	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
165		**6.4**	**SISTEMA CONTRA INCENDIOS**	**0 days**	**Fri 17/01/25**	**Fri 17/01/25**	
166		6.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTO	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
167		6.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTO	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
168		6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ESTR	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
169		6.4.4	PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS	0 days	Fri 17/01/25	Fri 17/01/25	152;153;154
170		**6.5**	**VOZ Y DATOS**	**33,88 days**	**Sat 7/12/24**	**Wed 22/01/25**	
171		6.5.3	SUMINISTRO RACK 60 X 60	0 days	Sat 7/12/24	Sat 7/12/24	
172		6.5.4	BANDEJA PORTACABLES MALLA	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
173		**6.6**	**CONDUCTORES**	**79,38 days**	**Tue 5/11/24**	**Thu 20/02/25**	
174		6.6.1	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
175		6.6.2	CABLE FPL 2X14	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
176		6.6.3	CABLE UTP	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123
177		6.6.4	CABLE UTP 6A	0 days	Wed 22/01/25	Wed 22/01/25	123

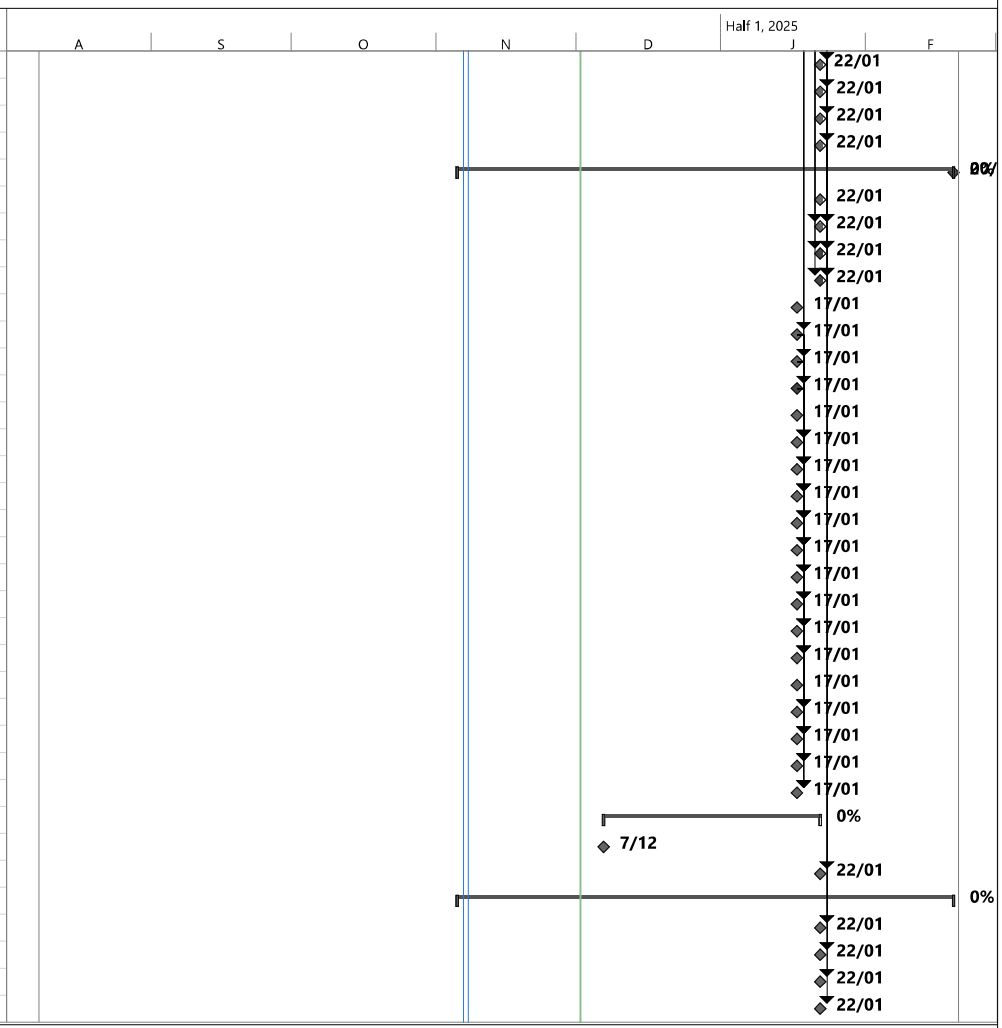

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

PROGRAMACION PRORROGA

ID	Task Mod	ITEM	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
178		NP-8.2	CONCRETO MURO DE CONTENCIÓN 30	15 days	Wed 6/11/24	Wed 27/11/24	25
179		NP-8.3	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	10 days	Tue 5/11/24	Tue 19/11/24	24
180			**FIN**	0 days	Thu 20/02/25	Thu 20/02/25	



Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva	
División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo	
Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite	
División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo			
