
INFORME No. 03

PERIODO: 17 DE SEPTIEMBRE 2024 HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. **1262-2024** DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"**

REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ	

I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA

829000757-4

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

Contenido

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL....3
2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA....5
3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA....6
4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA....7
5. LOCALIZACIÓN....7
6. DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO:....8
7. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO....8
8. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO....8
9. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CANTIDADES....10
10. REGISTO FOTOGRAFICO....11
11. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO....15
11.1 Avance físico....15
11.2 Avance en tiempo....15
11.3 Avance financiero:....15
12. REPORTE DEL ESTADO DE TIEMPO:....16
13. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST....17
13.1 GESTION SST DEL MES:....17
14. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO....24
14.1. COMPONENTE AMBIENTAL....24
14.2. REGISTRO FOTOGRAFICO....25
15. SEGUIMIENTO SOCIAL....27
16. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....27
17. ACTAS DE LA INTERVENTORIA....28
18. POLIZAS DE LA INTERVENTORIA.....28
19. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA....28
20. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL....29
21. CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....30
22. ACTAS DE COMITÉ O REUNION....30
23. CORRESPONDENCIA ENVIADA....31
24. CORRESPONDENCIA RECIBIDA....31

25. RELACION PERSONAL INTERVENTORIA 31
26. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 31
23.1. FORMA DE PAGO 31
27. RESUMEN BALANCE FINANCIERO 32
28. CURVA DE AVANCE FISICO 33
29. CONCLUSIONES 33
30. ANEXOS 34

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL

El Distrito de Barrancabermeja Santander mediante la adjudicación del **contrato de obra pública No. 1261-24** a la empresa contratista **UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA**. Se procede a la ejecución del proyecto cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER."**, por un valor de **NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($965.704.038)**, con un plazo de ejecución de **SEIS (06) meses** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

La realización del proyecto se lleva a cabo a través de la construcción de la línea de conducción de agua potable en diámetros 3" y 4" desde la línea de conducción de 10" en material PVC del acueducto La Fortuna hasta la vereda la Cascajera del corregimiento La Fortuna en el Municipio de Barrancabermeja, con el fin de garantizar el servicio de agua potable, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la vereda.

Dentro del objeto contractual se Incluyen las siguientes actividades principales:

Preliminares: Comprende las actividades de Localización y replanteo acueducto, retiro de material sobrante forma manual, bombeo y manejo de agua, excavación y descapote manual.

Movimiento de Tierra: Comprende las actividades de excavación manual y relleno. Concretos, pavimentos y andenes: comprende la actividad de concreto para atraque. Suministro e instalación tubería de acueducto: Comprende las actividades de suministro e instalación de tubería.

Suministro e instalación accesorios acueducto: Comprende las actividades de suministro e instalación de TEE, reducción, codo, tapón, uniones de reparación y adaptador brida.

Elementos hidráulico acueducto: Comprende las actividades de suministro e instalación de válvulas y collarines.

Actividades Complementarias: Comprende las actividades de empalme de tubería, instalación de acometida domiciliaria incluye medidor, caja plástica y tapa de seguridad, y kit de contra bridas, tornillos, tuercas, arandelas y empaque.

En el siguiente informe se detalla a manera descriptiva las actividades establecidas mediante ítems de pago realizadas en el periodo comprendido entre el día **DIECISIETE (17) de SEPTIEMBRE de 2024 al DIECISEIS (16) OCTUBRE de 2024** y se exponen los lineamientos de tipo administrativo, ambiental y financiero.

2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	1261–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900 - 6
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA
NIT	901819149-3
REPRESENTANTE LEGAL	ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
IDENTIFICACION	C. C. 63.507.675 de Bucaramanga
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	LPO-009-2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($965.704.038)
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTORIA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023, homologado por la secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01
FUENTE DE FINANCIACION:	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-09556 del 07 de Diciembre de 2023 con cargo al rubro 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01, por concepto de OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) por valor de MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.013.226.098); Certificado de Disponibilidad Presupuestal del SPGR No. 5523 del 07 de Diciembre de 2023 con cargo al rubro 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091, Fuente: Nación, por valor de MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.013.226.098).
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02970 DEL 3 DE MAYO DE 2024 SGR - 324 del 2024-05-03
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.14452851 CO1.WRT.14452698 DEL 26 DE JUNIO DE 2024 CO1.WRT.144824497 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CEPPA No.	8784 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024

3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

Se adjuntan pólizas iniciales, pólizas del adicional N.1 en plazo y pólizas después de suspensión y reinicio. (VER ANEXOS)

Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Vigencia		Valor
			Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	56-44-101007779	17/07/2024	28/07/2025	$193,140,807.60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado	56-44-101007779	17/07/2024	28/01/2028	$96,570,403.80
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del Estado	56-44-101007779	17/07/2024	28/07/2030	$193,140,807.60
Predios, labores y operaciones	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Contratistas y subcontratistas	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Perjuicios extrapatrimoniales	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Responsabilidad civil patronal	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Vehículos propios y no propios	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00


Responsabilidad civil cruzada	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00
Gastos médicos	Seguros del Estado	56-40-101003441	17/07/2024	28/01/2025	$260,000,000.00

4. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Las actividades se ejecutarán en la vereda La Cascajera situada en el corregimiento de la Fortuna, zona rural de Barrancabermeja.

5. LOCALIZACIÓN

Corregimiento La Fortuna noreste del Distrito de Barrancabermeja, Santander.



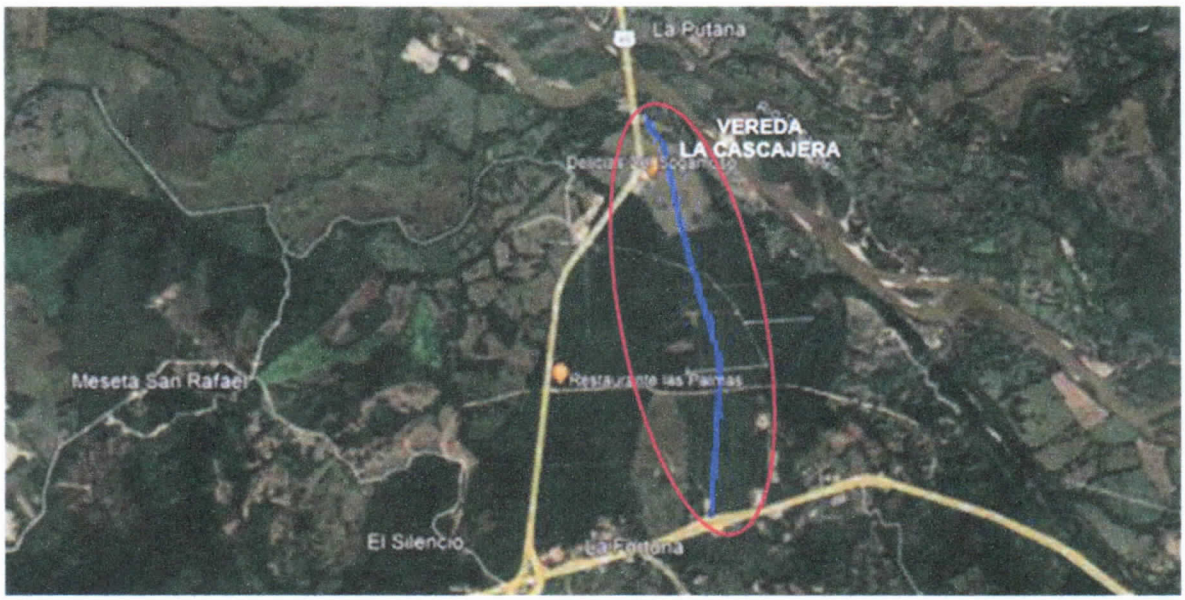


MATERIALES

Dentro del proyecto solo se utilizarán materiales certificados por el proveedor de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto del contrato, se tendrá en cuenta que los proveedores de todos los materiales pétreos extraídos para los proyectos cuenten con la respectiva documentación legal y licencias ambientales necesarias para la extracción y comercialización de estos.

6. DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se localizará el Corregimiento La Fortuna, municipio de Barrancabermeja.

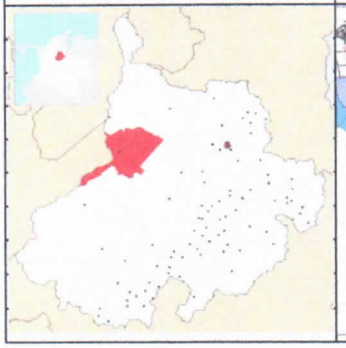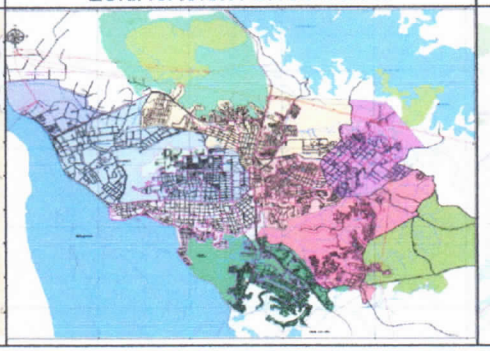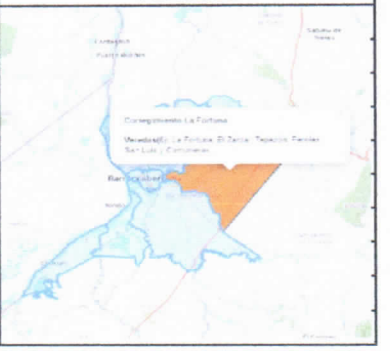LOCALIZACIÓN GENERAL	LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA ZONIFICACIÓN POR COMUNAS	LOCALIZACIÓN CORREGIMIENTO LA FORTUNA
		

7. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO

8. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO

Durante el tercer mes de ejecución, se llevaron a cabo diversas actividades clave relacionadas con la instalación de la tubería principal de la línea de conducción de diámetro nominal 4" (Dn 4"). Estas actividades incluyeron la localización y el replanteo del trazado previamente definido para la instalación de la tubería. Se realizaron excavaciones manuales hasta alcanzar el nivel de la cama de arena, seguidas de la instalación de tuberías de diámetro 2" para las ventosas correspondientes, así como tuberías de Dn 3" para los sistemas de purgas y tuberías de Dn 4" para la línea de conducción hacia la vereda La Cascajera.

De manera paralela, se ejecutaron excavaciones manuales adicionales, el recubrimiento con arena, el relleno con material proveniente de la excavación y, finalmente, el retiro del material sobrante generado por estas actividades.

Las actividades realizadas se detallan a continuación:

- **Localización y replanteo acueducto:**

Se realiza localización y replanteo de tramos ejecutados donde se instaló tubería de 4" y puntos de sistemas de purga y ventosas respectivamente.

- **Retiro de material sobrante**

El material sobrante generado durante las actividades constructivas, como el material reemplazado por la implementación de recubrimiento de arena, fue necesario retirarlo

mediante cargue manual en equipos de volqueta. En el mismo sentido, fue necesario retirar material producto de apiques manuales para construcción de cajas de inspección.

- **Descapote manual**

Esta actividad correspondió al desmalezado manual y rocería de tramos por donde se requirió instalar tubería para la línea de conducción de agua potable en Dn 4".

- **Excavación manual:**

Se realiza actividades de excavación manual para llegar hasta cota de diseño pertinente a la instalación de tubería requerida.

- **Relleno tipo 1 (arena de rio):**

Se realizó el suministro e instalación de relleno de tuberías instaladas a través de material de arena de río como cama de arena y recubrimiento del perímetro exterior del tubo instalado.

- **Relleno tipo 3 (material proveniente de excavación)**

Debido a las condiciones de ruralidad, se procedió a realizar relleno con el mismo material orgánico proveniente de las actividades de excavación.

- **Suministro e instalación de tuberías PVC Dn= 2", 3" y 4".**

Las instalaciones de tuberías se realizaron según especificaciones técnicas donde la resistencia de presión para acueducto estipulada RDE 21 cuyo sistema de acople se realiza a través de unión mecánica con personal idóneo para su correspondiente instalación.

- **Suministro e instalación de accesorios de acueducto.**

De acuerdo al relieve topográfico y necesidades propias del sistema de acueducto se requirió la instalación de una serie de accesorios y elementos hidráulicos con la finalidad de obtener el adecuado funcionamiento del acueducto. En este sentido se instalaron los siguientes accesorios: Tee PVC 4x3, tee PVC 4x2, codos PVC de 4" y uniones PVC 4".

- **Suministro e instalación de elementos hidráulicos**

Los elementos hidráulicos permitirán garantizar un mejor desempeño del sistema de distribución de agua potable, a través de la implementación de válvulas ventosas y sistemas de purga.


- **Actividades Seguridad y salud en el trabajo:**

De acuerdo con el cumplimiento SST del proyecto, se contempló la gestión y desarrollo de diferentes actividades buscando las buenas prácticas enfocadas a la seguridad y salud en el trabajo mediante diferentes actividades durante la ejecución del contrato.

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CANTIDADES

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1000	**PRELIMINARES**		
1001	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTO	MTS	446,00
1007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FORMA MANUAL	M3	169,05
1009	BOMBEO Y MANEJO DE AGUA	DIA	2,00
1018	DESCAPOTE MANUAL	M2	892,00
2000	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2001	EXCAVACION MANUAL	M3	214,08
2015	RELLENO TIPO 1 (ARENA DE RIO)	M3	130,04
2017	RELLENO TIPO 3 (MATERIAL PROVENIENTE EXCAVACION)	M3	84,04
3000	**CONCRETOS, PAVIMENTOS Y ANDENES**		
3026	CONCRETO (3000 PSI) PARA ATRAQUE DE ACCESORIOS 3" Y 4" Y VALVULAS CON SIKASET L Y PLASTOCRETE DM	UND	2,00
4000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACUEDUCTO**		
4004	SUM. E INST. TUBERIA PVC U.M. RDE 21 Ø 4"	MTS	446,00
5000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACUEDUCTO**		
5090	SUM. E INST. REDUCCION HD 4" X 3" J.H.	UND	1,00
5152	SUM. E INST. DE CODO PVC 11.25 X 4"	UND	1,00
5249	SUM. E INST. UNION DE REPARACION UZ 4"	UND	8,00
5349	SUM. E INST. Adaptador Brida x Universal 2"	UND	4,00
6000	**ELEMENTOS HIDRÁULICOS ACUEDUCTO**		
6001	SUM. E INST. VALVULA C.E. HD 2" J.H O E.L	UND	2,00
6002	SUM. E INST. VALVULA C.E. 3" J.H O E.L	UND	2,00
6003	SUM. E INST. VALVULA C.E. 4" J.H O E.L	UND	1,00
6008	SUM. E INST. VALVULA C.E. 2" BB	UND	2,00
6067	SUM. E INST. VALVULA DE VENTOSA 2" BRIDA	UND	2,00
7000	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO**		
7057	KIT DE CONTRABRIDAS, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y EMPAQUE DE DN <= 4"	UND	4,00
	PRESUPUESTO SST & AMBIENTAL		
1	BARRERA CON CINTA PLASTICA (Incluye base en madera)	MTS	487,04
3	SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	MES	1,00
6	SUMINISTROS DE HIGIENE PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN OBRA.	MES	1,00

10. REGISTO FOTOGRAFICO

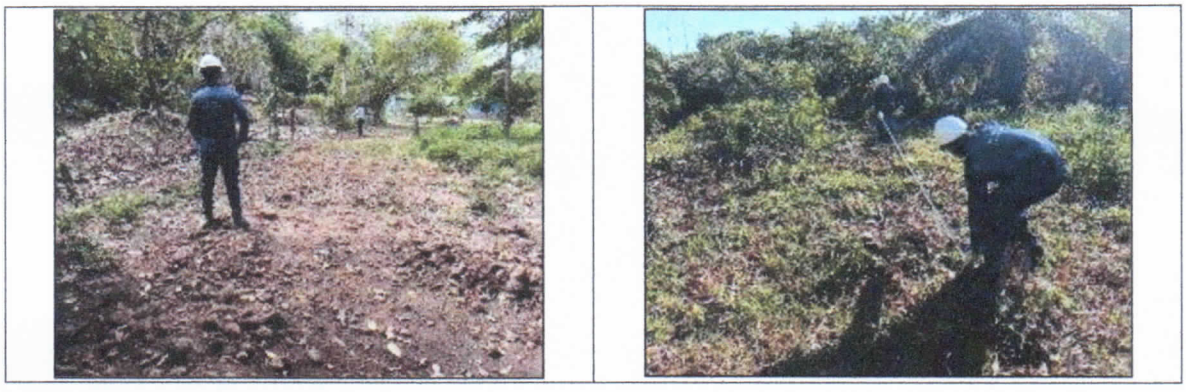

- **Localización y Replanteo Acueducto**



- **Retiro de Material sobrante**



- **Descapote Manual**



- **Excavación Manual**



- **Relleno Tipo 1 (Arena de Río)**




- **Relleno tipo 3 (material proveniente de excavación)**



- **Suministro e instalación de tuberías PVC Dn= 2", 3" y 4".**



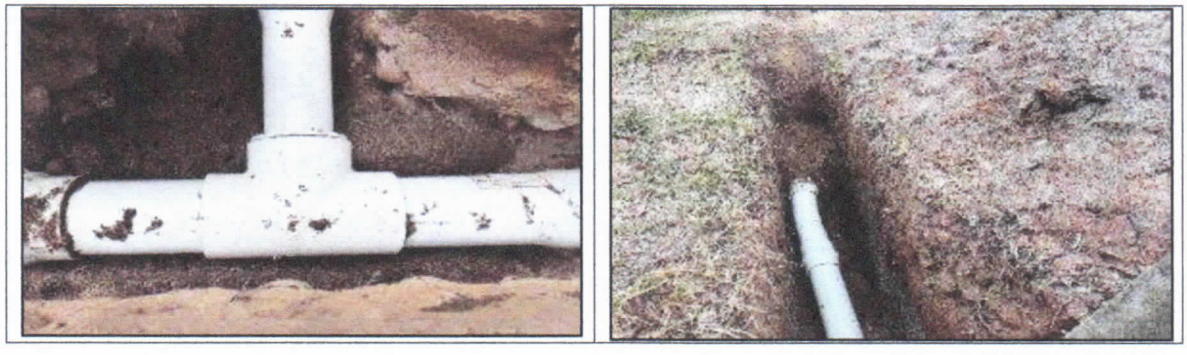

- **Suministro e instalación de accesorios de acueducto.**




- **Suministro e instalación de elementos hidráulicos:**







- **Actividades Seguridad y salud en el trabajo:**


11. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO

11.1 Avance físico

En función de la ejecución del proyecto relacionado con la planeación proyectada tenemos lo siguiente:

El Contrato tiene un avance total del 53,52 %, sobre un 47,94 % programado.

PROGRAMADO VS EJECUTADO

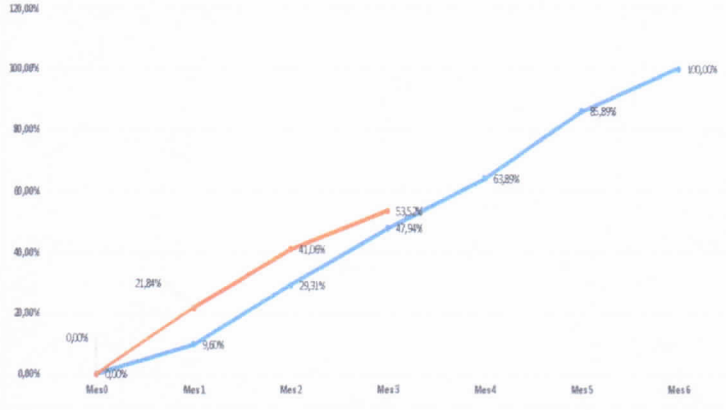

11.2 Avance en tiempo

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO EN MESES	3 MESES
AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO RESPECTO AL TIEMPO DEL CONTRATO	50,00 %

11.3 Avance financiero:


Durante el segundo mes, no se cobrará acta, por tanto, no hay avance financiero.

ACTA PARCIAL 01		FECHA
CONTRATISTA	$ 210.897.958,00	16-ago-24
INTERVENTOR	**$ 15.289.681,68**	16-ago-24

12. REPORTE DEL ESTADO DE TIEMPO:

A continuación, se relaciona reporte del tiempo correspondiente al periodo comprendido entre los dias 17 de septiembre 2024 hasta 16 de octubre 2024.



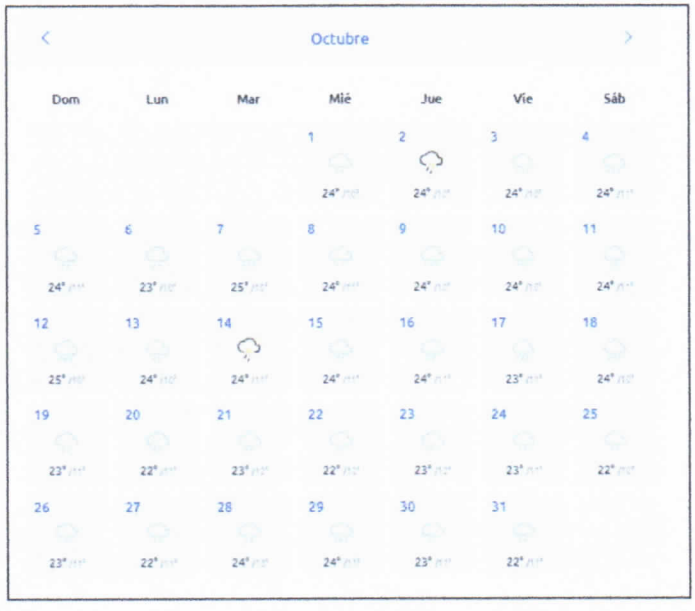

En este sentido, se observa la proporción del estado del tiempo en función de los días lluviosos, destacándose que durante este periodo predominan los días sin lluvia. Evidenciandose en la torta del estado del tiempo tan solo 5 días de lluvia.



13. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

13.1 GESTION SST DEL MES:

- **ENTREGAS Y REPOSICION DE EPP**

En el periodo de este informe la interventoría ha realizado seguimiento al contratista para velar por el cumplimiento del uso de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, y epp, que el contratista entrega al personal de obra dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en el ámbito laboral y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

ANEXO 7 (*reposición de epp)*

- **CHARLAS DIARIAS HSE**

La interventoría hace seguimiento antes de iniciar labores, el área de SST y ambiental, con el apoyo del área técnica, realiza charlas diarias de 5 min, donde se divulgan los riesgos del día

de acuerdo a cada actividad a ejecutar y el acompañamiento constante del maestro de obra y SST operativo.

ANEXO 7 (Charlas *de seguridad*)

- **INSPECCION DE HERRAMIENTAS**

La interventoría hace seguimiento en campo del estado de las herramientas y se hace recomendaciones con el objetivo de garantizar la integridad física de los trabajadores. Además, se evidencia el acompañamiento del sst operativo.

ANEXO 1 (Inspección de herramientas)

- **PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

La interventoría se ha asegurado de realizar el seguimiento al pago de todas las planillas de parafiscales para el personal contratado

ANEXO 7 (Pago de planillas)

- **RELACION PERSONAL DE OBRA**

ITEM	NOMBRES	ID	CARGO	FECHA INICIO	PENSION	SALUD	ARL	CAJA COMPENSACION
7	ESNEIDER JESUS VEGA ANGARITA	1118826262	OBRERO	25/07/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
16	JULIETH MARCELA OLIVEROS FRANCO	1096207694	AUXILIAR HSE	15/07/2024	PORVENIR	SANITAS	COLPATRIA	CAFABA
17	ELKIN FABIANO VERGEL PEREZ	88282070	RESIDENTE	15/07/2024	PORVENIR	SALUD MIA	COLPATRIA	CAFABA
18	MARBIE ROSSANA VEGA RUIZ	1096205115	SOCIAL	15/07/2024	PROTECCION	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
19	JHON HENRY VALDERRAMA ALARCON	13850736	AMBIENTAL	15/07/2024	COLPENSIONES	SANITAS	COLPATRIA	CAFABA
20	JAIME HERNAN MARTINEZ PLATA	1098712774	DIRECTOR	21/05/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
21	FABIAN MAURICIO	91489847	SUPERVISOR	24/05/2024	PROTECCION	FAMISANAR	COLPATRIA	CAFABA

	ROJAS VARGAS							

PERSONAL RETIRADO

ITEM	NOMBRES	ID	CARGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PENSION	SALUD	ARL	CAJA COMPENSACION
1	ELIBERTO ARDILA BENAVIDES	91136061	OBRERO	13/08/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
2	LUIS MIGUEL PINTO GONZALEZ	1005179335	OBRERO	13/08/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
3	EDUIN ENRIQUE ANGARITA SANCHEZ	15452121	OBRERO	13/08/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
4	JHON JAIRO SUAREZ GARCIA	1099373820	OBRERO	29/07/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
5	SERGIO ANDRES VEGA MUÑOZ	1102722733	OBRERO	29/07/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
6	ELKIN MANUEL LOBO GUERRA	85166845	OBRERO	29/07/2024	29/08/2024	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
8	JULIETH NATALIA BONILLA HERNANDEZ	1005259986	AUX. HSE	25/07/2024	30/09/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
9	EUDY ARENIS DURAN	1098788036	OBRERO	25/07/2024	29/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
10	BENUR GONZALEZ RAMIREZ	1098686205	OBRERO	25/07/2024	30/07/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
11	JHON FREDDY SISA JAIMES	1102387771	OBRERO	25/07/2024	14/09/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
12	JAIDER ENRIQUE SEGURA LUNA	10903175	OBRERO	25/07/2024	29/08/2024	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
13	ONOFRE PEREZ CARRASCAL	91427387	OBRERO	25/07/2024	14/09/2024	COLPENSIONES	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA

14	RAUL JAIMES	91476587	OBRERO	25/07/2024	1/08/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA
15	CAMILO VALDIVIESO MUÑOZ	1096192986	OBRERO	25/07/2024	14/09/2024	PORVENIR	NUEVA EPS	COLPATRIA	CAFABA

- **AUSENTISMO LABORAL**

Durante este período no se presento ausentismo laboral

- **ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES**

Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales

- **REPORTE DE HORAS HOMBRES TRABAJADAS**

Durante este periodo se generaron 1880 HHT, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

No de Semana	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	MES	ACUMULADO
N° TRABAJADORES	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*
H.H. TRABAJADAS	*376,0*	*376,0*	*376,0*	*376,0*	*376,0*	*1.880,0*	*1.880,0*
TOTAL H.H	***376,0***	***376,0***	***376,0***	***376,0***	***376,0***	***1.880,0***	***1.880,0***

- **REPORTE DE HORAS CAPACITACION**

Durante este periodo se generaron 6.4 HHC, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

No de Semana	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	MES	ACUMULADO
H.H. CAPACITACIÓN	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*6,4*	*6,4*
AUDITORIAS Y VISITAS DE SEGURIDAD	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
INSPECCIONES	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*30,0*

ACCIDENTES E INCIDENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ACCIDENTES/ INCIDENTES AMBIENTALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS SST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS SOCIALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRABAJOS SUSPENDIDOS POR ASPECTOS AMBIENTALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACIDAD X EFG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INCAPACIDAD CON OCASIÓN AL TRABAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- **REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA GESTIÓN SST DEL MES**

CHARLAS ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES



INSPECCIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO





SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE PELIGROS



REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS



REPOSICION DE EPP



14. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

14.1. COMPONENTE AMBIENTAL

El contratista realiza las actividades de la obra, cumpliendo con el cuido del medio ambiente.

Se realizó continuo seguimiento para este periodo la reposición de la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores del proyecto, verificando la entrega de casco, guantes, tapones de silicona, botas de seguridad y demás elementos como lo está estipulado en el PMA.

La evidencia se encuentra en el **ANEXO 7** (Inspección y entrega de EPP) del ítem de SST al inicio de este informe.

- **INSPECCIÓN Y ENTREGA DE EPP**

Esta interventoría verificó el cumplimiento del contratista en mantener el punto ecológico en el área y dando cumplimiento a la nueva normatividad colombiana y cumplen con el nuevo código de colores, además cuentan con el kit de emergencia como camillas rígidas, botiquín de primeros auxilios, extintor de 10 libras e inspección ambiental, además se capacitó al personal en temas ambientales.

- **EXCAVACIÓN**

Se realizaron actividades con referencia a este programa, se continúa haciendo uso del material sobrante de la excavación ya que es óptimo para su reutilización, sin afectar la zonas aledañas ni vegetación del área intervenida por la obra.

- **CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS**

No se presentaron quejas por ruido, material particulado, ni emisión de gases combustibles de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = NOquejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido = 0$

14.2. REGISTRO FOTOGRAFICO

ELEMENTOS DE EMERGENCIA





PUNTO ECOLOGICO





Durante el periodo se recibe informe mensual del contratista donde se realiza la verificación de las actividades ejecutadas, adjuntando el registro fotográfico.

A la fecha no se evidencian quejas presentadas por la comunidad, para el informe ambiental no se han recibido PQR, por las entidades ambientales o la comunidad.

15. SEGUIMIENTO SOCIAL

El contratista presenta a la interventoría el seguimiento de todas las actividades sociales, reuniones con la comunidad.

16. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	:	1262–24
CONTRATANTE	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	ICI LTDA
NIT.	:	829000757-4
REP LEGAL	:	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C.	:	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
DIRECCIÓN	:	calle 42 21-79.
TELÉFONO	:	311 4226323
CORREO ELECTRÓNICO	:	interventoriaici.ltda@gmail.com
LOCALIZACIÓN	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ING MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FETCHER
OBJETO	:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	:	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	17 de abril del 2024
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	SEIS (6) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-09557 del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL

		DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024
BANCO DE PROYECTOS	:	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023
CEPAA	:	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO	:	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	:	16 DE ENERO DEL 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	:	47,94 %
PERIODO DE EJECUCIÓN	:	17 DE AGOSTO DEL 2024 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR DEL ACTA PARCIAL N°1	:	**NO SE COBRA ACTA PARCIAL EN EL PERÍODO**
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR	:	**$ 54.718.018,32**

17. ACTAS DE LA INTERVENTORIA

En el presente período no se presenta Acta de Interventoría

18. POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

GARANTIAS	VALOR	VIGENCIA INICIAL (dd/mm/aa)	VIGENCIA FINAL (dd/mm/aa)
Cumplimiento	$ 14.001.540,00	17/07/2024	17/07/2025
Salarios y Prestaciones sociales	$ 7.000.770,00	17/07/2024	17/01/2028
Calidad del servicio	$ 14.001.540,00	17/07/2024	17/07/2030

Se adjuntan pólizas iniciales (VER ANEXOS)

19. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

Se han realizado los informes técnicos semanales con el fin de mantener una trazabilidad para la entidad contratante del avance de las actividades de obra, así como lograr

evaluar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales y legales del contrato de OBRA No. 1261-2024.

Esta interventoría ha velado para que la comunicación del contratista y la entidad municipal sea constante a través de la supervisión ejercida para la verificación de las condiciones mínimas exigidas para la obra y de igual manera se logre el cumplimiento de los plazos pactados en el contrato OBRA No.1261-2024.

Esta interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento del contratista en lo referente a la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales).

Se ha verificado permanentemente a calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato.

Se han verificado y medido oportunamente los ítems y sus cantidades establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada como parte del proyecto entregada por el distrito de Barrancabermeja, para el correcto seguimiento a la obra objeto de esta interventoría externa.

Se ha informado a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo.

Se ha realizado la verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato.

Se ha velado por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental que hace parte del componente del proyecto y como actividad contractual que se debe implementar, realizando el correcto seguimiento mensual.

Esta interventoría ha realizado el seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendando los ajustes en plazo a que haya lugar.

Se ha plasmado en bitácora y comités todo lo concerniente a dudas del proyecto en cuanto a diseños, localizaciones, diferencias entre diseños estructurales y diseños arquitectónicos para realizar su posterior revisión y tomar una decisión junto a supervisión sobre los cambios a los que haya lugar.

20. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL

Se han programado y coordinado con el contratista y supervisión del distrito de Barrancabermeja, reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, en estas reuniones se ha presentado el estado de avance del contrato, así como también se han tratado y analizado temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre todas las partes soluciones prácticas y oportunas.

Se ha realizado la entrega de los informes semanales requeridos por la supervisión del distrito de Barrancabermeja, donde se ha presentado e informado el estado de ejecución y avance, este informe semanal se ha presentado con corte al día domingo de cada semana, y ha sido entregado a más tardar los días miércoles de la siguiente semana.

El día 25 de septiembre, se firmó el Otro si N° 001, al contrato N° 1261-24, por medio del cual se actualizó el Plan de Pagos, el cual, quedó de la siguiente manera:

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 965.704.038,00**	**FECHA PROYECTAD DE PAGOS**	**FUENTE DE FINANCIACIÓN**
ACTAS PARCIALES	**VALOR ACTA**		
ACTA 1	$ 210.897.957,00	4 de octubre 2024	SGR
ACTA 2	$ 185.608.102,00	5 de noviembre 2024	SGR
ACTA 3	$ 468.504.911,00	3 de diciembre 2024	SGR
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN	$ 100.693.068,00	8 de enero de 2025	SGR
TOTAL EJECUCIÓN	**$ 965.704.038,00**		

Anexo 5: Otro si No. 1 al contrato de obra No 1261-1.

21. CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El día 10 de octubre del 2024, se firmó Otro si N° 001, al contrato de interventoría N° 1262-24, por medio del cual se actualizó el Plan de Pagos, el cual, quedó de la siguiente manera.

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 70.007.700,00**	**FECHA PROYECTADA DE PAGOS**	**FUENTE DE FINANCIACION**
ACTAS PARCIALES	**VALOR ACTA**		
Acta 1	$ 15.289.682,00	17 de octubre de 2024	SGR
Acta 2	$ 13.455.480,00	5 de noviembre de 2024	SGR
Acta 3	$ 33.960.735,00	3 de diciembre de 2024	SGR
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	$ 7.301.803,00	8 de enero 2025	SGR
TOTAL EJECUCION	**$ 70.007.700,00**		

Anexo 6: Otro si No. 1 al contrato de interventoría No 1262-1.

22. ACTAS DE COMITÉ O REUNION

Durante este periodo no se realizaron actas de seguimiento del contrato.

23. CORRESPONDENCIA ENVIADA

10/10/2024: 005-24: SOLICITUD INFORME TECNICO DE AVANCE, INFORME HSE Y AMBIENTAL CON SUS ANEXOS

24. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

18/09/2024: ENTREGA PAGO Planilla seguridad social e informes de Contrato de obra No. 1261-24.
16/10/2024: Entrega pago planilla seguridad social e informes de contrato de obra No.1261-24. Mes septiembre 2024.

25. RELACION PERSONAL INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JESSICA PAOLA FORERO AVILA	1.096.226.065	ING RESIDENTE

26. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

El valor estimado del contrato es de SETENTA MILLONES SIETE MIL SETESCIENTOS PESOS CON M/CTE ($ 70.007.700,00) incluido IVA, costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación.

23.1. FORMA DE PAGO

La entidad pagara el contrato de la siguiente manera:

a. Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra así:

   El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al sistema de seguridad

social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

b. Ultimo pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor solo aprobara el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará una vez aporte la liquidación del contrato de obra pública y liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC del distrito.


Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

En todo caso las partes acuerdan que ya para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.

27. RESUMEN BALANCE FINANCIERO

A la fecha se ha presentado un cobro de interventoría, por el valor de $ 15.289.681,68. Durante el período no se cobró Acta.

28. CURVA DE AVANCE FISICO

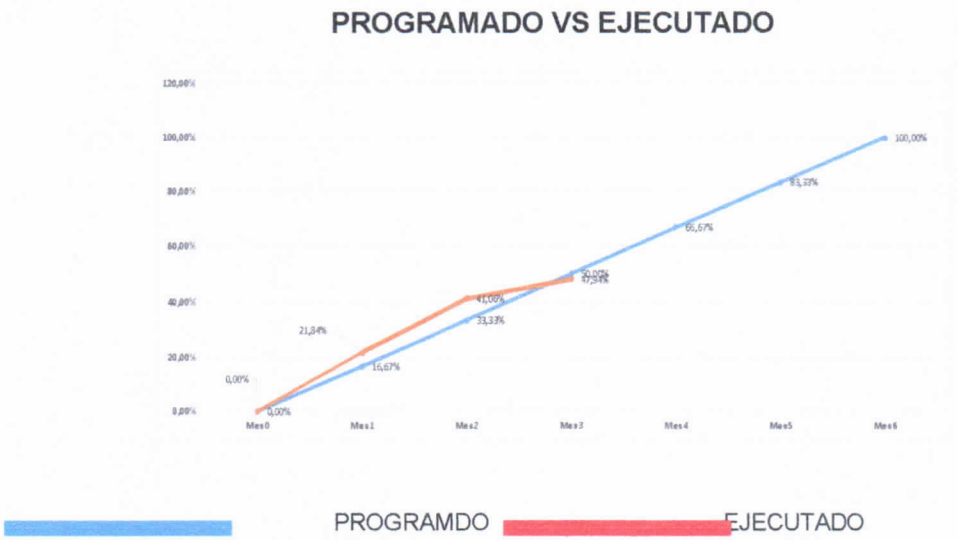

29. CONCLUSIONES

- Durante este segundo mes se presenta un avance físico del 47,94 % vs un programado del 50,00 %. Debido a que la forma de pago de la Interventoría se da por Avance de Obra, el avance ejecutado presenta un ligero atraso con respecto al programado, el cual se programa en partes iguales por mes.

- Se realizan los debidos controles por parte de esta interventoría.

JUAN PABLO CASTELLANO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

30. ANEXOS

- Anexo 1: pago seguridad social interventoría
- Anexo 2: pago seguridad social contratista
- Anexo 3: bitácora de obra
- Anexo 4: oficios enviados y recibidos
- Anexo 5: otrosí número 01 de interventoría.
- Anexo 6: anexos HSE contratista

- Anexo 1: pago de seguridad social interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000757
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 42 21 79 BARRIO LA VICTORIA	TELÉFONO:	6009251
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7946353129		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES septiembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/10/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	997446242	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 416.000	$ 2.100	$ 418.100
SUBTOTALES:										**$ 416.000**	**$ 2.100**	**$ 418.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
SUBTOTALES:													**$ 104.000**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 104.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 147.100	$ 147.100	$ 800	$ 0	$ 147.900
SUBTOTALES:									**$ 147.100**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 147.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	2	$ 104.000	$ 600	$ 104.600
SUBTOTALES:			**$ 104.000**	**$ 600**	**$ 104.600**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1096185072	HOYOS PEREZ JOSE ALFREDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1096226065	FORERO AVILA JESSICA PAOLA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 775.200

- Anexo 2: pago de seguridad social contratista.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901819149	3	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 68 28 43	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3175094534	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1037978908	9477080730	E	2024/10/10	2024/11/08	BANCOLOMBIA	29	$6,908,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (12 Afiliados)						$15,220,001	$2,435,300			$15,220,001	$1,902,700			$15,220,001	$608,900			$15,220,001	$1,059,700		$15,220,001	$761,500
Centro de Trabajo: Principal (12 Afiliados)						**$15,220,001**	**$2,435,300**			**$15,220,001**	**$1,902,700**			**$15,220,001**	**$608,900**			**$15,220,001**	**$1,059,700**		**$15,220,001**	**$761,500**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)						**$15,220,001**	**$2,435,300**			**$15,220,001**	**$1,902,700**			**$15,220,001**	**$608,900**			**$15,220,001**	**$1,059,700**		**$15,220,001**	**$761,500**
1	CC	1005259986	BONILLA HERNANDEZ JULIETH NATALIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	63507675	CAMARGO CAMACHO ZULMA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
3	CC	1098712774	MARTINEZ PLATA JAIME HERNAN	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF38	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$3,000,000	$150,000
4	CC	1096207694	OLIVEROS FRANCO JULIETH MARCELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
5	CC	91427387	PEREZ CARRASCAL ONOFRE	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS041	14	$606,667	$75,900	CCF38	14	$606,667	$24,300	14-4	14	$606,667	$42,300	14	$606,667	$30,500
6	CC	91489847	ROJAS VARGAS FABIAN MAURICIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
7	CC	1102387771	SISA JAIMES JHON FREDDY	230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900	CCF38	14	$606,667	$24,300	14-4	14	$606,667	$42,300	14	$606,667	$30,500
8	CC	13850736	VALDERRAMA ALARCON JHON HENRY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
9	CC	1096192986	VALDIVIESO MUÑOZ CAMILO	230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$75,900	CCF38	14	$606,667	$24,300	14-4	14	$606,667	$42,300	14	$606,667	$30,500
10	CC	1118826262	VEGA ANGARITA ESNEIDER JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
11	CC	1096205115	VEGA RUIZ MARBIE ROSSANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
12	CC	88282070	VERGEL PEREZ ELKIN FABIANO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$162,500	CCF38	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
Total			**Afiliados(12)**			**$15,220,001**	**$2,435,300**			**$15,220,001**	**$1,902,700**			**$15,220,001**	**$608,900**			**$15,220,001**	**$1,059,700**		**$15,220,001**	**$761,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901819149	3	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 68 28 43	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3175094534	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1037978908	9477080730	E	2024/10/10	2024/11/08	BANCOLOMBIA	29	$6,908,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,435,300	$50,600	$0	$2,485,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$305,100	$6,400	$0	$311,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,714,200	$35,500	$0	$1,749,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$8,700	$0	$424,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,059,700	$22,000	$0	$1,081,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$1,059,700	$22,000	$0	$1,081,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$608,900	$12,600	$0	$621,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	12	$608,900	$12,600	$0	$621,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$1,902,700	$39,600	$0	$1,942,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$3,400	$0	$165,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$162,500	$3,400	$0	$165,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,014,300	$21,000	$0	$1,035,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$75,900	$1,600	$0	$77,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$162,500	$3,400	$0	$165,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$6,800	$0	$331,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$456,900	$9,500	$0	$466,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$456,900	$9,500	$0	$466,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$304,600	$6,300	$0	$310,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$304,600	$6,300	$0	$310,900
TOTAL				12	$6,768,100	$140,600	$0	$6,908,700

2024/11/29 10:47 AM

- Anexo 3: bitácora de obra

17 Septiembre 2024.
Se continua con excavación manual para instalación de tubería PN=3"
Se realiza relleno manual con arena y material proveniente de excavación
Jaime Martínez

18 Septiembre 2024
Se realiza localización y replanteo para trazado por diseño.
Se realiza roceria y desmalezado manual para instalación de tubería.
Jaime M.

19 Septiembre 2024
Se realiza roceria y desmalezado manual para instalación de tubería
Jaime M.

20 Septiembre 2024
Se realiza roceria y desmalezado manual para instalación de tubería
Jaime M.

23 Septiembre 2024
Se realiza localización y replanteo para trazado de tubería.
Se realiza roceria y desmalezado manual para instalación tubería
Jaime M.

24 Septiembre 2024
Se realiza roceria y desmalezado manual para instalación de tubería
Jaime M.

25 Septiembre 2024
Se realiza roceria y desmalezado manual para instalación de tubería
Jaime M.

26 Septiembre 2024
Se realizo roceria y desmalezado manual para instalación de tubería
Jaime M.

014

27 septiembre 2024
Se realiza roceria manual sobre trazado levantado topog
Jaime M.

30 septiembre 2024
Se realiza roceria manual y desmalezado
Jaime M.

01 Octubre 2024
Se realiza roceria manual y desmalezado sobre trazado
Se continua con excavación manual para instalación
tubería 3"
Jaime M.

02 Octubre 2024
Se continua con excavación manual para instalación de
tubería DN = 3"
Se realiza relleno con cama de arena y recubrimiento
de tubería instalada.
Se realiza relleno manual con material proveniente
excavación.
Jaime M.

03 Octubre 2024
Se realiza excavación manual para instalación de tub
Se procede rellenos con arena y material proveniente
de excavación
Jaime M.

04 Octubre 2024
Se realiza excavación manual para instalación de tub
Se procede con rellenos manuales mediante arena
y material proveniente de excavación
Se procede con jornada de retiro de material
sobrantes producto de actividades
Jaime M.

07 Octubre 2024
Se continua con excavación manual para instalación de tubería 3"
Se continua con rellenos sobre trazado de tubería instalada.
Se continua con retiro de material sobrante
Jaime M.

08 Octubre 2024.
Se realiza excavación manual para instalación de tubería 3"
Se continua con relleno en cama de arena y recubrimiento para protección de tubería instalada.
Se continua con retiro de material sobrante.
Jaime M.

09 Octubre 2024
Se realizan excavaciones manuales para instalación de tubería 3"
Se continua con relleno manual con cama de arena
Se realiza relleno con material proveniente de excavación.
Se continua con retiro de material sobrante.
Jaime M.

10 Octubre 2024.
Se realiza excavación manual para instalación de tubería 3"
Se realizan rellenos manual sobre tubería instalada
Jaime M.

11 Octubre 2024
Se realiza raseo y desmalezado manual para instalación de tubería 3"
Se continua con instalación de tubería dn = 3".
Se realizan rellenos en cama de arena, recubrimiento y material proveniente de excavación.
Jaime M.

12 octubre 2024
Se realiza raseria manual y desmalezado para instalacion tubería 3"
Jaime M.

15 Octubre 2024
Se continua con instalacion manual de tubería
Se realiza relleno manual con arena y material pa
de excavación sobre tubería instalada.
Jaime M.

15 octubre 2024.
Se realiza roceria y desmalezado manual.
Se continua con instalacion de tubería Dn = 3
Se realizan rellenos manuales.
Se realiza retiro de material sobrante.
Jaime M.

16 Octubre 2024
Se realiza roceria y desmalezado manual
Se realiza excavación manual y rellenos sobre tub
a instalar en Dn = 3".
Jaime M.

17 octubre 2024
Se continua con excavación manual para instalac
de tubería Dn = 3"
Se realiza relleno manual con arena y material p
de excavación.
Se realiza retiro de material sobrante
Jaime M.

18 Octubre 2024
Se realiza jornada de materiales sobrantes
Jaime M.

19 octubre 2024
Se realiza jornada de retiro de materiales sobr
producto de actividades de instalacion de tuberi
en el proyecto
Jaime M.

- Anexo 4: oficios enviados y recibidos

INGENIO CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LIMITADA.

Barrancabermeja, 10 de octubre del 2024 005-24

Señores

UT LINEA CASCAJERA.
ZULMA MILENA CAMARGO
CAPACHO
Ciudad,

Referencia: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.

Asunto: SOLICITUD INFORME TECNICO DE AVANCE, INFORME HSE Y AMBIENTAL CON SUS ANEXOS

Cordialmente,

Se solicita la siguiente documentación:

1. Pago de la seguridad social de los trabajadores, y personal mínimo del contrato No. 1261-24 empleados durante el periodo del mes de septiembre.
2. Informe técnico de avance de obra, del periodo comprendido entre el 17 de septiembre del 2024 al 16 de septiembre del 2024, igualmente el informe de actividades ejecutadas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental junto con sus anexos.

Atentamente,

Recibí: Elkin Vargel
10/10/24

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C. 19.597.865 de FUNDACIÓN
Representante legal.

Tel: (7) 6009251 - 301-241-9475
Dirección electrónica: INTERVENTORIAICI.LTDA@gmail.com
Barrancabermeja - Santander

UT Línea Cascajera

Barrancabermeja 18 de Septiembre de 2024

UT-CAS-05-1-24

Señores
ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
Barrancabermeja

REFERENCIA: Contrato No. 1261-24 "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

Asunto. Entrega pago planilla seguridad social e informes de Contrato de obra No. 1261-24

Estimados señores:

Mediante el presente la UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución del contrato de obra No.1261-24 se permite realizar entrega informe técnico y HSE junto a sus anexos. Del mismo modo, soporte de la seguridad social correspondiente al personal que laboró para el contrato en referencia durante el mes de agosto del 2024.

Atentamente,

ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
Representante legal

UT Línea Cascajera

Barrancabermeja 16 de Octubre de 2024

UT-CAS-05-2-24

Señores
ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
Barrancabermeja

REFERENCIA: Contrato No. 1261-24 "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

Asunto. Entrega pago planilla seguridad social e informes de Contrato de obra No. 1261-24. Mes septiembre 2024

Estimados señores:

Mediante el presente la UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecución del contrato de obra No.1261-24 se permite realizar entrega informe técnico y HSE junto a sus anexos. Del mismo modo, soporte de la seguridad social correspondiente al personal que laboró para el contrato en referencia durante el mes de septiembre del 2024.

Atentamente,

ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
Representante legal

Anexo 5: otrosí numero 01 interventoría.
y otrosí numero 01 de obra

OTROSÍ No 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1261-24

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	1261–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900 - 6
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LINEA CASCAJERA
NIT	901819149-3
REPRESENTANTE LEGAL	ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
IDENTIFICACION	C. C. 63.507.675 de Bucaramanga
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	LPO-009-2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($965.704.038)
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTORIA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01
FUENTE DE FINANCIACION:	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-09556 del 07 de Diciembre de 2023 con cargo al rubro 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-01, por concepto de OBRA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) por valor de MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.013.226.098); Certificado de Disponibilidad Presupuestal del SPGR No. 5523 del 07 de Diciembre de 2023 con cargo al rubro 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091, Fuente: Nación, por valor de MIL TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.013.226.098).
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02970 DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 SGR - 324 del 2024-05-03

APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.14452851 CO1.WRT.14452698 DEL 26 DE JUNIO DE 2024 CO1.WRT.14824407 CO1.WRT.14824559 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CEPPA No.	87884 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	17 DE JULIO DE 2024
FECHA FINALIZACIÓN:	16 DE ENERO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

En el Distrito de Barrancabermeja, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2024, se reunieron la ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 006 del cinco (05) de enero de 2024, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias y quien para efectos del presente documento se denominará EL DISTRITO, quien actúa en representación del Distrito de Barrancabermeja y por la otra parte la unión temporal UT. LINEA CASCAJERA, cuyo NIT es 901819149-3 representado legalmente por ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.507.675 de Bucaramanga Contratista; hemos convenido celebrar el presente Otro sí No 01 al contrato de obra No. 1261-24, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.", previas los siguientes,

CONSIDERANDO:

1. Que el contrato fue suscrito por las partes el día 29 de abril del 2024.

2. Que se suscribió ACTA DE INICIO al contrato de obra No 1261-24. CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER" el día 17 de julio de 2024.

3. Que se hace necesario mediante el presente OTROSÍ No 01, actualizar el plan de pagos establecido en el SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS-SPGR a través de una nueva reprogramación del cronograma de desembolso, estableciendo nuevas fechas y valores, lo anterior teniendo en cuenta los aspectos sociales y técnicos presentados en desarrollo de la ejecución que han impedido el trámite de la primera cuenta de cobro tal y como estaba programada.

Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Actualícese, de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones mencionadas, la CLAUSULA 8 – FORMA DE PAGO, del DOCUMENTO ANEXO DE CONDICIONES del contrato de obra No 1261 de 2024, el cronograma de pagos del SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS-SPGR. Quedando actualizada de la siguiente forma:

(...) CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO. La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato mediante pagos mensuales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 90% del valor del Contrato y aportes parafiscales, a través de actas parciales. El 10 % restante se pagará mediante acta final y acta de liquidación del Contrato y aportes parafiscales:

VALOR CONTRATO INICIAL	**$**	**965.704.038,00**	**FECHA PROYECTADA DE PAGOS**	**FUENTE DE FINANCIACION**
ACTAS PARCIALES	**VALOR ACTA**			
Acta 1	$	210.897.957,00	4 de octubre de 2024	SGR
Acta 2	$	185.608.102,00	5 de noviembre de 2024	SGR
Acta 3	$	468.504.911,00	3 de diciembre de 2024	SGR
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	$	100.693.068,00	8 de enero 2025	SGR
TOTAL EJECUCION	**$**	**965.704.038,00**		

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

SEGUNDO: Las demás cláusulas, condiciones y términos pactados en el documento ANEXO DE CONDICIONES del contrato de obra No. 1261 de 2024, continúan como inicialmente fueron convenidas.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja a los veinticinco (25) del mes de septiembre de 2024.

UT. LINEA CASCAJERA
R.L/ ZULMA MILENA CAMARGO CAMACHO
Contratista

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyecto	Mario Daniel Hernandez Fleischer		25-09-2024
Proyecto Aspectos Juridicos	Erich Zamir Gomez Velasquez - Abg. - CPS		25-09-2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

OTROSÍ No 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1262-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1262–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACION	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MIN-004-2024
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
DURACIÓN	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02
FUENTE DE FINANCIACION:	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de disponibilidad presupuestal No. **23-09557** del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024 CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024
CEPPA No.	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	17 DE JULIO DE 2024
FECHA FINALIZACIÓN:	16 DE ENERO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	17 DE JULIO DE 2024

En el Distrito de Barrancabermeja, a los diez (10) del mes de octubre de 2024, se reunieron la ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario,

Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 006 del cinco (05) de enero de 2024, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias y quien para efectos del presente documento se denominará EL DISTRITO, quien actúa en representación del Distrito de Barrancabermeja y por la otra parte la firma ICI LTDA, representada legalmente por JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, cuyo NIT es 829000757-4, interventor; hemos convenido celebrar el presente Otro sí No 01 al contrato de interventoría No. 1262-24, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER", previas los siguientes,

CONSIDERANDO:

1. Que el contrato fue suscrito por las partes el día 29 de abril del 2024.
2. Que se suscribió ACTA DE INICIO del contrato de interventoría No. 1262-24, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER" el día 17 de julio de 2024.
3. Que se hace necesario mediante el presente OTROSÍ No 01, actualizar el plan de pagos establecido en el SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS-SPGR a través de una nueva reprogramación del cronograma de desembolso, estableciendo nuevas fechas y valores, lo anterior teniendo en cuenta los aspectos sociales y técnicos presentados en desarrollo de la ejecución del contrato de obra No. 1261-24 que han impedido el trámite de la primera cuenta de cobro tal y como estaba programada.

Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Actualícese, de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones mencionadas, la CLAUSULA 5 – FORMA DE PAGO, del DOCUMENTO ACEPTACION DE OFERTA del contrato de interventoría No 1262 de 2024, el cronograma de pagos del SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS-SPGR. Quedando actualizada de la siguiente forma:

CLÁUSULA 5. FORMA DE PAGO. Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de Actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra, así:
El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Ultimo Pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor sólo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez aporte la Liquidación del contrato de obra pública, y Liquidación del contrato de interventoría, siempre y

cuando cumpla las aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC del Distrito.
Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

VALOR CONTRATO INICIAL	**$**	**70.007.700,00**		
ACTAS PARCIALES	**VALOR ACTA**		**FECHA PROYECTADA DE PAGOS**	**FUENTE DE FINANCIACION**
Acta 1	$	15.289.682,00	17 de octubre de 2024	SGR
Acta 2	$	13.455.480,00	5 de noviembre de 2024	SGR
Acta 3	$	33.960.735,00	3 de diciembre de 2024	SGR
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	$	7.301.803,00	8 de enero 2025	SGR
TOTAL EJECUCION	**$**	**70.007.700,00**		

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

SEGUNDO: Las demás cláusulas, condiciones y términos pactados en el documento ANEXO DE CONDICIONES del contrato de obra No. 1261 de 2024, continúan como inicialmente fueron convenidas.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja a los diez (10) del mes de octubre de 2024.

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

ICI LTDA
R.L./ JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
Interventor

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyecto	Mario Daniel Hernandez Fletscher		10-10-2024
Proyecto Aspectos Juridicos	Erich Zamir Gomez Velasquez – Abg. - CPS		10-10-2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

Anexo 6: anexos hse contratista..

UT Línea Cascajera

"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

ANEXO 1. INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

UT Linea Cascajera	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO:	HSE-F-33
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: ACUEDUCTO CASCAJERA

CONTRATO: 1261-24

PERIODO : DEL 17 AL 23 DE SEP 2024

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	3	X		X		X		X		X		X			
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X			
Barras	Estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Pisones	Base, altura															
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes															
Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remendado), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)															
Punzon	Recto, adecuado															
Martillos, porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas															
Serruchos	Mango, dientes (trabados)															
Seguetas	Marco, hoja, instalación															
Machetes	Mango, filo, funda	1	X		X		X		X		X		X			
Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)															
Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas															
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado															
Reaches	Estado físico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro															
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas															
Extensiones	Tomas, estado de cables															
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	1	X		X		X		X		X		X			
Tijeras	Estado general															
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)															
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)															
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)															
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)															
Tarrajas	Dados, dientes															
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñon															
Diferenciales	Pin de tuerca, estado de las tuercas y cadena, soporte															
Poleas	Rodamiento y engranaje															
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla															
Ponchadora	Ajuste hidráulico															
Lasos:	Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas															
Otros:																

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

UT Linea Cascajera	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO:	HSE-F-33
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: ACUEDUCTO CASCAJERA | CONTRATO: 1261-24

PERIODO : DEL 24 AL 29 DE SEP 2024

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	3	X		X		X		X		X		X			
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X			
Barras	Estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Pisones	Base, altura															
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes															
Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remendado), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)															
Punzon	Recto, adecuado															
Martillos, porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas															
Serruchos	Mango, dientes (trabados)															
Seguetas	Marco, hoja, instalación															
Machetes	Mango, filo, funda	1	X		X		X		X		X		X			
Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)															
Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas															
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado															
Reaches	Estado físico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro															
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas															
Extensiones	Tomas, estado de cables															
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	1	X		X		X		X		X		X			
Tijeras	Estado general															
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)															
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)															
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)															
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)															
Tarrajas	Dados, dientes															
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñon															
Diferenciales	Pin de tuerca, estado de las tuercas y cadena, soporte															
Poleas	Rodamiento y engranaje															
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla															
Ponchadora	Ajuste hidráulico															
Lasos:	Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas															
Otros:																

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

UT Linea Cascajera	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO:	HSE-F-33
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: _____ACUEDUCTO CASCAJERA_____ CONTRATO:_____1261-24_____

PERIODO : DEL _____01_____ AL _____06_____DE ____OCT_____2024

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	3	X		X		X		X		X		X			
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X			
Barras	Estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Pisones	Base, altura															
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes															
Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remendado), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)															
Punzon	Recto, adecuado															
Martillos, porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas															
Serruchos	Mango, dientes (trabados)															
Seguetas	Marco, hoja, instalación															
Machetes	Mango, filo, funda	1	X		X		X		X		X		X			
Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)															
Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas															
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado															
Reaches	Estado físico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro															
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas															
Extensiones	Tomas, estado de cables															
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	1	X		X		X		X		X		X			
Tijeras	Estado general															
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)															
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)															
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)															
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)															
Tarrajas	Dados, dientes															
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñon															
Diferenciales	Pin de tuerca, estado de las tuercas y cadena, soporte															
Poleas	Rodamiento y engranaje															
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla															
Ponchadora	Ajuste hidráulico															
Lasos:	Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas															
Otros:																

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

UT Línea Cascajera	INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO:	HSE-F-33
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: _____ACUEDUCTO CASCAJERA_____ CONTRATO:_____1261-24_____

PERIODO : DEL _____07_____ AL _____13_____DE ____OCT_____2024

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
			SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC	SC	NC
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	3	X		X		X		X		X		X			
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	3	X		X		X		X		X		X			
Barras	Estado general	1	X		X		X		X		X		X			
Pisones	Base, altura															
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes															
Cinceles, punteros	Estado (fisuras, remendado), afilados, sin cabeza tipo hongo (con rebaba)															
Punzon	Recto, adecuado															
Martillos, porras	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, antichispas															
Serruchos	Mango, dientes (trabados)															
Seguetas	Marco, hoja, instalación															
Machetes	Mango, filo, funda	1	X		X		X		X		X		X			
Carretillas	Armazón (fuerte y recto), valde, llanta, mangos, ruedas (asegurada al armazón)															
Alicates	Aislamiento, mandíbulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas															
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado															
Reaches	Estado físico de los dados, funcionamiento de mecanismo de giro															
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas															
Extensiones	Tomas, estado de cables															
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	1	X		X		X		X		X		X			
Tijeras	Estado general															
Llaves (tubo, expansivas)	Estado (grietas, fisuras, remiendos), dientes (desgastados)															
Llaves fijas, de golpe	Estado (grietas, fisuras, remiendos), aristas (desgastadas)															
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)															
Gatos hidráulicos	Empaques (defectuosos), fugas (aceite)															
Tarrajas	Dados, dientes															
Biseladoras	Pines, cadena, manivela, ajuste de boquilla, resorte, seguro, piñon															
Diferenciales	Pin de tuerca, estado de las tuercas y cadena, soporte															
Poleas	Rodamiento y engranaje															
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla															
Ponchadora	Ajuste hidráulico															
Lasos:	Deshilachaduras, cortes, desgarres, quemaduras, hebras sueltas, costuras rotas															
Otros:																

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

UT Línea Cascajera

"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

ANEXO 2. INSPECCIONES DE OBRA E HIGIENE Y SEGURIDAD

UT Linea Cascajera	INSPECCIONES DE OBRA	CODIGO:	HSE-F-31
		VERSION:	1
		PAGINA:	1

Fecha de inspección ____***19/09/2024***_____ ***Inspección No.***___***4***___

proyecto:___***ACUEDUCTO CASCAJERA***_____

Zona y/o cuadrilla a inspeccionar____***OBRA ACUEDUCTO***_____

Nombre Inspector___***JULIETH OLIVEROS***_____

CONDICIONES A INSPECCIONAR	*SI*	*NO*	*N.A*	*OBSERVACIONES*
1. SEGURIDAD				
Disponibilidad de espacio	X			
Estado de los pisos es buen estado	X			
Almacenamiento de productos correcamente	X			
Orden y aseo en el sitio de trabajo	X			
Extintores suficientes y adecuados	X			
Utilización de E.P.P de acuerdo con el factor de riesgo	X			
Botiquín de primeros auxilios	X			
Salidas de emergencia	X			
Existe procedimientos para el desempeño de las labores	X			
Se expiden permisos de trabajo	X			
El trabajador posee la capacitación idónea.	X			
2. QUÍMICAS				
Productos químicos con etiquetas y rotulos adecuados	X			
Vehiculos con rotulacion adecuada	X			
Gases comprimidos asegurados			X	
Fichas técnicas de seguridad	X			
3. FÍSICAS				
Exposición a ruido con proteccion	X			
Exposición a temperaturas extremas (frio o calor)	X			
Iluminación en el puesto de trabajo adecuada			X	
4. MEDIO AMBIENTE				
Servicios sanitarios	X			
kit para control de derrames	X			
Recipientes para disposición de residuos industriales	X			
Comportamiento seguro frente ha hse	X			

Observaciones:

Realizó: _____

UT Línea Cascajera	INSPECCIONES DE OBRA	CODIGO:	HSE-F-31
		VERSION:	1
		PAGINA:	1

Fecha de inspección ____*10/10/2024*_____ ***Inspección No.***___*5*___

proyecto:___*ACUEDUCTO CASCAJERA*_____

Zona y/o cuadrilla a inspeccionar____*OBRA ACUEDUCTO*_____

Nombre Inspector___*JULIETH OLIVEROS*_____

CONDICIONES A INSPECCIONAR	*SI*	*NO*	*N.A*	*OBSERVACIONES*
1. SEGURIDAD				
Disponibilidad de espacio	X			
Estado de los pisos es buen estado	X			
Almacenamiento de productos correcamente	X			
Orden y aseo en el sitio de trabajo	X			
Extintores suficientes y adecuados	X			
Utilización de E.P.P de acuerdo con el factor de riesgo	X			
Botiquín de primeros auxilios	X			
Salidas de emergencia	X			
Existe procedimientos para el desempeño de las labores	X			
Se expiden permisos de trabajo	X			
El trabajador posee la capacitación idónea.	X			
2. QUÍMICAS				
Productos químicos con etiquetas y rotulos adecuados	X			
Vehiculos con rotulacion adecuada	X			
Gases comprimidos asegurados			X	
Fichas técnicas de seguridad	X			
3. FÍSICAS				
Exposición a ruido con proteccion	X			
Exposición a temperaturas extremas (frio o calor)	X			
Iluminación en el puesto de trabajo adecuada			X	
4. MEDIO AMBIENTE				
Servicios sanitarios	X			
kit para control de derrames	X			
Recipientes para disposicion de residuos industriales	X			
Comportamiento seguro frente ha hse	X			

Observaciones:

Realizó: _____

UT Linea Cascajera	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	CODIGO:	HSE-F-17
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

LUGAR: OBRA CASCAJERA

ENCARGADO DE INSPECCIÓN: JULIETH OLIVEROS

FECHA: 10/10/2024

CONDICIONES A EVALUAR	CRITERIO		LUGAR	TIPO DE ACCIÓN	RECOMENDACIONES
	C	NC			
Están limpias y ordenadas todas las áreas de trabajo?	X				
Hay basura o liquidos derramados en el suelo?		X			
Están los pasillos o ruta de evacuacion libres de cajas, canastas de basura, sillas u otros obstáculos que puedan impedir el tráfico?	X				
Están los cables en lugar seguro para evitar que alguien se pueda tropezar o enredar?	X				
Se encuentran los contenedores oficina y almacenes limpios y ordenados?	X				
Están todas las herramientas y equipo siendo utilizados por los empleados en sus áreas de trabajo en buenas condiciones?	X				
Se encuentra el termo con agua y los vasos desechables en un lugar visible y de fácil acceso para los trabajadores?	X				
Hay disposición alguna de recipientes para los desechos?	X				
Se encuentran en buen estado higiénico los sanitarios, baños, comedores y fuentes de agua potable disponibles para los empleados?	X				
En bodega los elementos esta ordenados, debidamente rotulados, ubicados en estantes fijos/estables?	X				
Se tiene adecuada señalizacion en las diferentes areas, la papeleria nueva y de reciclaje esta bien organizada?	X				
Se Observa o se siente la presencia de polvos en el sitio (recintos cerrados-oficina)?	X				

TIPO DE ACCIÓN: **(A)** INMEDIATA (3Dias), **(B)** PRONTA (15 Dias), **(C)** POSTERIOR (30 Dias)

OBSERVACIONES GENERALES:

No	SEGUIMIENTO	FECHA	RESPONSABLES	ESTADO	OBSERVACIONES

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

UT Línea Cascajera

"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

ANEXO 3. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA

UT Línea Cascajera	INSPECCION DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO:	HSE-F-15
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Obra: ACUEDUCTO CASCAJERA	FECHA: 10/10/2024

1. INSPECCIÓN BOTIQUIN

ID	DESCRIPCIÓN	CRITERIO		TIPO DE ACCIÓN	RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES
		C	NC			
1	El botiquin se encuentra en un lugar seco y seguro?	X				
2	El botiquin contiene los productos basicos para la atención de una emergencia?.	X				
3	Los productos estan dentro de la fecha de uso?	X				
4	Estan todos los medicamentos en el recipiente original?	X				
5	Se encuentran rotulados todos los medicamentos?	X				
6	Los medicamentos se encuentran en envases plasticos?	X				
7	Se encuentra el instrumental del botiquin limpio y desinfectado?	X				
8	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	X				
9	Vendajes Triangulares	X				
10	Compresas	X				
11	Gasa	X				
12	Vendaje elástico	X				
13	Guantes Desechables	X				
14	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	X				
15	Esparadrapo de tela rollo grande	X				
16	Tijeras	X				
17	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	X				
	OTROS					
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

TIPO DE ACCIÓN: (A) INMEDIATA (3Días), (B) PRONTA (15 Días), (C) POSTERIOR (30 Días)

Obra: ACUEDUCTO CASCAJERA	FECHA: 10/10/2024

2. CAMILLA

ID	DESCRIPCIÓN	CRITERIO		TIPO DE ACCIÓN	RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES
		C	NC			
1	Correa de Amarre	X				
2	Fisura en la tabla	X				
3	Manija de agarre	X				
4	Se encuentra en un lugar Visible	X				
5	Se encuentra en un lugar Accesible	X				
6	Se encuentra protegida de condiciones ambientales que puedan deteriorar su estructura	X				
6	Se encuentra rotulada					

TIPO DE ACCIÓN: (A) INMEDIATA (3Días), (B) PRONTA (15 Días), (C) POSTERIOR (30 Días)

No	SEGUIMIENTO	FECHA	RESPONSABLE	STAD	OBSERVACIONES

Nombre de Inspector	JULIE[illegible]VEROS
Firma	

UT Linea Cascajera	**INSPECCION DE EXTINTORES**	CODIGO:	HSE-F-18
		VERSION:	1
		PAGINA:	1

CONTRATO: 1261/24 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CASCAJERA

Nombre Inspector___JULIETH OLIVEROS_____

ITEM	*UBICACIÓN*	*CODIGO INTERNO*	*FECHA DE INSPECCION*	*CLASE DE EXTINTOR*	*COLOR*	*FECHA DE RECARGA*	*ASA*	*SEG*	*MANO*	*MANG*	*BOQU*	*CILI*	*INST*	*RECA*
1	OBRA CASCAJERA	NA	10/10/2024	ABC	AMARILLO	2/02/2024	BN	BN	BN	BN	BN	BN	*BN*	*BN*
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

ASA: Asa manual
SEG: Seguro
MANO: Manómetro
MAG: Mangera

BOQUI: Boquilla
CILI:Cilindro
INST: Etiqueta de Instrucciones de uso
RECA: Etiqueta de fecha de recarga

OBSERVACIONES :

Realizó: _____

Revisó: _____

UT Línea Cascajera

"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

ANEXO 4. INSPECCIÓN DE EPP

UT Linea Cascajera

INSPECCION DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL

CODIGO	HSE-F-19
VERSION	1
PAGINA	1

PROYECTO: 1261/24 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CASCAJERA

No.	NOMBRE	CARGO	FECHA	CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD CORTA	BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA LARGA	CAMISA	PANTALON	PETO DE CARNASA	ARNES	TRAJE TYVEK	TAPA BOCA	MASCARILLA MEDIA CARA	FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS	FILTROS HUMOS METALICOS	ESCAFANDRA	VISERAS	PETO DE VAQUETA	MANGAS DE CARNASA	MANGAS DE VAQUETA	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES LARGOS SOLDADOR	GUANTES DE CARNASA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE CAUCHO	PROTECCION AUDITIVA DE INSERCION	PROTECCION AUDITIVA TIPO COPA	GAFAS OSCURAS	GAFAS TRANSPARENTES	MONO GAFAS PARA CORTAR	OBSERVACIONES
1	ESNAIDER JESUS VEGA A.	OBRERO	10/10/2024	B	B		B	B				B									B								B			
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															

Escribe (B) si el estado es bueno y (M) si es malo

OBSERVACIONES: _____

REALIZÓ: _____ CARGO: _____

UT Línea Cascajera

"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"



ANEXO 5. ENTREGA DE DOTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP

UT Línea Cascajera

REPOSICION DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL

CODIGO:	HSE-F-32
VERSION:	1
PAGINA:	1

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

No.	NOMBRE	CARGO	FECHA	CANTIDAD																												FIRMA
				CASCO DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD CORTA	BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA LARGA	CAMISA	PANTALON	PETO DE CARNASA	ARNES	TRAJE TIBET	TAPA BOCA	TRAJE FONTANERO	MASCARIMEDIA CARAILLA	FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS	FILTROS HUMOS METALICOS	ESCAPANDRA	VISERAS	PETO DE VAQUETA	CANILLERA	MANGAS DE VAQUETA	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES PARA LARGOS PARA SOLDAR	GUANTES DE CARNASA	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE CAUCHO	PROTECCION AUDITIVA DE INSERCION	PROTECCION AUDITIVA TIPO COPA	GAFAS OSCURAS	GAFAS TRANSPARENTES	BABUQUEJO	GUANTES DE ALTURAS	MONO GAPAS PARA CORTAR	
1	ESNEIDER JESUS VEGA ANGARITA	OBRERO	3/10/2024																			X											
2	ESNEIDER JESUS VEGA ANGARITA	OBRERO	15/1002024																			X							X				
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	

UT Línea Cascajera

"CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

ANEXO 6. CHARLAS DIARIAS

UT Linea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 16/09/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am / **Hora Final:** 7: 15 am
Temas: Capacitación de comité de convivencia laboral sus funciones responsabilidades y Riesgo psicosocial	**Obra:** Ninguna

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 | **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones:

UT Línea Cascajera	**FORMATO ASISTENCIA**	**CODIGO:**	**GR-F-19**
		VERSION:	**2**
		PAGINA:	**1**

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 19/09/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am	**Hora Final:** 7: 15 am
Temas: Divulgación de plan de emergencia	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3

Firma del Expositor (es):

Conclusiones: Se realiza capacitación y se hacen preguntas en el trascurso de la capacitación y se resuelven satisfactoriamente

UT Línea Cascajera	**FORMATO ASISTENCIA**	**CODIGO:**	**GR-F-19**
		VERSION:	**2**
		PAGINA:	**1**

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción	X	Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 21/09/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am / **Hora Final:** 7: 15 am
Temas: políticas, objetivos, reglamento HSE, reglamento interno de trabajo, funciones y responsabilidades, peligro, riesgos y controles)	**Obra:** Ninguna

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones: Se inducción al personal y nuevo y reinducción al personal antiguo, se realiza y se hacen preguntas en el trascurso de la capacitación y se resuelven satisfactoriamente

UT Linea Cascajera	**FORMATO ASISTENCIA**	**CODIGO:**	**GR-F-19**
		VERSION:	**2**
		PAGINA:	**1**

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 23/09/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am — **Hora Final**: 7: 15 am
Temas: Estilos de Vida y Hábitos Saludables	**Obra:** Ninguna

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 — **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones: Se realiza capacitación y se hacen preguntas en el trascurso de la capacitación y se resuelven satisfactoriamente

UT Linea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 25/09/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am	**Hora Final**: 7: 15 am
Temas: Divulgación de la política de Alcohol, drogas y sustancias psicoactivas, Política SGI, Política SST, Política seguridad vial	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones: Se realiza capacitación y se hacen preguntas en el trascurso de la capacitación y se resuelven satisfactoriamente

UT Línea Cascajera	**FORMATO ASISTENCIA**	**CODIGO:**	**GR-F-19**
		VERSION:	**2**
		PAGINA:	**1**

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 27/09/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am / **Hora Final:** 7: 15 am
Temas: Riesgo físico ruido y conservación auditiva	**Obra:** Ninguna

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones: Se realiza capacitación y se hacen preguntas en el trascurso de la capacitación y se resuelven satisfactoriamente

UT Línea Cascajera	**FORMATO ASISTENCIA**	**CODIGO:**	**GR-F-19**
		VERSION:	**2**
		PAGINA:	**1**

Capacitación/Entrenamiento	x	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 01/10/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am / **Hora Final**: 7: 15 am
Temas: Riesgo físico, conservación visual e iluminación	**Obra:** Ninguna

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones: Se realiza capacitación y se hacen preguntas en el trascurso de la capacitación y se resuelven satisfactoriamente

UT Linea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 04/10/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am / **Hora Final:** 7: 15 am
Temas: Capacitación Higiene Postural y Manejo de Cargas y riesgo biomecánico y/o ergonómico	**Obra:** Ninguna

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 | **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones: Se realiza capacitación y se hacen preguntas en el trascurso de la capacitación y se resuelven satisfactoriamente

UT Línea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 07/10/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am / **Hora Final:** 7: 15 am
Temas: Divulgación y prevención de Riesgo y Acoso Laboral	**Obra:** Ninguna

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 | **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones:

UT Linea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 10/10/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am / **Hora Final**: 7: 15 am
Temas: RIESGO PSICOSOCIALES: Carga de trabajo, monotonía y repetitividad, sobre tiempo	**Obra:** Ninguna

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 | **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones:

UT Linea Cascajera	FORMATO ASISTENCIA	CODIGO:	GR-F-19
		VERSION:	2
		PAGINA:	1

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		Cual?			

Fecha: 15/10/2024	**Lugar:** OBRA CASCAJERA	
Expositor: JULIETH OLIVEROS	**Hora Inicio:** 7:00 am	**Hora Final:** 7: 30 am
Temas: Manejo de estrés, pausas activas	**Obra:** Ninguna	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1. ELKIN F. VERGEL	88.282.070	ING OBRA	
2. FABIAN ROJAS V.	91.489.847	SUPERVISOR	
3. ESNEIDER VEGA	1118826262	OBRERO	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):**

Conclusiones:
