SOLICITUD PRÓRROGA No. 2 CONTRATO DE COMPRAVENTA No.
CONTRATO No. 2245 de 2024, SUSCRITO ENTRE
INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S A.- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO:	2245 de 2024
CRP:	516724 del 19 de septiembre de 2024
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PESADA DE TIPO DOCUMENTAL Y DEMAS BIENES PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA SNR UBICADA EN FUNZA
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO	24 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 1	13 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL:	CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($5.690.525.171) M/CTE incluido IVA, impuestos, y todos los costos directos e indirectos que su ejecución conlleve.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S A
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN - NIT:	NIT. 860.051.447-7
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	JOHANNA RODRIGUEZ HERRERA O SUPERVISORA / ASESOR 1020-14 COORDINADORA GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA No. 2 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2245 de 2024

A la fecha de hoy nuestro cronograma presentado para la ejecución del Contrato suscrito entre INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S A.- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO tiene un avance aproximado del 70% que corresponde a las siguientes actividades:

1. Estructura de estantería que compone (laterales y vigas) avance del 100%
2. Entrepaño y pasillos de estantería avance de 70%
3. Instalación Iluminarias con un avance de 50%
4. Estructura para instalación de ascensor de 50%

Debido a que el plazo contractual se vence el próximo 13 de diciembre, comedidamente solicitamos a la Entidad se evalúe la posibilidad de una PRÓRROGA por un término adicional de máximo quince (15) días, para la entrega del proyecto en su totalidad (100%).

Lo anterior debido a que en áreas como esta (2760 m2), se pueden presentar desniveles a nivel de piso, los cuales se deben compensar con elementos de la misma estructura de estantería para lograr su estabilidad, proceso el cual es dispendioso y nos requirió un mayor tiempo.

En este sentido, se requiere el plazo solicitado para culminar las labores pendientes, de instalación de los entrepaños, pasillos, luminarias y estructura del ascensor.

La solicitud realizada no genera costo adicional a la entidad.


Se anexa imagen de algunas nivelaciones a utilizar






Se anexa imagen de avance




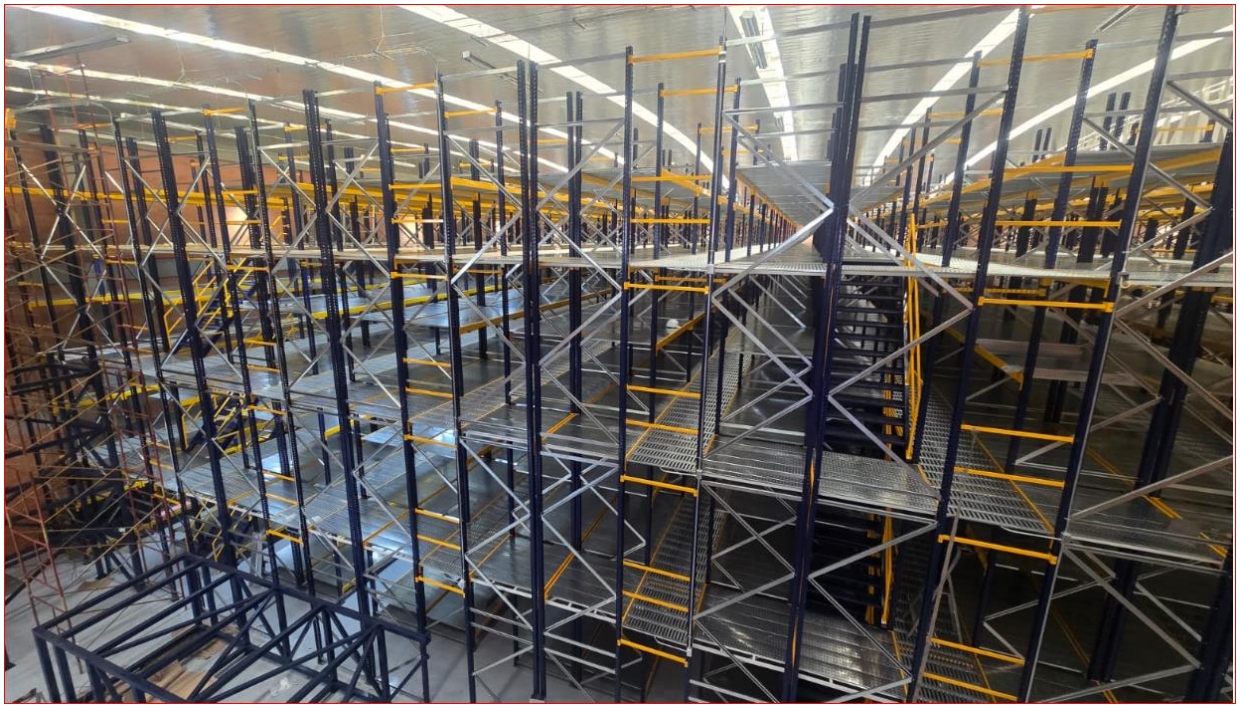



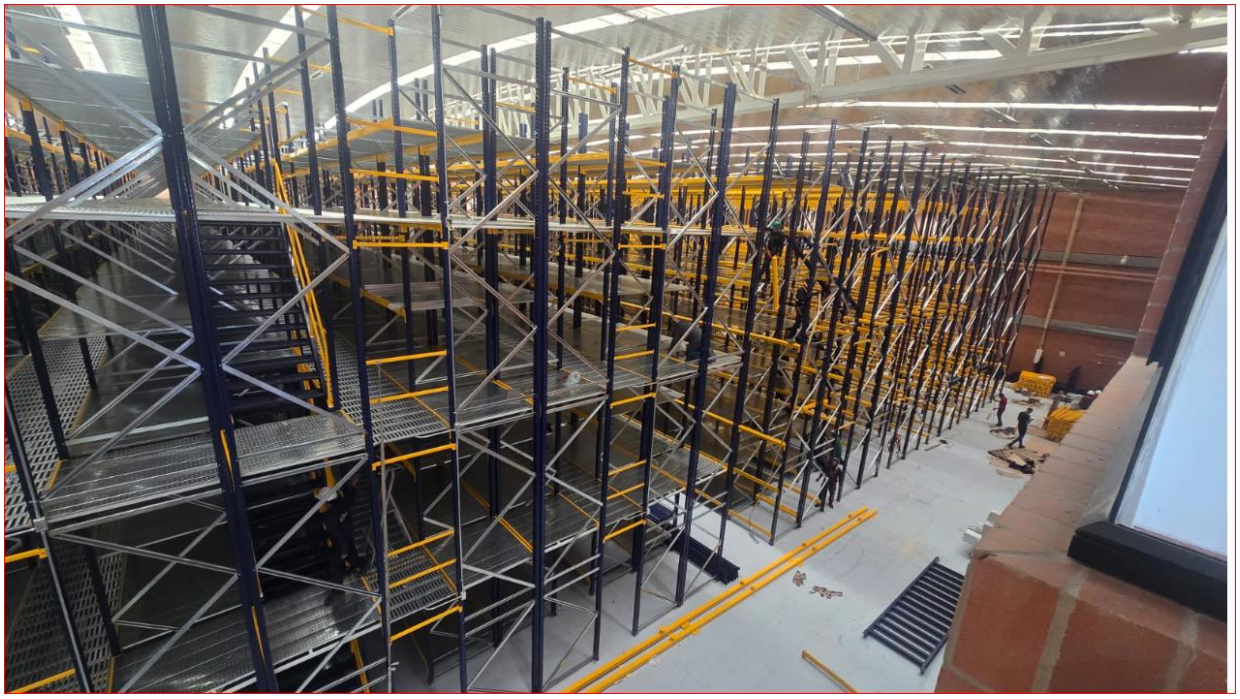



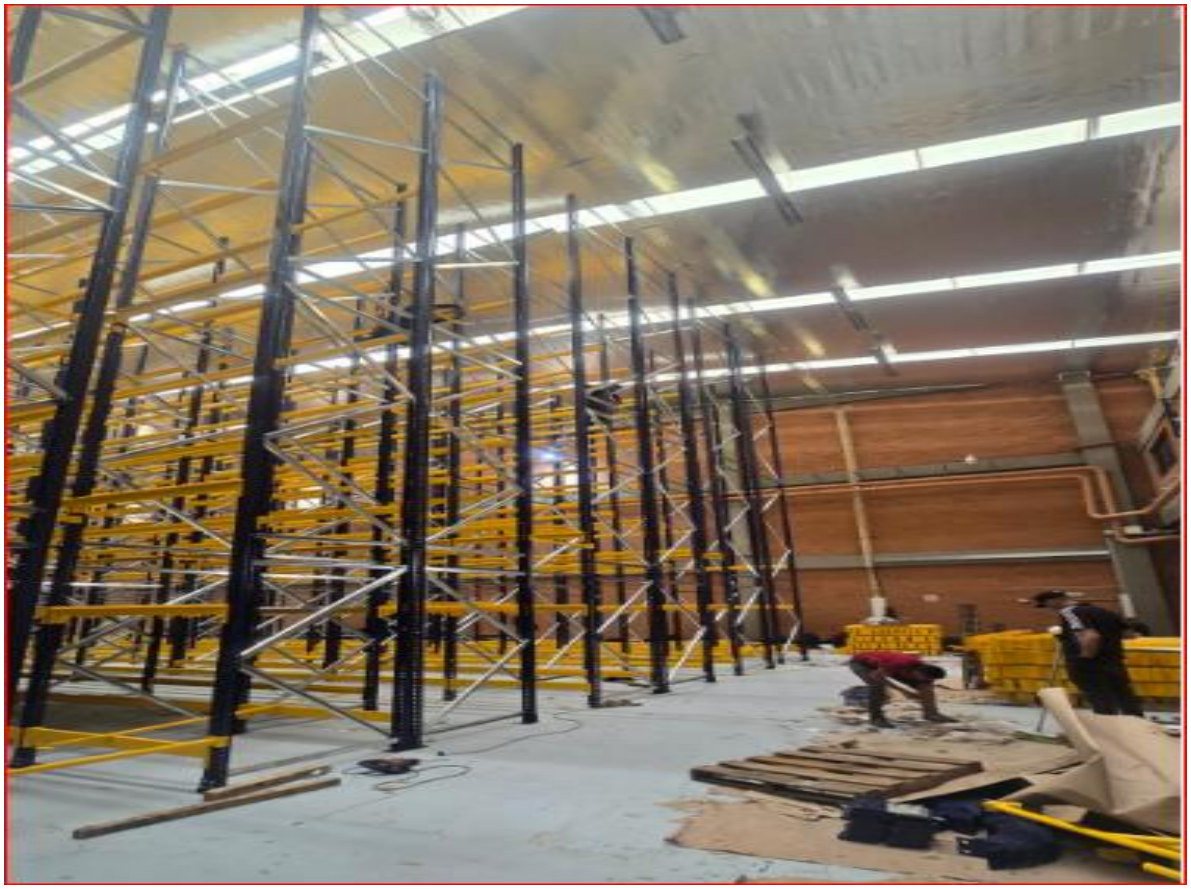

Con toda atención,

FIRMA
Nombre o Razón Social del Proponente: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NIT : 860.051.447-7
Nombre del Representante Legal: RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
C.C. No. 39.676.990 De Soacha
Dirección Comercial: Autopista sur NO 75D47
Teléfonos: 6017799400 Fax 6017799400
Ciudad Bogotá
