GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 10 de octubre de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**14**				FECHA:	10	de	OCTUBRE	de	2024		
PERIODO: 14 DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2024	AL	31	de	SEPTIEMBRE	de	2024	

CONTRATO No:	**2023-047**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**2023-071**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Carrera 6 N4-7 Esquina, La Uvita, Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S	**JULIO ROBERTO MONTENEGRO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
UNION TEMPORAL INTER UVITA	**GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA 01		3 MESES
2	SUSPENSIÓN 01		12 DIAS
3	PRORROGA 02		2 MESES
4	PRORROGA 03		45 DIAS
5	PRORROGA 04		3 MESES Y DOS DÍAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	15	de	ENERO	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	13	de	NOVIEMBRE	de	**2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**89,7%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**75,1%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**86,0%**



GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 10 de octubre de 2024**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	**68859**	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de 19	mm 7	a 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	VIG. DESDE mm	VIG. DESDE aaaa	VIG. HASTA dd	VIG. HASTA mm	VIG. HASTA aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	8	2023	14	3	2025	732.569.086,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	8	2023	14	11	2027	549.426.814,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13	11	2024	13	11	2029	732.569.086,00
CALIDAD DEL SERVICIO	16	8	2023	14	3	2025	366.284.543,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	16	8	2023	14	3	2025	732.569.086,00

No PÓLIZA	**20154**	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de 19	mm 7	a 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	VIG. DESDE mm	VIG. DESDE aaaa	VIG. HASTA dd	VIG. HASTA mm	VIG. HASTA aaaa	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23	4	2024	14	11	2025	232.000.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR		MALO		PÉSIMO	
	X						

Descripción: Se presentan buenas condiciones metereológicas, la mayor parte del tiempo ha estado soleado.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa
Actas de inicio de obra/interventoría.	16	8	2023
Acta de suspensión	29	12	2023
Acta de reinicio	10	1	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
EXCAVACIÓN MANUAL (REDES ENTERRADAS)	Exteriores, Andenes, zonas verdes
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Se conforman áreas exteriores para andenes y plazoletas
ESTRUCTURA EN CONCRETO	
CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS	Cuarto de bombas
CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS	Cuarto de bombas
CONCRETO 2500 PSI PARA PLACA BASE	Bloque 04 y andenes
ACERO DE REFUERZO Y MALLAS	
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Cuarto de bombas
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	Cuarto de bombas

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 10 de octubre de 2024**

MAPOSTERÍA	
MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	Se ejecuta en los bloques 4 Y Cuarto de bombas
PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CULATA	Se ejecuta en los bloques 4 Y Cuarto de bombas
PAÑETE LISO DEMUROS 1:4	Se ejecuta en los bloques 4 Y Cuarto de bombas
PISOS	
ALISTADO DE PISOS e: 4 cms	Se ejecuta en Bloque 1, 2 y 3
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	Se ejecuta en cuarto de bombas
ESTUCO Y PINTURA	
ESTUCO Y VINILO A 3 MANOS	Se ejecuta en los bloques 1,2,3 y 4
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Se ejecuta en los bloques 1,2,3 y 4
RED CONTRA INCENDIOS	
SUMINISTRO DE TUBERÍA 6"	EXTERIORES Y BLOQUE 2
REDES HIDROSANITARIAS	
RED HIDRAULICA	EXTERIORES BLOQUE 1, 2 Y 3
REDES ELECTRICAS	
PUNTOS ELECTRICOS, CAJAS ELECTRICAS, CAJAS DE PASO Y REDES AÉREAS	EXTERIORES Y BLOQUE 1, 2, 3 y 4
PISOS	
PISOS EN GRANITO, CERAMICA Y GRES	EXTERIORES Y BLOQUE 1, 2, 3 y 4

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Solicitudes de entrega de información y documentación	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de balance de obra, con los ajustes hechos por cambios aprobados	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos contractuales al contratista de obra, de acuerdo al desarrollo del proyecto.	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos al contratista para garantizar una correcta ejecución del contrato de obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento diario de ejecución de actividades de obra	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento de dosificación de materiales para la elaboración de concreto en obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento a la inversión y avance de ejecución de obra	PROYECTO EN GENERAL
Participación en comités de obra	PROYECTO EN GENERAL
Actividades de oficina, requerimientos y solicitudes al contratista	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de cumplimiento de programación y requerimiento por atrasos evidenciados en obra	PROYECTO EN GENERAL
Aprobación de cantidades de obra e items no previstos	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de aseo, orden y despeje de circulaciones frecuentemente	PROYECTO EN GENERAL

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
MEZCLADORA	CONCRETOS	100%	En buen estado.
VIBROCOMPACTADOR (RANA)	MEJORAMIENTO TERRENO ANDENES	100%	En buen estado.
HERRAMIENTA MENOR	ACTIVIDADES DIARIAS	100%	En buen estado.

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
BLQOUE #5	DEPOSITO	
Tabla, puntilla	ALMACEN G Y J	
Cemento Holcim	ALMACEN G Y J	

Tuberías	DURMAN	
Pisos y enchapes	ALFA	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computadores	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Elementos de oficina	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Cinta métrica, decámetro , escuadra	Verificación de dimensiones , escuadras	100%	INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	5	10	2023	$ 732.569.085,80
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 732.569.085,80**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	29	4	2024	$ 39.625.629,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 39.625.629,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
03/08/2024	CEROM	APUS GOBERNACIÓN	SI
07/09/2024	ESE-SUPERVISOR	OF 051 CONCEPTO INTERVENTORIA SOICITUD ADICIONAL Y TIEMPO	SI
09/09/2024	ESE CEROM SUPERVISOR	ACTA DE COMITÉ 017	SI
11/09/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME DE OBRA 13	SI
11/09/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME DE INTERVENTORÍA 13	SI
17/09/2024	ESE-SUPERVISOR	SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR INTERVENTORIÁ	SI
18/09/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME INTERVENTORÍA CORREGIDO #13	SI
19/09/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME DE OBRA CORREGIDO #13	SI

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 10 de octubre de 2024**

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
ACUÑA SUESCA SANTIAGO	4249073	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
BOTIA MORALES JOSE MIGUEL	4239368	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
BOTIA MURILLO DAVID LEONARDO	1002698905	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
CACERES BERRIO YULIAN ALEJANDRO	1056994069	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
CONTRERAS RODRIGUEZ HERNAN	1090399182	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
DIAZ CARRILLO YIMY JAVIER	1049413692	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
GALVIS NIÑO LUIS EBERTO	4240055	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
HILDEBRANDO JAIME LIMAS	11443434	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
MACHADO ALAPE JHON FAVER	83215793	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
MELO GRANADOS OSCAR EDUARDO	7172282	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
MESA CARLOS ALBERTO	4060131	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
RISCANEVO VELANDIA DAIRO ALONSO	1056994798	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	1049647963	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	1100502	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
MANUEL ANTONIO SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
TUMAY GIRON GEINER ELI	1118774601	X	X	X	1	9	2024	30	9	2024
								SI	X	NO

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE OBRA	1.057.690.579
ELIANA FABIOLA GONZALEZ ARENAS	RESIDENTE DE OBRA	1.049.613.808
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA	1.049.647.963
ALEX ESTEBAN RODRIGUEZ DURAN	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
GIOVANNY HUMBERTO PEREZ MORALES	ASESOR SISO	7.173.399
JAIRO ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ	ASESOR EN ESTRUCTURAS	1.049.641.270
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA	1.100.476

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 10 de octubre de 2024**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
SANDRA MARCELA BOHORQUEZ S.	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	1.057.410.858
EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	7.180.551
ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	1.054.254.612

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
VIGA CIMENTACIÓN BLOQUE 04	5	7	2024	CUMPLE
COLUMNAS BLOQUE 04	6	7	2024	CUMPLE
COLUMNAS BLOQUE 04	7	7	2024	CUMPLE
COLUMNAS BLOQUE 04	8	7	2024	CUMPLE
VIGAS AEREAS Y PLACA MACIZA BLOQUE 04	7	7	2024	CUMPLE
VIGAS CIMENTACION RAMPA ACCESO BLOQUE 02	5	8	2024	CUMPLE
PLACA BASE RAMPA ACCESO BLQOUE 02	7	8	2024	CUMPLE
ZAPATAS ACCESO AMBULANCIA	7	8	2024	CUMPLE
PLACA BASE PLAZOLETA BLOQUE 01	8	8	2024	CUMPLE
VIGAS CIMENTACIÓN ACCESO AMBULANCIA	9	8	2024	CUMPLE
PLACA BASE ACCESO BLOQUE 03	25	8	2024	CUMPLE
PLACA BASE BLOQUE 04	29	8	2024	CUMPLE
ZAPATAS VC CUARTO BOMBAS	30	8	2024	CUMPLE
COLUMNETAS BLOQUE 04	4	9	2024	CUMPLE
COLUMNAS CUARTO BOMBAS	4	9	2024	CUMPLE
BORDILLO PERIMETRAL BLOQUE 03	10	9	2024	CUMPLE
BORDILLO PERIMETRAL BLOQUE 02	11	9	2024	CUMPLE
BORDILLO PERIMETRAL BLOQUE 01	19	9	2024	CUMPLE
COLUMNETAS BLOQUE 04	23	9	2024	CUMPLE
BORDILLO PERIMETRAL BLOQUE 01	24	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 03	25	9	2024	CUMPLE
VIGAS AEREAS CUARTO BOMBAS	26	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 02	28	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL ZONA ENTRE BLOQUE 2 Y 3	17	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ODONTOLOGIA VACUNACIÓN	20	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ADMINISTRACIÓN	21	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ENFERMERIA LABORATORIO	23	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 04 TANQUES	27	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 Y 2	28	9	2024	CUMPLE

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
VIGA CIMENTACIÓN BLOQUE 04	5	7	2024	CUMPLE
COLUMNAS BLOQUE 04	6	7	2024	CUMPLE
COLUMNAS BLOQUE 04	7	7	2024	CUMPLE
COLUMNAS BLOQUE 04	8	7	2024	CUMPLE
VIGAS AEREAS Y PLACA MACIZA BLOQUE 04	7	7	2024	CUMPLE
VIGAS CIMENTACION RAMPA ACCESO BLOQUE 02	5	8	2024	CUMPLE
PLACA BASE RAMPA ACCESO BLQOUE 02	7	8	2024	CUMPLE
ZAPATAS ACCESO AMBULANCIA	7	8	2024	CUMPLE
PLACA BASE PLAZOLETA BLOQUE 01	8	8	2024	CUMPLE
VIGAS CIMENTACIÓN ACCESO AMBULANCIA	9	8	2024	CUMPLE
PLACA BASE ACCESO BLOQUE 03	25	8	2024	CUMPLE

PLACA BASE BLOQUE 04	29	8	2024	CUMPLE
ZAPATAS VC CUARTO BOMBAS	30	8	2024	CUMPLE
COLUMNETAS BLOQUE 04	4	9	2024	CUMPLE
COLUMNAS CUARTO BOMBAS	4	9	2024	CUMPLE
BORDILLO PERIMETRAL BLOQUE 03	10	9	2024	CUMPLE
BORDILLO PERIMETRAL BLOQUE 02	11	9	2024	CUMPLE
BORDILLO PERIMETRAL BLOQUE 01	19	9	2024	CUMPLE
COLUMNETAS BLOQUE 04	23	9	2024	CUMPLE
BORDILLO PERIMETRAL BLOQUE 01	24	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 03	25	9	2024	CUMPLE
VIGAS AEREAS CUARTO BOMBAS	26	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 02	28	9	2024	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL ZONA ENTRE BLOQUE 2 Y 3	17	9	2024	EN PROCESO
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ODONTOLOGIA VACUNACIÓN	20	9	2024	EN PROCESO
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ADMINISTRACIÓN	21	9	2024	EN PROCESO
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ENFERMERIA LABORATORIO	23	9	2024	EN PROCESO
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 04 TANQUES	27	9	2024	EN PROCESO
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 Y 2	28	9	2024	EN PROCESO

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Materiales granulares	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta 18. Seguimiento técnico	20	9	2024	Seguimiento técnico y administrivo al contrato

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe 7	1	2	2024	29	2	2024	Entregado a supervisor.
Informe 8	1	3	2024	31	3	2024	Entregado a supervisor.
Informe 9	1	4	2024	30	4	2024	Entregado a supervisor.
Informe 10	1	5	2024	31	5	2024	Entregado a supervisor.
Informe 11	1	6	2024	30	6	2024	Entregado a supervisor.
Informe 12	1	7	2024	31	7	2024	Entregado a supervisor.
Informe 13	1	8	2024	31	8	2024	Entregado a supervisor.
Informe 14	1	9	2024	30	9	2024	Presente informe.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 10 de octubre de 2024**

OBSERVACIONES:
Se hizo la revisión del acta de mayores y menores cantidades e items no previstas, la cual se avaló y se envió para el debido trámite por parte de la entidad del acta modificatoria 01.
Se hizo la revisión del presupuesto proyectado para finalizar la obra y entregarla totalmente funcional, el cual se avaló y se envió para el debido trámite por parte de la entidad del Adicional en tiempo y valor #01
Se ha requerido al contratista cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo a la oferta presentada y pliego de condiciones, situación que se evidencia a través de los oficios y correos entre las partes.
Mediante oficios se ha requerido al constructor para el cumplimiento de entrega de información y de sus obligaciones derivadas del contrato de obra y su propuesta.
La interventoría solicitó, se le diera cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato.
La interventoría reiteró la solicitud de cumplir con las especificaciones entregadas por la entidad en los procesos en desarrollo, de acuerdo al plan de calidad del contratista de obra, entregado al inicio de las actividades.
La interventoría solicitó el uso del equipo ofertado en la propuesta por el contratista de obra, como también se ha reiterado la asistencia de los profesionales asesores del contratista y/o entrega del informe de las revisiones realizadas y firmadas por dichos profesionales.
Se solicitó que personal que no cumpla con el uso de EPP's y elementos de bioseguridad sea retirado de INMEDIATO de la obra, el no cumplimiento de lo anterior, será responsabilidad total del contratista de obra, dado que esta solicitud se ha realizado de manera constante y no se evidencia un mejor control en campo.
El contratista solicitó prorroga 04, basados en el mal estado del tiempo, la dificultad para conseguir personal idoneo y la dificultad de allegar los materiales propios para la ejecución del proyecto, a lo cual interventoría emitió concepto al respecto.


CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS No.**
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	30-36
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	68
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	71
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.		
Memorias y planos de diseño aprobados		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	68
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	134
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**jueves, 10 de octubre de 2024**

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	**29-37**
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	**26**
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	**SI**	**26**
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes		
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	**31**
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**SI**	**96**

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	ANDRES DAVID MENDIVELSO

CONTRATO 2023-047

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"



ENTIDAD CONTRATANTE: ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER UVITA
R/L ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ

INFORME DE INTERVENTORIA 14

SEPTIEMBRE DE 2024

INDICE

INFORME MENSUAL 14 MES SEPTIEMBRE GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 1
INDICE INFORME INTERVENTORÍA #14 SEPTIEMBRE 10
INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA #14 SEPTIEMBRE ESE. CENTRO DE SALUD LA UVITA.....12
FORMATO DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA MES 14 18
FORMATO CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES MES 14 19
FORMATO CONTROL DE PLANOS DETALLADOS MES 14 20
FORMATO CONTROL DE ENSAYOS LABORATORIO MES 14 22
FORMATO CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN MES 14 25
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MES 14 26
FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA MES 14 27
FORMATO CONTROL DE COMITÉS MES 14 28
FORMATO CONTROL DE PERSONAL MES 14 29
FORMATO CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO MES 14 30
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL MES 14 31
REGISTRO FOTOGRAFICO MES 14 32
ANEXOS 36
PAGOS PARAFISCALES CONTRATISTA..... 37
PAGOS PARAFISCALES INTERVENTORIA 45
PÓLIZAS..... 49
ACTAS DE COMITÉ..... 68
BITACORA DE OBRA 71
CORRESPONDENCIA ENVIADA 96
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 104
ENSAYOS LABORATORIO CONTRATISTA 113
ENSAYOS LABORATORIO INTERVENTORIA..... 128
PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADA 134

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA — **jueves, 10 de octubre de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**14**				FECHA:	10	de	OCTUBRE	de	2024	
PERIODO: 14 DEL	1	de	SEPTIEMBRE	de	2024	AL	30	de	SEPTIEMBRE	de	2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	**2023-047**	DE	2023	CDP	**2023-071**						
CONTRATO DE OBRA N°:	**2023-045**	DE	2023	CDP	**2023-37**						

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA :

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
NIT DEL CONTRATISTA DE OBRA:	C.C. REP. LEGAL - OBRA:
NIT: 820.003.010 - 2	74.363.121 de Sutatenza
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	REPRESENTANTE LEGAL:
UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
NIT DEL INTERVENTOR:	C.C. REP. LEGAL - INTERVENTOR:
901.738.692 - 3	1.054.254.612
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DEPENDENCIA
ANDREA CATALINA PINZON BOTIA	GERENTE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA
GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CPS 2023-044

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS
2	ACTA DE REINICIO 01	10/01/2024	NA

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONTRATO PRÓRROGA 01	N/A	3 MESES
2	CONTRATO PRÓRROGA 02	N/A	2 MESES
3	CONTRATO PRÓRROGA 03	N/A	45 DIAS
4	CONTRATO PRÓRROGA 04	N/A	3 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	31	de	DICIEMBRE	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	13	de	NOVIEMBRE	de	2024

CONTRATO DE OBRA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS
2	ACTA DE REINICIO 01	10/01/2024	NA

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONTRATO PRÓRROGA 01	N/A	3 MESES
2	CONTRATO PRÓRROGA 02	N/A	2 MESES
3	CONTRATO PRÓRROGA 03	N/A	45 DIAS
4	CONTRATO PRÓRROGA 04	N/A	3 MESES Y DOS DÍAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A


VALOR INICIAL:	$ 3.662.845.429,00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 3.662.845.429,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	31	de	DICIEMBRE	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	13	de	NOVIEMBRE	de	2024

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**jueves, 10 de octubre de 2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	90%	% DE AVANCE EJECUTADO	75,1%	% DE AVANCE DE PROGRAMADO	85,98%

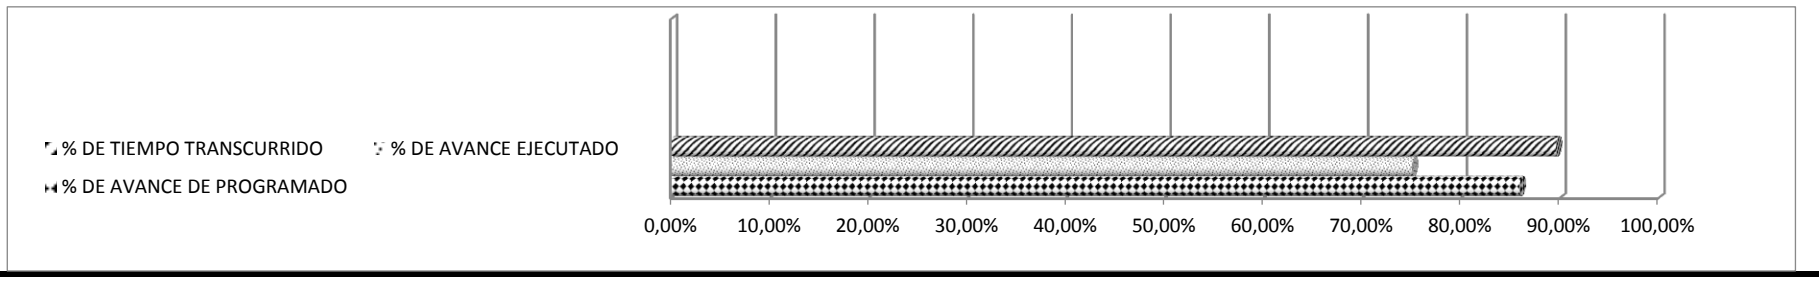

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Se presentan lluvias moderadas en la zona

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	**68859**	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	**Berkey international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATA	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	8	2023	14	3	2025	732.569.086
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	8	2023	14	11	2027	549.426.814
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13	11	2024	13	11	2029	732.569.086.2
CALIDAD DEL SERVICIO	16	8	2023	14	3	2025	366.284.543
CALIDAD DEL BIEN	16	8	2023	14	3	2025	732.569.0862

No PÓLIZA	**20154**	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	**Berkey international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATA	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23	4	2024	14	11	2025	232.000.000

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Actas de inicio	16	8	2023
Actas de suspensión	30	12	2023
Actas de reinicio	10	1	2023

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	**$ 3.662.845.429,00**	**$ 3.662.845.429,00**
Valor Adición del Contrato	**N/A**	
Anticipo	**$ 732.569.085,80**	**$ 2.930.276.343,20**
Valor acta parcial No. 1		
Valor total actas pagadas		
Saldo por ejecutar	**$ 2.930.276.343,20**	**$ 2.930.276.343,20**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
FASE DE OBRA	

COMPONENTE	DD	INICIO	FINAL	VALOR	AVANCE	NOTA	OBSERVACIONES
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	0	16/08/23	16/08/23	$ 11.299.860	100%		
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	11	16/08/23	27/08/23	$ 18.839.340	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	13	21/08/23	03/09/23	$ 6.214.887	100%		
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	13	04/09/23	17/09/23	$ 10.094.297	97%		
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	6	28/08/23	03/09/23	$ 17.738.697	100%		
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	6	04/09/23	10/09/23	$ 2.609.100	100%		
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCA VIBRATORIA	6	18/09/23	24/09/23	$ 71.256.733	95%		

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y O GRANULAR DESPUE DE 5 KM	6	18/09/23	24/09/23	$ 19.468.118	95%		
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	6	18/09/23	24/09/23	$ 10.493.381	98%		
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	6	18/09/23	24/09/23	$ 29.379.366	101%		
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	103	18/09/23	30/12/23	$ 32.315.950	103%		
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA H 3,5MTS	103	18/09/23	30/12/23	$ 18.797.813	107%		
PLACA MACIZA 21MPA E:012 MTS	103	18/09/23	30/12/23	$ 27.723.404	100%		
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA ALTURA MAYOR A 3M FORMALETA EN MADERA	89	02/10/23	30/12/23	$ 37.746.852	90%		
VIGA AEREA 21 MPA 3000 PSI	103	18/09/23	30/12/23	$ 54.002.236	74%		
CONCTRUCCIÓN VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21 MPA 3000 PSI	103	18/09/23	30/12/23	$ 14.306.652	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa(3000PSI)RELACIÓN60C/40P	103	18/09/23	30/12/23	$ 19.772.182	97%		
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	28	01/12/23	29/12/23	$ 112.131.023	100%		
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	103	18/09/23	30/12/23	$ 18.334.722	88%		
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	103	18/09/23	30/12/23	$ 6.514.073	64%		
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15MD=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 35.674.591	88%		
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	103	18/09/23	30/12/23	$ 224.024.338	94%		
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	28	01/12/23	29/12/23	$ 110.031.077	100%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	28	01/12/23	29/12/23	$ 60.544.920	100%		
MURO EN BLOQUE #5 E:12 CMS	28	01/12/23	29/12/23	$ 57.511.466	102%		
PAÑETE LISO MUROS 1.4	28	01/12/23	29/12/23	$ 30.509.005	96%		
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	28	01/12/23	29/12/23	$ 14.417.580	96%		
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	28	01/12/23	29/12/23	$ 31.838.806	100%		
SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA EN TEJA PANLE METALICO ALUZIN CAL 26	28	01/12/23	29/12/23	$ 161.694.740	99%		
SUMINISTRO E INSTALACION CUBERTA LAMINA POLICARBONATO CAL 6 MM	28	01/12/23	29/12/23	$ 27.872.813	98%		
SUMINISTRO E INTALACIÓN ENCHAPE PORCELANA OLIMPIA 20X20 MUROS	60	01/09/24	31/10/24	$ 13.470.376	96%		
ALISTADO DE PISO E: 4 CM 1:5	28	01/12/23	29/12/23	$ 7.888.467	34%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA 33X33 DUROPISO O SIMILAR	58	01/09/24	29/10/24	$ 5.315.940	74%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSIN GRANITO #5 30X30 COLOR	58	01/09/24	29/10/24	$ 10.984.370	102%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSIN GRANITO #5 30X30 BLANCO	58	01/09/24	29/10/24	$ 36.398.080	133%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLETA GRES FORMATO 30X30 CM	28	01/07/24	29/07/24	$ 767.598	10%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA PREPULIDA EXTERIOR 30X30 CM	120	01/07/24	29/10/24	$ 3.566.850	52%		
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	28	01/12/23	29/12/23	$ 20.293.317	95%		
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	59	01/08/24	29/09/24	$ 24.216.386	114%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGUES)	28	01/12/23	29/12/23	$ 22.915.389	34%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (AGUAS LLUVIAS DESAGUES)	28	01/12/23	29/12/23	$ 7.497.264	14%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)	28	01/12/23	29/12/23	$ 1.553.157	10%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (HIDROSANITARIAS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 8.396.341	95%		

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C900 4"	28	01/12/23	29/12/23	$ 8.834.038	87%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (MEDIA TENSION) VEHICULAR	28	01/12/23	29/12/23	$ 7.232.876	100%		
CAJAS DE INSPECCION DE DOBLE LADRILLO (MEDIA TENSION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 2.685.256	33%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (ELECTRICAS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 4.305.816	48%		
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1" PARA BAJANTE	28	01/12/23	29/12/23	$ 1.143.900	50%		
INSTALACIONES VOZ Y DATOS	28	01/12/23	29/12/23	$ 2.005.116	5%		
INSTALACIONES CCTV	28	01/12/23	29/12/23	$ 2.543.200	15%		
ITEMS NO PREVISTOS (VARIOS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 123.364.825	90%		
ITEMS NO PREVISTOS (MAMPOSTERIA)	28	01/12/23	29/12/23	$ 368.338.588	97%		
ITEMS NO PREVISTOS (ESTRUCTURA METALICA)	28	01/12/23	29/12/23	$ 17.112.195	100%		
ITEMS NO PREVISTOS (TANQUES ALMACENAMIENTO)	28	01/12/23	29/12/23	$ 34.524.980	85%		
ITEMS NO PREVISTOS (MURO DE CONTENCION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 22.305.933	100%		
ITEMS NO PREVISTOS (PISOS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 9.361.664	100%		
ITEMS NO PREVISTOS (RED HIDRAULICA)	28	01/12/23	29/12/23	$ 8.274.044	68%		
ITEMS NO PREVISTOS (SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y REVENTILACION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 5.753.285	49%		
ITEMS NO PREVISTOS (RED CONTRA INCENDIOS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 54.965.991	70%		
VALOR TOTAL OBRA				**$ 2.129.173.264**			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PROCESO
Seguimiento a los procesos constructivos	Campo - oficina - documentación
Verificacion de procedimientos	Campo - oficina - documentación
Seguimiento procesos administrativas atencion de comites,	Campo - oficina - documentación
Seguimiento a las atividades de prgramadas y avance financiero	Campo - oficina - documentación
Verficicación y revisión de cantidades de obra y aprobación de actividades	Campo - oficina - documentación

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	EXCAVACIONES ,ARMADO DE VIGAS	90%	
MEZCLADORA	ELABORACIÓN CONCRETO	60,00%	
VIBRADOR DE CONCRETO	ELABORACIÓN CONCRETO	60,00%	

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
Cemento	HOLCIM	
Tubería hidrosanitaria	Proveedor local	
tubería eléctrica	Proveedor local	
pisos y enchapes	ALFA	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Elementos de medición y verificación	Medición	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	5	10	2023	$ 732.569.085,80
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 732.569.086**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	29	4	2024	$ 39.625.625,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 39.625.625**

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**jueves, 10 de octubre de 2024**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR	1057690579
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE	1.049.647.963
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO	100.476
GYOVANY PEREZ	ASESOR SISO	7.173.399
ALEXANDER RODRIGUEZ	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
ALEJANDRO HERNANDEZ	ASESORDE ESTRUCTURAS	1.049.641.270

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
SANDRA MARCELA BOHORQUEZ	DIRECTORA	1.057.410.858
EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	RESIDENTE	7.180.551
ANDRES DAVID MENDIVIESO	INSPECTOR	1.054.254.612

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			LOCALIZACIÓN	Cumple/No Cumple
	dd	mm	aaaa		
VIGA CIMENTACIÓN BLOQUE 04	5	7	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
COLUMNAS BLOQUE 04	6	7	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
COLUMNAS BLOQUE 04	7	7	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
COLUMNAS BLOQUE 04	8	7	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
VIGAS AEREAS Y PLACA MACIZA BLOQUE 04	7	7	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
VIGAS CIMENTACIÓN RAMPA ACCESO BLOQUE 02	5	8	2024	BLOQUE 02	CUMPLE
PLACA BASE - RAMPA ACCESO BLOQUE 02	7	8	2024	BLOQUE 02	CUMPLE
ZAPATAS ACCESO AMBULANCIA	7	8	2024	BLOQUE 02	CUMPLE
PLACA BASE PLAZOLETA BLQOUE 01	8	8	2024	BLOQUE 01	CUMPLE
VIGAS CIMENTACIÓN ACCESO AMBULANCIA	9	8	2024	BLOQUE 01	CUMPLE
PLACA BASE ACCESO BLOQUE 03	25	8	2024	BLOQUE 03	CUMPLE
PLACA BASE BLOQUE 04	29	8	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
ZAPATAS VC CUARTO BOMBAS	30	8	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
COLUMNETAS BLOQUE 04	4	9	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
COLUMNAS CUARTO BOMBAS	4	9	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
BORDILLO ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 03	10	9	2024	BLOQUE 03	CUMPLE
BORDILLO ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 02	11	9	2024	BLOQUE 02	CUMPLE
BORDILLO ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01	19	9	2024	BLOQUE 01	CUMPLE
COLUMNETAS BLOQUE 04	23	9	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
BORDILLO ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01	24	9	2024	BLOQUE 01	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 03	25	9	2024	BLOQUE 03	CUMPLE
VIGAS AEREAS CUARTO BOMBAS	26	9	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 02	28	9	2024	BLOQUE 02	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL ZONA ENTRE BLOQUE 02-03	17	8	2024	BLOQUE 02	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ODONTOLOGÍA VACUNACIÓN	20	9	2024	BLOQUE 01	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ADMINISTRACIÓN	21	9	2024	BLOQUE 01	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ENFERMERIA LABORATORIO	23	9	2024	BLOQUE 01	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 04 TANQUES	27	9	2024	BLOQUE 04	CUMPLE
ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 Y 02	28	9	2024	BLOQUE 02	CUMPLE

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**jueves, 10 de octubre de 2024**

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
CEMENTO	HOLCIM	148 KM	NOBSA
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	CAPITANEJO
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
ACERO	G YJ	132	DUITAMA

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA 018	20	9	2024	SEGUIMIENTO DE OBRA

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME 06	10	1	2024	31	1	2024	
INFORME 07	1	2	2024	29	2	2024	
INFORME 08	1	3	2024	31	3	2024	
INFORME 09	1	4	2024	30	4	2024	
INFORME 10	1	5	2024	31	5	2024	
INFORME 11	1	6	2024	30	6	2024	
INFORME 12	1	7	2024	31	7	2024	
INFORME 13	1	8	2024	31	8	2024	
INFORME 14	1	9	2024	30	9	2024	PRESENTE INFORME

OBSERVACIONES Y/O PROBLEMAS PRESENTADOS:

Las actividades aprobadas y concertadas ya se acercan al 80% de ejecución, es necesario tramitar el adicional en valor y en tiempo para dar terminación al proyecto

Se presenta por parte del contratista el balance de mayores y menores cantidades de obra e items no previstos, el cual se avala por interventoría

Se presenta por parte del contratista el presupuesto general de obra, mediante el cual se solicita el adicional en valor y tiempo 01

FIRMA:

Residente de Interventoría

NOMBRE: EDWARD JONATHAN PARDO PARADA

FIRMA:

Director Interventoría

NOMBRE: SANDRA MARCELA BOHORQUEZ SALAMANCA

FIRMA:

Supervisor de la entidad contratante

NOMBRE: ANDREA CATALINA PINZON BOTIA

FIRMA:

Supervisor delegado de la entidad contratante

NOMBRE: ING. OSCAR RODRIGUEZ

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
NIT.:	826.002.202-7
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT.:	820.003.010 - 2
REP. LEGAL	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
C.C.	74.363.121 de Sutatenza
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
NIT.:	901.738.692 - 3
REP. LEGAL:	ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
C.C.	1.054.254.612 de Socotá – Boyacá
SUPERVISOR	ING. OSCAR RODRIGUEZ
DEPENDENCIA	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
PLAZO CONTRACTUAL:	DIEZ (13) MESES 45 días
FECHA FIRMA CONTRATO:	1/8/2023
FECHA DE INICIO:	16/8/2023
FECHA PROYECTADA FINAL:	15/1/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1:	10/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/11/2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	No aplica

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO (seleccionar con X)			OBSERVACIONES / ESTADO
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Contrato de: Obra	X			
2	Polizas de contrato	X			
3	Aprobación de polizas del contrato	X			
4	Acta de Inicio	X			
5	Verificacion de obligaciones contractuales (listado)			X	
6	Copia de la propuesta del contratista			X	
7	Programación de Obra	X			
8	Copia de Hojas de Vida profesionales propuestos	X			
9	Copia de equipos propuestos	X			
10	Acta de suspension (es)	X			
11	Acta de Reinicio (s)	x			
12	Ajuste de programacion	x			
13	Afiliaciones del personal propuesto	X			
14	Afiliaciones del personal operativo	X			
15	Diseños y planos de la entidad	X			
16	Especificaciones y memorias	X			

observaciones adicionales:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	ING. SANDRA MARCELA BOHORQUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	domingo, 01 de septiembre de 2024	**HASTA EL**	lunes, 30 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	**ESTUDIO DE SUELOS**				
1,1	Desarrollado por Perez y Asociados en junio 2012, y aceptado mediante certificado del 26 de agosto de 2022, firmado por Samuel Perez Duarte	X			Revisar las recomendaciones: Instalar drenes y subdrenes Cimentar a 1,50 sobre 0,40 granulares
2	**TOPOGRAFIA**				
2,1	Desarrollado por ICC Ingenieria Correa Correa SAS, septiembre de 2022, firma Eliecer Correa Basto MP 25335-24464	X			Presenta informe (12 folios), plano (1); memorial firmado (1), matricula profesional (1); plano redes (1); El plano de planta no tiene coordenadas de linderos ni coordenadas GPS
3	ARQUITECTURA	X			En el urbanismo se encontraron diferencias de nivel que no están reflejados en los diseños de las áreas exteriores
4	ESTRUCTURAL	X			Los planos estructurales no presentan cortes donde se aprecien los cambios de niveles de los diferentes bloques. No hay diseño de muro de contención contenido en los ítems presentados
5	HIDROSANITARIO	X			ALVARO JAVIER UCRÓS SIERRA MP. 13202-289968 BLV
6	RED CONTRA INCENDIOS	X			Se hacen los ajustes solicitados
7	DISEÑOS ELÉCTRICOS	X			Se hacen los ajustes solicitados

observaciones adicionales:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	ING. SANDRA MARCELA BOHORQUEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS DETALLADOS

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO SUPERVISOR EN JEFE INDIQUE

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	domingo, 01 de septiembre de 2024	**HASTA**	lunes, 30 de septiembre de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	Num Interno	CONTENIDO	MODIFICACIONES			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
			INICIAL	MODIF 1	MODIF 2	
1		**ARQUITECTURA (25-08-2022)**				Diseñador: Mario Nuñez Hernández - T.P. A22922013-80243529
	01 DE 08	PLANTA - LOCALIZACIÓN - ARÉAS	X			Esc 1:2000 y acercamiento ESC: 1:500
	2 DE 08	PLANTA - ARQUITECTÓNICA DE PRIMER PISO	X			Esc 1:100
	3 DE 08	PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS	X			Esc 1:100
	4 DE 08	FACHADAS 1 A 5	X			Esc 1:75
	5 DE 08	FACHADAS 6-8	X			Esc 1:75
	6 DE 08	CORTE A-A' , B-B´y E-E'	X			Esc 1:75
	7 DE 08	PLANTA DE ESPECIFICACIONES	X			Esc 1:100
	8 DE 08	PUERTAS, VENTANAS Y Y DETALLES				
2		**ESTRUCTURA (29-07-2022)**				Diseñador: Julian Jimenez - M.P. 252021-96928 CND
	01 DE 08	PLANTA DE CIMENTACION, CORTES DETALLES	X			Esc: 1:75
	2 DE 08	PLANTA DE CUBIERTA -CORTES DETALLES	X			Esc: 1:25 Esc 1:50
	3 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 1 - CORTES DETALLES	X			
	4 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 2 - CORTES DETALLES	X			
	5 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 1	X			
	6 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 2	X			
	7 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 3 Y 4	X			
	ENE - 01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	X			
	MAYO 24	PLANO ESTRUCTURAL CUARTO DE BOMBAS	X			
	MAYO 24	DETALLE DESPIECE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	X			BLOQUE 1 Y BLOQUE 3
	JUN- 11/2024	PROPUESTA ESTRUCTURA CUARTO DE BOMBAS	X			CUARTO DE BOMBAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
	FEB - 22 -24	MEMORIA DE CALCULO	X			DOCUMENTO
3		**HIDROSANITARIO (AGOSTO 2022)**				ALVARO JAVIER UCROS SIERRA MP 13202-289968 BLV
	HYS-01	PLANTA PRIMER PISO RED SANITARIA	X			
	HYS-02	PLANTA PRIMER PISO RED AGUAS LLUVIAS	X			
	HYS-03	PLANTA CUBIERTA RED LLUVIAS	X			
	HYS-04	PLANTA PRIMER PISO RED AGUA POTABLE	X			
	HYS-05	DETALLES HIDROSANITARIOS	X			
		MEMORIAS DISEÑO HIDROSANITARIO	X			
	DOC 01	INFORME TÉCNICO HIDRO SANITARIO	X			
	DOC 02	MEMORIA CALCULO AGUA POTABLE	X			
	DOC 03	MEMORIA CALCULO DESAGUES	X			
4		RED PCI				Se presentan observaciones al diseño
	PCI-01	RED PCI PLANTA GENERAL	X			
	PCI-02	DETALLE CUARTO DE BOMBAS PCI	X			
	PCI-03	DETALLES PCI	X			
5		**ELECTRICO (SEPTIEMBRE 2022)**				DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182
	E-01	RED DE MEDIA TENSIÓN - PLANTA DE SUBESTACIÓN - CORTE A-A' - CORTE B-B'	X			
	E-02	DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL	X			
	E-03	ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN	X			

	E-04	ILUMINACIÓN	X			
	E-05	TOMACORRIENTES	X			
	E-06	CUADROS DE CARGA	X			
	E-07	ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO	X			
	E-08	FACHADAS Y CORTES DE APANTALLAMIENTO	X			
		MEMORIAS DISEÑO ELECTRICO				
	DOC 01	Declaración RETIE DISEÑO	X			
	DOC 02	MEMORIA CALCULO RETIE	X			
	DOC 03	ESPECIFICACIONES ILUMINACIÓN	X			10 DOCUMENTOS
6		**PROYECTO VOZ Y DATOS- DETECCIÓN Y CCTV**				DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182
	VYD 01	RED CCTV	X			
	VYD 02	RED DE DETECCIÓN	X			
	VYD 03	RED DE VOZ Y DATOS	X			
	VYD 04	MEMORIA ESPECIFICACIÓNES	X			DOCUMENTO

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	ING. SANDRA MARCELA BOHORQUEZ SALAMANCA DIRECTORA DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE MEZLADO Y MUESTRAS PARA CONCRETOS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
FECHA INCIAL	domingo, 01 de septiembre de 2024	**HASTA EL**	lunes, 30 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	ELEMENTO Y LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA	Tipo	RESISTENCIA ESPERADA	N° CILINDRO	FECHA	EDAD	RESISTENCIA
1	VIGA CIMENTACIÓN BLOQURE 04	ESE LA UVITA	6	3000 PSI	8349	14/6/2024	7	2229
2	VIGA CIMENTACIÓN BLOQURE 04	ESE LA UVITA	4	3000 PSI	8350	21/6/2024	14	2745
3	VIGA CIMENTACIÓN BLOQURE 04	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	8351	5/7/2024	28	3213
4	COLUMNAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	3	3000 PSI	8352	15/6/2024	7	2310
5	COLUMNAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	3	3000 PSI	8353	22/6/2024	14	2649
6	COLUMNAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	8354	6/7/2024	28	3408
7	COLUMNAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	8355	16/6/2024	7	2448
8	COLUMNAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	2	3000 PSI	8356	23/6/2024	14	2733
9	COLUMNAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	8357	7/7/2024	28	3234
10	COLUMNAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	6	3000 PSI	8358	2/5/2024	7	2505
11	COLUMNAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	8359	9/5/2024	14	2775
12	COLUMNAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	4	3000 PSI	8360	23/5/2024	28	3303
13	VIGAS AEREAS Y PLACA MACIZA BLOQUE 04	ESE LA UVITA	4	3000 PSI	8361	26/6/2024	7	2229
14	VIGAS AEREAS Y PLACA MACIZA BLOQUE 04	ESE LA UVITA	3	3000 PSI	8362	3/7/2024	14	2589
15	VIGAS AEREAS Y PLACA MACIZA BLOQUE 04	ESE LA UVITA	3	3000 PSI	8363	17/7/2024	28	3867
16	VIGA CIMENTACIÓN RAMPA ACCESO BLOQUE 2	ESE LA UVITA	2	3000 PSI	8437	15/7/2024	7	2490
17	VIGA CIMENTACIÓN RAMPA ACCESO BLOQUE 2	ESE LA UVITA	6	3000 PSI	8438	22/7/2024	14	2793
18	VIGA CIMENTACIÓN RAMPA ACCESO BLOQUE 2	ESE LA UVITA	2	3000 PSI	8439	5/8/2024	28	3540

19	PLACA BASE RAMPA ACCESO BLQOUE 02	ESE LA UVITA	6	2500 PSI	8440	17/7/2024	7	2118
20	PLACA BASE RAMPA ACCESO BLQOUE 02	ESE LA UVITA	6	2500 PSI	8441	24/7/2024	14	2178
21	PLACA BASE RAMPA ACCESO BLQOUE 02	ESE LA UVITA	2	2500 PSI	8442	7/8/2024	28	2638
22	ZAPATAS ACCESO AMBULANCIA	ESE LA UVITA	2	3000 PSI	8443	17/7/2024	7	2280
23	ZAPATAS ACCESO AMBULANCIA	ESE LA UVITA	6	3000 PSI	8444	24/7/2024	14	2715
24	ZAPATAS ACCESO AMBULANCIA	ESE LA UVITA	3	3000 PSI	8445	7/8/2024	28	3579
25	PLACA BASE PLAZOLETA BLOQUE 01	ESE LA UVITA	4	2500 PSI	8446	18/7/2024	7	2005
26	PLACA BASE PLAZOLETA BLOQUE 01	ESE LA UVITA	3	2500 PSI	8447	25/7/2024	14	2260
27	PLACA BASE PLAZOLETA BLOQUE 01	ESE LA UVITA	4	2500 PSI	8448	8/8/2024	28	2730
28	VIGAS DE CIMENTACIÓN ACCESO AMBULANCIA	ESE LA UVITA	3	3000 PSI	8449	19/7/2024	7	2241
29	VIGAS DE CIMENTACIÓN ACCESO AMBULANCIA	ESE LA UVITA	2	3000 PSI	8450	26/7/2024	14	2727
30	VIGAS DE CIMENTACIÓN ACCESO AMBULANCIA	ESE LA UVITA	3	3000 PSI	8451	9/8/2024	28	3366
31	PLACA BASE - ACCESO BLOQUE 03	ESE LA UVITA	4	2500 PSI	8452	4/8/2024	7	1890
32	PLACA BASE - ACCESO BLOQUE 03	ESE LA UVITA	6	2500 PSI	8453	11/8/2024	14	2225
33	PLACA BASE - ACCESO BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	2500 PSI	8454	25/8/2024	28	2710
34	PLACA BASE - BLOQUE 04	ESE LA UVITA	6	2500 PSI	8455	8/8/2024	7	1923
35	PLACA BASE - BLOQUE 04	ESE LA UVITA	6	2500 PSI	8456	15/8/2024	14	2203
36	PLACA BASE - BLOQUE 04	ESE LA UVITA	2	2500 PSI	8457	29/8/2024	28	2873
37	ZAPATAS VC CUARTO BOMBAS	ESE LA UVITA	4	3000 PSI	8458	9/8/2024	7	2487
38	ZAPATAS VC CUARTO BOMBAS	ESE LA UVITA	3	3000 PSI	8459	16/8/2024	14	2676
39	ZAPATAS VC CUARTO BOMBAS	ESE LA UVITA	3	3000 PSI	8460	30/8/2024	28	3495
40	COLUMNETAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	4	3000 PSI	8461	14/8/2024	7	2349
41	COLUMNETAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	8462	21/8/2024	14	2595
42	COLUMNETAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	8463	4/9/2024	28	3273
43	COLUMNAS CUARTO BOMBAS	ESE LA UVITA	6	3000 PSI	8464	14/8/2024	7	2289
44	COLUMNAS CUARTO BOMBAS	ESE LA UVITA	4	3000 PSI	8465	21/8/2024	14	2805
45	COLUMNAS CUARTO BOMBAS	ESE LA UVITA	2	3000 PSI	8466	4/9/2024	28	3159
46	BORDILLO ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	3	2500 PSI	8467	20/8/2024	7	1918
47	BORDILLO ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	2500 PSI	8468	27/8/2024	14	2253
48	BORDILLO ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	5	2500 PSI	8469	10/9/2024	28	2808
49	BORDILLO ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 02	ESE LA UVITA	5	2500 PSI	8470	21/8/2024	7	2043
50	BORDILLO ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 02	ESE LA UVITA	2	2500 PSI	8471	28/8/2024	14	2300
51	BORDILLO ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 02	ESE LA UVITA	4	2500 PSI	8472	11/9/2024	28	2645
52	BORDILLO ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01	ESE LA UVITA	6	2500 PSI	8591	29/8/2024	7	2005
53	BORDILLO ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01	ESE LA UVITA	2	2500 PSI	8592	5/9/2024	24	2285

54	BORDILLO ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01	ESE LA UVITA	2	2500 PSI	8593	19/9/2024	28	2663
55	COLUMNETAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	2	3000 PSI	8594	2/9/2024	7	2340
56	COLUMNETAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	4	3000 PSI	8595	9/9/2024	14	2712
57	COLUMNETAS BLOQUE 04	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	8596	23/9/2024	28	3252
58	BORDILLO ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01	ESE LA UVITA	2	2500 PSI	8597	3/9/2024	7	2055
59	BORDILLO ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	2500 PSI	8598	10/9/2024	14	2150
60	BORDILLO ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01	ESE LA UVITA	5	2500 PSI	8599	24/9/2024	28	2628
61	ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	2	2500 PSI	8600	4/8/2024	7	2090
62	ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	2	2500 PSI	8601	11/9/2024	14	2250
63	ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 03	ESE LA UVITA	4	2500 PSI	8602	25/9/2024	28	2685
64	VIGAS AEREAS CUARTO BOMBAS	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	8603	5/9/2024	7	2259
65	VIGAS AEREAS CUARTO BOMBAS	ESE LA UVITA	3	3000 PSI	8604	12/9/2024	14	2589
66	VIGAS AEREAS CUARTO BOMBAS	ESE LA UVITA	5	3000 PSI	8605	26/9/2024	28	3321
67	ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 02	ESE LA UVITA	3	2500 PSI	8606	7/9/2024	7	1930
68	ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 02	ESE LA UVITA	4	2500 PSI	8607	12/9/2024	14	2350
69	ANDEN PERIMTRAL BLOQUE 02	ESE LA UVITA	3	2500 PSI	8608	26/9/2024	28	2658
70	ANDEN PERIMETRAL ZONA ENTRE BLOQUES 02 Y 03	ESE LA UVITA	6	2500 PSI	8609	10/9/2024	7	1798
71	ANDEN PERIMETRAL ZONA ENTRE BLOQUES 02 Y 03	ESE LA UVITA	5	2500 PSI	8610	17/9/2024	14	2330
72	ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ODONTOLOGIA VACUNACIÓN	ESE LA UVITA	6	2500 PSI	8612	13/9/2024	7	2093
73	ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ODONTOLOGIA VACUNACIÓN	ESE LA UVITA	4	2500 PSI	8613	20/9/2024	14	2265
74	ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ADMINISTRACIÓN	ESE LA UVITA	5	2500 PSI	8615	14/9/2024	7	1870
75	ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ADMINISTRACIÓN	ESE LA UVITA	5	2500 PSI	8616	21/9/2024	14	2280
76	ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ENFERMERIA LABORATORIO	ESE LA UVITA	4	2500 PSI	8618	16/9/2024	7	1920
77	ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 01 ENFERMERIA LABORATORIO	ESE LA UVITA	3	2500 PSI	8619	23/9/2024	14	2220
78	ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 04 TANQUES	ESE LA UVITA	4	2500 PSI	8621	20/9/2024	7	1913
79	ANDEN PERIMETRAL BLOQUE 04 TANQUES	ESE LA UVITA	5	2500 PSI	8622	27/9/2024	14	2193
80	ANDEN PERIMETRAL BLQOUE 01-BLOQUE 02	ESE LA UVITA	2	2500 PSI	8624	21/9/2024	7	2080
81	ANDEN PERIMETRAL BLQOUE 01-BLOQUE 02	ESE LA UVITA	4	2500 PSI	8625	28-924	14	2165

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ.JONATHAN PARDO	ING. SANDRA MARCELA BOHORQUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

	INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATANTE	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO DEL INFORME	domingo, 01 de septiembre de 2024	**HASTA EL**	lunes, 30 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

Labor a Realizar	Equipo Utilizado					
	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Certificado Vigente hasta	No. Serie / ID	OBSERVACION
COMPACTACIÓN	N/A	RANA	N/A	N/A		Se utiliza en actividad de compactación para muro de contención
MEDICIONES	N/A	Cinta metrica	N/A	N/A		Medición dimensiones
PLOMOS	N/A	Plomada centro y punto	N/A	N/A		Verificación de pañetes
VERIFIACIÓN DE ESCUADRAS	N/A	Escuadra metálica	N/A	N/A		Intersecciones de muros y pañetes
VERIFICACIÓN DE NIVELES	N/A	Nivel de precisión	N/A	N/A		Se utiliza para niveles de piso, sobre cimiento y losa de contrapiso
CONCRETOS	N/A	MEZCLADORA	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal
CONCRETOS	N/A	VIBRADOR DE CONCRETO	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal

OBS:

SUPERVISOR ENTIDAD ING. OSCAR RODRIGUEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ.JONATHAN PARDO	ING. SANDRA MARCELA BOHORQUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	domingo, 01 de septiembre de 2024	**HASTA EL**	lunes, 30 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO	X		
- Estado del equipo	X		Cumple condiciones de la maquina
- Regularidad del mantenimiento	X		Interventoría solicita mantenimiento acorde al plan de calidad
- Vibraciones /Ruidos	X		No presenta
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Cumple condiciones de la maquina
- Idoneidad operarios	X		Cumple condiciones de la maquina
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	x		
- Buen estado	x		
- Fácil acceso y operación	x		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		Se reitera al contratista que el personal debe contar con la dotacion completa , falta uso adecuado EPP
- Buen estado	X		Se hace cambio periódico según el estado de los implementos de seguridad industrial
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Se evidencia que se ha instalado la señalizacion pertinente teniendo en cuenta las actividades realizadas
- Uso según zona de trabajo	X		Se solicita al contratista, implementar medidas de seguridad para trabajo en altura ya que se comienza a armar formaleta para vigas aéreas
VIGILANCIA			
- Personal suficiente		N/A	
- Diurna		N/A	
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		Se solicitó entrega de planillas de afliaciones, examenes de ingreso, egreso y periodicos, ademas de copia de las planillas de pago
CHARLAS DE SEGURIDAD			
Charla de seguridad	X		Una vez por semana
ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRA			
Aseo	X		Se hace aseo una vez por semana
Circulaciones	X		Se mantienen circulaciones despejadas y aseadas

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	ING. SANDRA MARCELA BOHORQUEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE CORRESPONDENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	domingo, 01 de septiembre de 2024	**HASTA EL**	lunes, 30 de septiembre de 2024
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	FECHA	MEDIO DE ENVÍO	ESTADO			ASUNTO
			ENVIO	RECIBIO	RESPUESTA	
1	2/9/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	INFORME DE OBRA #13 AGOSTO
2	2/9/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	INTERVENTORÍA	SI	OBSERVACIONES SOLICITUD MODIFICATORIO
3	3/9/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM	SI	APUS GOBERNACIÓN
4	5/9/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	INTERVENTORÍA	SI	FORMATOS SECRETARÍA SALUD
5	6/9/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	SOLICITUD ADICONAL VALOR Y TIEMPO 01
6	7/9/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	OF 051 CONCEPTO SOLICITUD ADICIONAL
7	9/9/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	ACTAS COMITÉ 16 Y 17
8	9/9/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	INTERVENTORÍA	SI	ACTAS COMITÉ 16 Y 17 APROBADAS
9	11/9/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME DE OBRA #13 AGOSTO
10	11/9/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME DE INTERVENTORÍA #13 AGOSTO
11	12/9/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	INFORME SST #13 AGOSTO
12	17/9/2024	E-MAIL	SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA	SI	OBSERVACIONES INFORME #13 OBRA E INTERVENTORÍA
13	17/9/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	CEROM-INTERVENTORÍA	SI	INVITACIÓN COMITÉ 018
14	17/9/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL DIRECTOR INTERVENTORÍA
15	18/9/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME DE INTERVENTORIA #13 AGOSTO CORREGIDO
16	19/9/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME DE OBRA #13 AGOSTO CORREGIDO
17	19/9/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	INFORME DE OBRA #13 AGOSTO CORREGIDO

observaciones adicionales:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	ING. SANDRA MARCELA BOHORQUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE COMITES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA EL**	sábado, 31 de agosto de 2024
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	FECHA	REFERENCIA (INTERNO, TECNICO, ADMINISTRATIVO)	OBJETO DEL COMITÉ	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
18	20/9/2024	TÉCNICO	Seguimiento a proyecto	1. Lectura del acta anterior 2. Verificación de la ejecución del proyecto acorde a la programación presentada por el contratista. 3. Verificación de compromisos de solicitudes mediante oficios, y cumplimiento de los mismos. 4. Estado de avance de la obra. 5. Verificación proceso técnico. 6. Solicitudes de contratista de obra. 7. Solicitudes de la entidad contratante 8. Recomendaciones y sugerencias de interventoría 9.Otros y varios 10. Compromisos	PRESENTAR SOLICITUD DE MODIFICATORIO Y HACER CORRECCIONES A DOCUMENTOS DE ADICIONAL EN DRIVE, HACER LA RESPECTIVA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SOLICITAR EL MODIFICATORIO

observaciones adicionales:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA JARQ. JONATHAN PARDO	ING. SANDRA MARCELA BOHORQUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PERSONAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 14

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/9/2024 Y EL 30/9/2024 PLAZO: 13 MESES y CUARENTA Y CINCO DIAS

CONTRATISTA: CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2 — CONTRATO No. 2023-045

INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3 — CONTRATO No. 2023-047

SUPERVISOR: ING. OSCAR RODRIGUEZ - ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA — CONTRATO No. N/A

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	SEPTIEMBRE																													OBSERVACIONES
	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
CARGO		**D**							**D**							**D**							**D**							**D**			
DIRECTOR DE OBRA			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		
RESIDENTE DE OBRA			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		
INSPECTOR DE OBRA																																
PROFESIONAL HSQE																																
PROFESIONAL SOCIAL																																
ALMACENISTA			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		
MAESTRO			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		
OFICIAL			4	4	4	4	4	4		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		3	3	4	4	4	4		4		
AYUDANTE			10	8	8	7	7	7		8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8		4	4	4	4	4	4		4		
CELADOR			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**0**	**19**	**17**	**17**	**16**	**16**	**16**	**0**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**0**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**0**	**12**	**12**	**13**	**13**	**13**	**13**	**0**	**13**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**418**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**0**	**10**	**8**	**8**	**7**	**7**	**7**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**4**	**0**	**171**	**40,91%**	
De la región		0	10	8	8	7	7	7	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	4	4	4	4	4	4	0	4	0	171	40,91%	
De fuera de la región																																	0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**	**0**	**4**		**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**4**	**0**	**118**	**28,23%**	
De la región			2	4	0	4	4	4	0	4	2	0	3	4	4	0	4	0	0	0	3	4	0	3	3	0	4	4	4	0	4	0	68	16,27%	
De fuera de la región			2	0	4	0	0	0	0	2	4	6	3	2	2	0	2	6	6	6	3	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	54	12,92%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**36**	**8,61%**	
De la región			1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	18	4,31%	
De fuera de la región			1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	18	4,31%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
PROVEEDORES																																			
Local	FERRETERIAS Y DEPOSITOS LOCALES																																		
Nacional	Todos																																		
Internacional	Ninguno																																		

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se evidencia disminución de personal de acuerdo , se insiste en la dotación de los EPPS y elementos de seguridad personal especialmente en labores de altura, de igual manera, se insiste en las charlas, capacitaciones e implementación del SG SST al personal porque se evidencia que hay indisciplina en el uso de estos elementos y protocolos de seguridad.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ESTADO DEL TIEMPO

PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
PERIODO 13	DEL: 1/9/2024 HASTA: 31/09/2024

#	DIA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	DIA	D		L		M		M		J		V		S		D		L		M		M		J		V		S		D		L	
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)	X				X		X			X							X		X											X		X	
3	LLOVIZNA (LL)																																
4	LLUVIA FUERTE (LLF)								X																								
5	NUBLADO (NB)		X	X	X		X			X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

	DIA	17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30					
	DIA	M		M		J		V		S		D		L		M		M		J		V		S		D		L					
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)	X		X		X		X		X		X		X																			
3	LLOVIZNA (LL)																									X							
4	LLUVIA FUERTE (LLF)																		X		X				X		X		X				
5	NUBLADO (NB)		X		X		X		X		X		X		X	X	X	X		X		X	X	X				X					
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

Observaciones:_____

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 14

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1/9/2024	**Y EL**	30/9/2024	
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA			
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2		CONTRATO No.	2023-045
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3		CONTRATO No.	2023-047
SUPERVISOR:	ING. OSCAR RODRIGUEZ -ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA			

PERSONAL DEL CONTRATISTA

#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	CCF	PLANILLA #	CARGO	OBSERVACIONES
1	JOSE BERNARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	31210462	MARESTRO DE OBRA	
2	JEYSON JOSE	ROMERO QUINTERO	1049647963	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	31210462	RESIDENTE DE OBRA	
3	SANTIAGO	ACUÑA SUESCA	4249073	CAJACOPI	SURA	PORVENIR	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
4	DAVID LEONARDO	BOTIA MURILLO	1002698905	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
5	YULIAN ALEJANDRO	CACERES BERRIO	1056994069	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
6	HERNAN	CONTRERAS RODRIGUEZ	1090399182	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
7	YIMY JAVIER	DIAZ CARRILLO	1049413692	CAJACOPI	SURA	PORVENIR	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
8	LUIS EBERTO	GALVIS NIÑO	4240055	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
9	JHON FAVER	MACHADO ALAPE	83215793	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
10	OSCAR EDUARDO	MELO GRANADOS	7172281	FAMISANAR	SURA	PORVENIR	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
11	CARLOS ALBERTO	MESA	4060131	CAJACOPI	SURA	COLFONDOS	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
12	DAIRO ALONSO	RISCANEVO VELANDIA	1056994798	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
13	RAFAEL	SIPAMOCHA NOPE	1100502	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
14	MANUEL ANTONIO	SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	
15	GEINER ELI	TUMAY GIRON	1118774601	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	31210462	AYUDANTE	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 14

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	**domingo**, 01 de septiembre de 2024	**HASTA EL**	**lunes**, 30 de septiembre de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN



EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN



MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO



MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO



PLACA BASE EN CONCRETO



PLACA BASE EN CONCRETO



UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 14

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	**domingo**, 01 de septiembre de 2024	**HASTA EL**	**lunes**, 30 de septiembre de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACERO DE REFUERZO



ACERO DE REFUERZO



ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA



ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA



CUBIERTA EN POLICARBONATO



CUBIERTA EN POLICARBONATO



UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 14

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	**domingo**, 01 de septiembre de 2024	**HASTA EL**	**lunes**, 30 de septiembre de
2024 **INTERVENTOR**	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

MURO EN BLOQUE



MURO EN BLOQUE



PAÑETES



PAÑETES



ALISTADO DE PISO



ALISTADO DE PISO



PINTURA FACHADAS

PINTURA FACHADAS

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 14

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	**domingo**, 01 de septiembre de 2024	**HASTA EL**	**lunes**, 30 de septiembre de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS





SANDRA MARCELA BOHORQUEZ SALAMANCA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

EDWARD JONATHAN PARDO PARADA
RESIDENTE A. DE INTERVENTORIA

ANEXOS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31210462
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	17	NOMBRE SUCURSAL	ESELAUVITA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
17		$12.736.353		31210462

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-4249073	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	ACUÑA SUESCA SANTIAGO	$1.300.000
CC-4239368	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BOTIA MORALES JOSE MIGUEL	$1.300.000
CC-1002698905	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BOTIA MURILLO DAVID LEONARDO	$1.300.000
CC-1056994069	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CACERES BERRIO YULIAN ALEJANDRO	$1.300.000
CC-1090399182	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CONTRERAS RODRIGUEZ HERNAN	$1.300.000
CC-1100476	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE BERNARDO	$1.300.000
CC-1049413692	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	DIAZ CARRILLO YIMY JAVIER	$1.300.000
CC-4240055	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	GALVIS NIÑO LUIS EBERTO	$1.300.000
CC-11443434	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	JAIME LIMAS HILDEBRANDO	$1.300.000
CC-83215793	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MACHADO ALAPE JHON FAVER	$1.300.000
CC-7172281	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MELO GRANADOS OSCAR EDUARDO	$1.300.000
CC-4060131	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MESA CARLOS ALBERTO	$1.300.000
CC-1056994798	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	RISCANEVO VELANDIA DAIRO ALONSO	$1.300.000
CC-1049647963	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	ROMERO QUINTERO JEYSON JOSE	$1.859.682
CC-1100502	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	$1.300.000
CC-1055186223	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	SOCONGOCHA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO	$1.300.000
CC-1118774601	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	TUMAY GIRON GEINER ELI	$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 4249073																													0		
CC - 4239368			X	2024-09-01																									0		
CC - 1002698905																													0		
CC - 1056994069	X	2024-09-11	X	2024-09-12																									0		
CC - 1090399182																													0		
CC - 1100476																													0		
CC - 1049413692																													0		
CC - 4240055			X	2024-09-01																									0		
CC - 11443434																													0		
CC - 83215793	X	2024-09-10	X	2024-09-11																									0		
CC - 7172281	X	2024-09-10	X	2024-09-11																									0		
CC - 4060131																													0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1056994798			X	2024-09-01																									0		
CC - 1049647963																													0		
CC - 1100502																													0		
CC - 1055186223			X	2024-09-01																									0		
CC - 1118774601			X	2024-09-01																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 4249073	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 4239368	PROTECCION	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1002698905	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994069	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1090399182	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1100476	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1049413692	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 4240055	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 11443434	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 83215793	COLPENSIONES	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 7172281	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 4060131	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994798	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1049647963	PORVENIR	30	$1.859.682	0.1600000	$297.600	$0	$0	$297.600	$0	$0	$0
CC - 1100502	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1055186223	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1118774601	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4249073	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 4239368	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1002698905	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056994069	SANITAS	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	82000301 0	0.0696000	$6.100
CC - 1090399182	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1100476	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1049413692	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 4240055	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 11443434	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 83215793	SANITAS	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	82000301 0	0.0696000	$6.100
CC - 7172281	FAMISANAR	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	82000301 0	0.0696000	$6.100
CC - 4060131	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056994798	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1049647963	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.859.682	0.0400000	$74.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.859.682	82000301 0	0.0696000	$129.500
CC - 1100502	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1055186223	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1118774601	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4249073	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4239368	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002698905	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994069	COMFABOY	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090399182	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100476	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049413692	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4240055	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11443434	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83215793	COMFABOY	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7172281	COMFABOY	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4060131	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994798	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049647963	COMFABOY	30	$1.859.682	0.0400000	$74.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100502	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1055186223	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1118774601	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	4	$436.900	$0	$0	$0	$0	1	$400	$0	$0	$437.300
PORVENIR	10	$1.178.400	$0	$0	$0	$0	1	$900	$0	$0	$1.179.300
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	1	$200	$0	$0	$208.200
PROTECCION	2	$215.000	$0	$0	$0	$0	1	$200	$0	$0	$215.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	1	$100	$0	$52.100	$0	0	$0	$0	$52.100	$0	$0	$52.100
FAMISANAR	1	$3.500	$0	0	$0	0	$0	$3.500	1	$100	$0	$3.600	$0	0	$0	$0	$3.600	$0	$0	$3.600
NUEVA E.P.S. S.A.	8	$187.400	$0	0	$0	0	$0	$187.400	1	$200	$0	$187.600	$0	0	$0	$0	$187.600	$0	$0	$187.600
EPS CAJACOPI	3	$156.000	$0	0	$0	0	$0	$156.000	1	$200	$0	$156.200	$0	0	$0	$0	$156.200	$0	$0	$156.200
SANITAS	4	$111.000	$0	0	$0	0	$0	$111.000	1	$100	$0	$111.100	$0	0	$0	$0	$111.100	$0	$0	$111.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	17	$887.300	0	$0	$0	$887.300	1	$700	$888.000	0	$0	$0	$888.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	17	$509.900	1	$400	$510.300
SENA	0	$0	1	$0	$0
ICBF	0	$0	1	$0	$0
ESAP	0	$0	1	$0	$0
MinEdu	0	$0	1	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$510.600
PENSIONES	4	$2.040.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$888.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$510.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.948.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31268106
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL INTER UVITA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901738692	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 7 26 BRR CAROLINA	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	LA UVITA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114655831
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1054254612	PRIMER APELLIDO	MENDIVELSO	SEGUNDO APELLIDO	ALVAREZ
PRIMER NOMBRE	ANDRES	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.638.000		31268106

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7180551	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	$1.638.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7180551																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7180551	PORVENIR	30	$1.638.000	0.1600000	$262.100	$0	$0	$262.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7180551	EPS SURA	30	$1.638.000	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.638.000	1	0.0696000	$114.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7180551	COMFABOY	30	$1.638.000	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$262.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$262.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$65.600	$0	0	$0	0	$0	$65.600	0	$0	$0	$65.600	$0	0	$0	$0	$65.600	$0	$0	$65.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$114.100	0	$0	$0	$114.100	0	$0	$114.100	0	$0	$0	$114.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	1	$65.600	0	$0	$65.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$65.600
PENSIONES	1	$262.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$114.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$65.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$507.400

Tunja, 13 de Agosto de 2024

Señores
EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA
ATTE. DRA ANDREA CATALINA PINZON BOTÍA
LA UVITA.

REFERENCIA: CONTRATO 2023-045.

ASUNTO: RADICADO POLIZAS PRORROGA 4.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito radicar pólizas correspondientes a la Prorroga No.4 del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ).

Poliza Cumplimiento No. 68859 ANEXO 7
Póliza REC 20154 ANEXO 8

Atentamente,

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
R/L CEROM DE COLOMBIA SAS
C.C. 74.363.121
Celular 3134963719

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050006885900076BOG202408121440552

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 1.417.974,00	COP 10.000,00	COP 271.315,00	COP 1.699.289,00	11/09/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 4 DE FECHA 10/08/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0006 EMITIDO EN FECHA 28/06/2024 Y SEGUN PRORROGA 3 DE FECHA 27/06/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0005 EMITIDO EN FECHA 26/04/2024 Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 18/01/2024 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/01/2024 Y SEGUN PRORROGA 1 Y SUSPENSION 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/12/2023 Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/08/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/08/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 732.569.086,00

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025

Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

CARATULA

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 549.426.814,35
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/11/2027
Prima de la Cobertura : COP 254.693,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 13/11/2024, hasta las 0 hs del 13/11/2029

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 366.284.543,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 166.183,00

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
0500068859000076BOG202408121440552

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 1.417.974,00	COP 10.000,00	COP 271.315,00	COP 1.699.289,00	11/09/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 4 DE FECHA 10/08/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0006 EMITIDO EN FECHA 28/06/2024 Y SEGUN PRORROGA 3 DE FECHA 27/06/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0005 EMITIDO EN FECHA 26/04/2024 Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 18/01/2024 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/01/2024 Y SEGUN PRORROGA 1 Y SUSPENSION 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/12/2023 Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/08/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/08/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

CONTINUA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

CARATULA

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 549.426.814,35
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/11/2027
Prima de la Cobertura : COP 254.693,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 13/11/2024, hasta las 0 hs del 13/11/2029

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 366.284.543,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 166.183,00

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	TERCEROS AFECTADOS

PRORROGA DE VIGENCIA

CODIGO DE VERIFICACION :
060002015400088BOG202408121513519

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 167.397,00	COP 10.000,00	COP 33.705,00	COP 211.102,00	11/09/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

CARATULA

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 4 DE FECHA 10/08/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 14/11/2025

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN SMMLV AÑO 2024,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 29/06/2025

==========

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 16/01/2025

==========

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 SERAN CONSIDERADOS COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

CARATULA

SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 COMO ASEGURADOS ADICIONALES, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO “LIMITE POR EVENTO” Y “LIMITE POR VIGENCIA” PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO “PLO” QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 260.000.000,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo “Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad”.

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos”

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

==========

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:
==========

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

CARATULA

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 26.000.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

CARATULA

** RC PATRONAL:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	08	2024	16	08	2023	00:00	13	11	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA	NIT: 901.738.692-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	NIT: 826.002.202-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2023-047 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN LA PRORROGA No.04 AL CONTRATO DE OBRA No.2023-047 FIRMADA EL 10-08-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA .
- DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****200,876.00	$ *******3,000.00	$ ******38,736.00	$ **********242,613.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	08	2024	16	08	2023	00:00	13	11	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA		**NIT: 901.738.692-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	**NIT: 826.002.202-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	08	2024	16	08	2023	00:00	13	11	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL INTER UVITA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.738.692-3**

DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA — **CIUDAD:** CASTILLA NVA, META — **TELÉFONO:** 3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 826.002.202-7**

DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18 — **CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA — **TELÉFONO:** 7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARM CONSULTING SAS	822007239-7	8.00
BOHORQUEZ SALAMANCA SANDRA MARCELA	1057410858-1	92.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101420720	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	08	2024	16	08	2023	00:00	13	11	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA	NIT: 901.738.692-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	NIT: 826.002.202-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2023-047 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/08/2023	13/03/2025	$39,625,629.20	$39,625,629.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/08/2023	13/03/2025	$39,625,629.20	$39,625,629.20
CALIDAD DEL SERVICIO	16/08/2023	13/03/2025	$19,812,814.60	$19,812,814.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/08/2023	13/11/2027	$29,719,221.90	$29,719,221.90

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN LA PRORROGA No.04 AL CONTRATO DE OBRA No.2023-047 FIRMADA EL 10-08-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA .
- DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******97,869.00	$ *******8,000.00	$ ******20,115.00	$ ***********125,985.00	$ ******128,783,294.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101420720	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	08	2024	16	08	2023	00:00	13	11	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL INTER UVITA			**NIT: 901.738.692-3**
DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	**CIUDAD:** CASTILLA NVA, META	**TELÉFONO:**	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA			**NIT: 826.002.202-7**
DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18	**CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7895077

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARM CONSULTING SAS	822007239-7	8.00
BOHORQUEZ SALAMANCA SANDRA MARCELA	1057410858-1	92.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101420720, anexo 8, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de AGOSTO de 2024

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	20/09/2024	**COMITÉ N° :**	18
HORA DE INICIO:	09:00 a.m.	**TERMINACIÓN:**	11:00 a.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL	**OBJETO:**	SEGUIMIENTO TÉCNICO
CONTRATO #	2023-045		
OBJETO CONTRATO DISEÑOS Y DE OBRA:	*CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ*		
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826.002.202 - 7		
CONTRATISTA DE OBRA:	CEROM DE COLOMBIA SAS NIT 820.003.010-2 R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO CC 74.363.121 de Sutatenza		
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901.738.692 - 3 R/L: ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ		
SUPERVISIÓN:	ANDREA CATALINA PINZON BOTIA - GERENTE E.S.E. GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS - SUPERVISOR CPS 2023-044		

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)

SE HACE LECTURA DEL ACTA ANTERIOR SIN OBSERVACIONES

2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE	CUMPLE (S/N/P)	OBSERVACIONES
INFORMACIÓN COMPLETA PARA ADICIONAL Y MODIFICARORIO EN DRIVE	CEROM	SI	
SOLICITUD DE ADICIONAL Y MODIFICATORIO	SUPERVISIÓN	SI	
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	UT INTERUVITA	SI	

3. AGENDA DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR	7. SOLICITUDES CONTRATISTA DE OBRA
2. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	8. RECOMENDACIONES Y/O SOLICITUDES DE INTERVENTORÍA
3. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS	9. OTROS Y VARIOS
4. ESTADO AVANCE DE OBRA	10. COMPROMISOS PRÓXIMO COMITÉ
5. VERIFICACIÓN DE PROCESO TÉCNICO	
6. SOLICITUDES DEL CONTRATANTE	

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Se dá lectura al acta a lo que el ing Oscar aclara que el modificatorio se presenta a la ESE y el adicional y prórroga se presenta a la

secretaría de salud, dependencia de la gobernación de boyacá. **2. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**: Contratista informa que el avance a la fecha es del

73,86% ejecutado, que el porcentaje programado es del 83,73%, el tiempo transcurrido es del 86% lo que índica un atraso de 2,27% con respecto al avance programado.

3. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS: 3.1 MODIFICATORIO El ingeniero Oscar Rodriguez, por parte de la supervisión informa que se ha presentado la totalidad de los

documentos para la presentación del modificatorio, de acuerdo a los requisitos solicitados por parte de la secretaría de salud. Las carpetas del drive están completas a lo que el

FECHA PRESENTE ACTA	20/09/2024	COMITÉ N° :	18

contratista informa que ya se cargaron la totalidad de los documentos. Por tanto el ing Oscar informa que se hará la revisión para proceder con el pago del acta 01

3.2 ADICIONAL Y PRÓRROGA: Se presenta y se solicita el adicional y prórroga en tiempo 01 a la entidad y se informa que los documentos están cargados en el drive.

El ing Roberto informa que en reunión con el arq Edwin de la sec de salud, se informó que no hay los recursos para el adicional de obra, sin embargo dice que hay que entregar los

documentos para la revisión por parte de la secretaría de salud y que se debe hacer la gestión de los recurso por parte de la alcaldía y de la ESE para que la gobernación le de

prioridad a la consecución de los recursos para terminar la obra y entregarla funcional y estéticamente lista. El ing Oscar aclara que la demora en la entrega de la documentación

no ha sido por culpa de la ESE o la supervisión, a lo que el ing Roberto dice que no se trata de culpar a nadie sino por el contrario de hacer la gestión en equipo para conseguir

los recursos y poder terminar la obra, de igual forma se informa que las actividades contratadas se están terminando y se hará reducción de personal. El ingeniero Roberto agrega

que se debe obtener la vivabilidad técnica por parte de la secretaría de salud y de esa forma continuar con la gestión de los recursos. La doctora Catalina interviene informando

que por parte de la ESE se entregaron los documentos el 3 de septiembre para el traslado de los recuros y así poder generar el acta de cobro 01, el ing Oscar solicita hacer

la solicitud del modificatorio de acuerdo a los cambios solicitados a los APUS Y APM. **3.4 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:** De acuerdo con el compromiso de la interventoría, se

se hace la presentacion de la nueva directora de interventoría a la ING. SANDRA MARCELA BOHORQUEZ SALAMANCA, cumpliendo así con el staff que debe tener la interventoría

4. ESTADO DE AVANCE DE OBRA: Se informa que a la fecha se están ejecutando las actividades de pañetes en cuarto de bombas, remates de filos y dialataciones, enchapes

de baños, cuarto de basuras, los pisos tienen un avance del 43%, se instaló la tubería eléctricas aérea en bloques 1 y 2 y se está instalando el el bloque 3, se están terminando de

fundir los andenes internos y el contratista informa que tuvo retrasos con la llegada de parte de los pisos y la ceramica de pisos debido al paro camionero.

5. VERIFICACIÓN DEL PROCESO TÉCNICO: Interventoría informa que los procesos se han llevado a cabo de acuerdo a los diseños y en cumplimiento de la normatividad.

de igual forma solicita resultados de los ensayos, dar terminación a las cajas de inspección para evitar contaminación en las tuberías y taparlas debidamente.

6. SOLICITUDES CONTRATANTE DE OBRA: El ing Oscar interviene solicitando el concenso para hacer el cambio de piso del bloque 03 a piso en granito pulido como está en el

resto del proyecto, a lo que la interventoría dice estar de acuerdo por calidad y durabilidad, además se aduce que el piso en concreto pulido no es el acabado idoneo para la

finalidad del espacio, además da un acabado oscuro por tanto en conjunto entre supervisión, interventoría y contratista se define hacer el cambio de piso por piso en granito pulido

y así darle homogeneidad al proyecto y además garantía de mayor durabiliad ya que es un piso para tráfico pesado.. **7. SOLICITUDES DEL CONTRATATISTA:** El contratista

solicita dar trámite al modificatorio para poder generar el acta de cobro 01, recalca que la obra va en un 80% aproximadamente y aun no ha podido cobrar.

8. RECOMENDACIONES DE INTERVENTORIA: Interventoría interviene informando que está en disposición para el trámite del modificatorio por tanto queda al tanto de lo que se

necesite para continuar con el proceso, de igual forma solicita al contratista entregar informe de resultados de ensayos de concreto del último mes, resultados de las pruebas de

presión ya que ya se hicieron. **9. OTROS Y VARIOS:** El ingeniero Roberto informa que va a solicitar reunión en la secretaría para que se haga la revisión de los documentos que

ya se encuetran cargados en el drive. Interviene el Ing. Guillermo Berrio, alcalde de la Uvita, preguntando por el estado de la solicitud del adicional a lo que se le informa lo

conversado anteriormente. Y luego de rendirle el informe de la reunión se da por terminada la misma.

10. COMPROMISOS: 10.1 El contratista se compromete a buscar la reunión en la secretaría de salud para solicitar la revisión de los documentos y obtener la viabilidad técnica

del adicional. **10.2** Supervisión se compromete a dar revisón a los documentos para continuar con el proceso **10.3** Interventoría se compromete a hacer la solicitud del modificatorio

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	20/09/2024	COMITÉ N° :	18

de acuerdo a los cambios que se deben hacer según las observaciones que haga el supervisor al respecto.

COMPROMISOS PACTADOS

Compromiso	Fecha máx.. Cumplimiento	Responsable
SOLICITUD DE ADICIONAL Y MODIFICATORIO	INMEDIATO	SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN: **LUGAR**

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	TIPO ANEXO	QUIEN ENTREGA

PARTICIPANTES (En constancia Firman)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
CATALINA PINZÓN	GERENTE ESE	ESE CENTRO DE SALUD	3204485829	
OSCAR RODRIGUEZ	SUPEVISOR ESE	ESE CENTRO DE SALUD	3132335522	
JONATHAN PARDO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	UT INTER UVITA	3174359034	
JEYSON ROMERO	RESDIENTE DE OBRA	CEROM DE COLOMBIA SAS	3504525729	
MAGDA CORDOBA	JURIDICA ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA	ESE CENTRO DE SALUD		
JULIO ROBERTO MONTENEGRO	RL CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA SAS	3134963719	
ING SANDRA MARCELA BOHORQUEZ	DIR INTERVENTORIA	UT INTER UVITA	3134784479	

- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior
- Instalación de tubería eléctrica de techo para red eléctrica del Bloque 02.
- Instalación de bloque #5 para muro cubierta del cuarto de bombas
- Instalación de grafil para refuerzo de muro cubierta del cuarto de bombas.
- Ingreso de material

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibradora eléctrica

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral al bloque 02 #182.
Interventoría recomienda tener especial cuidado con el acabado de los andenes, revisar bombeos y evitar empozamientos, se debe garantizar que el agua de lluvias corra sin obstrucciones, de igual manera se solicita dar mejor acabado en la ejecución de las dilataciones y filos ya que es el acabado final.

Residente Obra 02. Resd. Interventoría.

Fecha: 9 de septiembre de 2021

Actividades: Sin actividades, día domingo

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 02 de septiembre de 2024

Actividades:- Instalacion de plastico negro para impermeabilizar placa bajo de anden
- Se instalo malla electrosoldado para refuerzo de placa bajo anden perimetral.
- Se realiza conformacion de terreno con material de afirmado compactado para zonas exteriores
- Instalación de pañete para muros del cuarto electrico.
- Se instala formaleta para bordillo - perimetral anden bloque c.
- Ingreso de material enchape blanco 49 x 49 262 m²)

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Por averiada en el mercado del formato de baldosin solicitado para la pisos, junto con interventoria se toma la decision de cambiarlo para no retrasar actividades.
Interventoria aprueba cambio de tamaño de pisos en granito para no tener retrasos por fabricación.
Interventoria recomienda verificar desnivel de andenes para evitar empozamientos.

Resid | Interventoria

Fecha: 03 de septiembre de 2024

Actividades: Se instala plastico negro para impermeabiliza placa bajo de anden.
- Instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de placa bajo anden perimetral.
- Se realiza conformacion de terreno con material de afirmado

Powered by CamScanner

Compactado para zona exteriores.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi según el diseño de mezcla para anden perimetral entre bloque 01 y bloque 03.
- Instalación de pañete impermeabilizado para muros exteriores del cuarto eléctrico.
- Se instalan flanches para cubierta exterior del bloque 02 (área técnica).
- Ingreso de material (cemento 238 Bol).

Personal en obra: 1 Residente obra a. Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoria. Mezcladora
1 Maestro Vibrador electrico.
4 Oficiales
8 Auxiliares

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral entre bloque 02 y bloque 03 # 183.
- Se presentan demoras en la llegada de material a obra debido a la situación que se esta viviendo a nivel nacional con el tema del paro camionero, generando así atraso en el cronograma de actividades y a su vez en el porcentaje de avance en obra.

Interventoria recomienda adelantar actividades como remate de cajas de inspección, fabricación de tapas para las mismas, detallado de muros, cajas de registros fijos y dilataciones, para ir dando acabado al proyecto, así se avanza mientras llegan los materiales de las actividades pendientes de inicio. Se solicita asear la obra y despejar las circulaciones.

Residente Obra

Resd. Interventoria

Fecha: 04 de septiembre de 2024

Actividades:
- Se realiza instalación de flanches para cubierta exterior del bloque 02
- Instalación de plástico negro para impermeabilización de placa base de anden perimetral
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa base de anden perimetral bloque 01.
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactada para circulaciones exteriores
- Se realizan filos y dilataciones en pañete para muro del cuarto eléctrico.
- Se instala formaleta para bordillo anden perimetral al bloque 01.
- Se realiza aseo general del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
8 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Lluvias)

Observaciones: Por motivos del paro. comunero programado de material cancelar los despachos hasta que la situación se normalice y sea seguro el transporte de material.
Interventoría recomienda hacer sellado de flanches con pdiuretano para evitar cristalización del producto de sellado de los flanches, para así garantizar el sellado y evitar futuras filtraciones. Se recomienda mejorar la formaleta con la que se fabrican los bordillos y así mejorar el acabado.

Residente Obra.

Resid. Interventoría.

Fecha: 05 de septiembre de 2024.

Actividades: Instalación de flanches para cubierta exterior del bloque 02
- Se instala plástico negro para impermeabilizar la placa base de orden perimetral
- Instalación de malla electrosoldada para refuerzo de placa base para orden permetral
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exteriores
- Se realizan tubos y dilataciones en pantalla para muros del cuarto eléctrico
- Se realiza aseo general del bloque 02.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
7 Oficiales

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Soleado)

Observaciones: Se realiza visita a obra por parte de Alcaldía, concejo municipal, interventoría, contratista de obra y ESE Ca Visita para revisa el avance y estado de la obra.

De acuerdo a la visita realizada, se informó que la obra ya superó el 70% de avance, y que se necesita del adicional en valor para entregar la obra terminada y funcional. Interventoría solicita hacer aseo general de la obra ya que se deben preparar los pisos para el acabado que será a instalar.

Residente Obra

Resd. Interventoría

Fecha: 06 de septiembre de 2024.

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en pañete para muro del cuarto de bombas.
- Instalación de tapas de caja de inspección hidrosanitaria y eléctrica
- Se instala plástico negro para impermeabilizar placa base de anden perimetral Bloque 01
- Instalación de malla electrosoldada para refuerzo de placa base de anden perimetral.
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para zonas exteriores.
- Instalación de enchape para muros del bloque 02 (zona basuras)
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para placa base de anden perimetral Bloque 01 (Cantidad - medición)
- Ingreso de material (arena de peña)
- Se retira material proveniente de excavaciones para depósito zona exteriores.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
7 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral Bloque 01 #1984.
Interventoría solicita que el enchape que se está instalando se dilate de 1 a 2 mm para que sea más homogenea la dilatación tanto horizontal como vertical.

Obra C. | Resd Interventoría.

Fecha: 07 de septiembre de 2020

Actividades: Se instala plastico negro para impermeabilizar placa base de anden perimetral.
Instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de placa base de anden perimetral.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para placa base anden perimetral bloque 1 (administracion)
- Se instala formaleta para escalera anden perimetral bq 1.
- Instalacion de enchape para muros del bloque 1 (basuras)
- Se realizan filos y dilataciones en pañete para muro del cuarto bombas

Personal en obra: 1 Residente obra 1
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
7 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico

Estado del tiempo: Mañana (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral al bloque 1 #9 es
Interventoria recomienda despejar zonas exteriores aprovechando que por motivos de paro hay actividades pendientes de inicio, se puede hacer el retiro de roca, madera, desperdicios y escombros y asi despejar para hacer las conformaciones y paisajismo.

Res. Obra 1 Resd. Interventoria

Fecha: 08 de septiembre de 2020

Actividades: Sin actividades dia dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Powered by CamScanner

Fecha: 04 de septiembre de 2024

Actividades: Conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exteriores
- Se realiza filos y dilataciones en pañete para muros del cuarto de bombas.
- Instalación de enchape para muros del cuarto de basuras y bona (zona administrativa)
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi según el diseño de mezcla para anden perimetral bloque 01
- Instalación de lamina para cubierta exterior del bloque 01 (plazoleta)
- Instalación de plástico impermeabilizado para anden perimetral.
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa del anden perimetral
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra 01
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
7 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral bloque 01 (enfermería - laboratorio) #186.
Interventoría recomienda hacer un plan de ingreso de materiales a obra y así abastecerla evitando retrasos en la ejecución de actividades recuperando el tiempo de retraso debido al paro de la semana anterior. Se recomienda abastecer de material para ejecuciones totales y no parciales.

Res. Obra.

Res. Interventoría

Fecha: 10 de septiembre de 2021

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en pañete para muros del cuarto de bombas.
- Instalación de enchape para muros del cuarto de bombas y baño (enfermería)
- Se aplica vinilo para muros del cuarto eléctrico
- Se realiza aseo y limpieza de área administrativa
- Se realiza instalación de baldosín blanco para área administrativa del bloque 01.
- Se instala bloque #5 para muros interna del bloque 01
- Se realiza afinado de piso para placa área del bloque 01
- Instalación de marco metálico para sumideros de anden perimetral
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior del cuarto eléctrico

-Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
8 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda adelantar el emboquillado del enchape para evitar contaminación de las dilataciones, el emboquillado debe ser casi simultaneo después de pegar el enchape. Se recomienda hacer pruebas de desagüe de los andenes para evitar empozamientos. Se recomienda hacer detallado en curvo y no dejar partes sin terminar.

Residente obra a. Resi Interventoría

Fecha: 11 de septiembre de 2024

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en pañete para muros del bloque 02.
- Instalación de enchape para muros del cuarto de basuras y baños.
- Se aplica vinilo para exteriores en muros del cuarto eléctrico
- Se realiza aseo en el área de farmacia y archivo del bloque 01
- Se instala baldosín blanca para zona de administración y farmacia del bloque 01
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior del cuarto eléctrico
- Se realiza alistado de piso para zona de rampa del bloque 02
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
8 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: En común acuerdo con el contratista se toma la decisión de no cubrir las instalaciones eléctricas internas, hasta tanto no se defina como se va a cerrar la edificación o si por el contrario se van a adicionar los recursos para dar terminación a la obra. Por motivos de seguridad por ahora no se instalará.

Res. Obra

Resd. Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 12 de Septiembre de 2024

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en pañete para muros del bloque 02
- Instalación de enchape para muros del cuarto de basuras y baños
- Se aplica vinilo para muros del cuarto eléctrico.
- Se realiza instalación de boldosín blanco para áreas de administración del bloque 01 y esterilización del bloque 02.
- Se realiza alistado de piso para zonas del bloque 02 (depósito - procedimientos - sala E.R.A).
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exteriores del cuarto eléctrico
- Se instalan tubería eléctrica de piso conectando cuarto eléctrico con caja de inspección.
- Se realiza instalación de plástico negro para impermeabilizar placa base-anden permetral cuarto eléctrico
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa base de anden permetral.

Personal en obra: 1 Residente obra a.
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
8 Ayudantes
1 Electricista

Equipo: Herramientas menores

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda hacer pruebas de desagüe en los anderes nuevos para evitar empozamientos. Interventoría solicita resultados de las pruebas de concreto realizadas en el último mes.

Residente obra a.

Residente Interventoría

Fecha: 13 de septiembre de 2024

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en panete para muros del bloque 02
- Instalación de enchape para muros del cuarto de basuras del bloque 02.
- Se realiza instalación de baldosín blanco para area de odontología y baños del bloque 02
- Se realiza alistado de piso para zona de rodadura general del bloque 02.
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior
- Se realiza mezclo de concreto de 2500 psi para placa base de anden perimetral al cuarto eléctrico
- Disposición de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
8 Ayudantes
1 Electricista.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de placa base de anden perimetral al cuarto eléctrico
Interventoría en conjunto con el contratista definió el arranque de la instalación de los pisos, los giros y la ubicación del granito verde para mantener o mejorar el diseño, evitando cortes innecesarios o remates que no sean estéticamente correctos

Res. Obra

Res. Interventoría.

Fecha: 14 de septiembre de 2024.

Actividades:
- Instalación de plástico negro para impermeabilizar placa base anden perimetral bloque 01.
- Instalación de malla electrosoldada para refuerzo de placa base de anden perimetral bloque 01.
- Se realiza merda de concreto de 2500 psi para placa base de anden perimetral del bloque 01.
- Se realiza instalación de boldosín blanco para area de odontologia y baños del bloque 02.
- Se realiza instalación de enchape para muros del cuarto de bombas.
- Instalación de tubería eléctrica para soldar cajas de inspección.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
6 Oficiales
8 Auxiliares
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de placa base de anden perimetral del bloque 01 #188.
Interventoria recomienda dar terminación a cajas de inspección tanto de desagües como eléctricas para así irlas cerrando y evitar contaminación de los ductos o posibles taponamientos.

Residente obra | Residente Interventoria

Fecha: 15 de septiembre de 2024.

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 16 de septiembre de 2024.

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en panete para muro del bloque 02.
- Se instala enchape para muro de cuarto de basuras del bloque 02.
- Se realiza instalacion de baldosin blanco para baños del bloque 02.
- Se realiza alistado de piso para zona del bloque 02 (Medianera general)
- Se realiza conformacion de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior.
- Se realiza media caña en mortero para zona de Enfermeria.
- Traslado de material (arena de rio)
- Instalacion de ducto para iluminacion exterior del cajal de pozo.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
8 Ayudantes
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda hacer revisión general de los vanos de puertas y ventanas, se debe revisar plomos, niveles y escuadras para evitar reprocesos en el momento de la instalación de las carpinterías tanto de madera como de aluminio.

Res. Obra C. | Resd Interventoría.

Fecha: 14 de septiembre de 2024

Actividades: Se realizan filos y dilataciones en pañete para muros del bloque 02.
- Se instala enchape para muros de cuarto de basura del bloque 02.
- Se realiza instalación de baldosín blanco para área de farmacia y archivo del bloque 01.
- Se aplica vinilo para muros exteriores del bloque 04 (cuarto de bombas)
- Se realiza media caña en mortero para zona de toma de muestras y laboratorio del bloque 01
- Instalación de tubería eléctrica de techo para bloque 03 (salón múltiple).
- Ingreso de material (baldosín verde).

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría.
1 Maestro
6 Oficiales
8 Auxiliares
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda dar terminación a la parte inferior de los muros de fachada y así hacer el remate junto a los andenes y así poder dar terminación a la pintura de fachada. Se deben definir los tamaños tanto de bocapuertas como de narices de las escaleras y escalones en granito.

Residente obra 01 | Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 18 de Septiembre de 2024

Actividades:- Instalación de baldosín (Blanco - verde) para área de sala de espera principal del bloque 01
- Se realizan afilatacones en pañete para muros del bloque 02
- Se aplica vinilo para muros exteriores del bloque 04 (cuarto electrico).
- Se realiza media caña en mortero para zonas del bloque 01 (laboratorio)
- Instalación de tubería eléctrica de techo para bloque 03 (salón múltiple)
- Instalación de enchape para muros de baño de 1 bloque 03 (salón múltiple)
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
2 Ayudantes
1 Electricista

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda avanzar con la boquilla del piso de granito y así evitar la contaminación de las dilataciones, así se va sellando la junta y se evita amarillamiento de la dilatación.

Res. Interventoría.

Res. Obra.

Fecha: 19 de Septiembre de 2025

Actividades: Se instala baldosin (blanco - verde) para area de circulación del bloque 01.
- Se realizan alistamientos en pañete para muros del bloque 01.
- Se aplica vinilo para muros internos del bloque 03 Cuarto eléctrico
- Se realiza medida para zona de procedimiento del bloque 02.
- Instalación de tubería eléctrica de techo para bloque 05 (Salón múltiple)
- Instalación de enchape para baño del bloque 02 (con medidas general)
- Ingreso de material (baldosa precidida para escalera color - terra).

Personal en obra: 1 Residente obra.
1 Residente interventoria.
1 Maestro
6 Oficiales
8 Ayudantes
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda allegar a obra las griferías tipo push para sanitarios y así dar avance a los enchapes en baños y de la misma forma avance a los acabados de muros, la demora en la llegada del material genera retraso en la programación.

Res Obra.

Resd Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 20 de septiembre de 2024.

Actividades: Instalación de baldosín (blanco-verde) para área de circulación del bloque 01
- Se aplica vinilo para muros del cuarto eléctrico bloque 04
- Se instala tubería eléctrica de techo para bloque 03 salón múltiple.
- Se realizan dilataciones en pañete para muros del bloque 02.
- Se instala bloque #5 para muros del cuarto de bombas.
- Se instala grafil de refuerzo para muros en bloque del cuarto de bombas.
- Se instala enchape para muros de baños del bloque 02.
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
8 Auxiliares
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda retirar de la obra el escombro, retal de madera, demás sobrantes reciclables y no reciclables para así despejar las áreas y terminar de conformar las áreas exteriores, zonas verdes y andenes faltantes por ejecutar.

Ing. Residente.

Powered by CamScanner

Fecha: 21 de septiembre de 2024.

Actividades: Instalación de baldosin (blanco - verde) para área de circulación del bloque 01.
- Se aplica vinilo para exteriores del cuarto dlotrico
- Instalacion de bloque #5 para muros del cuarto de bombas.
- Se instala grafil de retorno para muros en bloque #5 del cuarto de bombas.
- Instalación de tubería electrica de techo para red electrica del bloque 03.
- Se realiza aseo general de obra.

Personal en obra: 1 Residente obra a.
1 Residente interventoria.
1 Maestro.
6 Oficiales.
8 Auxiliares.
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda pañetar el cuarto de bombas antes de pintar la estructura de cubierta y antes de la instalación de la teja y así evitar daños en los materiales.

Res. Obra 01 Resd. Interventoría.

Fecha: 22 de septiembre de 2024.

Actividades: Sin actividades, día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Powered by CamScanner

Fecha: 23 de septiembre de 2024.

Actividades:- Instalación de baldosín (blanco - verde) para bloque 02 (salón múltiple)
- Se instala bloque #5 para muros de rampa de acceso al bloque 02.
- Instalación de gotil para refuerzo de muro en bloque para rampa de acceso al bloque 02
- Se instala enchape para muros de band del bloque 02
- Se realizan dilataciones en pañete para muros del bloque 02
- Ingreso de material (baldosín blanco)

Personal en obra: 1 Residente obra. Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoría.
1 Maestro
3 Oficiales
4 Auxiliares

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda que simultaneamente luego de instalar pisos, se vaya emboquillando para evitar contaminación en las juntas, de igual forma empezar a proteger los pisos para evitar daños en los diferentes materiales, se solicita mantener las áreas aseadas para evitar rayones.

Res. Obra. Resd. Interventoría.

Fecha: 24 de septiembre de 2024

Actividades:- Instalación de baldosín blanco para zona de circulación del bloque 02
- Se instala bloque #15 para muros de rampa de acceso del bloque 02

- Se instala malla de refuerzo para muro en bloque A-5 para rampa de acceso al bloque 02.
- Se instala enchape para muros de baños del bloque 02.
- Se realizan dilataciones en pañete para muros del bloque 4
- Ingreso de material (arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra 01 — Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
4 Auxiliares

Estado del tiempo: Mañana: Nublado - Tarde: Nublado

Observaciones: Interventoría recomienda verificar inclinación de las rampas antes de dar acabado para evitar que superen el máximo permitido, de igual forma verificar la rasante con respecto a las tapas de las cajas de inspección y evitar que las tapas queden altas o bajas con respecto al nivel del acabado.

Res. Obra — Res. Interventoría

Fecha: 25 de Septiembre de 2024

Actividades: - Instalación de baldosín blanco para zona de circulación del bloque 02.
- Se instala pañete para muro de rampa de acceso al bloque 02
- Se aplica vinilo para muros exteriores del bloque 04 (cuarto eléctrico
- Se realiza media caña en mortero para zona de medianera general del bloque 01.
- Ingreso de material (arena de río)

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente de obra. Equipo: Herramienta menor.
1 Residente interventoria.
1 Maestro.
4 Oficiales.
4 Auxiliares.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Lluvias)

Observaciones: Debido a que se presentaron lluvias, se identificaron algunas filtraciones en la unión de la cubierta con los muros, notando que algunos flanches no estan bien sellados, se solicita corregir inmediatamente ya que al parecer se avecina otra temporada de lluvias.

Resid. Obra. Resid. Interventoria.

Fecha: 26 de septiembre de 2025

Actividades: - Instalacion de baldosin (blanco - verde) para sala de espera del Bloque 02
- Se realiza alistado de piso para bloque 04 (cuarto electrico)
- Se realizan excavaciones en material comun para salida red contra incendios
- Se realiza instalacion de enchape para muros de baño del Bloque 01
- Se realiza media caña en mortero para zona del Bloque 02 (sala ERA)
- Se aplica boquilla para baldosin verde del area de circulacion del Bloque 04

Personal en obra: 1 Residente obra.
1 Residente interventoria.
1 Maestro
4 Oficiales
4 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (lluvia fuerte)

Observaciones: Interventoría recomienda hacer reparación homogénea de los pisos exteriores generando una dilatación un poco más amplia pero evitando que queden recortes en el material, generando módulos incompletos que deteriorem el diseño de los acabados exteriores.

Residente. Residente Interventoría.

Fecha: 27 de septiembre de 2024

Actividades: Se aplica boquilla para baldosín verde en las áreas de circulación (bloque 02) y salón múltiple bloque 03
- Se instala pañete para muros internos del cuarto de bombas
- Instalación de baldosa propuesta para zona exterior del bloque 03 (salón múltiple)
- Se realiza adecuación y limpieza para cajas de inspección de red hidrosanitaria
- Se instalan marcos metálicos para cajas de inspección faltantes de red aguas lluvias
- Instalación de enchape en muros de baños del bloque 02
- Ingreso de material (cemento blanco - dilatación - granito - grava mo

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
4 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Powered by CamScanner

Observaciones: Interventoría recomienda despejar áreas exteriores, retirar escombro, desechos y así poder conformar y terracear los espacios pendientes generando así las circulaciones y andenes pendientes por ejecutar

Residente. Resd. Interventoría

Fecha: 28 de septiembre de 2024

Actividades: Se instala baldosa pegolida para zonas exteriores del Bloque 01
- Se realiza instalación de boquilla para baldosín blanca del bloque 01 (área administrativa).
- Instalación de pañete para muros del área de maquinas para red hidráulica
- Instalación de enchape para gabinetes del Bloque 02.
- Adecuación y limpieza de cajas de inspección de red Antena y aguas lluvias
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para zonas exteriores del Bloque 01.
- Aseo general de obra.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
4 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor. Pona compactadora

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (No Bloque - (Lluvias fuertes)

Observaciones: Interventoría recomienda verificar los muros que van enchapados para evitar reprocesos y/o sobrecostos por material aplicado en lugares donde no figuran.

Residente. Resd. Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 29 de septiembre de 2024

Actividades: Sin actividades, día domingo

Estado del tiempo: Mañana (lluvia) - Tarde (lluvia fuerte)

Fecha: 30 de septiembre de 2024

Actividades: - Instalación de bolsa prepulida para rampa de acceso al bloque 02
- Instalación de boquilla para baldosín blanco en zonas de circulación del bloque 01 y bloque 03
- Instalación de enchape para mural de gabinetes del área del bloque 01.
- Se realizan corte y dilataciones en pañete para muros del bloque 02
- Se realizan dilataciones en granito para boca puerta del bloque 01
- Se aplica vinilo para muro exterior del cuarto de bombas y bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
4 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (lluvia)

Observaciones: Interventoría nuevamente y debido a las fuertes lluvias solicita rectificar el sellado de juntas y planchas en unión de muros con cubierta ya que se están presentando filtraciones.

Residente Obra

Residente Interventoría

APU GOBERNACIÓN

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Andres

mar, 3 sept, 12:09 p.m.

--

Señores
ING ANDRES CEPEDA

Cordial saludo
Por este medio envío los apus de la gobernación que le hacen falta al pdf de los apus del modificatorio
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

25 archivos adjuntos • Analizado por Gmail







OF-051-INT CONCEPTO SOLICITUD ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO 01

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Oscarrodriguez0310, Cco:Andres, Cco:JULIO

sáb, 7 sept, 10:35 a.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se adjunta el oficio OF-051-INT, mediante el cual se da respuesta a la solicitud de adicional en tiempo y recursos, hecha por el contratista CEROM DE COLOMBIA, se adjunta oficio enviado por el contratista.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

ACTA DE COMITÉ 17 Recibidos ×

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> lun, 9 sept, 10:41 a.m.
para Empresa, JEYSON, Oscarrodriguez0310

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
ING. OSCAR RODRIGUEZ
SUPERVISOR
ING. JEYSON ROMERO
RESIDENTE OBRA CEROM

Cordial saludo
Por este medio se envía acta de comité 17 para su revisión y aprobación, y firma en caso de ser aprobada.
Agradecemos su atención.
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



INFORME #13 OBRA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> mié, 11 sept, 11:14 a.m.
para Oscarrodriguez0310, Empresa

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Ing. Oscar Rodriguez
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía el informe de obra correspondiente al mes de agosto luego de ser revisado y aprobado por la presente interventoría.

INFORME DE OBRA AGOSTO.rar

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

INFORME INTERVENTORIA #13 AGOSTO

Recibidos ×

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Oscarrodriguez0310, Empresa

mié, 11 sept, 11:12 a.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Ing. Oscar Rodriguez
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía informe #13 correspondiente al mes de agosto para su revisión y fines pertinentes.
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Oscarrodriguez0310, Cco:JULIO

mar, 17 sept, 8:50 a.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Ing. Oscar Rodriguez
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía oficio OF-052-INT, mediante el cual la presente interventoría solicita cambio de profesional Director de Interventoría., para lo cual se adjunta hoja de vida del profesional ofertado.
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail


OF-INT-052 SOLI...


HOJA DE VIDA S...

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Oscar, Empresa

mié, 18 sept, 8:55 a.m.

Cordial saludo,

Se envía el informe con las correcciones solicitadas.

INFORME DE OBRA AGOSTO.rar

•••

–

Señores

Cordial saludo

•••

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail





INFORME DE OBRA CORREGIDO

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Oscar

jue, 19 sept, 9:30 a.m.

--

Señores
ING- OSCAR RODRIGUEZ

Cordial saludo
Por este medio y de acuerdo a lo observado, se envía informe de obra corregido y de igual manera debidamente revisado por esta interventoría.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



INFORME MENSUAL CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO
para mi, residenteinteruvita

lun, 2 sept, 11:08 a.m.

Buenos Días

A Continuación, adjunto el informe mensual de obra correspondiente al mes de Agosto para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

INFORME DE OBRA AGOSTO.rar

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

INFORME DE OB...

SOLICITUD MODIFICATORIO 01 Recibidos ×

utinteruvita vie, 30 ago, 11:41 a.m.

-- Señores ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE ING. OSCAR RODRIGUEZ SUPERVISOR Cordial saludo Por este medio se envía O



Oscar Rodriguez lun, 2 sept, 11:03 p.m.

para mi

Cordial saludo, revisada la información se solicita anexar la totalidad de los APUS Ítems no previstos ya que no se encuentran incompletos, de igual manera se solicita anexar documento técnico de la justificación a la modificación relacionando las mayores y menores cantidades y los ítems no previstos anexados en el modificatorio.
Quedo atento a cualquier duda.

PSI.

OSCAR RODRIGUEZ T

INGENIERO CIVIL

ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Cel: 3132335522

Correo: oscarrodriguez0310@gmail.com

•••

Fwd: Formato Presupuesto Modifiacion y Adicional

Recibidos ×

Andrés Cepeda <ing.andrescepeda@gmail.com>
para mi

jue, 5 sept, 9:51 a.m.

---------- Forwarded message ---------
De: **Oscar Rodriguez** <oscarrodriguez0310@gmail.com>
Date: mar, 16 jul 2024 a la(s) 5:44 p.m.
Subject: Formato Presupuesto Modifiacion y Adicional
To: <ing.andrescepeda@gmail.com>

Muy buenas tardes ingeniero comparto el formato sobre el cual se debe presentar el ajuste del proyecto y le comparto la sabana del convenio que me envió el ingeniero Roberto agradezco su colaboración mil gracias.
PSI.

OSCAR RODRIGUEZ T

INGENIERO CIVIL

ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Cel: 3132335522

Correo: oscarrodriguez0310@gmail.com

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail





SOLICITUD DE ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO No.1 - CONTRATO DE OBRA N° 2023-045

Recibidos ×

Andrés Cepeda <ing.andrescepeda@gmail.com>
para eselauvita, mi, oscarrodriguez0310

6 sept 2024, 5:40 p.m.

Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto la **Solicitud de Adicional en Valor y Tiempo No.1,** para el contrato en referencia, anexando el link de la documentación requerida para su respectivo trámite.

Agradezco su atención.

–

Andrés Camilo Cepeda Hernández
Ingeniero Civil
Administrativo Cerom de Colombia SAS
Email: ing.andrescepeda@gmail.com

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



SOLICITUD_DE_A...

ACTA DE COMITÉ 17

Recibidos ×

utinteruvita lun, 9 sept, 10:41 a.m.

-- Señores ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE ING. OSCAR RODRIGUEZ SUPERVISOR ING. JEYSON ROMERO RESIDENTE OBRA

Oscar Rodriguez lun, 9 sept, 11:24 a.m.

para mi

Se envían actas de comité firmadas y aprobadas por parte de la supervisión de la E.S.E
PSI.

OSCAR RODRIGUEZ T

INGENIERO CIVIL

ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Cel: 3132335522

Correo: oscarrodriguez0310@gmail.com

•••

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



ACTA COMITÉ 16...



COMITÉ 17.pdf

INFORMES MENSUALES CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO
para mí, residenteinteruvita

jue, 12 sept, 3:16 p.m.

Este mensaje parece peligroso

Se usaron mensajes similares para robar información personal a los usuarios. No hagas clic en vínculos, descargues archivos adjuntos ni respondas con informaci

Parece seguro

Buenas Tardes

A Continuación, adjunto informe mensual sst correspondiente al mes de Agosto para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

RV: Invitación: Comité de obra Septiembre vie 20 de sept de 2024 09:00 - 11:00 (GMT-10) (eselauvita@hotmail.com) Recibidos ×

E.S.E LA UIVTAS¿ E.S.E LA UVITA mar, 17 sept, 4:58 p.m.

para alcaldia, planeacion, mi, ceromlimitada@hotmail.com, Oscarrodriguez0310@gmail.com

sept
20
vie

RV: Invitación: Comité de obra Septie...

De Google Calendario

No se pudo recuperar este evento de tu calendario.

Atentamente

Andrea Catalina Pinzón Botia
GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD
LA UVITA
TEL. 320-448-58-29.

INFORME INTERVENTORIA #13 AGOSTO

Recibidos ×

utinteruvita mié, 11 sept, 11:12 a.m.

-- Señores ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE Ing. Oscar Rodriguez Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita Cordi



Oscar Rodriguez mar, 17 sept, 8:30 p.m.

para mí, Empresa

Cordial saludo,
Revisada la información enviada se solicita revisar los tiempos de ejecución de los contratos tanto de obra como de interventoría dado que la prórroga N° 4 se establecen 3 meses y 2 dias dando como fecha de terminación real de la ejecución de los mismos el día 13 de noviembre de 2024 por favor revisar corregir y enviar nuevamente mil gracias.

PSI.

OSCAR RODRIGUEZ T

INGENIERO CIVIL

ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Cel: 3132335522

Correo: oscarrodriguez0310@gmail.com

•••

INFORME MENSUAL CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO
para mi, residenteinteruvita

jue, 19 sept, 9:09 a.m.

Buenos Días

A Continuación, adjunto el informe mensual de obra correspondiente al mes de Agosto con las observaciones subsanadas para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1286

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 6/07/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS CIMENTACION BLOQUE 04	8349	7/06/2024	14/06/2024	7	15.0	30.0	176.7	5301.4	12149	2.292	**2229**	3000	**74%**	6
	8350	7/06/2024	21/06/2024	14	15.1	30.2	179.1	5408.2	12280	2.271	**2745**	3000	**92%**	4
	8351	7/06/2024	5/07/2024	28	15.5	30.2	188.7	5698.5	12967	2.276	**3213**	3000	**107%**	5
COLUMNAS BLOQUE 04	8352	8/06/2024	15/06/2024	7	15.4	30.2	186.3	5625.2	12602	2.240	**2310**	3000	**77%**	3
	8353	8/06/2024	22/06/2024	14	15.4	30.4	186.3	5662.5	12940	2.285	**2649**	3000	**88%**	3
	8354	8/06/2024	6/07/2024	28	15.5	30.5	188.7	5755.1	12812	2.226	**3408**	3000	**114%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 6/07/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1286

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 8/07/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNAS BLOQUE 04	8355	9/06/2024	16/06/2024	7	15.1	30.5	179.1	5461.9	12299	2.252	**2448**	3000	**82%**	5
	8356	9/06/2024	23/06/2024	14	15.1	30.6	179.1	5479.8	12445	2.271	**2733**	3000	**91%**	2
	8357	9/06/2024	7/07/2024	28	15.3	30.6	183.9	5625.9	12678	2.253	**3234**	3000	**108%**	5
COLUMNAS BLOQUE 04	8358	10/06/2024	17/06/2024	7	15.4	30.3	186.3	5643.8	12655	2.242	**2505**	3000	**84%**	6
	8359	10/06/2024	24/06/2024	14	15.4	30.4	186.3	5662.5	12647	2.233	**2775**	3000	**93%**	5
	8360	10/06/2024	8/07/2024	28	15.2	30.5	181.5	5534.5	12568	2.271	**3303**	3000	**110%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 8/07/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1286

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 17/07/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS AEREAS Y PLACA MACIZA **BLOQUE 04**	8361	19/06/2024	26/06/2024	7	15.1	30.0	179.1	5372.4	12205	2.272	**2229**	3000	**74%**	4
	8362	19/06/2024	3/07/2024	14	15.0	30.3	176.7	5354.5	12183	2.275	**2589**	3000	**86%**	3
	8363	19/06/2024	17/07/2024	28	15.1	30.6	179.1	5479.8	12487	2.279	**3417**	3000	**114%**	3
- - - - - - - - - - - - - -	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 17/07/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1319

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 7/08/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS CIMENTACION - RAMPA ACCESO BLOQUE2	8437	8/07/2024	15/07/2024	7	15.4	30.2	186.3	5625.2	12840	2.283	**2490**	3000	**83%**	2
	8438	8/07/2024	22/07/2024	14	15.2	30.4	181.5	5516.3	12516	2.269	**2793**	3000	**93%**	6
	8439	8/07/2024	5/08/2024	28	15.5	30.5	188.7	5755.1	12807	2.225	**3540**	3000	**118%**	2
PLACA BASE - RAMPA ACCESO BLOQUE2	8440	10/07/2024	17/07/2024	7	15.1	30.1	179.1	5390.3	12239	2.271	**2118**	2500	**85%**	6
	8441	10/07/2024	24/07/2024	14	15.1	30.2	179.1	5408.2	12103	2.238	**2178**	2500	**87%**	6
	8442	10/07/2024	7/08/2024	28	15.4	30.6	186.3	5699.7	12794	2.245	**2638**	2500	**106%**	2

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 7/08/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1319

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 8/08/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
ZAPATAS - ACCESO AMBULANCIA	8443	10/07/2024	17/07/2024	7	15.2	30.0	181.5	5443.8	12427	2.283	**2280**	3000	**76%**	2
	8444	10/07/2024	24/07/2024	14	15.2	30.6	181.5	5552.6	12611	2.271	**2715**	3000	**91%**	6
	8445	10/07/2024	7/08/2024	28	15.3	30.6	183.9	5625.9	12585	2.237	**3579**	3000	**119%**	3
PLACA BASE - PLAZOLETA BLOQUE 01	8446	11/07/2024	18/07/2024	7	15.4	30.0	186.3	5588.0	12710	2.275	**2005**	2500	**80%**	4
	8447	11/07/2024	25/07/2024	14	15.1	30.6	179.1	5479.8	12440	2.270	**2260**	2500	**90%**	5
	8448	11/07/2024	8/08/2024	28	15.5	30.0	188.7	5660.8	12634	2.232	**2730**	2500	**109%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 8/08/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1319

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 25/08/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS DE CIMENTACION - ACCESO AMBULANCIA	8449	12/07/2024	19/07/2024	7	15.2	30.0	181.5	5443.8	12217	2.244	**2241**	3000	**75%**	3
	8450	12/07/2024	26/07/2024	14	15.4	30.2	186.3	5625.2	12657	2.250	**2727**	3000	**91%**	2
	8451	12/07/2024	9/08/2024	28	15.1	30.2	179.1	5408.2	12339	2.282	**3366**	3000	**112%**	3
PLACA BASE - ACCESO BLOQUE 03	8452	28/07/2024	4/08/2024	7	15.5	30.6	188.7	5774.0	12900	2.234	**1890**	2500	**76%**	4
	8453	28/07/2024	11/08/2024	14	15.3	30.0	183.9	5515.6	12621	2.288	**2225**	2500	**89%**	6
	8454	28/07/2024	25/08/2024	28	15.5	30.1	188.7	5679.6	12713	2.238	**2710**	2500	**108%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 25/08/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1319

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 30/08/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
PLACA BASE - BLOQUE 04	8455	1/08/2024	8/08/2024	7	15.0	30.4	176.7	5372.1	12258	2.282	**1923**	2500	**77%**	6
	8456	1/08/2024	15/08/2024	14	15.0	30.2	176.7	5336.8	12269	2.299	**2203**	2500	**88%**	6
	8457	1/08/2024	29/08/2024	28	15.5	30.0	188.7	5660.8	12728	2.248	**2873**	2500	**115%**	2
ZAPATAS - VC - CUARTO BOMBAS	8458	2/08/2024	9/08/2024	7	15.5	30.2	188.7	5698.5	12658	2.221	**2487**	3000	**83%**	4
	8459	2/08/2024	16/08/2024	14	15.0	30.0	176.7	5301.4	12045	2.272	**2676**	3000	**89%**	3
	8460	2/08/2024	30/08/2024	28	15.3	30.2	183.9	5552.4	12458	2.244	**3495**	3000	**117%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.



Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 30/08/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1319

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 4/09/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
COLUMNETAS - BLOQUE 04	8461	7/08/2024	14/08/2024	7	15.1	30.3	179.1	5426.1	12279	2.263	**2349**	3000	**78%**	4
	8462	7/08/2024	21/08/2024	14	15.3	30.5	183.9	5607.5	12834	2.289	**2595**	3000	**87%**	5
	8463	7/08/2024	4/09/2024	28	15.5	30.3	188.7	5717.4	12829	2.244	**3273**	3000	**109%**	5
COLUMNAS - CUARTO BOMBAS	8464	7/08/2024	14/08/2024	7	15.0	30.2	176.7	5336.8	12131	2.273	**2289**	3000	**76%**	6
	8465	7/08/2024	21/08/2024	14	15.5	30.1	188.7	5679.6	12769	2.248	**2805**	3000	**94%**	4
	8466	7/08/2024	4/09/2024	28	15.4	30.1	186.3	5606.6	12827	2.288	**3159**	3000	**105%**	2

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 4/09/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1319

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 11/09/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
BORDILLO ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 03	8467	13/08/2024	20/08/2024	7	15.0	30.3	176.7	5354.5	12241	2.286	**1918**	2500	**77%**	3
	8468	13/08/2024	27/08/2024	14	15.1	30.5	179.1	5461.9	12460	2.281	**2253**	2500	**90%**	5
	8469	13/08/2024	10/09/2024	28	15.3	30.2	183.9	5552.4	12567	2.263	**2808**	2500	**112%**	5
BORDILLO ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 02	8470	14/08/2024	21/08/2024	7	15.5	30.3	188.7	5717.4	12689	2.219	**2043**	2500	**82%**	5
	8471	14/08/2024	28/08/2024	14	15.1	30.6	179.1	5479.8	12481	2.278	**2300**	2500	**92%**	2
	8472	14/08/2024	11/09/2024	28	15.1	30.1	179.1	5390.3	12241	2.271	**2645**	2500	**106%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 11/09/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1348

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 23/09/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
BORDILLO ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01	8591	22/08/2024	29/08/2024	7	15.5	30.1	188.7	5679.6	12571	2.213	**2005**	2500	**80%**	6
	8592	22/08/2024	5/09/2024	14	15.2	30.4	181.5	5516.3	12465	2.260	**2285**	2500	**91%**	2
	8593	22/08/2024	19/09/2024	28	15.5	30.2	188.7	5698.5	12759	2.239	**2663**	2500	**107%**	2
COLUMNETAS - BLOQUE 04	8594	26/08/2024	2/09/2024	7	15.2	30.2	181.5	5480.0	12474	2.276	**2340**	3000	**78%**	2
	8595	26/08/2024	9/09/2024	14	15.3	30.6	183.9	5625.9	12650	2.249	**2712**	3000	**90%**	4
	8596	26/08/2024	23/09/2024	28	15.1	30.4	179.1	5444.0	12426	2.283	**3252**	3000	**108%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 23/09/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1348

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 25/09/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
BORDILLO ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01	8597	27/08/2024	3/09/2024	7	15.2	30.2	181.5	5480.0	12501	2.281	**2055**	2500	**82%**	2
	8598	27/08/2024	10/09/2024	14	15.0	30.1	176.7	5319.1	12217	2.297	**2150**	2500	**86%**	5
	8599	27/08/2024	24/09/2024	28	15.2	30.1	181.5	5461.9	12408	2.272	**2628**	2500	**105%**	5
ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 03	8600	28/08/2024	4/09/2024	7	15.5	30.5	188.7	5755.1	12748	2.215	**2090**	2500	**84%**	2
	8601	28/08/2024	11/09/2024	14	15.0	30.5	176.7	5389.8	12245	2.272	**2250**	2500	**90%**	2
	8602	28/08/2024	25/09/2024	28	15.3	30.4	183.9	5589.2	12596	2.254	**2685**	2500	**107%**	4

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 25/09/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1348

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 28/09/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
VIGAS AEREAS - CUARTO BOMBAS	8603	29/08/2024	5/09/2024	7	15.0	30.5	176.7	5389.8	12284	2.279	**2259**	3000	**75%**	5
	8604	29/08/2024	12/09/2024	14	15.4	30.2	186.3	5625.2	12684	2.255	**2589**	3000	**86%**	3
	8605	29/08/2024	26/09/2024	28	15.3	30.5	183.9	5607.5	12636	2.253	**3321**	3000	**111%**	5
ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 02	8606	31/08/2024	7/09/2024	7	15.3	30.0	183.9	5515.6	12607	2.286	**1930**	2500	**77%**	3
	8607	31/08/2024	14/09/2024	14	15.0	30.5	176.7	5389.8	12300	2.282	**2350**	2500	**94%**	4
	8608	31/08/2024	28/09/2024	28	15.4	30.3	186.3	5643.8	12528	2.220	**2658**	2500	**106%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 28/09/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1348

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 4/10/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
ANDEN PERIMETRAL - ZONA ENTRE BLOQUES 02-03	8609	3/09/2024	10/09/2024	7	15.5	30.5	188.7	5755.1	12940	2.248	**1798**	2500	**72%**	6
	8610	3/09/2024	17/09/2024	14	15.0	30.1	176.7	5319.1	12226	2.299	**2330**	2500	**93%**	5
	8611	3/09/2024	1/10/2024	28	15.1	30.3	179.1	5426.1	12289	2.265	**2915**	2500	**117%**	2
ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01- ODONTOLOGIA- VACUNACION	8612	6/09/2024	13/09/2024	7	15.0	30.5	176.7	5389.8	12282	2.279	**2093**	2500	**84%**	6
	8613	6/09/2024	20/09/2024	14	15.4	30.0	186.3	5588.0	12790	2.289	**2265**	2500	**91%**	4
	8614	6/09/2024	4/10/2024	28	15.2	30.6	181.5	5552.6	12501	2.251	**2665**	2500	**107%**	5

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 4/10/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1348

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 7/10/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01- ADMINISTRACION	8615	7/09/2024	14/09/2024	7	15.0	30.4	176.7	5372.1	12206	2.272	**1870**	2500	**75%**	5
	8616	7/09/2024	21/09/2024	14	15.1	30.6	179.1	5479.8	12446	2.271	**2280**	2500	**91%**	5
	8617	7/09/2024	5/10/2024	28	15.3	30.0	183.9	5515.6	12636	2.291	**2770**	2500	**111%**	6
ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01- ENFERMERIA- LABORATORIO	8618	9/09/2024	16/09/2024	7	15.2	30.5	181.5	5534.5	12509	2.260	**1920**	2500	**77%**	4
	8619	9/09/2024	23/09/2024	14	15.5	30.1	188.7	5679.6	12621	2.222	**2220**	2500	**89%**	3
	8620	9/09/2024	7/10/2024	28	15.3	30.3	183.9	5570.8	12672	2.275	**2820**	2500	**113%**	3

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 7/10/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

F.P.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NTC-673

CODIGO: LAB 09
VERSION: 3
VIGENCIA: 2019/03/01

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA 2023-045 - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

ORDEN DE TRABAJO N° 1348

SECTOR: MUNICIPIO DE LA UVITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERESADO: CEROM DE COLOMBIA - NIT. 820.003.010-2

FECHA: 12/10/2024

Estructuras	Muestra Nro.	Fecha de toma	Fecha de ensayo	Edad (días)	Díametro (cm)	Altura (cm)	Area (cm^{2})	Volumen (cm^{3})	Peso cilindro (g)	Peso Unitario (g/cm^{3})	Resistencia Encontrada (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	Resistencia Respecto al diseño (%)	Tipo de Falla
ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 04 - TANQUES	8621	13/09/2024	20/09/2024	7	15.2	30.6	181.5	5552.6	12702	2.288	**1913**	2500	**77%**	4
	8622	13/09/2024	27/09/2024	14	15.0	30.2	176.7	5336.8	12214	2.289	**2193**	2500	**88%**	5
	8623	13/09/2024	11/10/2024	28	15.3	30.5	183.9	5607.5	12669	2.259	**2673**	2500	**107%**	5
ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01-BLOQUE 02	8624	14/09/2024	21/09/2024	7	15.4	30.6	186.3	5699.7	12637	2.217	**2080**	2500	**83%**	2
	8625	14/09/2024	28/09/2024	14	15.5	30.3	188.7	5717.4	12921	2.260	**2165**	2500	**87%**	4
	8626	14/09/2024	12/10/2024	28	15.1	30.2	179.1	5408.2	12338	2.281	**2925**	2500	**117%**	2

Observaciones: Cilindros suministrados por el cliente.

Aprobó: ING. FABIAN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
Fecha: 12/10/2024

Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos.
Diseño Geotécnico, Estructural, Arquitectónico , Hidráulico y Eléctrico.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Tel. 3165127444 - Correo: fabianpaezvelandia@gmail.com

SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Ingeniería Sísmica de Edificaciones

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA # 2023-047 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cliente: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901738692-3
Ubicación: MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ
Fecha: 28/09/2024
Nota: CILINDROS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Elemento:	BORDILLO ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01	COLUMNETAS - BLOQUE 04	BORDILLO ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01	ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 03	VIGAS AEREAS - CUARTO BOMBAS	ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 02
Diseño: (psi)	2500	3000	2500	2500	3000	2500
Código:	1935	1936	1937	1938	1939	1940
Fundida:	22/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	31/08/2024
Días:	28	28	28	28	28	28
Falla:	19/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	28/09/2024
Diametro: (mm)	151.0	154.0	151.0	150.0	153.0	153.0
Altura: (mm)	301.0	301.0	305.0	300.0	305.0	303.0
Volumen: (cm^3)	5390.3	5606.6	5461.9	5301.4	5607.5	5570.8
Peso: (g)	12487	12788	12401	12298	12574	12551
Peso Unitario (g/cm^3)	2.32	2.28	2.27	2.32	2.24	2.25
Resistencia: (psi)	**2913**	**3244**	**2854**	**2678**	**3393**	**2635**
Cumplimiento: (%)	**117%**	**108%**	**114%**	**107%**	**113%**	**105%**

ING. ESP. JORGE ANDRÉS ROA ROMERO

SISMO ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Laboratorio de Suelos, Diseño Geotécnico, Estructural.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Carrera 13 A # 22-33

SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Ingeniería Sísmica de Edificaciones

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA # 2023-047 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cliente: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901738692-3
Ubicación: MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ
Fecha: 12/10/2024
Nota: CILINDROS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Elemento:	ANDEN PERIMETRAL - ZONA ENTRE BLOQUES 02-03	ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01-ODONTOLOGIA-VACUNACION	ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01- ADMINISTRACION	ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01- ENFERMERIA-LABORATORIO	ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 04 - TANQUES	'ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 01-BLOQUE 02
Diseño: (psi)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Código:	1941	1942	1943	1944	1945	1946
Fundida:	3/09/2024	6/09/2024	7/09/2024	9/09/2024	13/09/2024	14/09/2024
Días:	28	28	28	28	28	28
Falla:	1/10/2024	4/10/2024	5/10/2024	7/10/2024	11/10/2024	12/10/2024
Diametro: (mm)	151.0	150.0	153.0	150.0	155.0	152.0
Altura: (mm)	302.0	301.0	306.0	304.0	303.0	300.0
Volumen: (cm^3)	5408.2	5319.1	5625.9	5372.1	5717.4	5443.8
Peso: (g)	12525	12337	12929	12407	12648	12752
Peso Unitario (g/cm^3)	2.32	2.32	2.30	2.31	2.21	2.34
Resistencia: (psi)	**2865**	**2925**	**2890**	**2823**	**2778**	**2680**
Cumplimiento: (%)	**115%**	**117%**	**116%**	**113%**	**111%**	**107%**

Jorge Andres Roa Romero

ING. ESP. JORGE ANDRÉS ROA ROMERO

SISMO ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Laboratorio de Suelos, Diseño Geotécnico, Estructural.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Carrera 13 A # 22-33

SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Ingeniería Sísmica de Edificaciones

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA # 2023-047 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cliente: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901738692-3
Ubicación: MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ
Fecha: 25/08/2024
Nota: CILINDROS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Elemento:	VIGAS CIMENTACION - RAMPA ACCESO BLOQUE2	PLACA BASE - RAMPA ACCESO BLOQUE2	ZAPATAS - ACCESO AMBULANCIA	PLACA BASE - PLAZOLETA BLOQUE 01	VIGAS DE CIMENTACION - ACCESO AMBULANCIA	PLACA BASE - ACCESO BLOQUE 03
Diseño: (psi)	3000	2500	3000	2500	3000	2500
Código:	1872	1873	1874	1875	1876	1877
Fundida:	8/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	12/07/2024	28/07/2024
Días:	28	28	28	28	28	28
Falla:	5/08/2024	7/08/2024	7/08/2024	8/08/2024	9/08/2024	25/08/2024
Diametro: (mm)	151.0	154.0	151.0	155.0	154.0	151.0
Altura: (mm)	301.0	300.0	304.0	306.0	300.0	304.0
Volumen: (cm^3)	5390.3	5588.0	5444.0	5774.0	5588.0	5444.0
Peso: (g)	12502	12508	12435	12960	12928	12485
Peso Unitario (g/cm^3)	2.32	2.24	2.28	2.24	2.31	2.29
Resistencia: (psi)	**3438**	**2998**	**3570**	**2655**	**3156**	**2948**
Cumplimiento: (%)	**115%**	**120%**	**119%**	**106%**	**105%**	**118%**

Jorge Andres Roa Romero

ING. ESP. JORGE ANDRÉS ROA ROMERO

SISMO ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Laboratorio de Suelos, Diseño Geotécnico, Estructural.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Carrera 13 A # 22-33

SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Ingeniería Sísmica de Edificaciones

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA # 2023-047 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cliente: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901738692-3
Ubicación: MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ
Fecha: 11/09/2024
Nota: CILINDROS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Elemento:	PLACA BASE - BLOQUE 04	ZAPATAS - VC - CUARTO BOMBAS	COLUMNETAS - BLOQUE 04	COLUMNAS - CUARTO BOMBAS	BORDILLO ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 03	BORDILLO ANDEN PERIMETRAL - BLOQUE 02
Diseño: (psi)	2500	3000	3000	3000	2500	2500
Código:	1878	1879	1880	1881	1882	1883
Fundida:	1/08/2024	2/08/2024	7/08/2024	7/08/2024	13/08/2024	14/08/2024
Días:	28	28	28	28	28	28
Falla:	29/08/2024	30/08/2024	4/09/2024	4/09/2024	10/09/2024	11/09/2024
Diametro: (mm)	151.0	154.0	153.0	154.0	150.0	152.0
Altura: (mm)	301.0	302.0	306.0	305.0	302.0	304.0
Volumen: (cm^3)	5390.3	5625.2	5625.9	5681.1	5336.8	5516.3
Peso: (g)	12529	12810	12922	12800	12432	12806
Peso Unitario (g/cm^3)	2.32	2.28	2.30	2.25	2.33	2.32
Resistencia: (psi)	**2810**	**3534**	**3432**	**3597**	**2710**	**2988**
Cumplimiento: (%)	**112%**	**118%**	**114%**	**120%**	**108%**	**120%**

Jorge Andres Roa Romero

ING. ESP. JORGE ANDRÉS ROA ROMERO

SISMO ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Laboratorio de Suelos, Diseño Geotécnico, Estructural.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Carrera 13 A # 22-33

SISMOESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Ingeniería Sísmica de Edificaciones

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA # 2023-047 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

Cliente: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901738692-3
Ubicación: MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ
Fecha: 17/07/2024
Nota: CILINDROS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE


Elemento:	VIGAS CIMENTACION BLOQUE 04	COLUMNAS BLOQUE 04	COLUMNAS BLOQUE 04	COLUMNAS BLOQUE 04	VIGAS AEREAS Y PLACA MACIZA BLOQUE 04	----------
Diseño: (psi)	3000	3000	3000	3000	3000	----------
Código:	1802	1803	1804	1805	1806	----------
Fundida:	7/06/2024	8/06/2024	9/06/2024	10/06/2024	19/06/2024	----------
Días:	28	28	28	28	28	----------
Falla:	5/07/2024	6/07/2024	7/07/2024	8/07/2024	17/07/2024	----------
Diametro: (mm)	154.0	153.0	155.0	154.0	152.0	----------
Altura: (mm)	301.0	306.0	305.0	300.0	303.0	----------
Volumen: (cm^3)	5606.6	5625.9	5755.1	5588.0	5498.2	----------
Peso: (g)	12825	12833	12517	12577	12478	----------
Peso Unitario (g/cm^3)	2.29	2.28	2.17	2.25	2.27	----------
Resistencia: (psi)	**3435**	**3522**	**3428**	**3537**	**3156**	----------
Cumplimiento: (%)	**115%**	**117%**	**114%**	**118%**	**105%**	----------

Jorge Andres Roa Romero

ING. ESP. JORGE ANDRÉS ROA ROMERO

SISMO ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS
Laboratorio de Suelos, Diseño Geotécnico, Estructural.
Supervisión técnica, Interventoría, Gestión y Construcción de Proyectos
Carrera 13 A # 22-33


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**	**319 días**	**mié 16/08/23**	**mié 13/11/24**
2		**PRELIMINARES DE OBRA**	**12 días**	**mié 16/08/23**	**jue 31/08/23**
3		LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	5 días	mié 16/08/23	mar 22/08/23
4		DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	7 días	mié 23/08/23	jue 31/08/23
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAMINA	0 días	mar 22/08/23	mar 22/08/23
6		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	7 días	mié 23/08/23	jue 31/08/23
7		DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	5 días	mié 23/08/23	mar 29/08/23
8		**MOVIMEINTO DE TIERRAS**	**48 días**	**vie 1/09/23**	**mar 7/11/23**
9		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	14 días	jue 21/09/23	mar 10/10/23
10		EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	14 días	vie 1/09/23	mié 20/09/23
11		CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	6 días	vie 1/09/23	vie 8/09/23
12		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CONPLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	20 días	mié 11/10/23	mar 7/11/23
13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	19 días	mié 11/10/23	lun 6/11/23
14		**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**194 días**	**mié 11/10/23**	**mié 17/07/24**
15		SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	8 días	mié 11/10/23	vie 20/10/23
16		CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	15 días	mié 1/11/23	mar 21/11/23
17		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	15 días	mié 22/11/23	mar 12/12/23
18		MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 2.01MTS H 3,5 MTS	20 días	jue 20/06/24	mié 17/07/24
19		PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	8 días	vie 16/02/24	mar 27/02/24
20		COLUMNASENCONCRETO21MPa(3000PSI),ALTURAMAYORA3mtsFORM	15 días	mié 27/12/23	jue 25/01/24
21		VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	15 días	vie 26/01/24	jue 15/02/24
22		ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	8 días	mié 20/03/24	vie 29/03/24
23		CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21MPa-(3000PSI)	3 días	vie 26/01/24	mar 30/01/24
24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS	4 días	mié 28/02/24	lun 4/03/24
25		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa(3000PSI)RELACIÓN60C/40P	15 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23
26		PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	20 días	mié 29/11/23	mar 26/12/23
27		SUMINISTRO EI NSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000PSI)PARAPLACA DE TANQUE E=10CM	1 día	mié 28/02/24	mié 28/02/24
28		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	2 días	jue 29/02/24	vie 1/03/24
29		CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	2 días	jue 29/02/24	vie 1/03/24
30		**ACERO DE REFUERZO Y MALLAS**	**61 días**	**mié 29/11/23**	**vie 1/03/24**
31		MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 MD=6MM (INCLUYESUMINISTROFIJACIONEINSTALACION)	45 días	mié 29/11/23	jue 8/02/24
32		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	45 días	jue 21/12/23	vie 1/03/24
33		**ESTRUCTURA METÁLICA**	**45 días**	**lun 20/05/24**	**vie 19/07/24**
34		SUMINISTRO,TRANSPORTE,FABRICACION,ENSAMBLAJEYMONTAJEDE METALICA	45 días	lun 20/05/24	vie 19/07/24
35		SUMINISTROEINSTALACIÓNPERFILERIAMETALICAPARAESTRUCTURA DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	45 días	lun 20/05/24	vie 19/07/24
36		**CIELOS RASOS**	**0 días**	**mié 16/08/23**	**mié 16/08/23**
37		SUMINISTROEINSTALACIONDECIELORASORETICULARENPANELESEN INCLUYE PERFILERÍA EN ALUMINIO	0 días	mié 16/08/23	mié 16/08/23
38		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)	0 días	mié 16/08/23	mié 16/08/23
39		**MAMPOSTERIA**	**160 días**	**lun 4/03/24**	**vie 11/10/24**

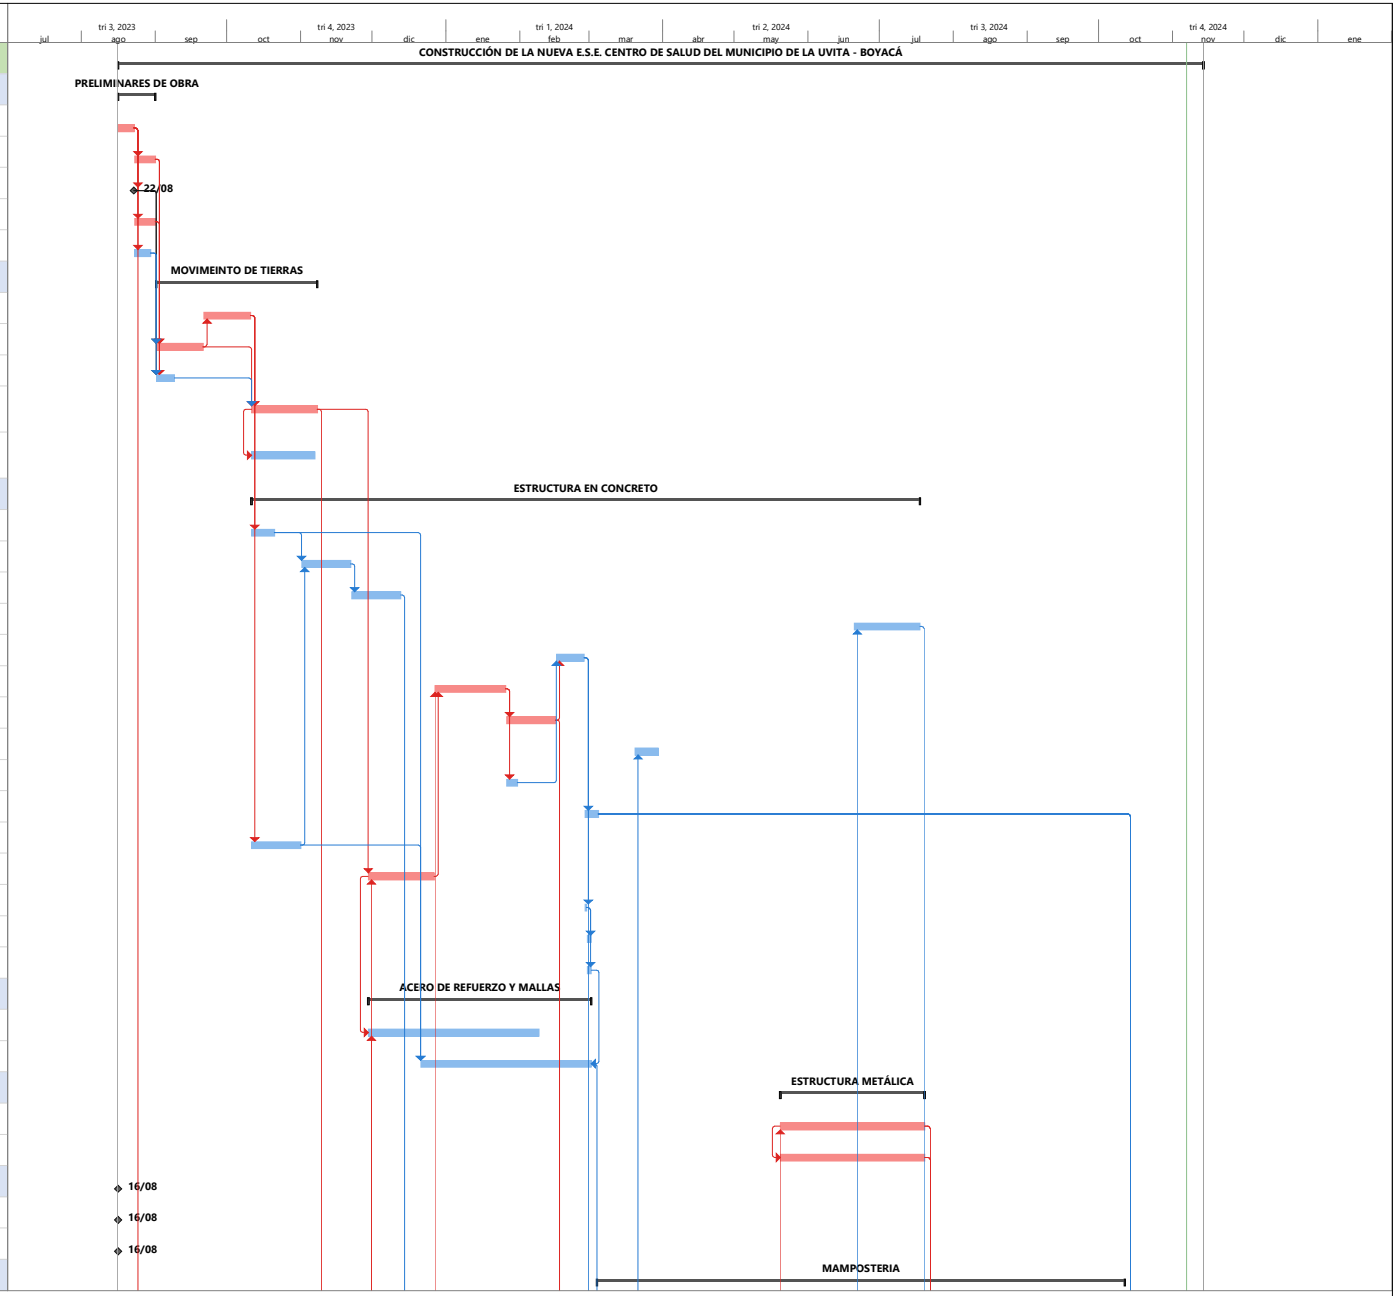

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
40		MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	12 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24
41		PAÑETE LISO MUROS 1:4	10 días	lun 1/04/24	vie 12/04/24
42		PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	2 días	jue 19/09/24	vie 20/09/24
43		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	15 días	lun 1/04/24	vie 19/04/24
44		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	15 días	lun 23/09/24	vie 11/10/24
45		SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROCEMENTO / MICROSTONE - O SIMILAR	0 días	vie 20/09/24	vie 20/09/24
46		**CUBIERTA**	**20 días**	**lun 22/07/24**	**vie 16/08/24**
47		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC CAL26TIPOSANDUCHE,CONPOLIURETANOEXPANDIDODEALTADENSID	20 días	lun 22/07/24	vie 16/08/24
48		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	15 días	lun 22/07/24	vie 9/08/24
49		**RECUBRIMIENTO Y ENCHAPES**	**8 días**	**mié 30/10/24**	**lun 11/11/24**
50		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA O LIMPIA20X20OSIMILAR(SOBRE MUROS ÁREA BASURAS, BAÑOS Y POCETAS)	8 días	jue 31/10/24	lun 11/11/24
51		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL PVC EKOWOD COLOR MADERA O SIMILAR	0 días	mié 30/10/24	mié 30/10/24
52		**PISOS**	**50 días**	**jue 5/09/24**	**mié 13/11/24**
53		PULIDA MECANICA SUPERFICIE EN CONCRETO (INCLUY ECORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	5 días	jue 5/09/24	mié 11/09/24
54		ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	5 días	jue 12/09/24	mié 18/09/24
55		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO EN ROLLO	2 días	lun 14/10/24	mar 15/10/24
56		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA 0.338*0.338 (DUROPISO) O SIMILAR	5 días	lun 14/10/24	vie 18/10/24
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM (COLOR)	10 días	lun 14/10/24	vie 25/10/24
58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM (BLANCO)	10 días	lun 14/10/24	vie 25/10/24
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES FORMATO 30*30 CM	2 días	lun 14/10/24	mar 15/10/24
60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA PREPULIDA PARA EXTERIORES 30X30 CM	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
61		SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN PVC	0 días	mar 15/10/24	mar 15/10/24
62		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	3 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24
63		**PINTURA**	**1 día**	**jue 5/09/24**	**jue 5/09/24**
64		ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
65		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
66		PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
67		**CARPINTERIA METALICA**	**2 días**	**mar 12/11/24**	**mié 13/11/24**
68		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA DOBLE NAVE APERSIANADA PARA SUBESTACION	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24
69		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 16INC.CHAPA Y ACCESORIOS	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24
70		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 16 - (BARRA ANTIPÁNICO)	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24
71		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DOBLE EN TUBULAR METALICO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
72		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA CERRAMIENTO TUBO ESTRUCTURAL CALIBRE SEGÚN DISEÑO	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
73		**CARPINTTERIA ALUMINIO**	**2 días**	**mar 12/11/24**	**mié 13/11/24**
74		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
75		SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPUERTAENMARCOALUMINIOYVIDRIOTE HOJA	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
76		SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPUERTAVENTANAENMARCOALUMINIOY	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
77		**CARPINTERIA EN MADERA**	**0 días**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
78		SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPUERTAENTANBORADAENMADERABAT MARCO INCLUYE PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE Y MANIJA DE SEGURIDAD (UNA HOJA)	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24

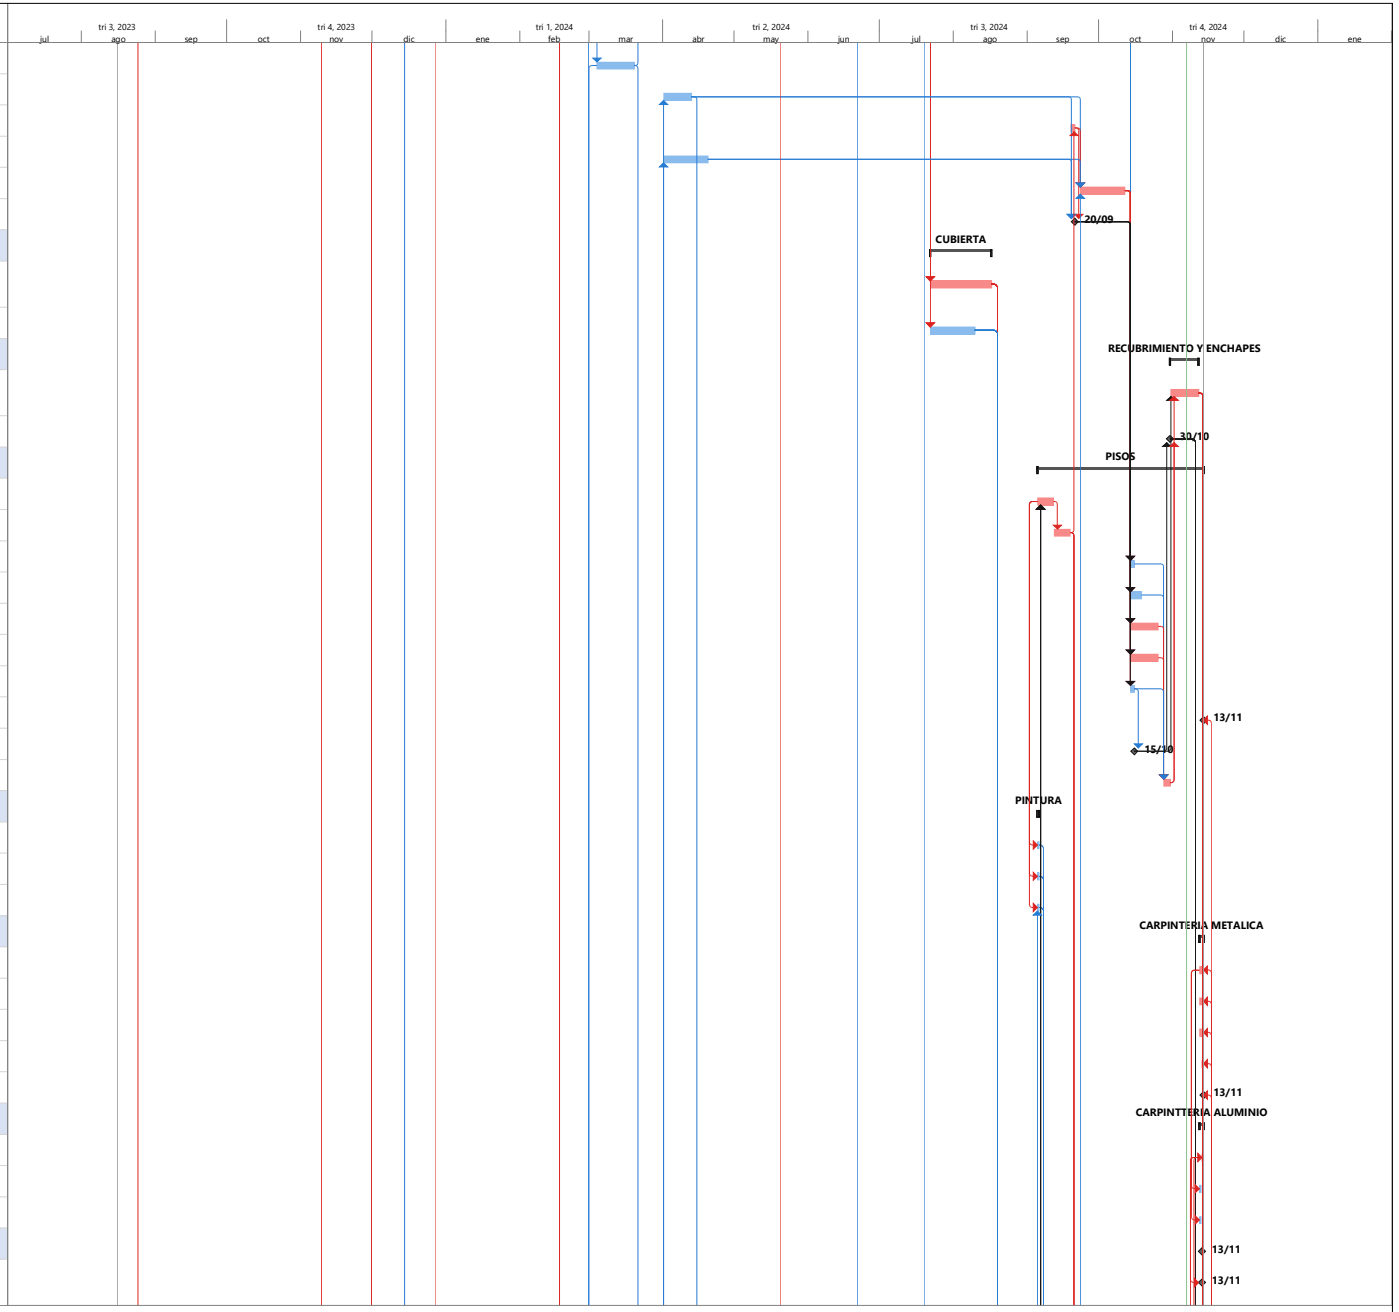

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
79		SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPUERTAENTAMBORADAENMADERABAT MARCO INCLUYE PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE Y MANIJA DE SEGURIDAD (DOBLE HOJA)	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
80		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGUES)**	**63 días**	**lun 19/08/24**	**mié 13/11/24**
81		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2 días	lun 19/08/24	mar 20/08/24
82		RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
83		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
84		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
85		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
86		TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
87		SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
88		SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=3" x 2"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
89		SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
90		SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
91		SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
92		SUMINISTRO EI NSTALACION DE ACCESORIO CODO90° 1/4CXC SANITARIO EN PVC4"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
93		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO90° 1/4CXC SANITARIO EN PVC2"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
94		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4CXC SANITARIO EN PVC4"X2"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
95		SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D=2"x2"x2"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
96		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4"	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
97		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRENAJE 4"	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
98		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRENAJE 6"	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
99		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DRENAJE 2"	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
100		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA ADRIATICA CON FLUXOMETRO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
101		SUMINISTRO EI NSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJE T(INCLUYE GRIFERIA SENSOR)	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
102		SUMINISTRO E INSTALACIÓN D ECOMBO SANITARIO AQUAPRO .INCLUYE LAVAMANOS Y ACCESORIOS	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
103		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30"	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
104		SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
105		SUMINISTROEINSTALACIÓNDESECADORELÉCTRICOPARAMANOS,AUT ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
106		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
107		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (AGUAS LLUVIAS DESAGUES)**	**4 días**	**mié 21/08/24**	**lun 26/08/24**
108		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24
109		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24
110		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24
111		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24
112		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24
113		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6"	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24
114		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24
115		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24
116		CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=6"	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
117		CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=4"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
118		CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24

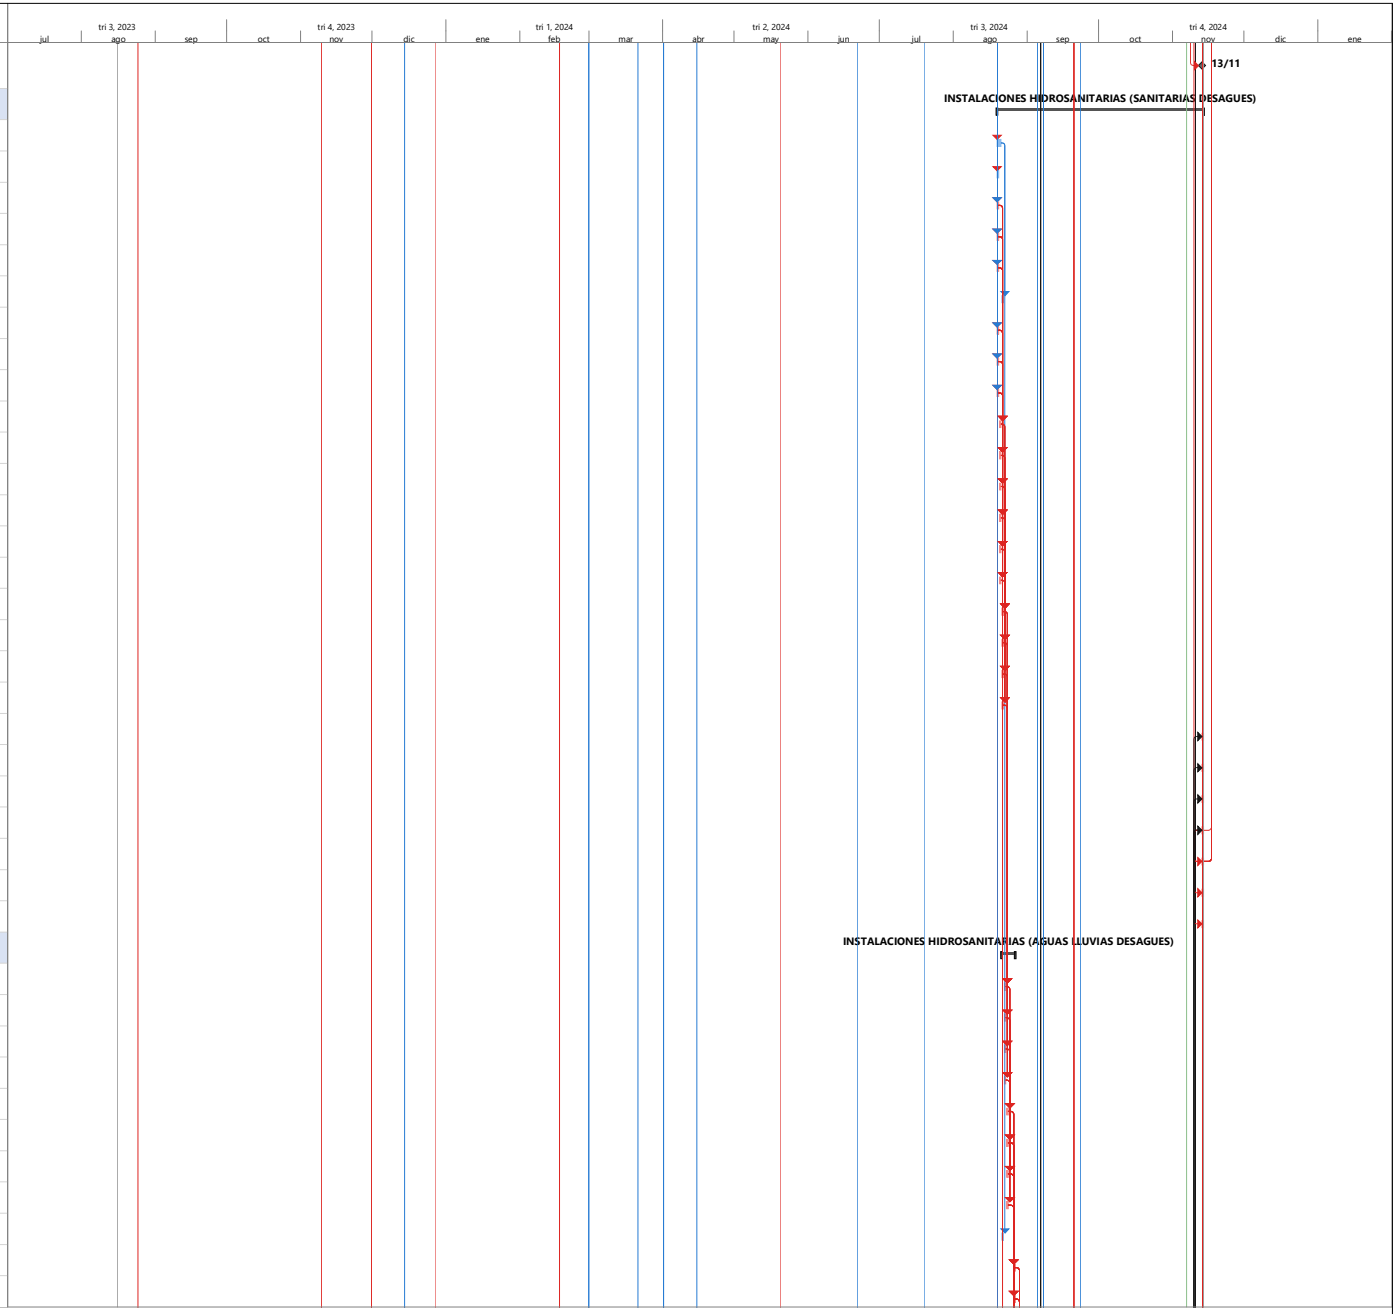

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
119		CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=6"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
120		CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
121		UNION PVC MECANICA D = 8"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
122		UNION PVC MECANICA D = 6"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
123		UNION PVC MECANICA D = 4"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
124		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)**	**2 días**	**mar 27/08/24**	**mié 28/08/24**
125		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 E.L	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
126		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
127		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
128		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 9	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
129		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
130		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
131		SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/4"	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
132		SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1/2"	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
133		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
134		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=4"	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
135		CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1/2"	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
136		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACÓMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
137		CÓNEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE CAJA Y MEDIDÓR	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
138		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (OBRA CIVIL HIDROSANITARIAS)**	**1 día**	**jue 29/08/24**	**jue 29/08/24**
139		CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	1 día	jue 29/08/24	jue 29/08/24
140		**RED CONTRAINCENDIOS (CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIOS)**	**0 días**	**lun 11/11/24**	**lun 11/11/24**
141		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
142		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
143		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
144		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (TEE Y CODOS) HD RANURADOS DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
145		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
146		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (UNIÓN Y CODOS) HD ROSCADOS DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
147		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 6"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
148		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
149		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
150		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO R.W. P.D. DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
151		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
152		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
153		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
154		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
155		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ANTIVIBRATORIA DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
156		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ANTIBORDICE DE 4" ACERO AL CARBÓN	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
157		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24

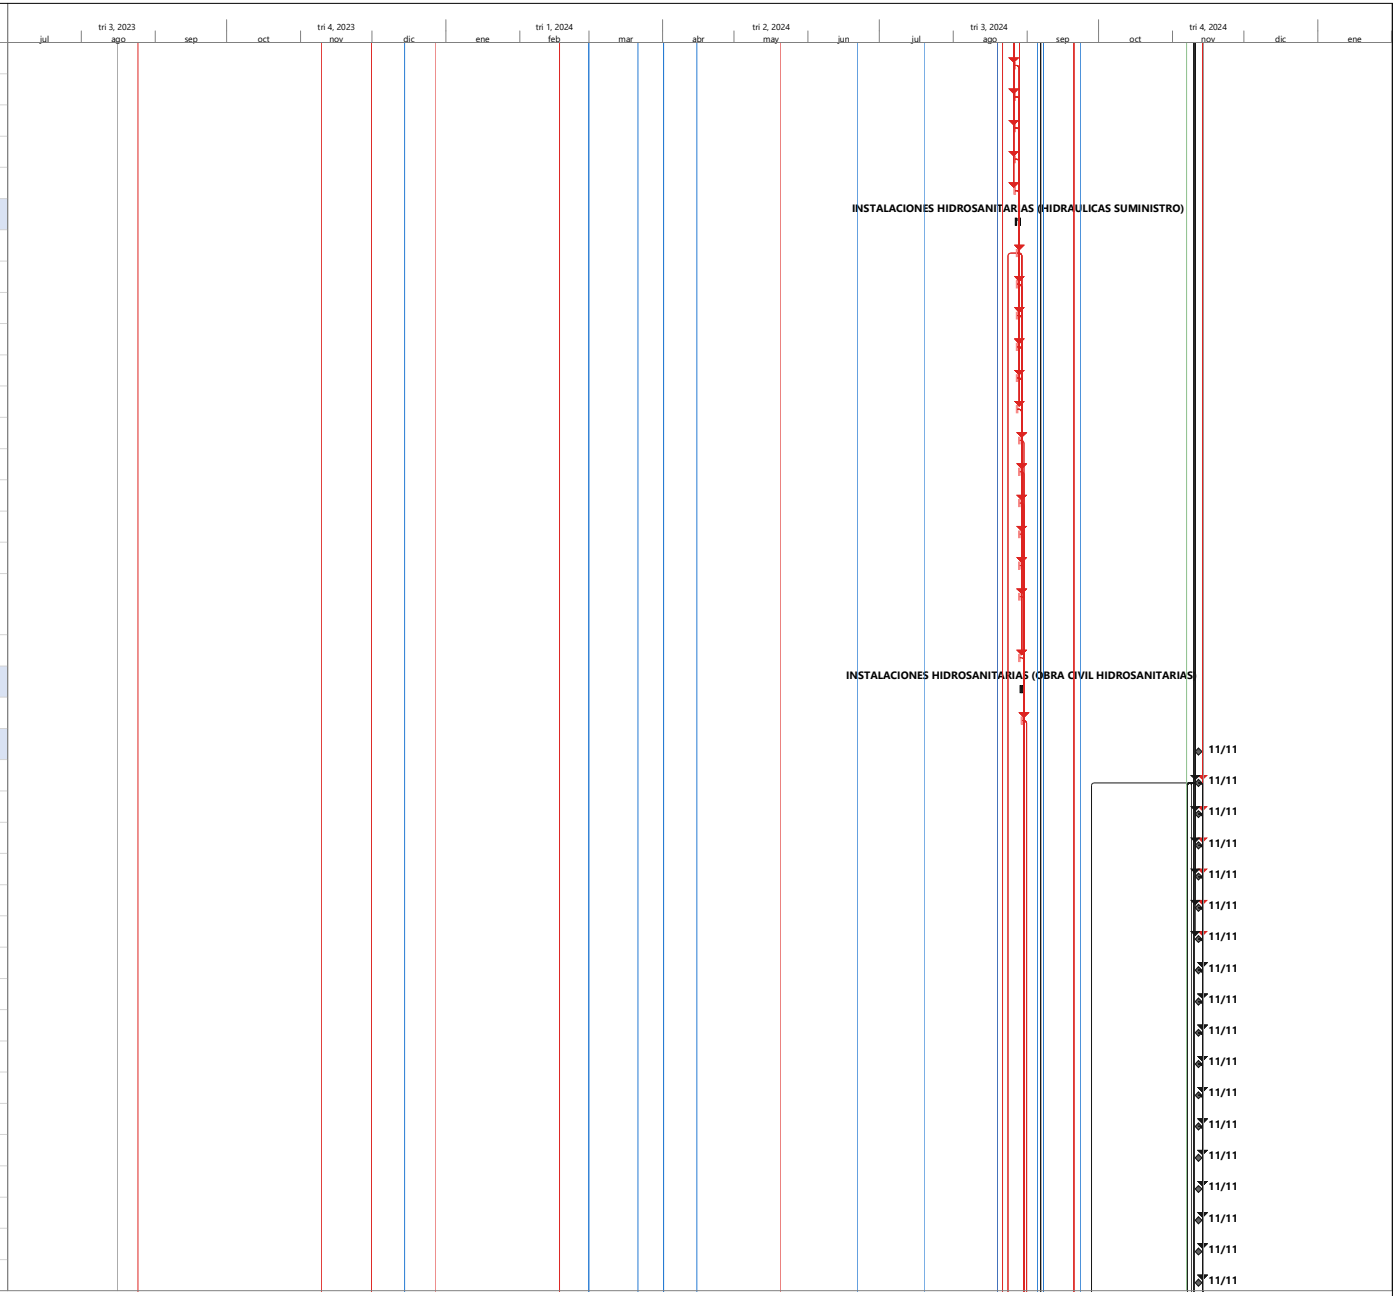

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
158		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
159		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
160		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
161		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBAS 2 X 2.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
162		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO DE 2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
163		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH SUPERVISOR	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
164		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO ANTIVIBRATORIO	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
165		**RED CONTRAINCENDIOS**	**32 días**	**mar 1/10/24**	**mié 13/11/24**
166		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C900 DE 4"	5 días	mar 1/10/24	lun 7/10/24
167		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
168		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 2.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
169		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
170		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 1.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
171		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 ROSCADA DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
172		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 ROSCADA DE 1"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
173		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC C900 DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
174		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE MATERIAL DE PVC A ACERO DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
175		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE VELOCIDAD DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
176		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
177		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 2.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
178		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
179		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 1.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
180		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
181		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 2.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
182		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
183		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 1.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
184		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
185		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
186		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 1.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
187		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
188		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE ACERO ROSCADOS DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
189		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE ACERO ROSCADOS DE 1"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
190		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2"	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
191		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE (UL/FM) DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
192		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
193		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADORES PENDENT TEMP. ESTANDAR K=5.6	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
194		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA ROCIADORES	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
195		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 10lb	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
196		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
197		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 2.1/2"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24

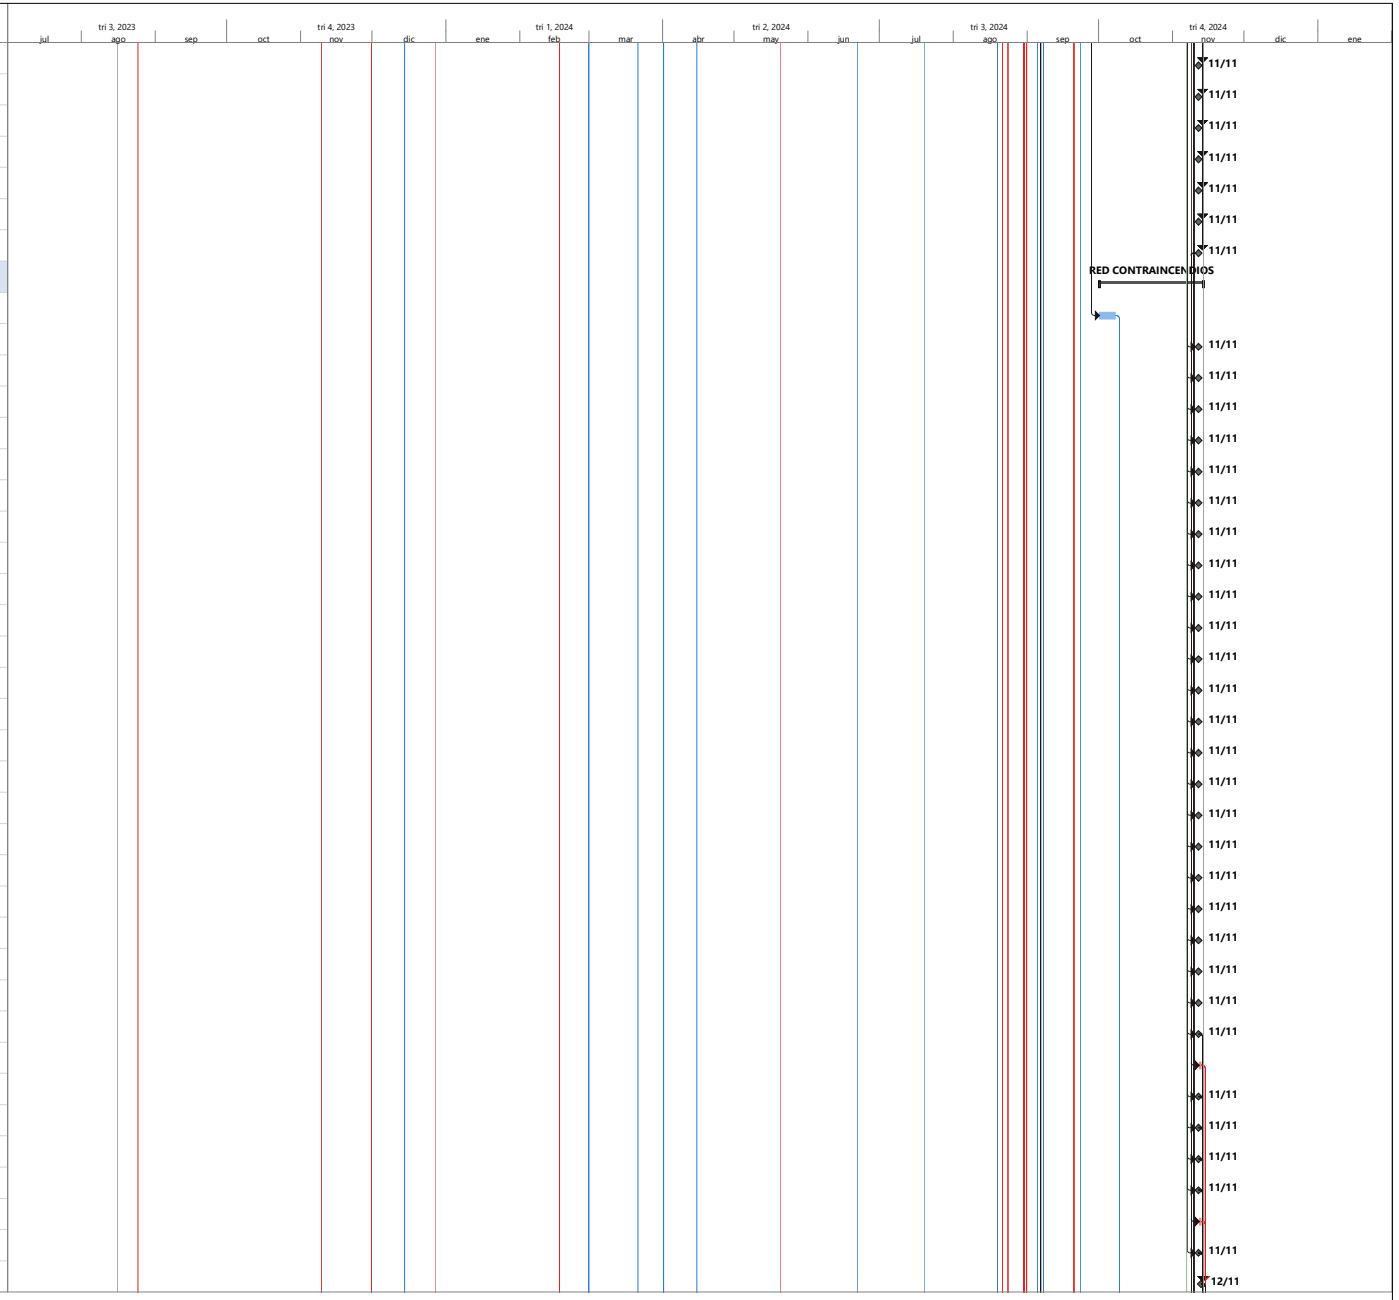

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
198		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 2"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
199		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1.1/2"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
200		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1.1/4"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
201		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
202		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL UL/FM DE 3"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
203		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL UL/FM DE 3"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
204		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL UL/FM DE 2.1/2"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
205		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL UL/FM DE 2"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
206		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE II	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
207		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
208		SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
209		SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON ESTROBO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
210		SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR MANUAL	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
211		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Civil de Media Tensión)**	**1 día**	**mar 12/11/24**	**mar 12/11/24**
212		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 6X6" PVC TDP ANDEN EN CONCRETO	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
213		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DERIVACION SUBTERRANEA EN CONTRUCCION TANGENCIAL PARA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
214		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION PARA RED DE MEDIA TENSION TIPO VEHICULAR (SUJETO A CAMBIO SEGÚN PROYECTO APROBADO)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
215		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA RED DE MEDIA TENSION (SUJETO A CAMBIO SEGÚN PROYECTO APROBADO)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
216		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Eléctrica de Media Tensión)**	**1 día**	**mar 12/11/24**	**mar 12/11/24**
217		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (CARCAMO) 5CMX30CM	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
218		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 120MM2 AL XLPE 15KV (*ESTIMACION SUJETA A CAMBIO SEGÚN PROYECTO SERIE 3 APROBADO)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
219		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR PARA CABLE 120MM AL 15KV (JUEGO X 3 UNIDADES)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
220		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES DPS 12KV, 10KA (JUEGO X 3 UNIDADES)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
221		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Civil En Baja Tensión)**	**1 día**	**jue 29/08/24**	**jue 29/08/24**
222		CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	1 día	jue 29/08/24	jue 29/08/24
223		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Canalizaciones)**	**2 días**	**vie 30/08/24**	**lun 2/09/24**
224		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+1X1") PVC	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
225		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (2X1") / (1X1")PVC	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
226		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+3X1") PVC	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
227		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+3X1"+1X3/4") PVC	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
228		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+4X1"+1X3/4") PVC	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
229		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1 1/4")PVC	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
230		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X 1 1/4"+2X1") PVC	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
231		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1 1/4"+5X1")PVC	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
232		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1"+1 1/4")PVC	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
233		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X2"IMC)	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
234		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Acometidas Electricas En Baja Tensión)**	**1 día**	**mar 3/09/24**	**mar 3/09/24**
235		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL PLANTA-GM.TGAG(3X2+1X2+1X8T) CU LSHF FR POR CARCAMO	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24

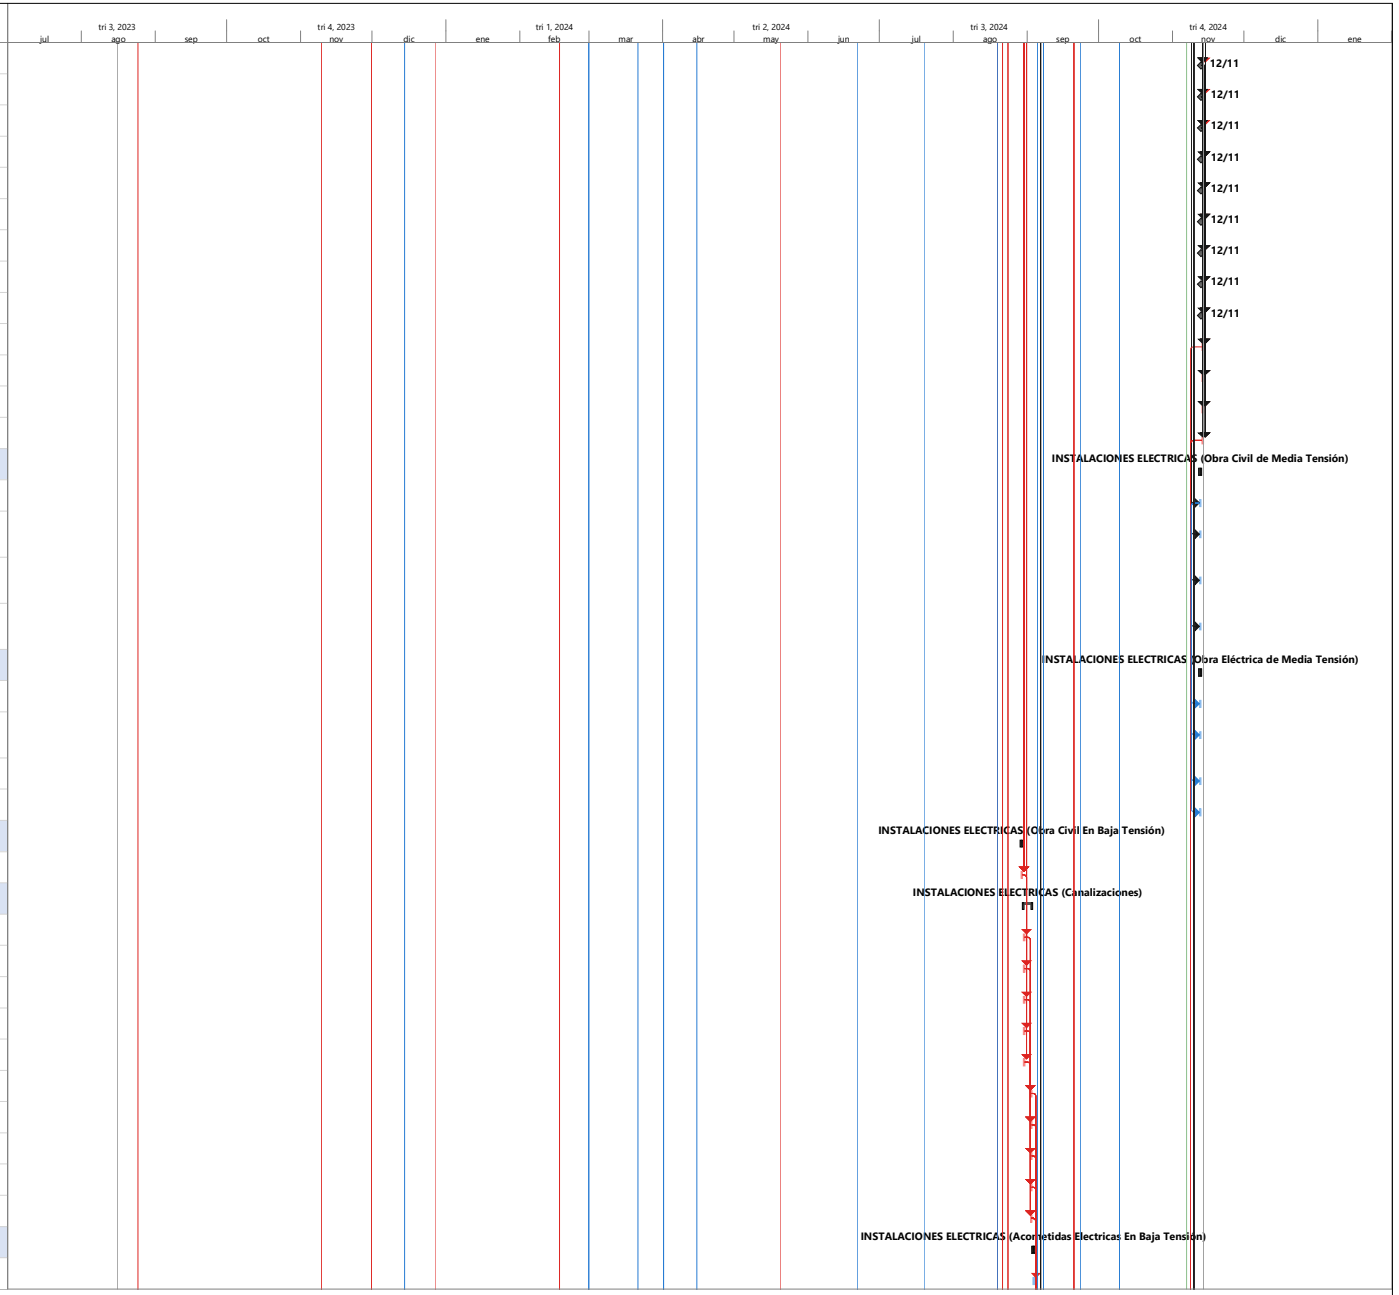

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
236		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRAFO-GM.TGA/GM.TGA-TGA(3X2/0+1X2/0+1X6T) CU LSHF FR POR CARCAMO	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
237		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRANSF.TGAESC-TGAESC/TGAG-TRANSF.TGAESC/GA-TRANSF.TGAESC (3X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR, POR CARCAMO	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
238		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRANSF.TGAEQ-TGAEQ/TGAG-TRANSF.TGAEQ/TGA-TRANSF.TGAEQ (3X4+1X4+1X8T) CU LSHF FR, POR CARCAMO	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
239		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGA-TN.1/TGA-TN.2/TGAEQ-PTALL/TGAEQ-T.BMB/TGAESC-TEC (3X8+1X8+1X10T) CU LSHF FR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
240		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGA-T.SM (1X10+1X10+1X10T) CU LSHF FR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
241		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAEQ-TR (2X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
242		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAEQ-T.SE (1X10+1X10+1X10T) 1X3/4"EMT CU LSHF FR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
243		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAESC-TEV (1X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
244		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Tableros De Distribución Final En Baja Tensión)**	**1 día**	**mar 3/09/24**	**mar 3/09/24**
245		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER (T.BMB)-INCLUYE BREAKER 3X20A /(PTALL)-INCLUYE BREAKER 3X40A	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
246		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION TCIL, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
247		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS 1F (T.EV) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 4 /TABLERO TIPO ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS 1F (TSM) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 3	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
248		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS 1F (T.R) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 5	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
249		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS 1F (T.SE) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 2	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
250		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 24 CIRCUITOS 3F, 5H (TEC) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 11	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
251		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 18 CIRCUITOS 3F, 5H (TN1) BREKAERS ENCHUFABLES 1X20: 8. BREAKERS ENCHUFABLES 2X20: 1	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
252		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 18 CIRCUITOS 3F, 5H (TN2) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 13	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
253		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA SEMI-DIRECTA EN BAJA TENSION TGA NORMALIZADA EBSA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
254		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL (TGA) DE ACOMETIDAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
255		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS GENERADOR (TGAG) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
256		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS SISTEMA DE EQUIPOS (TGAEQ) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
257		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS SISTEMA ESCENCIAL (TGAESC) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
258		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SISTEMA ESCENCIAL (TRANFS.ESC) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
259		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SISTEMA EQUIPOS (TRANFS.EQ) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
260		SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE MEDIDA EN BT NORMA ET914-AE319	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
261		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGA, SEGÚN ET908-AE311	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
262		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS GENERADOR TGAG	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
263		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL SISTEMA DE EQUIPOS TGAEQ	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
264		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL SISTEMA ESCENCIAL TGAESC	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
265		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 50A-USO INTERIOR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
266		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 70A-USO INTERIOR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
267		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Iluminacion Zonas Verdes, Fachadas Y Senderos)**	**0 días**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
268		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR JETTA 20W	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
269		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROL LED OPERA 80W	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
270		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR JETTA 30W	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24

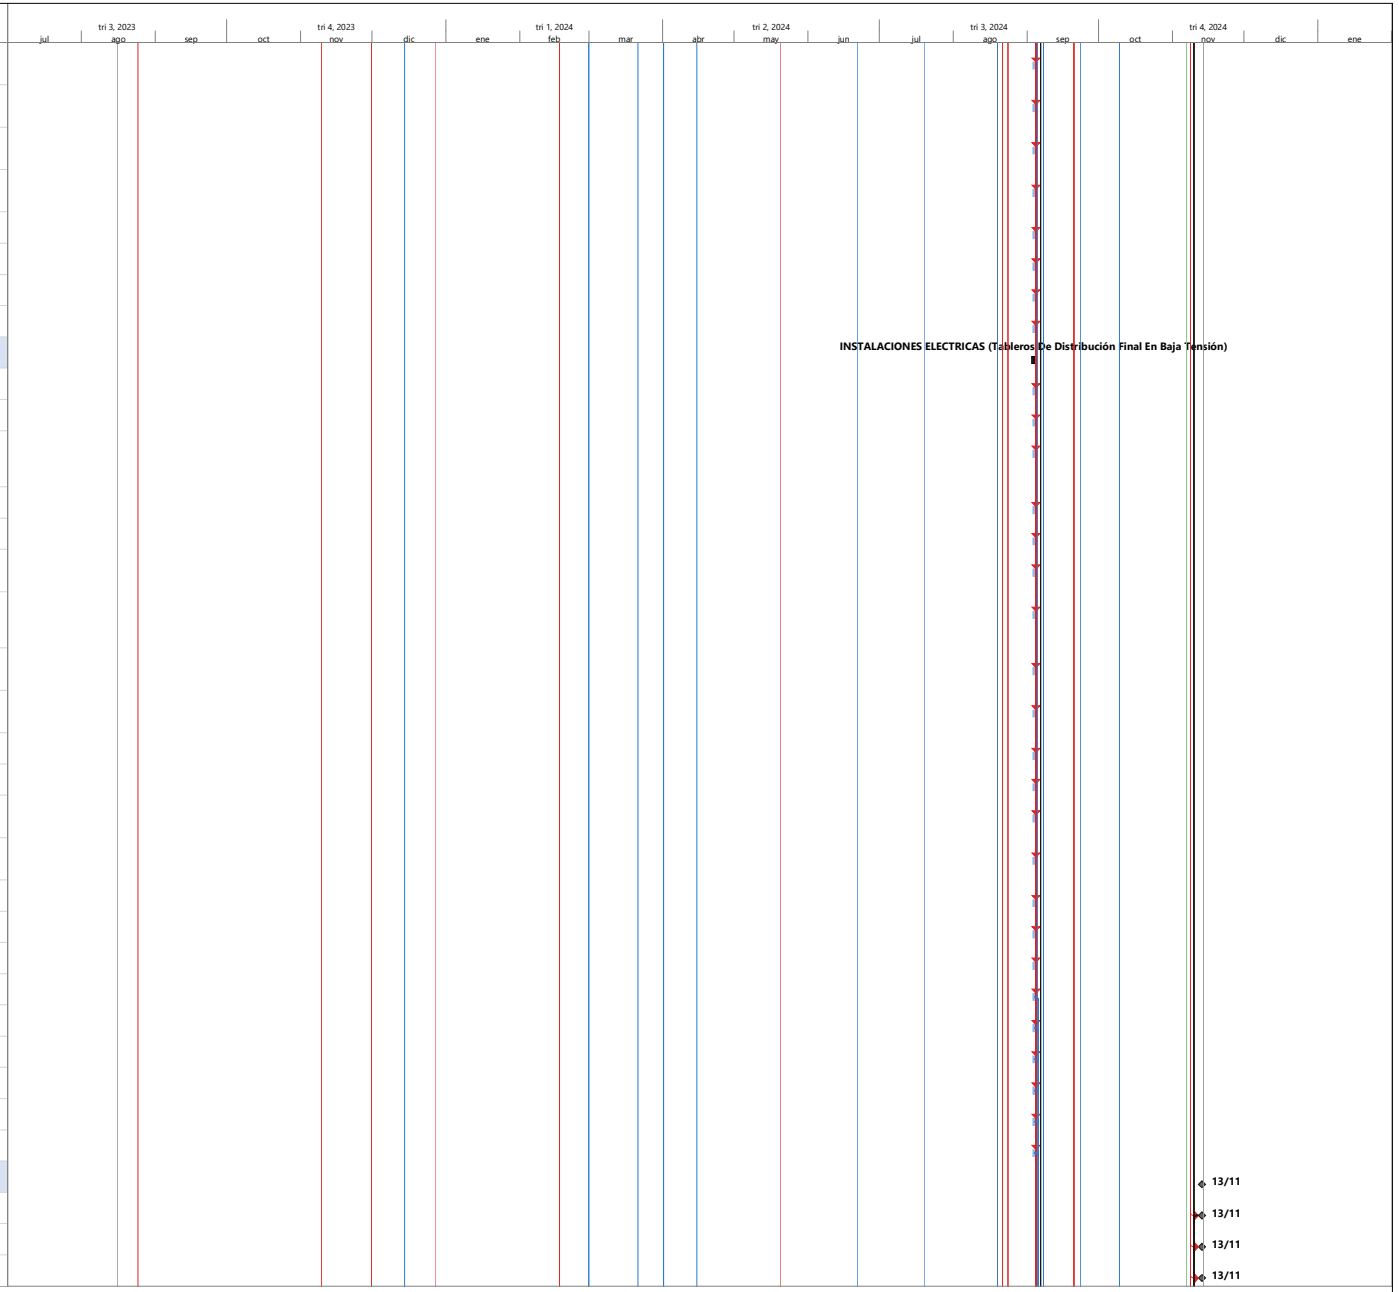

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
271		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ALUMBRADO EXTERIOR 3(1X10+1X10)+10T CU THHN	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
272		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION ALUMBRADO EXTERIOR TUBERÍA 1 1/2" PVC	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
273		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Interruptores para iluminación)**	**1 día**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
274		SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR SENCILLO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
275		SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR DOBLE	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
276		SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR TRIPLE	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
277		SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-200 LEVITON O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
278		SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR PIR 360 ODCOS L1W LEVITON O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
279		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W SYLVANIA O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
280		SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT LED PANEL SQ 45W SYLVANIA P37459 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
281		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED SYLVANIA 15W JUPITER SYLVANIA P27931 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
282		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL RD SYLVANIA P24628 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
283		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL SQ 18W SYLVANIA P24975 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
284		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA ECO KIT 7W SYLVANIA P27868 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
285		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA (P33718) SYLVANIA O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
286		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 50W SYLVANIA P26728 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
287		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED MINI CONTINUUM 40W SYLVANIA P28318 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
288		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W SYLVANIA P37562 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
289		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 12W P27479 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
290		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 30W P26449 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
291		SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMERGENCIA P24023 18W O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
292		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED DECO PISO P26960 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
293		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Tomacorrientes)**	**1 día**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
294		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA LUMINEX FUTURA 686533 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
295		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R, GFCI CON LED INDICADOR LUMINEX FUTURA 686535 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
296		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA LUMINEX FUTURA 686538 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
297		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
298		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
299		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F GFCI CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
300		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE BIFASICO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
301		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA CON TAPA TIPO INTEMPERIE	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
302		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Salidas De Alumbrado Y Tomacorrientes)**	**51 días**	**mar 3/09/24**	**mié 13/11/24**
303		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (SISTEMA NORMAL-EMERGENCIA) 5CMX15CM	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
304		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (SISTEMA REGULADO Y NORMAL) 5CMX10CM	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
305		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTACABLES EN (2X12+1X12+12T) CU LSHF FR CT-SISTEMA CRITICO Y NORMAL	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
306		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTACABLES EN (2X12+1X12+12TA) CU LSHF FR CT-SISTEMA REGULADO	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
307		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W, TUBERÍA 3/4" EMT, NO INCLUYE LUMINARIA, CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	mié 4/09/24	mié 4/09/24

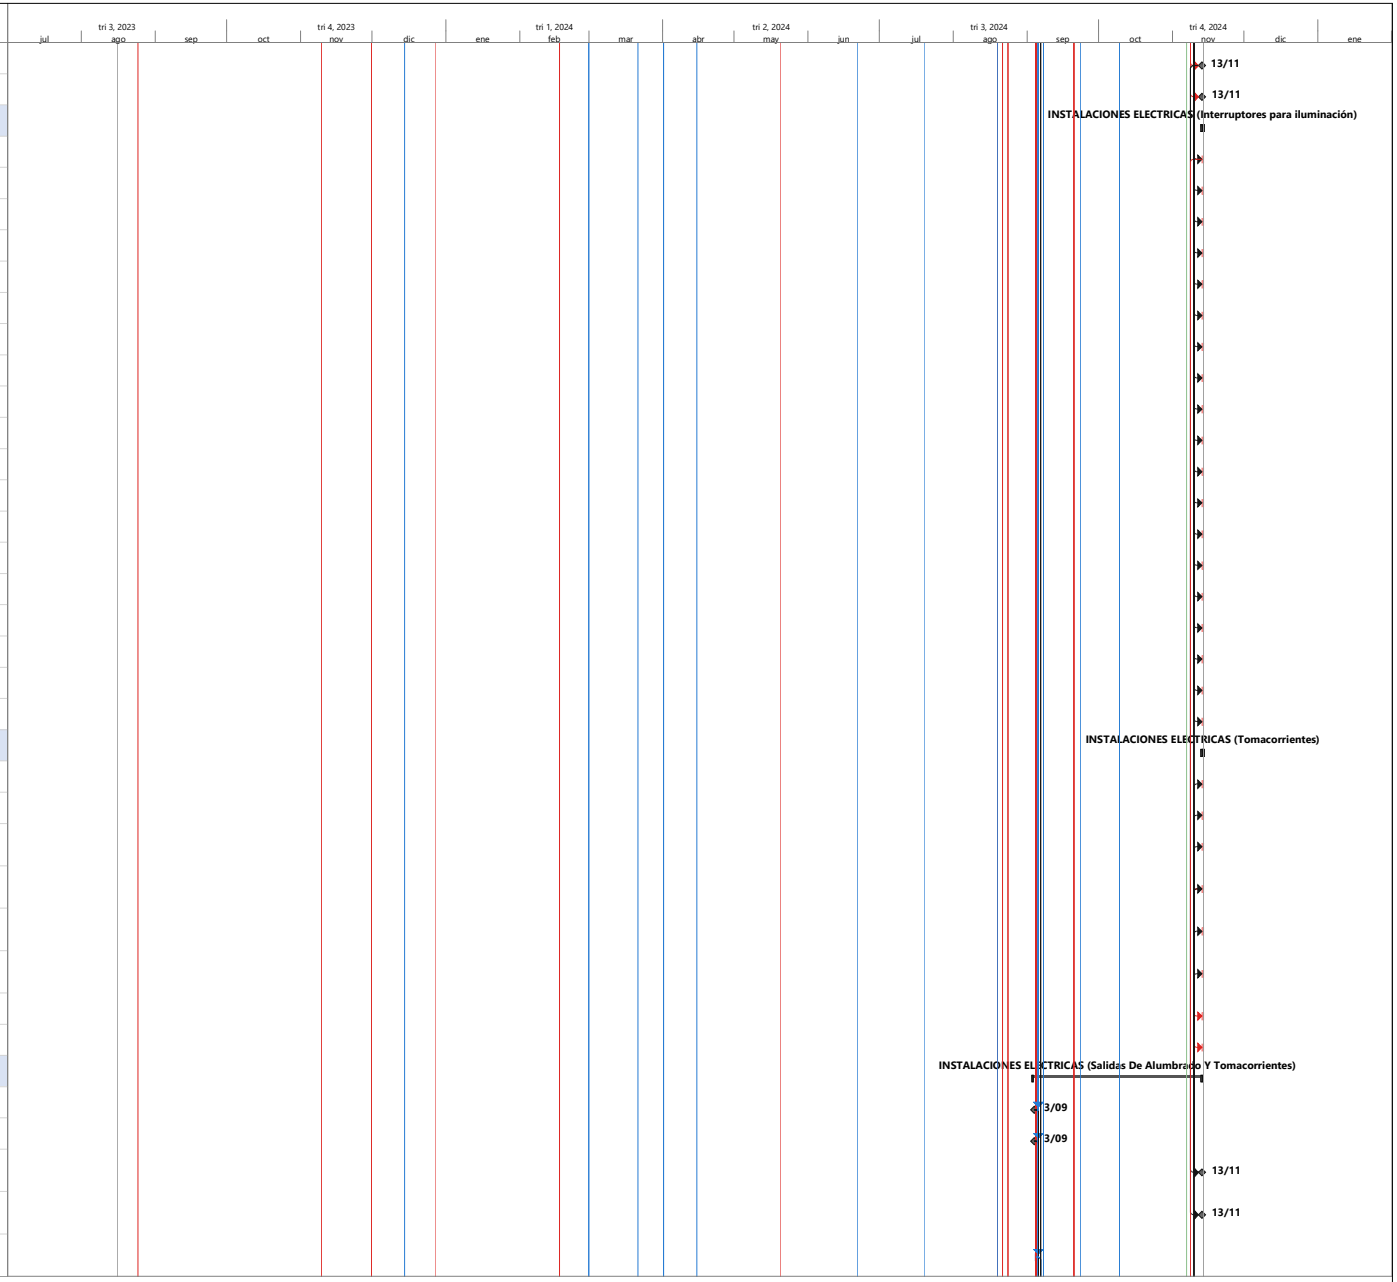

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
308		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE TUBERÍA 3/4" EMT/SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-200, TUBERIA 3/4"PVC NO INCLUYE SENSOR, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN/SENSOR PIR 360 ODCOS	1 día	mié 4/09/24	mié 4/09/24
309		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F POLO A TIERRA, NO INCLUYE TOMACORRIENTE DE COLOR BLANCO ROJO Y NARANJA INCLUYE TUBERIA 3/4" EMT, CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
310		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA KIT LED PANEL SQ 45W/ BALA LED 15W JUPITER/ LUMINARIA LED PANEL RD/ LUMINARIA LED PANEL SQ 18W / BALA ECO KIT 7W/ LUMINARIA LED EMERGENCIA (P33718), TUBERÍA 3/4" PVCSCH40, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CAB	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
311		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA REFLECTOR LED JETTA 50W-LUMINARIA LED MINI CONTINUM 40W, TUBERÍA 3/4" PVC, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
312		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, TUBERÍA 3/4" PVC NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
313		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, TUBERÍA 3/4" PVC NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE CABLEADO EN 3X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
314		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 12W P27479, TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R/ TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F POLO A TIERRA MONTAJE EN PISO / TOMACORRIENTE DOBLE1F 5-20R/ TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R / SECAMANOS TUBERÍA 3/4" PVC/	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
315		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SECAMANOS TUBERÍA 3/4"-UNIDAD TIPO MINI SPLIT 3/4 PVC , INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
316		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 1F CON POLO A TIERRA AISLADA COLOR NARANJA y rojo, TUBERÍA 3/4"PVC, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T+12TA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
317		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F / + 1F POLO A TIERRA MONTAJE EN CANALETA, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
318		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA CALIBRE 22 EN LAMINA COLD ROLLED 4X12 CON DIVISIÓN (INCLUYE ACCESORIOS Y TROQUELES)	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
319		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 1F -TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R- TOMACORRIENTE DOBLE 1F CON POLO A TIERRA AISLADA COLOR NARANJA, TUBERÍA 3/4"PVC SCH40, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CON	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
320		**INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA PUESTA A TIERRA)**	**1 día**	**mar 3/09/24**	**mié 4/09/24**
321		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLAJE Y CABLEADO PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN INCLUYE ACCESORIOS COPPERWELD DE 5/8" X 8'(2,44M) SOLDADURA Y CABLE Nº 2/0 AWG DESNUDO	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
322		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN PLATINA DE COBRE (50X5X300 MM) DE LARGO CON 2 AISLADORES DE FIBRA TIPO BARRIL PARA SUBESTACION	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
323		MEDICIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA POST CONSTRUCCION	0 días	mié 4/09/24	mié 4/09/24
324		**INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS)**	**1 día**	**mar 3/09/24**	**mié 4/09/24**
325		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA AL H=0.6M, 5/8"	0 días	mié 4/09/24	mié 4/09/24
326		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD Ø 5/8" X 2,4 ML	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
327		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" PARA BAJANTE (DESDE CUBIERTA)	1 día	mié 4/09/24	mié 4/09/24
328		SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM (CUBIERTA) Y VARILLAJE COPPERWELD 2,4M	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
329		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS DE CONEXIÓN 8 MM A JUNTA DE DILATACION - PUNTA CAPTADORA - ALAMBRON - BAJANTE	0 días	mié 4/09/24	mié 4/09/24
330		**INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS**	**1 día**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
331		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MULTITOMAS VERTICALES Y CLAVIJA DE SEGURIDAD L5-30 PARA GABINETE RACK DE 19"	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
332		SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS, CAT 6A BLINDADO+24 JACKS RJ45 CAT6A PARA CABLEADO HORIZONTAL.	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
333		SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45 CAT 6AX3 ADMINISTRACIÓN EN RACK Y PUESTOS DE TRABAJO	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
334		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CATEGORÍA 6A LIBRE DE HALOGENOS	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
335		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA RJ45 DOBLE PARA VOZ Y DATOS. INCLUYE FACEPLATE SENCILLO, JACK RJ45 CAT 6A	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
336		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA RJ45 SENCILLA PARA DATOS.INCLUYE FACE PLATE SENCILLO, JACK RJ45 CAT 6A	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24

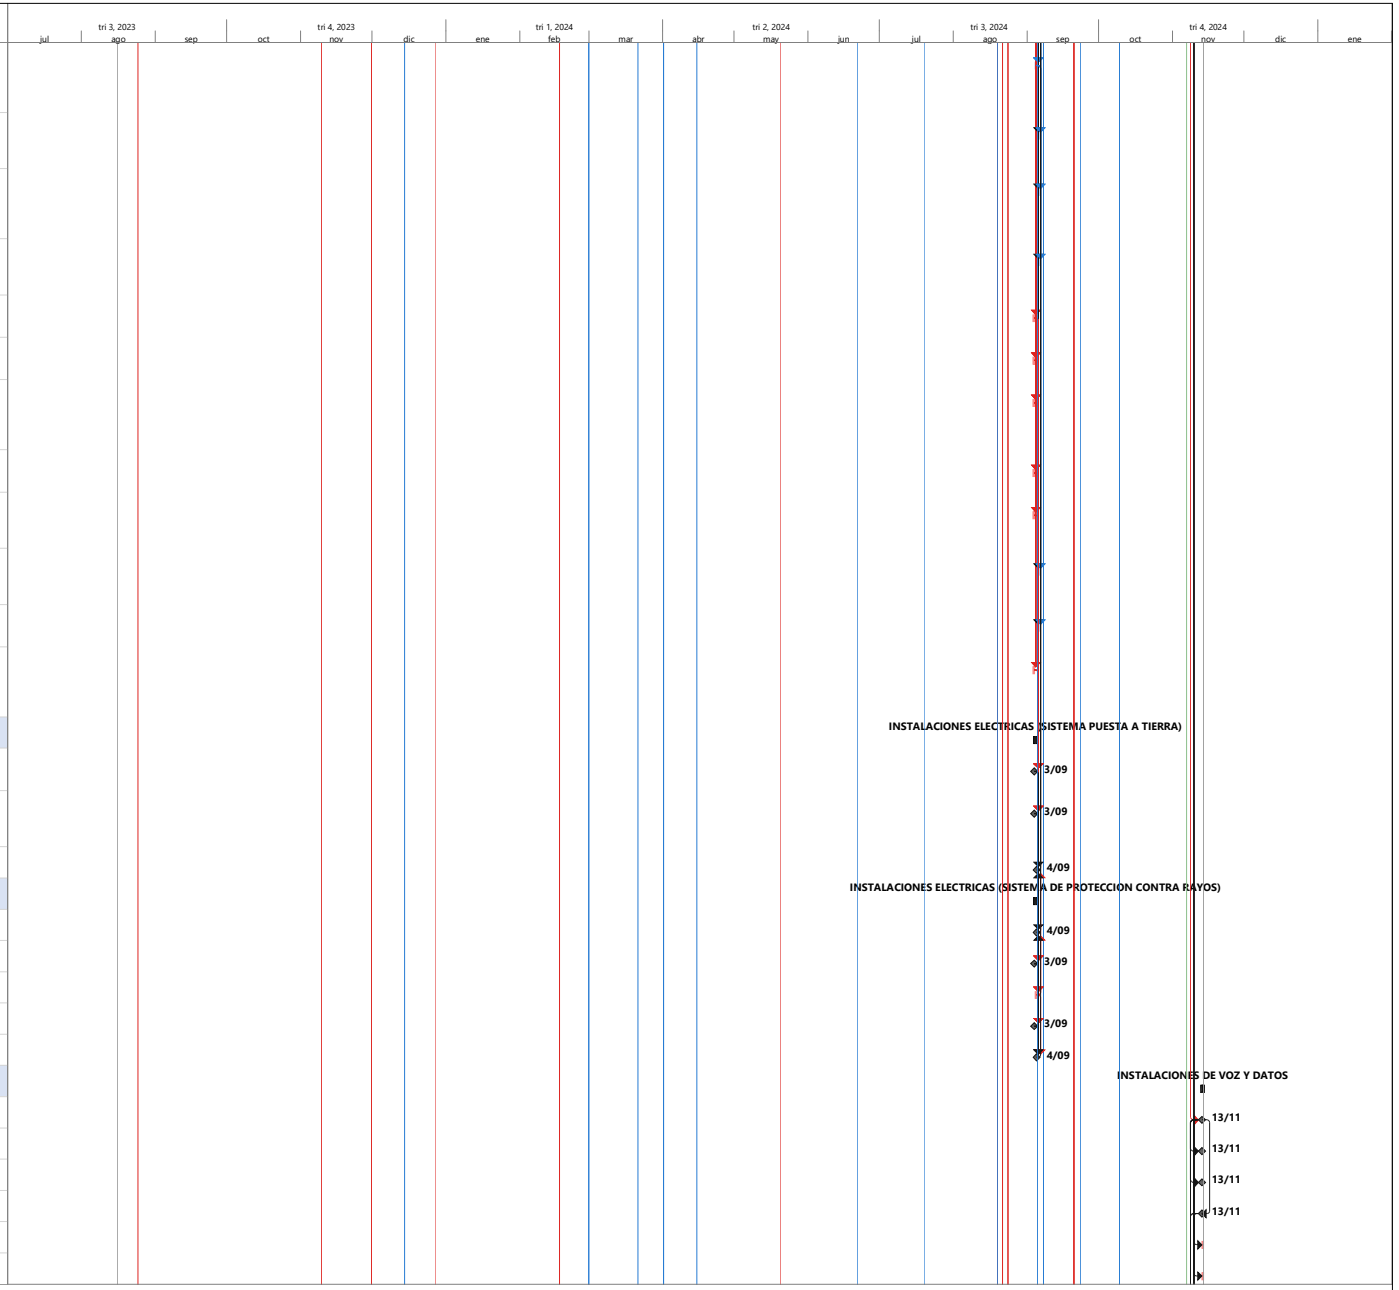

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
337		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA PARA RED DE DATOS 200X100MM EZ CABLOFIL INCLUYE SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIGURACIÓN , ATTERRIZAJE EN CALIBRE 4 CU Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
338		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PERIMETRAL 12X5CM, FABRICADO EN LAMINA CR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, DIVISION CENTRAL, TAPA TIPO ATORNILLABLE, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
339		SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL LOGICO PARA CANALETA DE 12X5CM FABRICADO EN LAMINA CR	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
340		**INSTALACIONES CCTV**	**1 día**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
341		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA CCTV EN TUBERÍA 3/4" EMT, INCLUE TERMINALES, UNIONES, CURVAS, CAJAS Y SOPORTERÍA.	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
342		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CATEGORÍA 6A LIBRE DE HALOGENOS	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
343		SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT CCTV HIK VISION 4K 5MP: INCLUYE: A) 1DVR REF DS7216HUHI-K1 16 CANALES TURBO 4.0, COPRESIÓN H.265+TURBO 8MP LITE/5MP 1BAHIA/10TB H.265+30FPS HDMI 4K/VGA METAL HIK VISION SALIDA A 4K. B) 5 CAMARAS TIPO DOMO REF.DS2CE56H0T-ITP	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
344		**EXTERIORES Y ZONAS VERDES**	**0 días**	**jue 5/09/24**	**jue 5/09/24**
345		PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
346		PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
347		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS DE PERMANENCIA EN CONCRETO Y MADERA	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
348		ASEO GENERAL ENTREGA	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
349		**VÍAS Y PARQUEDADEROS**	**48 días**	**jue 5/09/24**	**mié 13/11/24**
350		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
351		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
352		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUÉS DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
353		SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
354		**EQUIPOS ESPECIALES**	**0 días**	**jue 5/09/24**	**jue 5/09/24**
355		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE TELECOMUNICACIONES. INCLUYE (10 SALIDAS CON POLO A TIERRA AISLADA, CONEXIÓN MEDIANTE CLAVIJA DE SEGURIDAD L5-30 Y DOS ORGANIZADORES VERTICALES)	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
356		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINTS	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
357		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA CABINADA DIESEL, TIPO STAND BY 208/120V 60KW,75KVA. INCLUYE DESFOGUE, SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUARTO ISONORIZADO	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
358		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESIÓN (ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA) Y TANQUE HIDROACUMULADOR PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
359		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA, RED CONTRA INCENDIOS. INCLUYE: BOMBA JOCKEY DIESEL, TABLERO JOCKEY, TABLERO PRINCIPAL Y ACCESORIOS	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
360		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ON LINE, 5KVA 2F CON BY PASS AUTOMATICO Y TIEMPO MINIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
361		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,2KV/208V, 112.5KVA SECO CLASE H EN CELDA NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
362		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE INTERCONEXIÓN CELDA-TRANSFORMADOR 3X120MM2 XLPE AL 15KV	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
363		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA TRIPLEX DE ENTRADA-SALIDA-PROTECCION NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
364		**NO PREVISTOS (VARIOS)**	**259 días**	**mié 23/08/23**	**mié 28/08/24**
365		CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	3 días	mié 23/08/23	vie 25/08/23
366		SOBRERCIMIENTO DE ALTURA HASTA 30CM E=0.20 MTS	20 días	mié 13/12/23	jue 18/01/24
367		AFINADO EN CUBIERTAS PLANAS E=6CM	3 días	mié 28/02/24	vie 1/03/24
368		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	5 días	lun 19/08/24	vie 23/08/24
369		DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	1 día	lun 28/08/23	lun 28/08/23

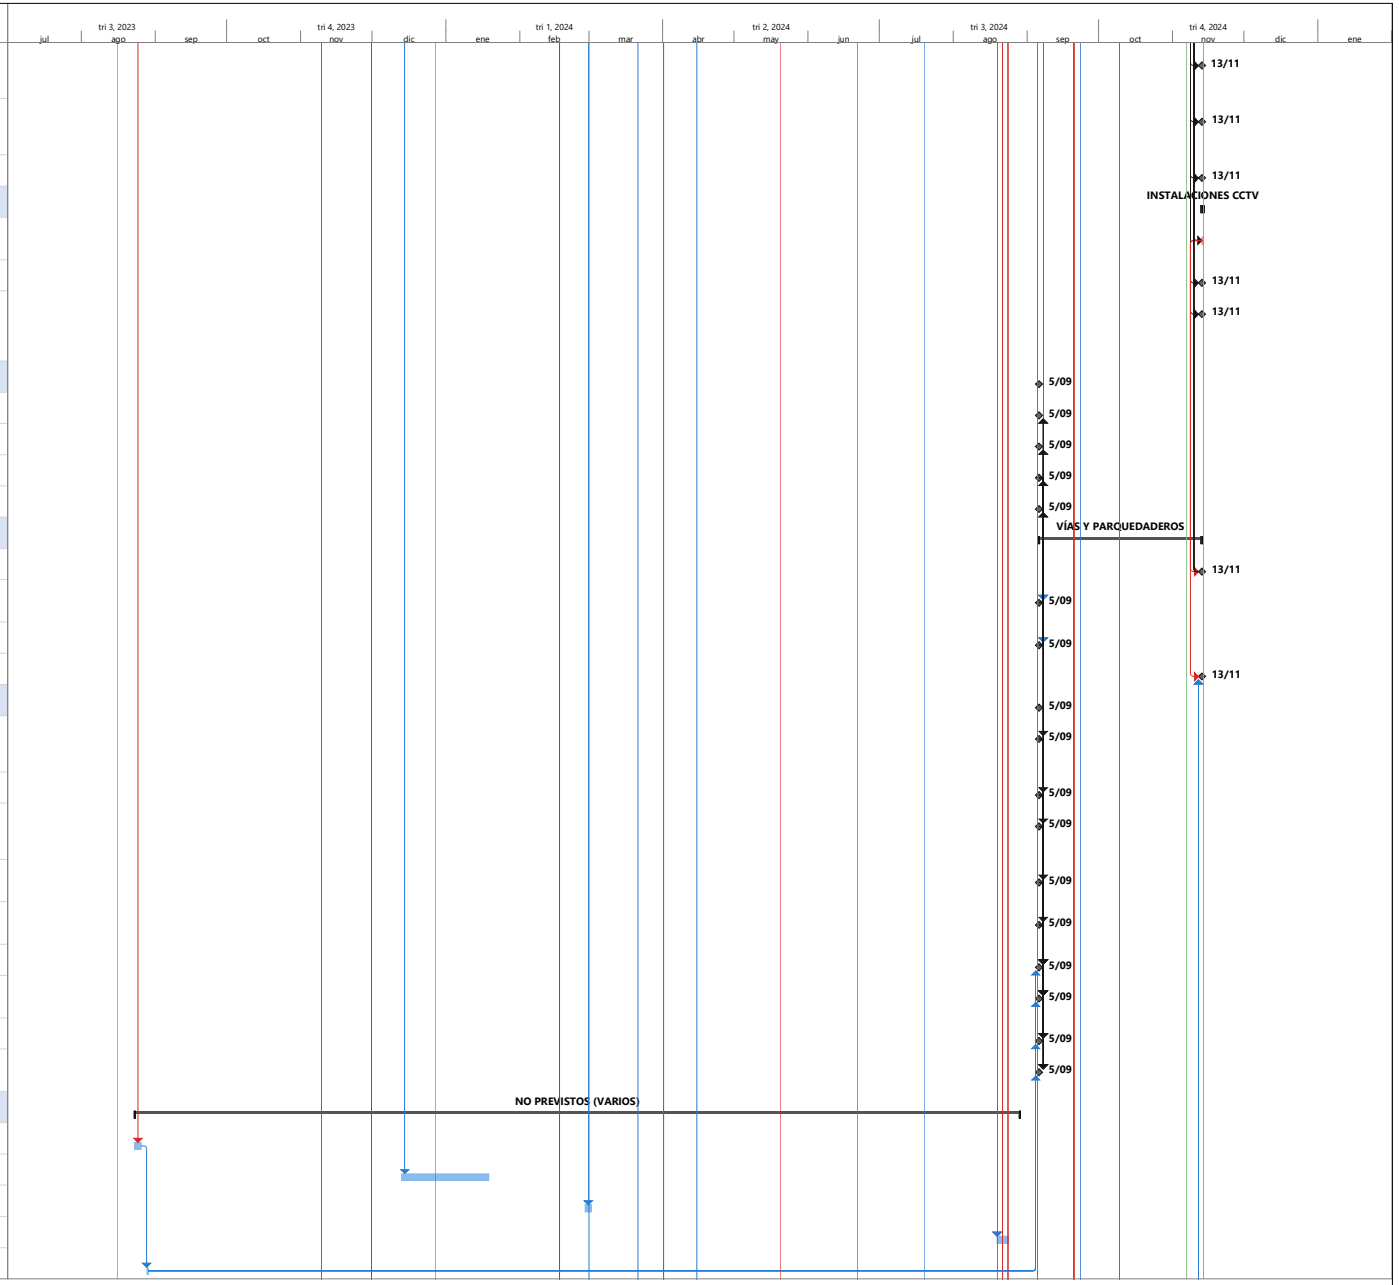

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
370		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO IMPERMEHABILIZANTE CALIBRE 4 PARA AISLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	15 días	mié 8/11/23	mar 28/11/23
371		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	8 días	lun 19/08/24	mié 28/08/24
372		**NO PREVISTOS (MAMPOSTERIA)**	**50 días**	**vie 16/02/24**	**jue 25/04/24**
373		COLUMNETA CONFINAMIENTO 0.12X0.25 (INCLUYE REFUERZO DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	20 días	lun 4/03/24	vie 29/03/24
374		VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO Y SOPORTE DE CORREAS 0.12X0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	15 días	lun 11/03/24	vie 29/03/24
375		COLUMNETA CONFINAMIENTO 0.12X0.20 (INCLUYE REFUERZO DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	16 días	vie 16/02/24	vie 8/03/24
376		VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 0.12X0.15 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	15 días	vie 8/03/24	jue 28/03/24
377		MURO CULATA EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	15 días	vie 16/02/24	jue 7/03/24
378		PAÑETE DE CULATA IMPERMEABILIZADO 1:3	20 días	vie 29/03/24	jue 25/04/24
379		FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	8 días	lun 15/04/24	mié 24/04/24
380		REGATA SOBRE MUROS EN CONCRETO LADRILLO Y BLOQUE	8 días	mié 20/03/24	vie 29/03/24
381		**NO PREVISTOS (ESTRUCTURA METALICA)**	**15 días**	**lun 1/04/24**	**vie 19/04/24**
382		ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE PERFILERIA METALICA Y ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE ANCLAJE Y FIJACION DE PLATINA O ANGULO	15 días	lun 1/04/24	vie 19/04/24
383		ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE PERFILES METALICOS Y ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE ANCLAJE DE HASTA 4 PERNOS Y FIJACION DE PLATINA	10 días	lun 1/04/24	vie 12/04/24
384		ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE PERFILES METALICOS Y ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE ANCLAJE DE HASTA 6 PERNOS Y FIJACION DE 2 PLATINAS	10 días	lun 1/04/24	vie 12/04/24
385		**TANQUES Y ESTACION DE BOMBEO (ITEM NO PREVISTOS)**	**5 días**	**mar 30/07/24**	**lun 5/08/24**
386		ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1"	1 día	mar 30/07/24	mar 30/07/24
387		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS PLASTICOS EN POLIPROPILENO PARA ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO	1 día	mié 31/07/24	mié 31/07/24
388		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÀLICO, BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	1 día	jue 1/08/24	jue 1/08/24
389		CINTA SIKA PVC. V=0.15	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24
390		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=2"	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
391		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=1"	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
392		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
393		PASES DE TANQUE DE HASTA 3" NIPLADOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ESPIGOS DE FIJACIÓN	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
394		PASES DE TANQUE DE HASTA 6" NIPLADOS DE HG, INCLUYE ESPIGOS DE FIJACIÓN	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
395		IMPERMEHABILIZACION DE ZONAS HUMEDAS	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
396		SUMIDERO LONGITUDINAL EN MAMPOSTERIA DE 20CM X40CM INTERNOS (INCLUYE REJILLA METALICA Y MARCO)	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
397		**MURO DE CONTENCION (ITEM NO PREVISTOS)**	**50 días**	**jue 30/05/24**	**mié 7/08/24**
398		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	1 día	jue 18/07/24	jue 18/07/24
399		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	15 días	jue 18/07/24	mié 7/08/24
400		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	15 días	jue 30/05/24	mié 19/06/24
401		EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA	3 días	jue 20/06/24	lun 24/06/24
402		**PISOS (ITEM NO PREVISTOS)**	**7 días**	**jue 19/09/24**	**vie 27/09/24**
403		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN MORTERO Y PEGACOR PARA PISOS VINILICOS	7 días	jue 19/09/24	vie 27/09/24
404		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO	7 días	jue 19/09/24	vie 27/09/24
405		**HIDRAULICO (ITEM NO PREVISTO)**	**9 días**	**mar 27/08/24**	**vie 6/09/24**
406		PUNTO DE HIDRAULICO 1/2"	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24

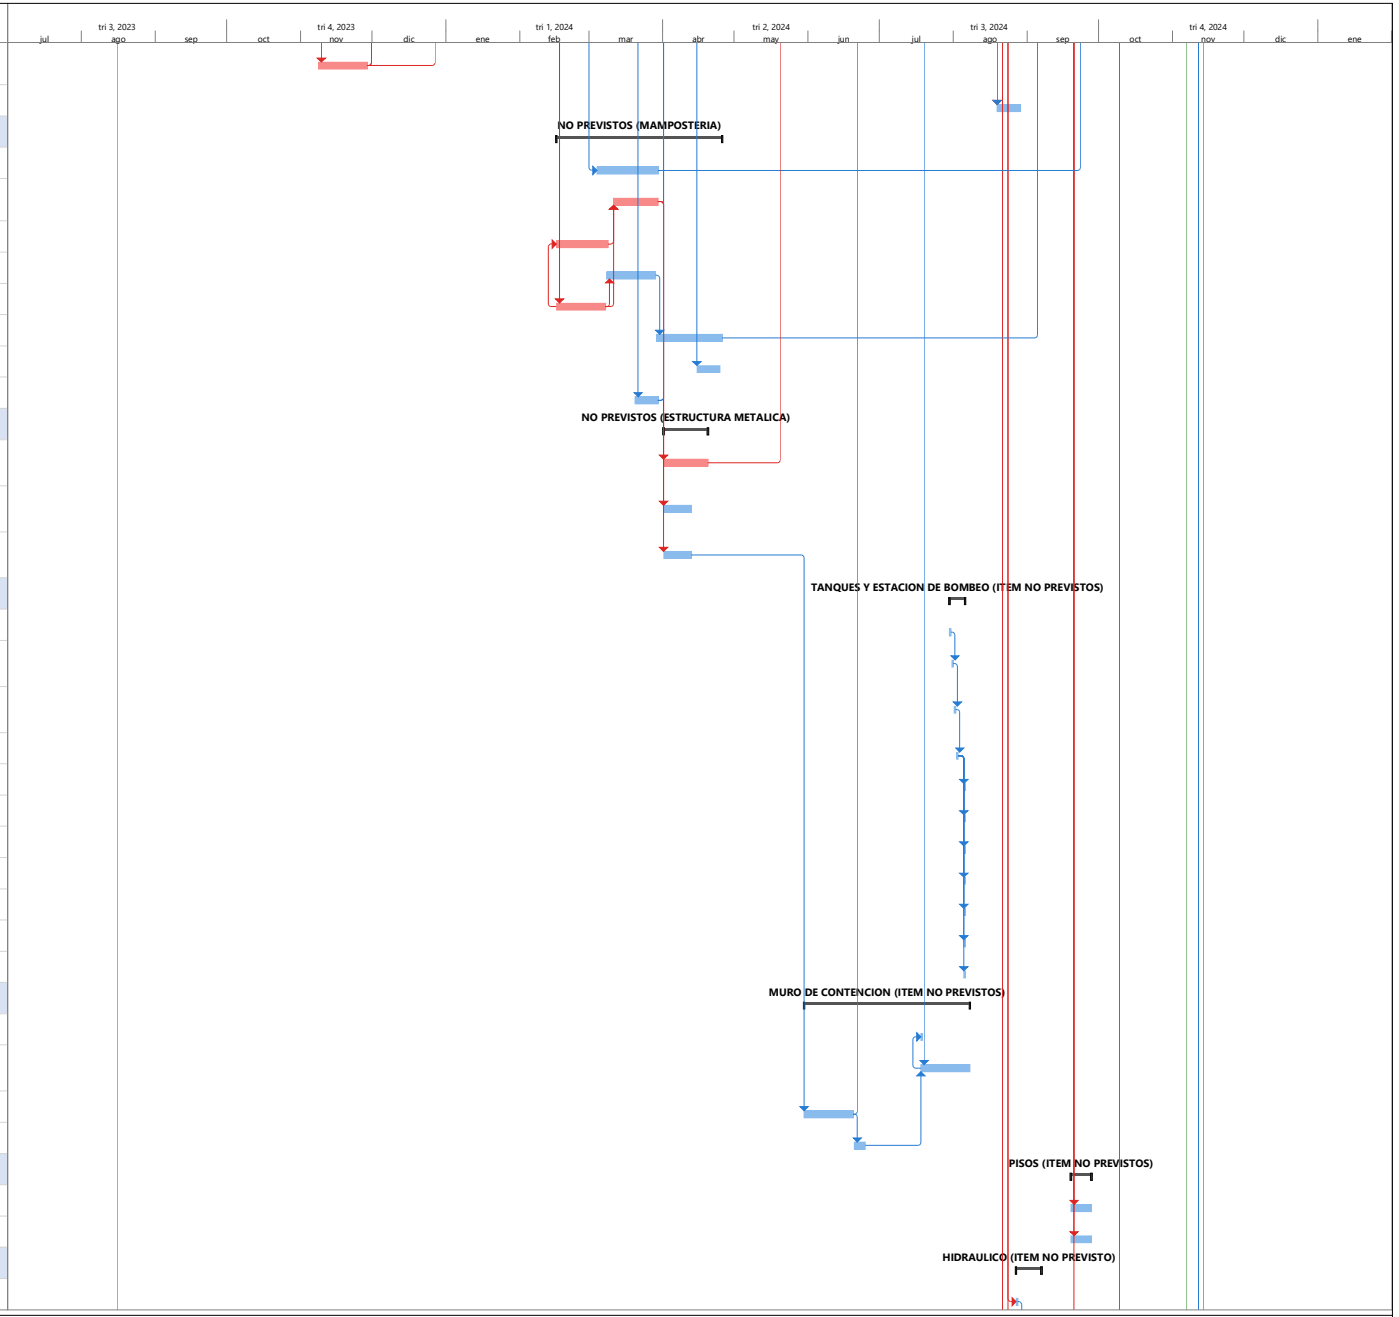

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
407		PUNTO DE HIDRAULICO 1-1/4"	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
408		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	1 día	jue 29/08/24	jue 29/08/24
409		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
410		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 " TIPO PESADO	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
411		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 -1/4" TIPO PESADO	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
412		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 2" TIPO PESADO	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
413		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE MANGUERA 1/2" INCLUYE ACOPLE HEMBRA ROSCADO	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
414		CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	1 día	jue 29/08/24	jue 29/08/24
415		CAJAS DE LLAVEMANGUERA DE 0.35 X 0.35 X 0.35 MTS LADRILLO	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
416		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=2 1/2"	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
417		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=2"	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
418		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 1/2"	1 día	mié 4/09/24	mié 4/09/24
419		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 1/4"	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
420		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 "	1 día	vie 6/09/24	vie 6/09/24
421		**SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y REVENTILACION (ITEM NO PREVISTO)**	**20 días**	**mar 20/08/24**	**lun 16/09/24**
422		PUNTO DE DESAGUES D=2"	15 días	mar 20/08/24	lun 9/09/24
423		PUNTO DE DESAGUES D= 3" Y 4"	1 día	mar 10/09/24	mar 10/09/24
424		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6"4	1 día	lun 16/09/24	lun 16/09/24
425		SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	1 día	mié 11/09/24	mié 11/09/24
426		SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE AIRE MINI-VENT 2"	1 día	mar 10/09/24	mar 10/09/24
427		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC VENTILACION 2"	1 día	mié 11/09/24	mié 11/09/24
428		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC VENTILACION 2"	1 día	jue 12/09/24	jue 12/09/24
429		SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC VENTILACION 2"	1 día	vie 13/09/24	vie 13/09/24
430		**RED CONTRA INCENDIOS - NO PREVISTOS**	**14 días**	**mar 8/10/24**	**vie 25/10/24**
431		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 DE 6"	5 días	mar 8/10/24	lun 14/10/24
432		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C900 DE 6"	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24
433		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (CODO) HD C900 DE 6"	1 día	mié 16/10/24	mié 16/10/24
434		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (SEMICODO) HD C900 DE 6"	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24
435		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (TEE) HD C900 DE 6"x6"x4"	1 día	vie 18/10/24	vie 18/10/24
436		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOR BRIDA PVC A AC DE 6"	2 días	jue 24/10/24	vie 25/10/24
437		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE HD DE PVC A PVC 6"	3 días	lun 21/10/24	mié 23/10/24
438		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (CODO) HD C900 DE 4"	1 día	mar 8/10/24	mar 8/10/24
439		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (SEMICODO) HD C900 DE 4"	1 día	mié 9/10/24	mié 9/10/24
440		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (TEE) HD C900 DE 4"x4"x4"	1 día	jue 10/10/24	jue 10/10/24
441		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOR BRIDA PVC A AC DE 4"	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24
442		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE HD DE PVC A PVC 4"	3 días	vie 11/10/24	mar 15/10/24
443		**PLACAS DE ACCESO VEHICULAR Y OBRAS EXTERIORES - (NO PREVISTOS)**	**7 días**	**jue 19/09/24**	**vie 27/09/24**
444		CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	7 días	jue 19/09/24	vie 27/09/24

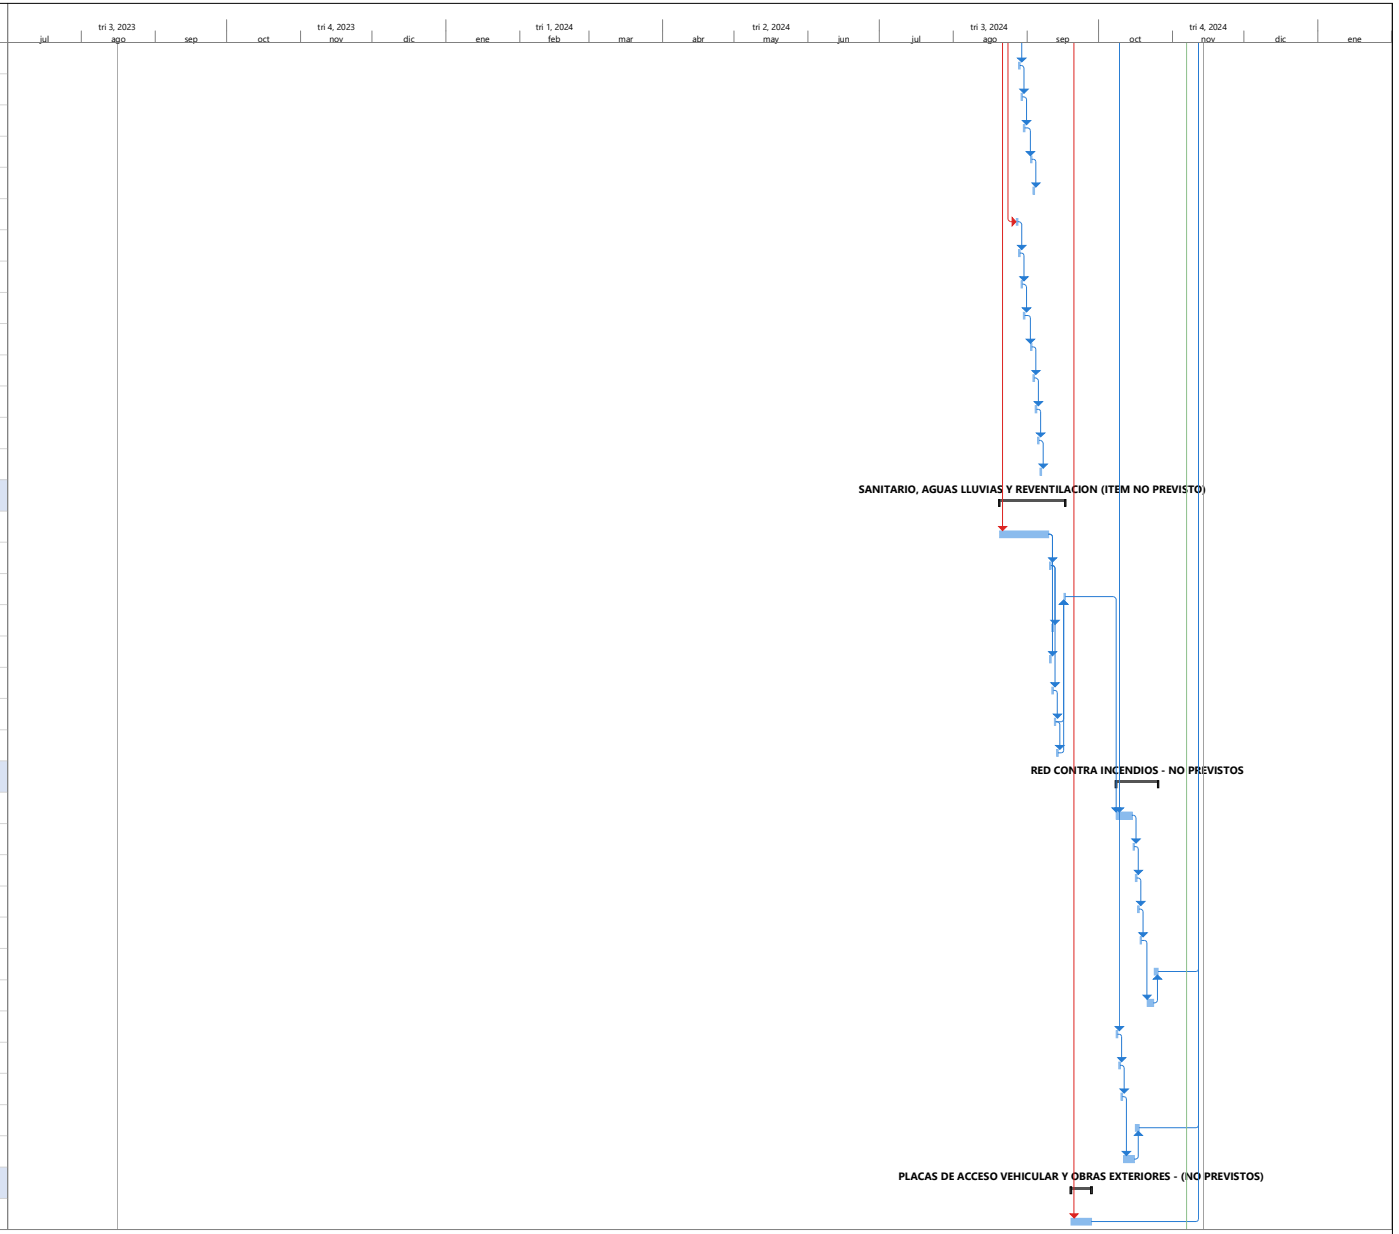

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual
