GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 10 de septiembre de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**13**			FECHA:	10	de	SEPTIEMBRE	de	2024		
PERIODO: 13 DEL	1	de	AGOSTO	de	2024	AL	31	de	AGOSTO	de	2024

CONTRATO No:	**2023-047**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**2023-071**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Carrera 6 N4-7 Esquina, La Uvita, Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S	**JULIO ROBERTO MONTENEGRO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
UNION TEMPORAL INTER UVITA	**GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA 01		3 MESES
2	SUSPENSIÓN 01		12 DIAS
3	PRORROGA 02		2 MESES
4	PRORROGA 03		45 DIAS
5	PRORROGA 04		3 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	15	de	ENERO	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	12	de	NOVIEMBRE	de	**2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**82,8%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**70,4%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**72,6%**



GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 10 de septiembre de 2024**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	**68859**	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de: 19	mm: 7	a: 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	VIG. DESDE mm	VIG. DESDE aaaa	VIG. HASTA dd	VIG. HASTA mm	VIG. HASTA aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	8	2023	14	3	2025	732.569.086,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	8	2023	14	11	2027	549.426.814,35
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13	11	2024	13	11	2029	732.569.086,00
CALIDAD DEL SERVICIO	16	8	2023	14	3	2025	366.284.543,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	16	8	2023	14	3	2025	732.569.086,00

No PÓLIZA	**20154**	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	**Berkley international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	de: 19	mm: 7	a: 2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	VIG. DESDE mm	VIG. DESDE aaaa	VIG. HASTA dd	VIG. HASTA mm	VIG. HASTA aaaa	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23	4	2024	14	11	2025	232.000.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR		MALO		PÉSIMO	
	X						

Descripción: Se presentan buenas condiciones metereológicas, la mayor parte del tiempo ha estado soleado.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa
Actas de inicio de obra/interventoría.	16	8	2023
Acta de suspensión	29	12	2023
Acta de reinicio	10	1	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
MOVIMIENTO DE TIERRAS	
EXCAVACIÓN MANUAL (REDES ENTERRADAS)	Exteriores, Andenes, zonas verdes
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Se conforman áreas exteriores para andenes y plazoletas
ESTRUCTURA EN CONCRETO	
CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS	Cuarto de bombas
CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS	Cuarto de bombas
CONCRETO 2500 PSI PARA PLACA BASE	Bloque 04 y andenes
ACERO DE REFUERZO Y MALLAS	
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Bloque 4, andenes, plazoletas
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	Se ejecuta en los bloques 1,2

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 10 de septiembre de 2024**

MAPOSTERÍA	
MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	Se ejecuta en los bloques 4
PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS DE CULATA	Se ejecuta en los bloques 4
PAÑETE LISO DEMUROS 1:4	Se ejecuta en los bloques 3 y 4
PISOS	
ALISTADO DE PISOS e: 4 cms	Se ejecuta en Bloque 1, 2 y 3
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	Se ejecuta en cuarto de bombas
ESTUCO Y PINTURA	
ESTUCO Y VINILO A 3 MANOS	Se ejecuta en los bloques 1 Y 2
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	Se ejecuta en los bloques 1,2 Y 3
RED CONTRA INCENDIOS	
SUMINISTRO DE TUBERÍA 6"	EXTERIORES Y BLOQUE 2
REDES HIDROSANITARIAS	
RED HIDRAULICA	EXTERIORES BLOQUE 1, 2 Y 3
REDES ELECTRICAS	
PUNTOS ELECTRICOS, CAJAS ELECTRICAS, CAJAS DE PASO Y REDES AÉREAS	EXTERIORES Y BLOQUE 1, 2 Y 3

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**
Solicitudes de entrega de información y documentación	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de balance de obra, con los ajustes hechos por cambios aprobados	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos contractuales al contratista de obra, de acuerdo al desarrollo del proyecto.	PROYECTO EN GENERAL
Requerimientos al contratista para garantizar una correcta ejecución del contrato de obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento diario de ejecución de actividades de obra	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento de dosificación de materiales para la elaboración de concreto en obra.	PROYECTO EN GENERAL
Seguimiento a la inversión y avance de ejecución de obra	PROYECTO EN GENERAL
Participación en comités de obra	PROYECTO EN GENERAL
Actividades de oficina, requerimientos y solicitudes al contratista	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de cumplimiento de programación y requerimiento por atrasos evidenciados en obra	PROYECTO EN GENERAL
Solicitud de aseo, orden y despeje de circulaciones frecuentemente	PROYECTO EN GENERAL

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
MEZCLADORA	CONCRETOS	100%	En buen estado.
VIBROCOMPACTADOR (RANA)	MEJORAMIENTO TERRENO ANDENES	100%	En buen estado.
HERRAMIENTA MENOR	ACTIVIDADES DIARIAS	100%	En buen estado.

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
BLQOUE #5	DEPOSITO	
Tabla, puntilla	ALMACEN G Y J	
Cemento Holcim	ALMACEN G Y J	
Tuberías	DURMAN	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computadores	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Elementos de oficina	Elaboración de informes	100%	INTERVENTORÍA
Cinta métrica, decámetro , escuadra	Verificación de dimensiones , escuadras	100%	INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	5	10	2023	$ 732.569.085,80
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 732.569.085,80**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	29	4	2024	$ 39.625.629,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 39.625.629,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
02/08/2024	ESE-SUPERVISOR	OF-047 Concepto prórroga	SI
05/08/2024	ESE-SUPERVISOR	Acta modificatoria con soportes	NO
05/08/2024	ESE-SUPERVISOR	OF-048 CONCEPTO SOLICITUD MODIFICATORIO	SI
08/08/2024	ESE-SUPERVISOR	Concepto interventoría solicitud de prórroga 04	SI
09/08/2024	CEROM	OBSERVACIONES AL INFORME #12 JULIO	SI
10/08/2024	ESE-SUPERVISOR	PRÓRROGA 04 INTERVENTORÍA	SI
13/08/2024	ESE-SUPERVISOR	OF 049 CONCEPTO POLIZAS PRORROGA 04 OBRA	SI
14/08/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME #12 INTERVENTORÍA	SI
14/08/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME #12 OBRA	SI
14/08/2024	ESE-SUPERVISOR	INFORME #12 SST	SI
22/08/2024	SUPERVISOR	REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL OBRA	SI
30/08/2024	ESE-SUPERVISOR	SOLICITUD DE MODIFICATORIO	SI

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 10 de septiembre de 2024**

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
ACUÑA SUESCA SANTIAGO	4249073	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
BERRIO CACERES CARLOS ARTURO	5440859	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
BLANCO DUARTE OSCAR JAVIER	1002698742	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
BOTIA MORALES JOSE MIGUEL	4239368	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
BOTIA MURILLO DAVID LEONARDO	1002698905	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
CACERES BERRIO YULIAN ALEJANDRO	1056994069	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
CACERES JIMENEZ REYES JULIO	4240128	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
CONTRERAS RODRIGUEZ HERNAN	1090399182	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
DIAZ CARRILLO YIMY JAVIER	1049413692	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
GALVIS NIÑO LUIS EBERTO	4240055	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
HILDEBRANDO JAIME LIMAS	11443434	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
LIMAS QUINCHARA JOSE LIBARDO	1056994947	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
MEDINA VERANO BRAYAN STIVEN	1010030728	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
MEDINA REYES JULIO CESAR	1049647255	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
MESA CARLOS ALBERTO	4060131	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
MONSALVE RAMIREZ JOSE ALEXANDER	74377900	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
RISCANEVO VELANDIA DAIRO ALONSO	1056994798	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	1049647963	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	1100502	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
MANUEL ANTONIO SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
TUMAY GIRON GEINER ELI	1118774601	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
TUMAY GIRON YOLMAN	1006636660	X	X	X	1	8	2024	31	8	2024
								SI	X	NO

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE OBRA	1.057.690.579
ELIANA FABIOLA GONZALEZ ARENAS	RESIDENTE DE OBRA	1.049.613.808
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA	1.049.647.963
ALEX ESTEBAN RODRIGUEZ DURAN	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
GIOVANNY HUMBERTO PEREZ MORALES	ASESOR SISO	7.173.399
JAIRO ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ	ASESOR EN ESTRUCTURAS	1.049.641.270
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA	1.100.476

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 10 de septiembre de 2024**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOC. IDENTIFICACIÓN
EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	7.180.551
ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	1.054.254.612

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Para este periodo no hay resultados de ensayos				

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Para este periodo no hay resultados				

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
Materiales granulares	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta 17. Seguimiento técnico	29	8	2024	Seguimiento técnico y administrivo al contrato

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe 7	1	2	2024	29	2	2024	Entregado a supervisor.
Informe 8	1	3	2024	31	3	2024	Entregado a supervisor.
Informe 9	1	4	2024	30	4	2024	Entregado a supervisor.
Informe 10	1	5	2024	31	5	2024	Entregado a supervisor.
Informe 11	1	6	2024	30	6	2024	Entregado a supervisor.
Informe 12	1	7	2024	31	7	2024	Entregado a supervisor.
Informe 13	1	8	2024	31	8	2024	Presente informe.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 10 de septiembre de 2024**

OBSERVACIONES:
Se hizo la revisión del acta de mayores y menores cantidades e items no previstas, la cual se avaló y se envió para el debido trámite por parte de la entidad del acta modificatoria 01.
Se hizo la revisión del presupuesto proyectado para finalizar la obra y entregarla totalmente funcional, el cual se avaló y se envió para el debido trámite por parte de la entidad del Adicional en tiempo y valor #01
Se ha requerido al contratista cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo a la oferta presentada y pliego de condiciones, situación que se evidencia a través de los oficios y correos entre las partes.
Mediante oficios se ha requerido al constructor para el cumplimiento de entrega de información y de sus obligaciones derivadas del contrato de obra y su propuesta.
La interventoría solicitó, se le diera cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato.
La interventoría reiteró la solicitud de cumplir con las especificaciones entregadas por la entidad en los procesos en desarrollo, de acuerdo al plan de calidad del contratista de obra, entregado al inicio de las actividades.
La interventoría solicitó el uso del equipo ofertado en la propuesta por el contratista de obra, como también se ha reiterado la asistencia de los profesionales asesores del contratista y/o entrega del informe de las revisiones realizadas y firmadas por dichos profesionales.
Se solicitó que personal que no cumpla con el uso de EPP's y elementos de bioseguridad sea retirado de INMEDIATO de la obra, el no cumplimiento de lo anterior, será responsabilidad total del contratista de obra, dado que esta solicitud se ha realizado de manera constante y no se evidencia un mejor control en campo.
El contratista solicitó prorroga 04, basados en el mal estado del tiempo, la dificultad para conseguir personal idoneo y la dificultad de allegar los materiales propios para la ejecución del proyecto, a lo cual interventoría emitió concepto al respecto.


CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS No.**
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	26-32
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	45
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	67
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.		
Memorias y planos de diseño aprobados		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	64
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	118
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**martes, 10 de septiembre de 2024**

Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	**24 - 32**
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	**21**
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	**SI**	**21**
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes		
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	**27**
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**SI**	**93**

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	ANDRES DAVID MENDIVELSO

CONTRATO 2023-047

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"



ENTIDAD CONTRATANTE: ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER UVITA
R/L ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ

INFORME DE INTERVENTORIA 13

AGOSTO DE 2024

INDICE

INFORME MENSUAL 13 MES AGOSTO GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 1
INDICE INFORME INTERVENTORÍA #13 AGOSTO.....9
INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA #13 AGOSTO ESE. CENTRO DE SALUD LA UVITA.....11
FORMATO DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA MES 13 16
FORMATO CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES MES 13 17
FORMATO CONTROL DE PLANOS DETALLADOS MES 13 18
FORMATO CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN MES 13 20
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MES 13 21
FORMATO CONTROL DE CORRESPONDENCIA MES 13 22
FORMATO CONTROL DE COMITÉS MES 13 23
FORMATO CONTROL DE PERSONAL MES 13 24
FORMATO CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO MES 13 25
FORMATO CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL MES 13 26
REGISTRO FOTOGRAFICO MES 13 27
ANEXOS 31
PAGOS PARAFISCALES CONTRATISTA..... 32
PAGOS PARAFISCALES INTERVENTORIA 41
PÓLIZAS..... 45
ACTAS DE COMITÉ..... 64
BITACORA DE OBRA 67
CORRESPONDENCIA ENVIADA 93
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 105
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 118

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA — **martes, 10 de septiembre de 2024**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**13**			FECHA:	10	de	SEPTIEMBRE	de	2024		
PERIODO: 12 DEL	1	de	AGOSTO	de	2024	AL	31	de	AGOSTO	de	2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	**2023-047**	DE	2023	CDP	**2023-071**						
CONTRATO DE OBRA N°:	**2023-045**	DE	2023	CDP	**2023-37**						

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA :

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CEROM DE COLOMBIA S.A.S.	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
NIT DEL CONTRATISTA DE OBRA:	C.C. REP. LEGAL - OBRA:
NIT: 820.003.010 - 2	74.363.121 de Sutatenza
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	REPRESENTANTE LEGAL:
UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ
NIT DEL INTERVENTOR:	C.C. REP. LEGAL - INTERVENTOR:
901.738.692 - 3	1.054.254.612
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DEPENDENCIA
ANDREA CATALINA PINZON BOTIA	GERENTE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA
GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CPS 2023-044

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS
2	ACTA DE REINICIO 01	10/01/2024	NA

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONTRATO PRÓRROGA 01	N/A	3 MESES
2	CONTRATO PRÓRROGA 02	N/A	2 MESES
3	CONTRATO PRÓRROGA 03	N/A	45 DIAS
4	CONTRATO PRÓRROGA 04	N/A	3 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A

VALOR INICIAL:	$ 198.128.146,00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 198.128.146,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	31	de	DICIEMBRE	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	12	de	NOVIEMBRE	de	2024

CONTRATO DE OBRA

INICIO

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE INICIO	16/08/2023	CINCO (05) MESES

REINICIOS Y SUSPENSIONES

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
1	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29/12/2023	12 DÍAS
2	ACTA DE REINICIO 01	10/01/2024	NA

ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONTRATO PRÓRROGA 01	N/A	3 MESES
2	CONTRATO PRÓRROGA 02	N/A	2 MESES
3	CONTRATO PRÓRROGA 03	N/A	45 DIAS
4	CONTRATO PRÓRROGA 04	N/A	3 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N/A	N/A


VALOR INICIAL:	$ 3.662.845.429,00	VALOR ADICIONALES:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 3.662.845.429,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	31	de	DICIEMBRE	de	2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	12	de	NOVIEMBRE	de	2024

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**martes, 10 de septiembre de 2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	83%	% DE AVANCE EJECUTADO	70,4%	% DE AVANCE DE PROGRAMADO	72,57%

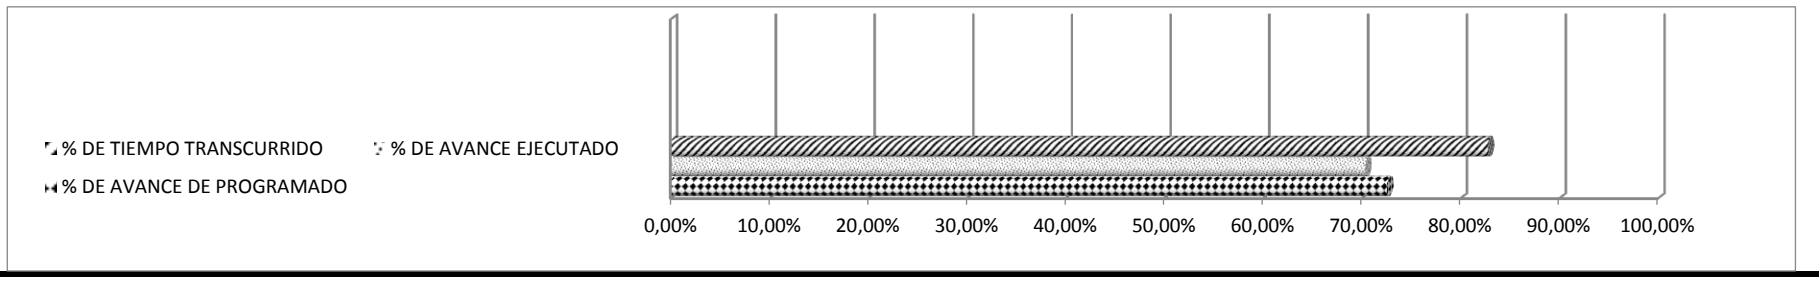

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR		MALO		PÉSIMO	
	X						

Descripción: Se presentan lluvias moderadas en la zona

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	**68859**	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	**Berkey international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATA	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	8	2023	14	3	2025	732.569.086
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	8	2023	14	11	2027	549.426.814
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13	11	2024	13	11	2029	732.569.086.2
CALIDAD DEL SERVICIO	16	8	2023	14	3	2025	366.284.543
CALIDAD DEL BIEN	16	8	2023	14	3	2025	732.569.0862

No PÓLIZA	**20154**	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	**Berkey international seguros Colombia S.A**	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATA	de	mm	a
							19	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	de	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23	4	2024	14	11	2025	232.000.000

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Actas de inicio	16	8	2023
Actas de suspensión	30	12	2023
Actas de reinicio	10	1	2023

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	**$ 3.662.845.429,00**	**$ 3.662.845.429,00**
Valor Adición del Contrato	**N/A**	
Anticipo	**$ 732.569.085,80**	**$ 2.930.276.343,20**
Valor acta parcial No. 1		
Valor total actas pagadas		
Saldo por ejecutar	**$ 2.930.276.343,20**	**$ 2.930.276.343,20**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**
FASE DE OBRA	

COMPONENTE	DD	INICIO	FINAL	VALOR	AVANCE	NOTA	OBSERVACIONES
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	0	16/08/23	16/08/23	$ 11.299.860	100%		
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	11	16/08/23	27/08/23	$ 18.839.340	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	13	21/08/23	03/09/23	$ 6.214.887	100%		
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	13	04/09/23	17/09/23	$ 10.094.297	97%		
EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	6	28/08/23	03/09/23	$ 17.738.697	100%		
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	6	04/09/23	10/09/23	$ 2.609.100	100%		
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCA VIBRATORIA	6	18/09/23	24/09/23	$ 70.885.785	94%		

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y O GRANULAR DESPUE DE 5 KM	6	18/09/23	24/09/23	$ 19.366.770	94%		
SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	6	18/09/23	24/09/23	$ 10.493.381	98%		
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	6	18/09/23	24/09/23	$ 29.379.366	101%		
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	103	18/09/23	30/12/23	$ 32.315.950	103%		
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPA H 3,5MTS	103	18/09/23	30/12/23	$ 18.797.813	107%		
PLACA MACIZA 21MPA E:012 MTS	103	18/09/23	30/12/23	$ 27.723.404	100%		
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA ALTURA MAYOR A 3M FORMALETA EN MADERA	89	02/10/23	30/12/23	$ 37.746.852	90%		
VIGA AEREA 21 MPA 3000 PSI	103	18/09/23	30/12/23	$ 54.002.236	74%		
CONCTRUCCIÓN VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21 MPA 3000 PSI	103	18/09/23	30/12/23	$ 14.306.652	100%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa(3000PSI)RELACIÓN60C/40P	103	18/09/23	30/12/23	$ 19.772.182	97%		
PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	28	01/12/23	29/12/23	$ 88.331.913	79%		
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	103	18/09/23	30/12/23	$ 18.334.722	88%		
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	103	18/09/23	30/12/23	$ 6.514.073	64%		
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15MD=6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 28.102.905	69%		
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	103	18/09/23	30/12/23	$ 224.024.338	94%		
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	28	01/12/23	29/12/23	$ 110.031.077	100%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	28	01/12/23	29/12/23	$ 60.544.920	100%		
MURO EN BLOQUE #5 E:12 CMS	28	01/12/23	29/12/23	$ 55.404.617	99%		
PAÑETE LISO MUROS 1.4	28	01/12/23	29/12/23	$ 28.590.546	90%		
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	28	01/12/23	29/12/23	$ 14.284.133	95%		
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	28	01/12/23	29/12/23	$ 31.838.806	100%		
SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA EN TEJA PANLE METALICO ALUZIN CAL 26	28	01/12/23	29/12/23	$ 159.071.356	98%		
SUMINISTRO E INSTALACION CUBERTA LAMINA POLICARBONATO CAL 6 MM	28	01/12/23	29/12/23	$ 27.872.813	98%		
ALISTADO DE PISO E: 4 CM 1:5	28	01/12/23	29/12/23	$ 3.560.227	15%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLETA GRES FORMATO 30X30 CM	28	01/07/24	29/07/24	$ 767.598	10%		
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	28	01/12/23	29/12/23	$ 19.188.654	90%		
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	59	01/08/24	29/09/24	$ 24.216.386	114%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGUES)	28	01/12/23	29/12/23	$ 17.154.030	25%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (AGUAS LLUVIAS DESAGUES)	28	01/12/23	29/12/23	$ 7.497.264	14%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)	28	01/12/23	29/12/23	$ 1.553.157	10%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (HIDROSANITARIAS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 8.396.341	95%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C900 4"	28	01/12/23	29/12/23	$ 8.834.038	87%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (MEDIA TENSION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 2.685.256	33%		
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO (ELECTRICAS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 4.305.816	48%		
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1" PARA BAJANTE	28	01/12/23	29/12/23	$ 1.143.900	50%		
INSTALACIONES VOZ Y DATOS	28	01/12/23	29/12/23	$ 2.005.116	5%		
INSTALACIONES CCTV	28	01/12/23	29/12/23	$ 2.543.200	15%		

ITEMS NO PREVISTOS (VARIOS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 119.171.904	87%		
ITEMS NO PREVISTOS (MAMPOSTERIA)	28	01/12/23	29/12/23	$ 368.338.588	97%		
ITEMS NO PREVISTOS (ESTRUCTURA METALICA)	28	01/12/23	29/12/23	$ 17.112.194	100%		
ITEMS NO PREVISTOS (TANQUES ALMACENAMIENTO)	28	01/12/23	29/12/23	$ 34.524.980	85%		
ITEMS NO PREVISTOS (MURO DE CONTENCION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 22.305.933	100%		
ITEMS NO PREVISTOS (RED HIDRAULICA)	28	01/12/23	29/12/23	$ 8.274.044	68%		
ITEMS NO PREVISTOS (SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y REVENTILACION)	28	01/12/23	29/12/23	$ 5.753.285	49%		
ITEMS NO PREVISTOS (RED CONTRA INCENDIOS)	28	01/12/23	29/12/23	$ 54.965.987	70%		
VALOR TOTAL OBRA				**$ 1.988.830.689**			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PROCESO
Seguimiento a los procesos constructivos	Campo - oficina - documentación
Verificacion de procedimientos	Campo - oficina - documentación
Seguimiento procesos administrativas atencion de comites,	Campo - oficina - documentación
Seguimiento a las atividades de prgramadas y avance financiero	Campo - oficina - documentación

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
HERRAMIENTA MENOR	EXCAVACIONES ,ARMADO DE VIGAS	90%	
MEZCLADORA	ELABORACIÓN CONCRETO	60,00%	
VIBRADOR DE CONCRETO	ELABORACIÓN CONCRETO	60,00%	

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	
Material granular seleccionado	TRITURADOS LA PALMERA	
Aceros 60000 psi	ALMACEN G Y J	
Cemento	HOLCIM	
Tubería hidrosanitaria	Proveedor local	
tubería eléctrica	Proveedor local	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Elementos de medición y verificación	Medición	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	5	10	2023	$ 732.569.085,80
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 732.569.086**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	29	4	2024	$ 39.625.625,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 39.625.625**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	DIRECTOR	1057690579
JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	RESIDENTE	1.049.647.963
JOSE BERNARDO CONTRERAS RODRIGUEZ	MAESTRO	100.476
GYOVANY PEREZ	ASESOR SISO	7.173.399
ALEXANDER RODRIGUEZ	ASESOR ELECTRICISTA	1.118.538.787
ALEJANDRO HERNANDEZ	ASESORDE ESTRUCTURAS	1.049.641.270

Libertad y Orden	**UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA**	**ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE INTERVENTORÍA		**martes, 10 de septiembre de 2024**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EDWARD JONATHAN PARDO PARADA	RESIDENTE	7.180.551
ANDRES DAVID MENDIVIESO	INSPECTOR	1.054.254.612

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			LOCALIZACIÓN	Cumple/No Cumple
	dd	mm	aaaa		
Para este periodo no hay resultados de ensayos					

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
CEMENTO	HOLCIM	148 KM	NOBSA
Arenas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	CAPITANEJO
Gravas	TRITURADOS LA PALMERA	60 KM	
ACERO	G YJ	132	DUITAMA

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA 017	29	8	2024	SEGUIMIENTO DE OBRA

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME 06	10	1	2024	31	1	2024	
INFORME 07	1	2	2024	29	2	2024	
INFORME 08	1	3	2024	31	3	2024	
INFORME 09	1	4	2024	30	4	2024	
INFORME 10	1	5	2024	31	5	2024	
INFORME 11	1	6	2024	30	6	2024	
INFORME 12	1	7	2024	31	7	2024	
INFORME 13	1	8	2024	31	8	2024	PRESENTE INFORME

OBSERVACIONES Y/O PROBLEMAS PRESENTADOS:

Se solicita la prórroga por 3 MESES por parte del contratista por el mal estado del tiempo, la demora en la llegada de los materiales y la falta de personal en la región

Se presenta por parte del contratista el balance de mayores y menores cantidades de obra e items no previstos, el cual se avala por interventoría

Se presenta por parte del contratista el presupuesto general de obra, mediante el cual se solicita el adicional en valor y tiempo 01

FIRMA:

Residente de Interventoría

NOMBRE: EDWARD JONATHAN PARDO PARADA

FIRMA:

Director Interventoría

NOMBRE:

FIRMA:

Supervisor de la entidad contratante

NOMBRE: ANDREA CATALINA PINZON BOTIA

FIRMA:

Supervisor delegado de la entidad contratante

NOMBRE:

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	DATOS GENERALES DEL PROYECTO EN INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
NIT.:	826.002.202-7
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT.:	820.003.010 - 2
REP. LEGAL	JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
C.C.	74.363.121 de Sutatenza
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
NIT.:	901.738.692 - 3
REP. LEGAL:	ANDRÉS DAVID MENDIVELSO ÁLVAREZ
C.C.	1.054.254.612 de Socotá – Boyacá
SUPERVISOR	ING. OSCAR RODRIGUEZ
DEPENDENCIA	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
PLAZO CONTRACTUAL:	DIEZ (13) MESES 45 días
FECHA FIRMA CONTRATO:	1/8/2023
FECHA DE INICIO:	16/8/2023
FECHA PROYECTADA FINAL:	15/1/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1:	10/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/11/2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	No aplica

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO (seleccionar con X)			OBSERVACIONES / ESTADO
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	Contrato de: Obra	X			
2	Polizas de contrato	X			
3	Aprobación de polizas del contrato	X			
4	Acta de Inicio	X			
5	Verificacion de obligaciones contractuales (listado)			X	
6	Copia de la propuesta del contratista			X	
7	Programación de Obra	X			
8	Copia de Hojas de Vida profesionales propuestos	X			
9	Copia de equipos propuestos	X			
10	Acta de suspension (es)	X			
11	Acta de Reinicio (s)	x			
12	Ajuste de programacion	x			
13	Afiliaciones del personal propuesto	X			
14	Afiliaciones del personal operativo	X			
15	Diseños y planos de la entidad	X			
16	Especificaciones y memorias	X			

observaciones adicionales:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA EL**	sábado, 31 de agosto de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	DOCUMENTOS Y/O REVISIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
1	**ESTUDIO DE SUELOS**				
1,1	Desarrollado por Perez y Asociados en junio 2012, y aceptado mediante certificado del 26 de agosto de 2022, firmado por Samuel Perez Duarte	X			Revisar las recomendaciones: Instalar drenes y subdrenes Cimentar a 1,50 sobre 0,40 granulares
2	**TOPOGRAFIA**				
2,1	Desarrollado por ICC Ingenieria Correa Correa SAS, septiembre de 2022, firma Eliecer Correa Basto MP 25335-24464	X			Presenta informe (12 folios), plano (1); memorial firmado (1), matricula profesional (1); plano redes (1); El plano de planta no tiene coordenadas de linderos ni coordenadas GPS
3	ARQUITECTURA	X			No hay claridad en la diferencia de niveles entre las estructuras. Los cortes presentados no se puede apreciar la diferencia de nivel entre las estructuras presentadas.
4	ESTRUCTURAL	X			Los planos estructurales no presentan cortes donde se aprecien los cambios de niveles de los diferentes bloques. No hay diseño de muro de contención contenido en los ítems presentados
5	HIDROSANITARIO	X			ALVARO JAVIER UCRÓS SIERRA MP. 13202-289968 BLV
6	RED CONTRA INCENDIOS	X			Se hacen los ajustes solicitados
7	DISEÑOS ELÉCTRICOS	X			Se hacen los ajustes solicitados

observaciones adicionales:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PLANOS DETALLADOS

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA: FORMATO DE VERIFICACIÓN MENSUAL O CUANDO SUPERVISOR EN JEFE INDIQUE

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA**	sábado, 31 de agosto de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	Num Interno	CONTENIDO	MODIFICACIONES			OBSERVACIONES / VALORACIÓN
			INICIAL	MODIF 1	MODIF 2	
1		**ARQUITECTURA (25-08-2022)**				Diseñador: Mario Nuñez Hernández - T.P. A22922013-80243529
	01 DE 08	PLANTA - LOCALIZACIÓN - ARÉAS	X			Esc 1:2000 y acercamiento ESC: 1:500
	2 DE 08	PLANTA - ARQUITECTÓNICA DE PRIMER PISO	X			Esc 1:100
	3 DE 08	PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTAS	X			Esc 1:100
	4 DE 08	FACHADAS 1 A 5	X			Esc 1:75
	5 DE 08	FACHADAS 6-8	X			Esc 1:75
	6 DE 08	CORTE A-A' , B-B´y E-E'	X			Esc 1:75
	7 DE 08	PLANTA DE ESPECIFICACIONES	X			Esc 1:100
	8 DE 08	PUERTAS, VENTANAS Y Y DETALLES				
2		**ESTRUCTURA (29-07-2022)**				Diseñador: Julian Jimenez - M.P. 252021-96928 CND
	01 DE 08	PLANTA DE CIMENTACION, CORTES DETALLES	X			Esc: 1:75
	2 DE 08	PLANTA DE CUBIERTA -CORTES DETALLES	X			Esc: 1:25 Esc 1:50
	3 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 1 - CORTES DETALLES	X			
	4 DE 08	DETALLES ESTRUCTURALES 2 - CORTES DETALLES	X			
	5 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 1	X			
	6 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 2	X			
	7 DE 08	DESPIECE DE VIGAS Y COLUMNAS BLOQUE 3 Y 4	X			
	ENE - 01	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	X			
	MAYO 24	PLANO ESTRUCTURAL CUARTO DE BOMBAS	X			
	MAYO 24	DETALLE DESPIECE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	X			BLOQUE 1 Y BLOQUE 3
	JUN- 11/2024	PROPUESTA ESTRUCTURA CUARTO DE BOMBAS	X			CUARTO DE BOMBAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
	FEB - 22 -24	MEMORIA DE CALCULO	X			DOCUMENTO
3		**HIDROSANITARIO (AGOSTO 2022)**				ALVARO JAVIER UCROS SIERRA MP 13202-289968 BLV
	HYS-01	PLANTA PRIMER PISO RED SANITARIA	X			
	HYS-02	PLANTA PRIMER PISO RED AGUAS LLUVIAS	X			
	HYS-03	PLANTA CUBIERTA RED LLUVIAS	X			
	HYS-04	PLANTA PRIMER PISO RED AGUA POTABLE	X			
	HYS-05	DETALLES HIDROSANITARIOS	X			
		MEMORIAS DISEÑO HIDROSANITARIO	X			
	DOC 01	INFORME TÉCNICO HIDRO SANITARIO	X			
	DOC 02	MEMORIA CALCULO AGUA POTABLE	X			
	DOC 03	MEMORIA CALCULO DESAGUES	X			
4		RED PCI				Se presentan observaciones al diseño
	PCI-01	RED PCI PLANTA GENERAL	X			
	PCI-02	DETALLE CUARTO DE BOMBAS PCI	X			
	PCI-03	DETALLES PCI	X			
5		**ELECTRICO (SEPTIEMBRE 2022)**				DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182
	E-01	RED DE MEDIA TENSIÓN - PLANTA DE SUBESTACIÓN - CORTE A-A' - CORTE B-B'	X			
	E-02	DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL	X			
	E-03	ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN	X			

	E-04	ILUMINACIÓN	X			
	E-05	TOMACORRIENTES	X			
	E-06	CUADROS DE CARGA	X			
	E-07	ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO	X			
	E-08	FACHADAS Y CORTES DE APANTALLAMIENTO	X			
		MEMORIAS DISEÑO ELECTRICO				
	DOC 01	Declaración RETIE DISEÑO	X			
	DOC 02	MEMORIA CALCULO RETIE	X			
	DOC 03	ESPECIFICACIONES ILUMINACIÓN	X			10 DOCUMENTOS
6		**PROYECTO VOZ Y DATOS- DETECCIÓN Y CCTV**				DIEGO ALEXANDER MEDINA TIBANÁ CN 205-97182
	VYD 01	RED CCTV	X			
	VYD 02	RED DE DETECCIÓN	X			
	VYD 03	RED DE VOZ Y DATOS	X			
	VYD 04	MEMORIA ESPECIFICACIÓNES	X			DOCUMENTO

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

	INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATANTE	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO DEL INFORME	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA EL**	sábado, 31 de agosto de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

Labor a Realizar	Equipo Utilizado					
	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Certificado Vigente hasta	No. Serie / ID	OBSERVACION
COMPACTACIÓN	N/A	RANA	N/A	N/A		Se utiliza en actividad de compactación para muro de contención
MEDICIONES	N/A	Cinta metrica	N/A	N/A		Medición dimensiones
PLOMOS	N/A	Plomada centro y punto	N/A	N/A		Verificación de pañetes
VERIFIACIÓN DE ESCUADRAS	N/A	Escuadra metálica	N/A	N/A		Intersecciones de muros y pañetes
VERIFICACIÓN DE NIVELES	N/A	Nivel de precisión	N/A	N/A		Se utiliza para niveles de piso, sobre cimiento y losa de contrapiso
CONCRETOS	N/A	MEZCLADORA	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal
CONCRETOS	N/A	VIBRADOR DE CONCRETO	N/A	N/A		Se utiliza para fundir concretos de Vigas aereas, placa maciza aerea y viga canal

OBS:

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ.JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA EL**	sábado, 31 de agosto de 2024
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO	X		
- Estado del equipo	X		Cumple condiciones de la maquina
- Regularidad del mantenimiento	X		Interventoría solicita mantenimiento acorde al plan de calidad
- Vibraciones /Ruidos	X		No presenta
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Cumple condiciones de la maquina
- Idoneidad operarios	X		Cumple condiciones de la maquina
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	x		
- Buen estado	x		
- Fácil acceso y operación	x		
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		Se reitera al contratista que el personal debe contar con la dotacion completa , falta uso adecuado EPP
- Buen estado	X		Se hace cambio periódico según el estado de los implementos de seguridad industrial
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Se evidencia que se ha instalado la señalizacion pertinente teniendo en cuenta las actividades realizadas
- Uso según zona de trabajo	X		Se solicita al contratista, implementar medidas de seguridad para trabajo en altura ya que se comienza a armar formaleta para vigas aéreas
VIGILANCIA			
- Personal suficiente		N/A	
- Diurna		N/A	
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		Se solicitó entrega de planillas de afliaciones, examenes de ingreso, egreso y periodicos, ademas de copia de las planillas de pago
CHARLAS DE SEGURIDAD			
Charla de seguridad	X		Una vez por semana
ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRA			
Aseo	X		Se hace aseo una vez por semana
Circulaciones	X		Se mantienen circulaciones despejadas y aseadas

SUPERVISOR ENTIDAD DRA. ANDREA CATALINA PINZÓN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE CORRESPONDENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA EL**	sábado, 31 de agosto de 2024
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	FECHA	MEDIO DE ENVÍO	ESTADO			ASUNTO
			ENVIO	RECIBIO	RESPUESTA	
1	1/8/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	CEROM-ESE-SUPERVISIÓN	SI	INVITACIÓN COMITÉ
2	2/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	OF 047 CONCEPTO PRÓRROGA 04
3	3/8/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	SOLICITUD MODIFICATORIO ITEMS NO PREVISTOS
4	5/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	SABANA ACTA MODIFICATORIA 01 Y SOPORTES
5	5/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	OF 048 CONCEPTO SOLICITUD MODIFCATORIO 01
6	5/8/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	SABANA ACTA MODIFICATORIA 01 Y SOPORTES
7	5/8/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	INFORME TÉCNICO ITEMS NO PREVISTOS
8	7/8/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	INFORME DE OBRA #12 JULIO
9	8/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	CONCEPTO INTERVENTORÍA SOLICITUD PRÓRROGA
10	9/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	CEROM DE COLOMBIA	SI	OBSERVACIONES A INFORME DE OBRA #12
11	9/8/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	CEROM-INTERVENTORÍA	SI	INVITACIÓN REUNIÓN SECRETARIA DE SALUD
12	10/8/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	CEROM-INTERVENTORÍA	SI	PRÓRROGA 04 OBRA E INTERVENTORÍA
13	10/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	PRÓRROGA 04 INTERVENTORÍA FIRMADA
14	10/8/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	PRÓRROGA 04 OBRA FIRMADA
15	12/8/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	INFORME DE OBRA #12 JULIO CORREGIDO
16	13/8/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	PÓLIZAS PRÓRROGA 04 OBRA
17	13/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	CONCEPTO PÓLIZAS PRÓRROGA 04
18	14/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME #12 INTERVENTORÍA JULIO
19	14/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME DE OBRA #12 JULIO
20	14/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	INFORME SST #12 JULIO
21	16/8/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	CEROM-INTERVENTORÍA	SI	LINK DRIVE MODIFICATORIO - ADICIONAL
22	22/8/2024	E-MAIL	CEROM	INTERVENTORÍA	SI	REGISTRO FOTOGRÁFICO
23	22/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	REGISTRO FOTOGRÁFICO
24	27/8/2024	E-MAIL	ESE LA UVITA	CEROM-INTERVENTORÍA	SI	INVITACIÓN COMITÉ 017
25	30/8/2024	E-MAIL	INTERVENTORÍA	ESE-SUPERVISIÓN	SI	SOLICITUD MODIFICATORIO ITEMS NO PREVISTOS

observaciones adicionales:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE COMITES

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"		
PERIODO	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA EL**	sábado, 31 de agosto de 2024
CONTRATISTA	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

No.	FECHA	REFERENCIA (INTERNO, TECNICO, ADMINISTRATIVO)	OBJETO DEL COMITÉ	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
	22/8/2024	INFORMATIVO	REQUISITOS PARA SOLICITAR ADICIONAL ANTE GOBERNACIÓN	1. Presentación de requisitos y documentos para solicitud de traslado de los fondos del proyecto desde la gobernacion a la ESE. 2. Presentación de requisitos y documentos para la solicitud de acta modificatoria y adicional para el proyecto.	Cargar en el drive suministrado, todos los documentos y soportes de la sabana tanto de modificatorio como la de solicitud de adcional.
17	29/8/2024	TÉCNICO	Seguimiento a proyecto	1. Lectura del acta anterior 2. Verificación de la ejecución del proyecto acorde a la programación presentada por el contratista. 3. Verificación de compromisos de solicitudes mediante oficios, y cumplimiento de los mismos. 4. Estado de avance de la obra. 5. Verificación proceso técnico. 6. Solicitudes de contratista de obra. 7. Solicitudes de la entidad contratante 8. Recomendaciones y sugerencias de interventoría 9.Otros y varios 10. Compromisos	SUBIR INFORMACIÓN AL DRIVE PARA MODIFICATORIA Y ADICIONAL INTERVENTORÍA DEBE PRESENTAR AL NUEVO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN TRAMITAR MODIFICATORIO Y ADICIONAL ANTE GOBERNACIÓN

observaciones adicionales:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ARQ. JONATHAN PARDO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FIRMA NOMBRE DEL REVISOR

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE PERSONAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 13

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/8/2024 Y EL 31/8/2024 PLAZO: 13 MESES y CUARENTA Y CINCO DIAS

CONTRATISTA: CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2 — CONTRATO No. 2023-045

INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3 — CONTRATO No. 2023-047

SUPERVISOR: ING. OSCAR RODRIGUEZ - ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA — CONTRATO No. N/A

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES	AGOSTO																													OBSERVACIONES
	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO					D							D							D	F						D							
DIRECTOR DE OBRA		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
RESIDENTE DE OBRA		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
INSPECTOR DE OBRA																																	
PROFESIONAL HSQE																																	
PROFESIONAL SOCIAL																																	
ALMACENISTA		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
MAESTRO		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
OFICIAL		9	8	8		6	5	4	5	5	5		5	7	7	6	6				3	6	6	6	6		6	5	5	5	5	5	
AYUDANTE		11	11	11		11	11	11	11	11	10		10	10	10	10	10				0	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	
CELADOR		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**0**	**25**	**24**	**24**	**0**	**22**	**21**	**20**	**21**	**21**	**20**	**0**	**20**	**22**	**22**	**21**	**21**	**0**	**0**	**0**	**8**	**21**	**21**	**21**	**21**	**0**	**21**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**TOTAL PERIODO** 517

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA	**0**	**11**	**11**	**11**	**0**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**248**	**47,97%**	
De la región		11	11	11	0	11	11	11	11	11	10	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	248	47,97%	
De fuera de la región																																	0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA	**0**	**0**	**8**		**0**	**6**	**5**	**4**	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**7**	**7**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**3**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**127**	**24,56%**	
De la región			2	4	0	4	4	4	4	4	2	0	3	4	4	4	4	0	0	0	3	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	90	17,41%	
De fuera de la región			6	4	0	2	1	0	1	1	3	0	2	3	3	2	2	0	0	0	0	2	2	2	2	0	2	1	1	1	1	1	45	8,70%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**46**	**8,90%**	
De la región			1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	23	4,45%	
De fuera de la región			1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	23	4,45%	
POBLACIÓN VULNERABLE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
En condición de desplazamiento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
PROVEEDORES																																			
Local	FERRETERIAS Y DEPOSITOS LOCALES																																		
Nacional	Todos																																		
Internacional	Ninguno																																		

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Se evidencia disminución de personal de acuerdo , se insiste en la dotación de los EPPS y elementos de seguridad personal especialmente en labores de altura, de igual manera, se insiste en las charlas, capacitaciones e implementación del SG SST al personal porque se evidencia que hay indisciplina en el uso de estos elementos y protocolos de seguridad.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	ESTADO DEL TIEMPO

PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
CONTRATISTA:	CEROM DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA
PERIODO 13	DEL: 1/8/2024 HASTA: 31/8/2024

#	DIA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	DIA	J		V		S		D		L		M		M		J		V		S		D		L		M		M		J		V	
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)							X														X		X				X		X		X	
3	LLOVIZNA (LL)																																
4	LLUVIA FUERTE (LLF)																X																
5	NUBLADO (NB)	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X		X		X		X
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

	DIA	17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31			
	DIA	S		D		L		M		M		J		V		S		D		L		M		M		J		V		S			
	JORNADA	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
1	SECO (SE)																																
2	SOLEADO (SL)	X		X		X		X				X				X												X		X			
3	LLOVIZNA (LL)																																
4	LLUVIA FUERTE (LLF)														X								X										
5	NUBLADO (NB)		X		X		X		X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X		
6	GRANIZO (GZ)																																
7	OTRO																																

Observaciones:_____

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	INFORME # 13

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/8/2024 **Y EL** 31/8/2024

CONTRATANTE: ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

CONTRATISTA: CEROM DE COLOMBIA S.A.S. NIT 820.003.010 - 2 — CONTRATO No. 2023-045

INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA NIT 901.738.692 - 3 — CONTRATO No. 2023-047

SUPERVISOR: ING. OSCAR RODRIGUEZ -ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

#	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	CCF	PLANILLA #	CARGO	OBSERVACIONES
1	JOSE BERNARDO	CONTRERAS RODRIGUEZ	1100476	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	MARESTRO DE OBRA	
2	JEYSON JOSE	ROMERO QUINTERO	1049647963	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	30879658	RESIDENTE DE OBRA	
3	SANTIAGO	ACUÑA SUESCA	4249073	CAJACOPI	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
4	CARLOS ARTURO	BERRIO CACERES	5440859	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
5	OSCAR JAVIER	BLANCO DUARTE	1002698742	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
6	JOSE MIGUEL	BOTIA MORALES	4239368	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
7	DAVID LEONARDO	BOTIA MURILLO	1002698905	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
8	YULIAN ALEJANDRO	CACERES BERRIO	1056994069	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
9	REYES JULIO	CACERES JIMENEZ	4240128	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
10	HERNAN	CONTRERAS RODRIGUEZ	1090399182	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
11	YIMY JAVIER	DIAZ CARRILLO	1049413692	CAJACOPI	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
12	LUIS EBERTO	GALVIS NIÑO	4240055	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
13	HILDEBRANDO	JAIME LIMAS	11443434	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
14	JOSE LIBARDO	LIMAS QUINCHARA	1056994947	SANITAS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
15	JULIO CESAR	MEDINA REYES	1049647255	FAMISANAR	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
16	BRAYAN STIVEN	MEDINA VERANO	1010030728	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
17	CARLOS ALBERTO	MESA	4060131	CAJACOPI	SURA	COLFONDOS	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
18	JOSE ALEXANDER	MONSALVE RAMIREZ	74377900	COOSALUD	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
19	DAIRO ALONSO	RISCANEVO VELANDIA	1056994798	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
20	RAFAEL	SIPAMOCHA NOPE	1100502	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
21	MANUEL ANTONIO	SOCONGOCHA RODRIGUEZ	1055186223	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	
22	GEINER ELI	TUMAY GIRON	1118774601	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	COMFABOY	30879658	AYUDANTE	

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 13

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA EL**	sábado, 31 de agosto de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN



EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN



MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO



MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO



PLACA BASE EN CONCRETO



PLACA BASE EN CONCRETO



UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 13

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA EL**	sábado, 31 de agosto de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACERO DE REFUERZO



ACERO DE REFUERZO



ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA



ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA



CUBIERTA EN POLICARBONATO



CUBIERTA EN POLICARBONATO



UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 13

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA EL**	sábado, 31 de agosto de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

MURO EN BLOQUE



MURO EN BLOQUE



PAÑETES



PAÑETES



ALISTADO DE PISO



ALISTADO DE PISO



PINTURA FACHADAS

PINTURA FACHADAS

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	INFORME 13

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.		
PERIODO	jueves, 01 de agosto de 2024	**HASTA EL**	sábado, 31 de agosto de 2024
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA		

ACTIVIDADES REALIZADAS





EDWARD JONATHAN PARDO PARADA
RESIDENTE A. DE INTERVENTORIA

ANEXOS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30879658
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CEROM DE COLOMBIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	820003010	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 10 36 OFC 210	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CEROMLIMITADA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7401245
FAX	7401245	SUCURSAL	17	NOMBRE SUCURSAL	ESELAUVITA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	74363121	PRIMER APELLIDO	MONTENEGRO	SEGUNDO APELLIDO	SALCEDO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ROBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
22		$19.106.354		30879658

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-4249073	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	ACUÑA SUESCA SANTIAGO	$1.300.000
CC-5440859	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BERRIO CACERES CARLOS ARTURO	$1.300.000
CC-1002698742	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BLANCO DUARTE OSCAR JAVIER	$1.300.000
CC-4239368	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BOTIA MORALES JOSE MIGUEL	$1.300.000
CC-1002698905	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	BOTIA MURILLO DAVID LEONARDO	$1.300.000
CC-1056994069	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CACERES BERRIO YULIAN ALEJANDRO	$1.300.000
CC-4240128	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CACERES JIMENEZ REYES JULIO	$1.300.000
CC-1090399182	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CONTRERAS RODRIGUEZ HERNAN	$1.300.000
CC-1100476	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE BERNARDO	$1.300.000
CC-1049413692	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	DIAZ CARRILLO YIMY JAVIER	$1.300.000
CC-4240055	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	GALVIS NIÑO LUIS EBERTO	$1.300.000
CC-11443434	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	JAIME LIMAS HILDEBRANDO	$1.300.000
CC-1056994947	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	LIMAS QUINCHARA JOSE LIBARDO	$1.300.000
CC-1049647255	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MEDINA REYES JULIO CESAR	$1.300.000
CC-1010030728	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MEDINA VERANO BRAYAN STIVEN	$1.300.000
CC-4060131	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MESA CARLOS ALBERTO	$1.300.000
CC-74377900	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	MONSALVE RAMIREZ JOSE ALEXANDER	$1.300.000
CC-1056994798	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	RISCANEVO VELANDIA DAIRO ALONSO	$1.300.000
CC-1049647963	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	ROMERO QUINTERO JEYSON JOSE	$1.859.682
CC-1100502	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	SIPAMOCHA NOPE RAFAEL	$1.300.000
CC-1055186223	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	SOCONGOCHA RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO	$1.300.000
CC-1118774601	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	TUMAY GIRON GEINER ELI	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 4249073																													0		
CC - 5440859			X	2024-08-01																									0		
CC - 1002698742			X	2024-08-01																									0		
CC - 4239368																													0		
CC - 1002698905																													0		
CC - 1056994069			X	2024-08-01																									0		
CC - 4240128			X	2024-08-01																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1090399182																													0		
CC - 1100476																													0		
CC - 1049413692																													0		
CC - 4240055																													0		
CC - 11443434																													0		
CC - 1056994947			X	2024-08-01																									0		
CC - 1049647255			X	2024-08-01																									0		
CC - 1010030728			X	2024-08-01																									0		
CC - 4060131																													0		
CC - 74377900			X	2024-08-01																									0		
CC - 1056994798																													0		
CC - 1049647963																													0		
CC - 1100502																													0		
CC - 1055186223																													0		
CC - 1118774601																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 4249073	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 5440859	PROTECCION	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1002698742	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 4239368	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1002698905	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994069	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 4240128	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1090399182	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1100476	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1049413692	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 4240055	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 11443434	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1056994947	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1049647255	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1010030728	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 4060131	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 74377900	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1056994798	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1049647963	PORVENIR	30	$1.859.682	0.1600000	$297.600	$0	$0	$297.600	$0	$0	$0
CC - 1100502	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1055186223	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1118774601	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4249073	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 5440859	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1002698742	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 4239368	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1002698905	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1056994069	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 4240128	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1090399182	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1100476	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1049413692	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 4240055	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 11443434	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1056994947	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049647255	FAMISANAR	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1010030728	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 4060131	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 74377900	EPS-S COOSALUD	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	82000301 0	0.0696000	$3.100
CC - 1056994798	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1049647963	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.859.682	0.0400000	$74.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.859.682	82000301 0	0.0696000	$129.500
CC - 1100502	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500
CC - 1055186223	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1118774601	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	82000301 0	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4249073	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5440859	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002698742	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4239368	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002698905	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994069	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4240128	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090399182	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100476	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049413692	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4240055	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11443434	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994947	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049647255	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010030728	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4060131	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-74377900	COMFABOY	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1056994798	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1049647963	COMFABOY	30	$1.859.682	0.0400000	$74.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100502	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1055186223	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1118774601	COMFABOY	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$624.000	$0	$0	$0	$0	2	$1.000	$0	$0	$625.000
PORVENIR	15	$1.802.600	$0	$0	$0	$0	2	$2.700	$0	$0	$1.805.300
PROTECCION	3	$423.000	$0	$0	$0	$0	2	$700	$0	$0	$423.700
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	2	$400	$0	$0	$208.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$53.800	$0	0	$0	0	$0	$53.800	2	$100	$0	$53.900	$0	0	$0	$0	$53.900	$0	$0	$53.900
EPS CAJACOPI	3	$156.000	$0	0	$0	0	$0	$156.000	2	$300	$0	$156.300	$0	0	$0	$0	$156.300	$0	$0	$156.300
FAMISANAR	1	$1.800	$0	0	$0	0	$0	$1.800	2	$100	$0	$1.900	$0	0	$0	$0	$1.900	$0	$0	$1.900
SANITAS	6	$111.200	$0	0	$0	0	$0	$111.200	2	$200	$0	$111.400	$0	0	$0	$0	$111.400	$0	$0	$111.400
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$440.200	$0	0	$0	0	$0	$440.200	2	$700	$0	$440.900	$0	0	$0	$0	$440.900	$0	$0	$440.900
EPS-S COOSALUD	1	$1.800	$0	0	$0	0	$0	$1.800	2	$100	$0	$1.900	$0	0	$0	$0	$1.900	$0	$0	$1.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	22	$1.330.800	0	$0	$0	$1.330.800	2	$2.000	$1.332.800	0	$0	$13.328	$1.332.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	22	$764.800	2	$1.200	$766.000
SENA	0	$0	2	$0	$0
ICBF	0	$0	2	$0	$0
ESAP	0	$0	2	$0	$0
MinEdu	0	$0	2	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$766.300
PENSIONES	4	$3.062.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.332.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$766.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.927.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30824690
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL INTER UVITA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901738692	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 4 7 26 BRR CAROLINA	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	LA UVITA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	OFICINAINGENIEROSINTER@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3114655831
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1054254612	PRIMER APELLIDO	MENDIVELSO	SEGUNDO APELLIDO	ALVAREZ
PRIMER NOMBRE	ANDRES	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.638.000		30824690

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7180551	01	No	No	No	15	403	5429001	Fijo	PARDO PARADA EDWARD JONATHAN	$1.638.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7180551																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7180551	PORVENIR	30	$1.638.000	0.1600000	$262.100	$0	$0	$262.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7180551	EPS SURA	30	$1.638.000	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.638.000	1	0.0696000	$114.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7180551	COMFABOY	30	$1.638.000	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$262.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$262.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$65.600	$0	0	$0	0	$0	$65.600	0	$0	$0	$65.600	$0	0	$0	$0	$65.600	$0	$0	$65.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$114.100	0	$0	$0	$114.100	0	$0	$114.100	0	$0	$0	$114.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	1	$65.600	0	$0	$65.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$65.600
PENSIONES	1	$262.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$114.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$65.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$507.400

Tunja, 13 de Agosto de 2024

Señores
EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA
ATTE. DRA ANDREA CATALINA PINZON BOTÍA
LA UVITA.

REFERENCIA: CONTRATO 2023-045.

ASUNTO: RADICADO POLIZAS PRORROGA 4.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito radicar pólizas correspondientes a la Prorroga No.4 del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ).

Poliza Cumplimiento No. 68859 ANEXO 7
Póliza REC 20154 ANEXO 8

Atentamente,

JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
R/L CEROM DE COLOMBIA SAS
C.C. 74.363.121
Celular 3134963719

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050006885900076BOG202408121440552

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 1.417.974,00	COP 10.000,00	COP 271.315,00	COP 1.699.289,00	11/09/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 4 DE FECHA 10/08/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0006 EMITIDO EN FECHA 28/06/2024 Y SEGUN PRORROGA 3 DE FECHA 27/06/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0005 EMITIDO EN FECHA 26/04/2024 Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 18/01/2024 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/01/2024 Y SEGUN PRORROGA 1 Y SUSPENSION 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/12/2023 Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/08/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/08/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 732.569.086,00

Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025

Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

CARATULA

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 549.426.814,35
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/11/2027
Prima de la Cobertura : COP 254.693,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 13/11/2024, hasta las 0 hs del 13/11/2029

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 366.284.543,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 166.183,00

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

ASEGURADO	BENEFICIARIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA CALLE 7 N. 7-18 LA UVITA BOYACA NIT: 8260022027 Teléf. 3204485829

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
0500068859000076BOG202408121440552

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 1.417.974,00	COP 10.000,00	COP 271.315,00	COP 1.699.289,00	11/09/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 4 DE FECHA 10/08/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0006 EMITIDO EN FECHA 28/06/2024 Y SEGUN PRORROGA 3 DE FECHA 27/06/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0005 EMITIDO EN FECHA 26/04/2024 Y SEGUN PRORROGA 2 DE FECHA 23/04/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 18/01/2024 Y SEGUN ACTA DE REINICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 17/01/2024 Y SEGUN PRORROGA 1 Y SUSPENSION 1 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/12/2023 Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 24/08/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 16/08/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

CONTINUA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	68859 / 7
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 10/08/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 13/11/2029.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	05 - 0068859 / 007

CARATULA

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 549.426.814,35
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/11/2027
Prima de la Cobertura : COP 254.693,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 13/11/2024, hasta las 0 hs del 13/11/2029

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 366.284.543,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 166.183,00

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS --- COP 732.569.086,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 16/08/2023, hasta las 0 hs del 14/03/2025
Prima de la Cobertura : COP 332.366,00

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S CL 4 4 36 TUNJA BOYACA NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	TERCEROS AFECTADOS

PRORROGA DE VIGENCIA

CODIGO DE VERIFICACION :
060002015400088BOG202408121513519

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 167.397,00	COP 10.000,00	COP 33.705,00	COP 211.102,00	11/09/2024

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

CARATULA

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN PRORROGA 4 DE FECHA 10/08/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 14/11/2025

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN SMMLV AÑO 2024,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 29/06/2025

==========

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OFICIO DE FECHA 18/12/2023 SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 16/08/2023 HASTA 16/01/2025

==========

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2023-045 DE FECHA 11/07/2023 CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”.

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 SERAN CONSIDERADOS COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

CARATULA

SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826002202-7 Y DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT 891800498-1 COMO ASEGURADOS ADICIONALES, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO “LIMITE POR EVENTO” Y “LIMITE POR VIGENCIA” PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO “PLO” QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 260.000.000,00

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.
7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo “Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad”.

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos”

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

==========

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:
==========

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

CARATULA

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 260.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 260.000.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 52.000.000,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 52.000.000,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 26.000.000,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CEROM DE COLOMBIA. S.A.S	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20154 / 8
CL 4 4 36 TUNJA BOYACA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 12/08/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/08/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/11/2025.	
NIT: 8200030102 Teléf. 3134963719	NUMERO DE FACTURA	06 - 0020154 / 008

CARATULA

** RC PATRONAL:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 4.640.000,00

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	08	2024	16	08	2023	00:00	13	11	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA	NIT: 901.738.692-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	NIT: 826.002.202-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2023-047 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN LA PRORROGA No.04 AL CONTRATO DE OBRA No.2023-047 FIRMADA EL 10-08-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA .
- DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****200,876.00	$ *******3,000.00	$ ******38,736.00	$ **********242,613.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	08	2024	16	08	2023	00:00	13	11	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA		**NIT: 901.738.692-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	**NIT: 826.002.202-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	16/08/2023	13/11/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101216081	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	08	2024	16	08	2023	00:00	13	11	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL INTER UVITA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.738.692-3**

DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA — **CIUDAD:** CASTILLA NVA, META — **TELÉFONO:** 3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 826.002.202-7**

DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18 — **CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA — **TELÉFONO:** 7895077

BENEFICIARIO: 826002202 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARM CONSULTING SAS	822007239-7	8.00
BOHORQUEZ SALAMANCA SANDRA MARCELA	1057410858-1	92.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101216081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101420720	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	08	2024	16	08	2023	00:00	13	11	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTER UVITA	NIT: 901.738.692-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	CASTILLA NVA, META	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA	NIT: 826.002.202-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 7 NRO. 7 - 18	LA UVITA, BOYACA	7895077

ADICIONAL: DEPARTAMENTO DE BOYACA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 2023-047 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/08/2023	13/03/2025	$39,625,629.20	$39,625,629.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	16/08/2023	13/03/2025	$39,625,629.20	$39,625,629.20
CALIDAD DEL SERVICIO	16/08/2023	13/03/2025	$19,812,814.60	$19,812,814.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/08/2023	13/11/2027	$29,719,221.90	$29,719,221.90

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN LA PRORROGA No.04 AL CONTRATO DE OBRA No.2023-047 FIRMADA EL 10-08-2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA .
- DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******97,869.00	$ *******8,000.00	$ ******20,115.00	$ ***********125,985.00	$ ******128,783,294.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
HR ASESORES INTEGRALES LTDA	194664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101420720	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	08	2024	16	08	2023	00:00	13	11	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL INTER UVITA			**NIT: 901.738.692-3**
DIRECCIÓN: CR CARRERA 4 NRO. 7 - 26 BRR CAROLINA	**CIUDAD:** CASTILLA NVA, META	**TELÉFONO:**	3208029608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LA UVITA			**NIT: 826.002.202-7**
DIRECCIÓN: CL 7 NRO. 7 - 18	**CIUDAD:** LA UVITA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7895077

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARM CONSULTING SAS	822007239-7	8.00
BOHORQUEZ SALAMANCA SANDRA MARCELA	1057410858-1	92.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101420720, anexo 8, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de AGOSTO de 2024

21-44-101420720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	29/08/2024	**COMITÉ N° :**	17
HORA DE INICIO:	09:30 a.m.	**TERMINACIÓN:**	11:00 a.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL	**OBJETO:**	SEGUIMIENTO TÉCNICO
CONTRATO #	2023-045		
OBJETO CONTRATO DISEÑOS Y DE OBRA:	*CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ*		
CONTRATANTE:	ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA NIT 826.002.202 - 7		
CONTRATISTA DE OBRA:	CEROM DE COLOMBIA SAS NIT 820.003.010-2 R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO CC 74.363.121 de Sutatenza		
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA - NIT 901.738.692 - 3 R/L: ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ		
SUPERVISIÓN:	ANDREA CATALINA PINZON BOTIA - GERENTE E.S.E. GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS - SUPERVISOR CPS 2023-044		

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (POSIBLES OBSERVACIONES)

SE HACE LECTURA DEL ACTA ANTERIOR SIN OBSERVACIONES

2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE	CUMPLE (S/N/P)	OBSERVACIONES
ADICIONAL Y PRÓRROGA	CEROM	SI	
MODIFICATORIO	CEROM	SI	

3. AGENDA DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR	7. SOLICITUDES CONTRATISTA DE OBRA
2. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	8. RECOMENDACIONES Y/O SOLICITUDES DE INTERVENTORÍA
3. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS	9. OTROS Y VARIOS
4. ESTADO AVANCE DE OBRA	10. COMPROMISOS PRÓXIMO COMITÉ
5. VERIFICACIÓN DE PROCESO TÉCNICO	
6. SOLICITUDES DEL CONTRATANTE	

4. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Se dá lectura sin observaciones. **2. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** Contratista informa que el avance a la fecha es del

69,85% ejecutado, que el porcentaje programado es del 72,57%, el tiempo transcurrido es del 83,33% lo que índica un atraso de 2,72% con respecto al avance programado.

3. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS: 3.1 MODIFICATORIO El ingeniero Oscar Rodriguez, por parte de la supervisión informa que no se ha presentado la totalidad de los

documentos para la presentación del modificatorio, de acuerdo a los requisitos solicitados por parte de la secretaría de salud. Las carpetas del drive están incompletas a lo que el

contratista solicita plazo para completar los documentos para el jueves 5 de septiembre, por lo tanto el supervisor responde que en ese caso luego de revisar los documentos, el los

FECHA PRESENTE ACTA	29/08/2024	COMITÉ N° :	17

estaría radicando entre el 9 y 10 de septiembre, siempre y cuando no hayan observaciones al respecto.

3.2 ADICIONAL Y PRÓRROGA: Luego de generar el balance proyectado del valor final de la obra, se presenta y se solicita el adicional y prórroga en tiempo 01 a la entidad.

De igual manera el ing Oscar informa que no se han montado al drive la totalidad de los documentos, también solicita que se presente de nuevo la solictiud y se informe que tiempo

se necesita para terminar la obra, a lo que le contratista responde que se está calculando el tiempo y que es probable que se entregue en el mes de marzo de 2025, sin embargo

aclara que se está generando aún la proyección del tiempo que se necesita.

4. ESTADO DE AVANCE DE OBRA: Se informa que a la fecha se están ejecutando las actividades de pañetes y pintura en el cuarto eléctrico, que se ejecutó la estructura del

cuarto de bombas, se están fabricando bordillos y andenes vaciados en concreto, la ducteria de la red eléctrica está a un 90% de ejecución en el bloque 1 y 2 y las cajas de

inspección ya están terminadas y se están fabricando las tapas para las mismas.

5. VERIFICACIÓN DEL PROCESO TÉCNICO: Interventoría informa que los procesos se han llevado a cabo de acuerdo a los diseños y en cumplimiento de la normatividad.

Sin embargo recomienda tener cuidado con el bombeo de los andenes para evitar empozamientos.

6. SOLICITUDES CONTRATANTE DE OBRA: La doctora Catalina informa que el día martes 27 de agosto se radicaron los papeles por parte de la ESE para la solictud del traslado

de los recursos de la gobernación a la ESE, por tanto la dra Magda, solicita se le envíen los documentos como sabana y soportes para realizar el acta modificatoria, para lo cual la

interventoría se compromete a enviar los documentos de inmediato para la generiación del acta. **7. SOLICITUDES DEL CONTRATATISTA:** El contratista solicita que se genere

el acta modificatoria para ellos a su vez poder generar el acta de cobro 01 dado que el avance está cercano al 70%, y aduce que es urgente poder cobrar para poder cumplir con

los compromisos del proyecto. **8. RECOMENDACIONES DE INTERVENTORIA:** Interventoría solicita que la información sea cargada en el drive lo antes posible para no retrasar

más el proceso ante la secretaría y la gobernación, interventoría también solicita las pruebas a las tuberías dado que ya se hicieron la conexiones al alcantarillado y de la tubería

de suministro. **9. OTROS Y VARIOS:** El ing Oscar, supervisor por parte de la ESE, informa que la interventoría no cuenta con director de interventoría y que ya pasó un mes y no se

ha presentado al profesional que va a asumir el cargo y las funciones propias del mismo, por tanto hace solicitud mediante la presente acta que se incluya al profesional faltante,

por tanto la interventoría responde que no ha sido facil encontrar un profesional que cumpla con el perfil propuesto para el proyecto, sin embargo se compromete a solucionar lo

más pronto posible. A lo cual la doctora Magda hace llamado de atención e informa que de no cumplirse con el requisito se tendría que suspender el contrato hasta tanto no se

cuente con el profesional faltante. Por tante hace requirimiento verbal a la interventoría y queda como compromiso por parte de la interventoría, completar el staff solicitado.

10. COMPROMISOS: 10.1 El contratista se compromete al día 5 de septiembre, tener la información completa y cargada en el drive para continuar con el proceso de solicitud

del adicional y modificatorio. **10.2** Interventoría se compromete a enviar los documentos soporte del modificatorio. **10.3** Supervisión se compromete máximo al día 10 de

septiembre a revisar y hacer el trámite de los documentos ante la secretaría de salud y gobernación. **10.4** Interventoría se compromete a ingresar al director de interventoría.

UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"	UNIÓN TEMPORAL INTER UVITA 2023-047
		ACTA DE COMITÉ

FECHA PRESENTE ACTA	29/08/2024	COMITÉ N° :	17

COMPROMISOS PACTADOS


Compromiso	Fecha máx.. Cumplimiento	Responsable
INFORMACIÓN COMPLETA PARA ADICIONAL Y MODIFICARORIO EN DRIVE	05/09/2024	CEROM E INTERVENTORÍA
SOLICITUD DE ADICIONAL Y MODIFICATORIO	10/09/2024	SUPERVISIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INMEDIATO	UT INTERUVITA

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:		LUGAR	OBRA ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	TIPO ANEXO	QUIEN ENTREGA

PARTICIPANTES (En constancia Firman)

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
CATALINA PINZÓN	GERENTE ESE	ESE CENTRO DE SALUD	3204485829	
OSCAR RODRIGUEZ	SUPEVISOR ESE	ESE CENTRO DE SALUD	3132335522	
JONATHAN PARDO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	UT INTER UVITA	3174359034	
JEYSON ROMERO	RESDIENTE DE OBRA	CEROM DE COLOMBIA SAS	3504525729	
MAGDA CORDOBA	JURIDICA ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA	ESE CENTRO DE SALUD		

Fecha: 01 de Agosto de 2024

Actividades: Corte y ensamble de estructura metalica para soporte de cubierta exterior del bloque 01 (entrada ambulancia)
- Excavaciones manuales para tubería alcantarillado 10" para conexión a red principal
- Instalación de tubería alcantarillado de 10" para conexión a red principal
- Instalación silleta yee 16" x 10" para conexión de alcantarillado de la red interna a la red principal
- Instalación de ladrillo común para cárcamos de red eléctrica del bloque 04.
- Instalación de tubería eléctrica de techo para bloque 01 (zona procedimientos - sala ERA).
- Figuración de acero de refuerzo para vigas de cimentación y columnas del cuarto de bombas.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para placa bajo del cuarto eléctrico (b04)
- Se instala estuco para muros internos del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra a.
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
2 Electricistas
1 Ornamentador
11 Oficiales

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor
Equipo soldadura

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para placa base del bloque 04 #171. Interventoría recomienda hacer cajas de inspección que hacen falta de los desagües para proteger las tuberías y evitar la contaminación de los flujos y posibles taponamientos.

Res. Obra a

Res. Interventoría.

Fecha: 02 de Agosto de 2024

Actividades: Instalación de ladrillo común para cárcamos de red eléctrica del blogue 04.
- Se instala pañete para cárcamos del cuarto eléctrico (blogue 04)
- Excavaciones manuales para cajo de inspección eléctrica frente al blogue 04.
- Instalación de acero de refuerzo para zapatas, vigas de cimentación y columnas del cuarto de bombas
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para zapatas y vigas de cimentación del cuarto de bombas
- Se instala blogue #5 para muros del blogue 04
- Instalación de grafil para refuerzo de muros del blogue 04.
- Se instala geotextil para filtro de muro de contención.
- Instalación de tubería de drenaje de 4" para filtro del muro de contención
- Se instala grava para filtro de muro de contención.
- Instalación de estuco y pintura vinilo para muros internos del blogue 02.
- Instalación de tubería eléctrica de techo para blogue 02

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
2 Electricistas
11 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de cimentación del blogue 04 #172. Interventoría recomienda despejar el área del vecino en zona de muro de contención, hacer el relleno y conformar el terreno para evitar inconvenientes con el propietario.

Obra a. Resid Interventoría

Fecha: 03 de agosto de 2024

Actividades:- Instalación de estuco y pintura para muros internos del bloque 02 (esterilización - depósito - medicina general)
- Se instala bloque #5 para muros de cuarto eléctrico
- Instalación de grafil para muros del bloque 04
- Se instala panelete para muros del bloque 03 (salón multiple)
- Se instala grava para filtro de muro de contención.
- Instalación de geotextil para muro de contención
- Se instala tubería eléctrica de techo para bloque 02 (esterilización)
- Se instala panelete para circuitos de red eléctrica del bloque 04
- Se instala vinilo para exteriores para fachadas del bloque 02 (cara baja).
- Ingreso de material (grava 3/4 m^3)

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
2 Electricistas
4 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Medio Nublado) - Tarde (Medio Nublado)

Observaciones: Interventoría solicita sellar y aplicar antioxidante en las uniones de la estructura metálica para evitar corrosión y daños en la estructura. Interventoría recomienda dar acabado a los muros superiores de fachada antes de instalar el policarbonato para evitar daños en el mismo.

Residente Obra

Resid Interventoría

Fecha: 04 de agosto de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 05 de agosto de 2024

Actividades: - Instalación de bloque #5 para muros del bloque 04 (cuarto eléctrico
- Se instala geotil para refuerzo de muros en bloque #5 del cuarto eléctrico
- Se instala pañete para cajas de red eléctrica del bloque 04.
- Instalación de geotextil para muro de contención
- Se instala grava para filtro del muro de contención
- Instalación de vinilo para extensores del bloque 02
- Instalación de acero de refuerzo para columnas del cuarto de bombas.
- Se aplica anticorrosivo y vinilo para estructura metálica de cubierta entre bloque 01 y bloque 02
- Ingreso de material (grava para relleno 8 m^3)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
6 Oficiales
4 Auxiliares.

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría solicita los resultados de los cilindros de concreto del último mes

Residente Obra

Resd. Interventoría

Fecha: 06 de agosto de 2024

Actividades: Se instala bloque #5 para muros del cuarto eléctrico (Bloque 04)

- Instalación de grafil para refuerzo de muro en bloque #5 del cuarto eléctrico.
- Se instala pernete para cárcamos del cuarto eléctrico
- Instalación de acero de refuerzo para columnas del cuarto de bombas y columnetas del cuarto eléctrico
- Se instala formaleta para columnas del cuarto de bombas y columnetas del cuarto eléctrico
- Se aplica anticorrosivo y vinilo para estructura metalica de soporte de cubierta del bloque 02 (área techada)
- Se instala geotextil para filtro del muro de contención
- Instalación de grava para filtro del muro de contención

Personal en obra: 1 Residente a
1 Res interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
4 Auxiliares
1 Electricista

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda avanzar con la conformación de terreno para los andenes, de igual manera despejar las áreas y retirar la roca y material sobrante. Se recomienda la construcción de las cajas de inspección pendientes de hacer para lograr así la protección de las tuberías expuestas y evitar daños o contaminación de los ductos.

Residente Obra

Resd Interventoría.

Fecha: 07 de agosto de 2024

Actividades: Se instala bloque #5 para muros del cuarto eléctrico
- bloque 04
- Instalación de grafil para refuerzo de muros en bloque #5 del cuarto eléctrico
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnas del cuarto de bombas y columneta del cuarto eléctrico
- Se realizan rellenos para conformación del terreno del muro de contención
- Se instala policarbonato para cubrir externo del bloque #2 (zona baños)
- Se aplica vinilo para muros exteriores del bloque 02 fachada 3
- Se realizan excavaciones para caja de inspección eléctrica frente al bloque 04.

- Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
11 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibradora eléctrica
Compresor.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado.

Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnas del cuarto de bombas y columneta del cuarto eléctrico (#174 - #175).
Interventoría nuevamente recomienda dar acabado a muros de fachada antes de instalar el policarbonato para evitar daños al pintar ya que se puede manchar y dañar el material.
Interventoría recomienda nivelar y conformar el terreno e ir despejando las áreas exteriores.

Residente Obra

Resid. Interventoría

Fecha: 08 de agosto de 2024

Actividades: Se instala bloque #5 para muros del bloque 04 (cuarto eléctrico
- Instalación de grout para refuerzo de muros en bloque #5 del cuarto eléctrico
- Se instala acero de refuerzo para columnas del cuarto de bombas y columnetas del cuarto eléctrico
- Se realizan cortes en bloque para instalación de tubería electrica del bloque 04.
- Se instala pañete para cárcamos del cuarto eléctrico.
- Instalación de policarbonato para cubierta exterior del bloque 02 (bajantes)
- Se realizan rellenos para conformar el terreno posterior al muro de contención.
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 02.
- Ingreso de material (arena de peña 8m³)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
4 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (lluvias fuertes)

Observaciones: Interventoría ve lento el proceso de construcción del cuarto de bombas, por lo tanto sugiere el aumento de personal para dar celeridad a su construcción ya que puede generar atrasos en otras actividades y se recuerda que el plazo se está terminando.

Residente Obra

Resid Interventoría

Fecha: 09 de agosto de 2024

Actividades: Se instala pañete para muros internos del bloque 03 (1ra capa múltiples).
- Instalación de acero de refuerzo para columnas del cuarto de bombas y columnetas del cuarto eléctrico.
- Se instala policarbonato para cubierta exterior entre bloque 01 y bloque 02.
- Se realizan rellenos para conformar el terreno posterior al muro de contención.
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 01.
- Se instala pañete para cárcamos del cuarto eléctrico.
- Se realizan excavaciones para caja de inspección eléctrica frente al cuarto eléctrico.
- Ingreso de material (Grava 1/2": 8m³)

Personal en obra: 1 Residente Obra a. Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoría.
1 Maestro
5 Oficiales
4 Auxiliares.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda acelerar el proceso de construcción del cuarto de bombas, se recomienda allegar los materiales necesarios para tal fin. Se recomienda hacer las instalaciones en muros del bloque 4 antes de pañetar para no hacer cortes en muros luego de pañetar para evitar daños en el mismo. De igual forma se recomienda hacer entrega mediante oficio del predio vecino (sur) al propietario para evitar inconvenientes a futuro.

Res. Obra a. Resd. Interventoría.

Fecha: 10 de agosto de 2024

Actividades: Instalación de policarbonato para cobierta exterior entre bloque 01 y bloque 02
- Se aplica vinilo para exteriores en techados del bloque 01
- Excavaciones manuales para tubería 4" pulgadas Dic ca de red contra incendio frente a procedimiento bloque 02
- Se realiza conformación de terreno para parte posterior al muro de contención.
- Se instala pañete para muros del bloque 03 salón múltiple
- Instalación de acero de refuerzo para columnetas del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Instalación de pañete para cárcamo de bloque 04.

Personal en obra: 1 Residente obra a. Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
10 Auxiliares.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda acometer actividades de piso pendientes de inicio por lo tanto se debe allegar el material necesario para tal fin. Se solicita conformar en muros las diferentes cajas para registros y así poder dar acabado a los muros. Se recomienda dar acabado (pintura) a las estructuras metálicas pendientes de pintar.

Residente Obra a. Resd. Interventoría.

Fecha: 11 de agosto de 2024

Actividades: Sin actividades por día dominical

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Powered by CamScanner

Fecha: 12 de agosto de 2024

Actividades: Instalación de policarbonato para cubierta exterior del bloque 01 (Fachada principal)
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 01.
- Se realizan excavaciones manuales para tubería RCI frente al bloque 02.
- Se instala pañete para muros del bloque 03 salón múltiple
- Se instala ladrillo común para caja de inspección eléctrica y red hidrosanitaria.
- Se instala formaleta para bordillo anden perimetral al bloque 03 (salón múltiple)
- Se realiza conformación de terreno para andenes entre el bloque 02 y el bloque 03.
- Instalación de acero de refuerzo para columnetas del bloque 03 Cuarto eléctrico

Personal en obra: 1 Residente obra a
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda tener especial cuidado con los niveles de acabado de los andenes y zonas exteriores, ya que los materiales de acabado no tienen el mismo espesor y así evitar reprocesos por desniveles. Se recomienda mejorar el rendimiento en la construcción del cuarto de bombas para así dar pronta terminación al bloque #4.

Residente Obra a

Resid. Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 13 de agosto de 2024

Actividades: Instalación de policarbonato para cubierta exterior del bloque 01 (Fachada principal)
- Se instala paneto para muros del bloque 03 salón múltiple
- Instalación de formaleta para bordillo anden perimetral entre bloque 02 y bloque 03
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para bordillo perimetral al bloque 03.
- Se instala ladrillo común para cajas de inpección ele (frente al box) y sanitaria lobby anden exterior (bloque 01)
- Se realiza conformación de terreno para el cuarto de bombas
- Se aplica vinilo para exterior en fachada del bloque 01.
- Se instala paneto para caja de inpección red sanitaria

Personal en obra: 1 Residente obra. Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoria Mezcladora
1 Maestro Vibradora electrica
6 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de bordillo anden perimetral al bloque 03 ##### HFS.
Interventoría recomienda proteger el policarbonato mientras se da el acabado final a los muros de fachada para evitar manchones de pintura u otros daños en el mismo. Se solicita mantener la obra aseada y en completo orden.

Residente Obra. Interventoría

Fecha: 14 de agosto de 2024

Actividades:
- Se aplica anticorrosivo y esmalte para estructura metálica para aguate de cubierta del bloque 02 (Contabilancia)
- Se instala formaleta para bordillo anden perimetral al bloque 02 (esterilización - depósito)
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para bordillo anden perimetral bloque 02
- Se instala ladrillo común para cajas de inspección red aguas lluvias del bloque 01
- Se instala panete para muros del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 03 (Salón múltiple)
- Instalación de accesorios para anillo de apantallamiento de la red eléctrica (bloque 01)
- Se realizan cárcamos para cuarto de bombas (excavaciones - solado)

Personal en obra:
1 Residente obra a.
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
2 Electricistas
10 Auxiliares.

Equipo:
Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador eléctrico
Compresor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto de 2500 psi para bordillo anden perimetral al bloque 02 # 176.
Interventoría recomienda tener especial cuidado con el acabado del bordillo y andenes para evitar reprocesos, el bordillo debe quedar perfectamente alineado y nivelado. Se recomienda dar acabado a las cajas de inspección e instalar las tapas para evitar contaminación al interior.

Res. Obra

Res. Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 15 de agosto de 2024.

Actividades:
- Se instala parete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Se realizan instalaciones para anillo de apantallamiento de red eléctrica (bloque 01)
- Distribución de ladrillo común para cárcamos del cuarto de bombas
- Se instala formaleta para bordillo anden perimetral al bloque 01.
- Se realizan excavaciones manuales para tubería red aguas lluvias del muro de contención
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral
- Se realiza mocha cara en mortero para zona de laboratorio y zona de muestras.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
1 electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda iniciar las actividades pendientes como la instalación de pisos, se recomienda allegar los materiales a obra para evitar mayores atrasos. De igual forma la construcción del cuarto de bombas, se recomienda verificar los niveles de los desagües de los carcamos y evitar contrapendientes.

Residente obra.

Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 16 de agosto de 2024

Actividades: Instalación de pañete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Se realizan instalaciones para anillo de apantallamiento de red eléctrica (bloque 02)
- Instalación de ladrillo común para cárcamos del cuarto de bombas.
- Instalación de formaleta para bordillo anden perimetral bloque 02
- Se realizan excavaciones manuales para tubería de desagüe del muro de contención
- Se realiza media caña en mortero para zona de vaciado y odontología del bloque 01.
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral.
- Se realizan instalaciones eléctricas para iluminación exterior provisional.
- Se realiza aseo general de obra.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
10 Auxiliares
1 Electricista.

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda hacer la instalación de los ductos y cajas eléctricas del bloque #4 para evitar cortes después de haber pañetado. Se debe hacer la revisión de los puntos que se deben instalar.

Obra.

Resd Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha: 17 de agosto de 2024.

Actividades: Sin actividades, día compensatorio por jornada del 7 de agosto.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 18 de agosto de 2024

Actividades: Sin actividades día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 19 de agosto de 2024.

Actividades: Sin actividades, día festivo

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 20 de agosto de 2024

Actividades: Se instala panete en caja de inspección eléctrica frente al bloque 04.
Se realizan instalaciones de accesorios para anillo de apantallamiento de red eléctrica.
Se instala ladrillo común para cárcamos de drenaje del cuarto de bombas.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Res. interventoría
1 Maestro
2 Oficiales
1 Electricista

Equipo: Herramienta menor

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría recomienda despejar por completo el área donde se está ejecutando el apuntallamiento y de igual forma verificar los niveles de instalación para evitar cruces con otras redes.

Residente obra

Resd. Interventoría

Fecha: 21 de agosto de 2024

Actividades: - Instalación de panete para muros internos del bloque 04.
- Se instala formaleta para bordillo andén perimetral del bloque 02.
- Se aplica anticorrosivo y esmalte para estructura metalica soporte de cubierta del bloque 02 (ambulancia)
- Se figura acero de refuerzo para viga aérea del cuarto de bombas
- Se instala panete para sardineles longitudinales del cuarto de bombas
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para andén perimetral del bloque 01.
- Se realizan excavaciones manuales para tubería desagüe del cuarto de bombas.
- Ingreso de material (tubería eléctrica - ceramica - enlace - arena)
- Instalación de acero de anclaje para anillo de apuntallamiento del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
5 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Compresor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Powered by CamScanner

Observaciones: Interventoría recomienda allegar el equipo necesario para fundir la estructura pendiente del cuarto de bombas para evitar mayores atrasos, se debe completar la formaleta para así lograr la ejecución de las actividad.

Ing. Obra en

Resd. Interventoría

Fecha: 22 de agosto de 2024

Actividades: -Instalación de policarbonato para cubierta exterior del Bloque 02 (entrada ambulancia)
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi según diseño de mezcla, para bordillo anden perimetral al Bloque 01
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral bloque 01.
- Se figura acero de refuerzo para vigas aereas del Bloque de cuarto de bombas
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del Bloque 02.
- Instalación de paneles para muros internos del cuarto eléctrico - bq4.
- Se instala acero de refuerzo para columnetas del Bloque 04. cuarto eléctrico
- Instalación de tubería eléctrica entre cajas de inspección y salida para iluminación exterior.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor - Mezcladora - vibrador electrico

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para bordillo anden perimetral bloque 01. #177

Interventoría recomienda despejar áreas exteriores retirar sobrantes, roca producto de excavación para así dar paso a la conformación del urbanismo que se debe entregar.

Res. Obra 01 Resid. Interventoría

Fecha: 23 de agosto de 2024

Actividades: - Instalación de policarbonato para cubierta exterior del bloque 02 (entrada ambulancia)
- Instalación de formaleta para bordillo anden perimetral del bloque 01
- Se instala acero de refuerzo para vigas aéreas del cuarto de bombas
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 02
- Instalación de pañete para muros internos del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Se instala formaleta para columnetas del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Instalación de tubería eléctrica entre cajas de inspección y salidas para iluminación exterior

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
5 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (lluvias 1:00 - 4:00).

Powered by CamScanner

Observaciones: De acuerdo a lo conversado se define dejar la estructura del cuarto de bombas de tal forma que se de la inclinación para la cubierta por tanto las columnas posteriores se van a dejar a mayor altura y en las vigas laterales se instala la estructura de cubierta para tal fin.

Res Obras Resid Interventoría

Fecha: 24 de agosto de 2024.

Actividades: - Se instala panel impermeabilizado para fachadas del cuarto eléctrico (bog)
- Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas del cuarto de bombas
- Instalación de tubería para red hidráulica externa, del bloque 02
- Se instala tubería de drenaje de red aguas lluvias
- Conformación de terreno con material de afirmado compactado para andén perimetral bloque 01.
- Se instala tubería eléctrica de techo para depósito y cuarto basura - bloque 02.
- Instalación de formaleta para bordillo de andén perimetral.
- Se aplica vinilo para exteriores en fachada del bloque
- Ingreso de material (cemento - 235 Bul)

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
3 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor

Estado del tiempo: Mañana Clara - Tarde Nublada

Observaciones: Interventoría recomienda tener cuidado con los desniveles de redes de aguas lluvias, las cuales deben tener suficiente inclinación para evitar empozamientos en los cárcamos y/o cajas de inspección. Se debe garantizar el recorrido de las aguas sin estancamiento.

Residente Obra Resid Interventoría

Fecha: 25 de agosto de 2024

Actividades: Sin actividades, día dominical.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Fecha: 26 de agosto de 2024

Actividades:
- Se instala pañete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 04 (cuarto eléctrico)
- Instalación de acero de refuerzo para vigas aéreas del cuarto de bombas.
- Instalación de tubería hidráulica para red exterior del bloque 02.
- Se instala tubería eléctrica de techo para deposito y cuarto basuras.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para columnetas del cuarto eléctrico.
- Se aplica vinilo para exteriores en fachadas del bloque 01.
- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para andenes exteriores.
- Corte y ensamble de marcos metálicos para rejillas de cárcamos.
- Instalación de aparatos para anillo de apantallamiento de red eléctrica.
- Se realizan tala y aplicación en pañete para cuarto eléctrico.

Powered by CamScanner

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoria
1 Maestro
5 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Equipo soldadura
Compresor

Estado del tiempo: Mañana [Nublado] - Tarde [Nublado]

Observaciones: Se toma muestra de concreto para columnetas del cuarto eléctrico (=# 176.)
Interventoría recomienda agilizar el ingreso de materiales para pisos y enchapes y así evitar atraso en la ejecución de las actividades, de igual forma se conmina al contratista a fundir andenes y mejorar la productividad.

Residente Obra Resi Interventoría

Fecha: 27 de agosto de 2024

Actividades: Se instala bloque #5 para muros del bloque 04 (Cuarto eléctrico
- Instalación de grafil para refuerzo de muros del bloque 04
- Se instala acero de refuerzo para viga aerea del cuarto de bombas
- Instalación de formaleta para viga aerea del cuarto de bombas
- Corte y ensamble de marcos metalicos para cárcamo de drenaje
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi según el diseño de mezcla, para bordillo de anden perimetral del bloque 04
- Instalación de panete impermeabilizado para muros exteriores del bloque 04.
- Instalación de tubería eléctrica de techo para red del bloque 02.

-Conformacion de terreno con material de afirmado compactado para anden perimetral
-Ingreso de material (Arena de pega)

Personal en obra: 1 Residente obra a.
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Equipo soldador.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado-Tarde (Lluvia)

Observaciones: se toma muestra de concreto de 2500 psi para bordillo anden perimetral bloque 01 (#919)
Interventoria recomienda verificar bombeo de los andenes que se estan fundiendo para evitar empozamientos. Se solicitan resultados de cilindros de ensayos de concreto del último mes.

Residente Interventoria

Fecha: 28 de agosto de 2024

Actividades: Se instala panete impermeabilizado para muro exteriores del bloque
- Instalacion de formaleta para viga aerea del cuarto de bombas.
- Corte y ensamble de marcos metalicos para cárcamos de drenaje de aguas lluvias.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi segun el diseño de mezcla para anden perimetral al bloque 03.
- Instalacion de tubería eléctrica a techo para red del bloque 02.
- Conformacion de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior al bloque 01.

- Se instala tableta de yeso para anden perimetral al bloque 03 (salón múltiple)
- Ingreso de material (baldosin - zocalo)

Personal en obra: 1 Residente obraa
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares.

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibrador electrico
Equipo soldadora

Estado del tiempo: Mañana [Nublado] - Tarde [Nublado]

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral al bloque 03 [salón múltiple] #1 80.
Dado que las tuberias de suministro y desagues se instalaron en su totalidad, se solicita hacer las pruebas de presión y estanqueidad respectivamente. Interventoria recomienda verificar todos los puntos electricos en cuanto a cantidad y ubicación para evitar reprocesos.

Ing. a. Resid. Interventoría

Fecha: 29 de agosto de 2024.

Actividades: Instalación de plástico negro para impermeabilizar anden perimetral al bloque 03.
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa anden perimetral al bloque 02.
- Se realiza mezcla de concreto de 3000 psi para viga aerea del cuarto de bombas
- Se instala tuberia electrica de techo para cajas de paso metalicas del bloque 02
- Se tienden tapas para cajas de inspección electricas
- Se realiza conformación de terreno para anden perimetral con material de afirmado compactado

Powered by CamScanner

- Se instala pañete impermeabilizado para muro exterior del cuarto eléctrico
- Se realiza instalación de flanches para cubierta exterior en policarbonato del bloque 01.

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
10 Ayudantes
1 Electricista

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibradora eléctrica

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado).

Observaciones: Se toma muestra de concreto de 3000 psi para vigas cubierta del cuarto de bombas #101.
Interventoría recomienda dar inicio a la instalación de pisos y enchapes para evitar atrasos en la programación, se recomienda despejar los exteriores y terminar de conformar andenes y terrazas sobretodo en la zona nor-oriental del proyecto.

Residente obra

Resid Interventoría

Fecha: 30 de agosto de 2024

Actividades: - Instalación de flanches para cubierta exterior del bloque 01 (zona baterías)
- Instalación de bloque #5 para muro cubierta del cuarto de bombas.
- Se instala plástico negro para impermeabilizar anden perimetral al bloque 02.
- Instalación de malla electrosoldada para refuerzo de placa anden perimetral bloque 02.
- Se instala tubería eléctrica de techo para cajas de piso metálica del bloque 02.

Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para anclaje perimetrales.
- Instalación de panete impermeabilizado para muros cabierta del cuarto de bombas.
- Ingreso de material (6m³ de arena de río)

Personal en obra: 1 Residente obra a. Equipo: Herramienta menor
1 Residente interventoria
1 Maestro
4 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares.

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Interventoría solicita mantener en completo orden y aseo la obra en general así como retirar sobrantes y materiales como madera que ya no tengan más usos. Hacer seguimiento a las pruebas de presión que se están ejecutando y realizar el debido registro fotográfico y en formato.

Ref Interventoría.

Fecha: 31 de agosto de 2024

Actividades: - Instalación de plastico negro para impermeabilizar placa base de anclaje perimetral bloque 02.
- Se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa base del anclaje perimetral al bloque 02.
- Instalación de panete impermeabilizado para muro cabierto del cuarto de bombas.
- Se realiza instalación de Flancher para cabierta exterior pluviotanque del bloque 02.
- Se realiza mezcla de concreto de 2500 psi para placa base de anclaje perimetral. Bloque 02.

Powered by CamScanner

- Se realiza conformación de terreno con material de afirmado compactado para zona exterior
- Instalación de tubería eléctrica de techo para red eléctrica del Bloque 02.
- Instalación de bloque #5 para muro cubierta del cuarto de bombas
- Instalación de grafil para refuerzo de muro cubierta de cuarto de bombas.
- Ingreso de material

Personal en obra: 1 Residente obra
1 Residente interventoría
1 Maestro
4 Oficiales
1 Electricista
10 Auxiliares

Equipo: Herramienta menor
Mezcladora
Vibradora eléctrica

Estado del tiempo: Mañana (Nublado) - Tarde (Nublado)

Observaciones: Se toma muestra de concreto para anden perimetral del Bloque 02 #182.
Interventoría recomienda tener especial cuidado con el acabado de los andenes, revisar bombeos y evitar empozamientos, se debe garantizar que el agua de lluvias corra sin obstrucciones, de igual manera se solicita dar mejor acabado en la ejecución de las dilataciones y filos ya que es el acabado final.

Res. Interventoría.

Fecha: 01 de septiembre de 2021

Actividades: Sin actividad, día domingo

Estado del tiempo: Mañana (Soleado) - Tarde (Nublado)

Powered by CamScanner

OF-INT-047 concepto prorroga 4-2.pdf

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Oscarrodriguez0310

vie, 2 ago, 3:10 p.m.

Cordial saludo, se envía OF-INT-047, mediante el cual la interventoria emite concepto de acuerdo a la solicitud de prórroga 04, solicitada por el contratista Cerom

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



OF-INT-047 conc...

Responder | Responder a todos | Reenviar

ACTA MODIFICATORIA 01

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Oscarrodriguez0310

lun, 5 ago, 12:15 p.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Ing. Oscar Rodriguez
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía acta modificatoria 01, con sus respectivos soportes como cantidades de obra y APU´S, luego de ser revisada, avalada y firmada por ésta interventoría, la misma se envía para su conocimiento y fines pertinentes.

MODIFICATORIO No1 ESE LA UVITA JULIO-2024F...

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

OF-INT-048 CONCEPTO SOLICITUD MODIFICATORIO 01

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Oscarrodriguez0310

lun, 5 ago, 2:21 p.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Ing. Oscar Rodriguez
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo

Por este medio se envía OF-INT-048, el cual emite concepto de interventoría acerca de acta modificatoria 01, con sus respectivos soportes como cantidades de obra y APU´S, luego de ser revisada, avalada y firmada por ésta interventoría, la misma se envía para su conocimiento y fines pertinentes.

Se adjunta solicitud por parte del contratista y acta modificatoria 01

INFORME TECNICO MAYORES Y MENORES ESE L...

MODIFICATORIO No1 ESE LA UVITA JULIO-2024F...

CONCEPTO INTERVENTORÍA PRÓRROGA 04

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Oscarrodriguez0310

jue, 8 ago, 11:35 a.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
ing. Oscar Rodriguez
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio envío concepto de interventoría acerca de la solicitud de prórroga hecha por el contratista la cual se adjunta al presente correo.
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> vie, 9 ago, 11:25 a.m.

para JULIO, JEYSON

SEÑORES:
CEROM DE COLOMBIA SAS

Por este medio se informa que luego de revisar el informe mensual del mes de julio, se tienen las siguientes observaciones:

1. Para la aprobación del informe se solicita la actualización de los resultados de los ensayos a los cilindros de concreto, ya que los enviados, están a fecha 15 de mayo y el presente informe es del mes de julio, es decir están pendientes los resultados del mes de junio y de julio.
2. Se sugiere que la sábana se maneje en los formatos solicitados por la supervisión.
3. Se debe actualizar a la fecha el certificado emitido de la escombrera, ya que tiene fecha del año anterior.

Agradecemos su atención y se solicita subsanar las solicitudes lo más pronto posible, para poder escalar el informe al supervisor de la entidad contratante.

•••

--

Señores

Cordial saludo

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> sáb, 10 ago, 8:07 a.m.

para E.S.E, ceromlimitada@hotmail.com

Cordial saludo, dando respuesta, se envía el documento prórroga 04, aprobado y debidamente firmado, para fines pertinentes.

•••

--

Señores

Cordial saludo

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



OF-INT-049 CONCEPTO Y AVAL PÓLIZAS CONTRATISTA PRÓRROGA 04

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Oscarrodriguez0310, Cco:JULIO

13 ago 2024, 10:04 a.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Ing. Oscar Rodriguez
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía OF-INT-049, por medio del cual se da concepto y aval a las pólizas enviadas por el contratista con el fin de ampliar garantías según prórroga 04, las cuales se adjuntan al presente correo.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

INFORME INTERVENTORÍA #12 MES JULIO

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Oscarrodriguez0310

14 ago 2024, 3:20 p.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
Arq. Gustavo A Sarmiento V
Supervisor E.S.E. Centro de salud de La Uvita

Cordial saludo
Por este medio se envía informe de interventoría #12 correspondiente al mes de julio de 2024
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ

INFORME #12 DE OBRA MES JULIO

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Oscarrodriguez0310

mié, 14 ago, 3:23 p.m.

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
ING. OSCAR RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Cordial saludo
Por este medio se envía informe de obra revisado y avalado por interventoría para fines pertinentes.

Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

INFORME SST #12 MES JULIO

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> mié, 14 ago, 3:25 p.m.
para Empresa, Oscarrodriguez0310

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
ING. OSCAR RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Cordial saludo

Por este medio se envía

INFORME SST JULIO ESE LA UVITA.rar

informe SST #12 correspondiente al mes de julio para fines pertinentes.
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

REGISTRO FOTOGRAFICO CONSTRUCCIÓN NUEVA ESE LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO jue, 22 ago, 2:46 p.m.

Buenos Tardes A Continuación, adjunto el registro fotográfico de obra del Contrato No 2023-045 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com> jue, 22 ago, 3:09 p.m.

para Oscarrodriguez0310

Ingeniero Oscar, cordial saludo, para su información y fines pertinentes.

•••

Responder Reenviar

SOLICITUD MODIFICATORIO 01

Recibidos ×

utinteruvita <utinteruvita@gmail.com>
para Empresa, Oscarrodriguez0310

vie, 30 ago, 11:41 a.m. (hace 10 días)

--

Señores
ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA
Dra. ANDREA CATALINA PINZÓN BOTIA / Gerente ESE
ING. OSCAR RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Cordial saludo
Por este medio se envía OF-INT-050, el cual emite concepto de interventoría acerca de acta modificatoria 01, con sus respectivos soportes como cantidades de obra y APU´S, luego de ser revisada, avalada y firmada por ésta interventoría, la misma se envía para su conocimiento y fines pertinentes.

Se adjunta acta modificatoria 01, APUS y memorias de cantidades.
Favor confirmar el recibido del presente correo.

UNIÓN TEMPORAL INTERUVITA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

RE: Invitación actualizada con una nota: Reunion Contrato Obra ESE 5% vie 2 de ago de 2024 09:00 - 11:00 (GMT-10) (eselauvita@hotmail.com) Recibidos ×

E

E.S.E LA UIVTAS¿ E.S.E LA UVITA
para Jorge, ceromlimitada@hotmail.com, mi, alcaldia, planeacion, Oscarrodriguez0310@gmail.com

jue, 1 ago, 10:52 a.m.

Este evento se ha actualizado con una nota:
"Correccion fecha"

Se ha cambiado: hora

Unirme con Google Meet

Enlace de la reunión
meet.google.com/oqy-ynxs-ofq

Cuándo CAMBIADO
viernes 2 de ago de 2024 · 09:00 – 11:00 (Hora estándar de Hawái-Aleutianas)

SOLICITUD APROBACIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS – MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 01 y SOLICITUD PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA.

Recibidos ×

JEYSON ROMERO
para mi, residenteinteruvita

sáb, 3 ago, 8:33 a.m.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, adjunto la solicitud de aprobación de ítems no previstos y prórroga en tiempo para el **CONTRATO DE OBRA 2023-045** que tiene por objeto la **"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ**". para su respectivo trámite.

Agradezco su atención y espero su pronta respuesta.

Atentamente,

Jeyson Romero
Ingeniero Civil
Residente de Obra

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail



MODIFICATORIO NO.1 - CONTRATO DE OBRA 2023-045 Recibidos ×

JEYSON ROMERO lun, 5 ago, 10:39 a.m.
para mi, residenteinteruvita

Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto Modificatorio No.1 del contrato en referencia, en el formato solicitado y firmado, para revisión y fines pertinentes.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

MODIFICATORIO No1 ESE LA UVITA JULIO-2024FIR.pdf

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



INFORME TÉCNICO SOLICITUD APROBACIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS – MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 01

Recibidos ×

JEYSON ROMERO
para mí, residenteinteruvita

lun, 5 ago, 1:39 p.m.

Cordial saludo,

Por medio de la presente adjunto Informe Técnico para la solicitud de aprobación de ítems no previstos del Modificatorio No.1 del contrato en referencia, en el formato solicitado y firmado, para revisión y fines pertinentes.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail



INFORME MENSUAL CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO
para mí, residenteinteruvita

mié, 7 ago, 10:34 a.m.

Buenas Noches

A Continuación, adjunto el informe mensual de obra correspondiente al mes de Julio para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

CITACION OFICINA PLANEACION, GOBERNACION

Recibidos ×

E

E.S.E LA UIVTAS¿ E.S.E LA UVITA

9 ago 2024, 10:44 a.m.

para alcaldia, planeacion, ceromlimitada@hotmail.com, mí, Oscarrodriguez0310@gmail.com

Traducir al español ×

Atentamente

Andrea Catalina Pinzón Botia
GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD
LA UVITA
TEL. 320-448-58-29.

...

[Mensaje acortado] Ver mensaje completo

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



RV: Porroga 4 contrato de obra e interventoria

Recibidos ×

E.S.E LA UIVTAS¿ E.S.E LA UVITA
para ceromlimitada@hotmail.com, mi

sáb, 10 ago, 6:13 a.m.

cordial saludo.

Remito documentos modificatorios de prórroga 4 contrato de obra e interventoría.

Agradezco remitir antes del domingo para poder cargar a SECOP ya que no puede vencer el contrato.

Atentamente

Andrea Catalina Pinzón Botia
GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD
LA UVITA
TEL. 320-448-58-29.

PRORROGA No. 4 CONTRATO DE OBRA ESE LA UVITA Recibidos ×

JULIO ROBERTO MONTENEGRO sáb, 10 ago, 9:22 a.m.
para Empresa, mí

Buenos días

Cordial saludo, dando respuesta a su solicitud, se envía el documento prórroga 04 de obra, aprobado y debidamente firmado, para fines pertinentes.

Gracias por su atención.

CEROM DE COLOMBIA SAS
R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO
...

[Mensaje acortado] Ver mensaje completo

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

INFORME MENSUAL CONTRATO 2023-045 CENTRO DE SALUD LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO lun, 12 ago, 10:08 a.m.

para mí, residenteinteruvita

Buenos Días

A Continuación, adjunto el informe mensual de obra correspondiente al mes de Julio con las solicitudes subsanadas para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

INFORME DE OBRA JULIO.rar

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

RADICADO POLIZAS PRORROGA NO. 4 CONTRATO DE OBRA 2023-045 CEROM DE COLOMBIA SAS

Recibidos

JULIO ROBERTO MONTENEGRO
para Empresa, mi, Jeyson.romero02@gmail.com

mar, 13 ago, 9:05 a.m.

Tunja, 13 de Agosto de 2024

Señores
EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA
ATTE. DRA ANDREA CATALINA PINZON BOTÍA
LA UVITA.

REFERENCIA: CONTRATO 2023-045.

ASUNTO: RADICADO POLIZAS PRORROGA 4.

Recopilacion Informacion Modificatorio y Adicional

Recibidos ×



Oscar Rodriguez vie, 16 ago, 8:13 a.m.

para Empresa, ing.andrescepeda, mí, residenteinteruvita, ceromlimitada, planeacion

Cordial saludo comparto carpeta en Drive como lo solicita la secretaría de salud para realizar el trámite de la modificación y adicional a realizar en el marco del proyecto E.S.E de La Uvita Agradezco Retroalimentar y corregir la información Ingeniero Andrés Cepeda según lo conversado.
Agradezco su apoyo

https://drive.google.com/drive/folders/1tpjAzt_MFetA19ElaGBLZITNLxqfKTIm?usp=drive_link

PSI.

OSCAR RODRIGUEZ T

INGENIERO CIVIL

ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

Cel: 3132335522

Correo: oscarrodriguez0310@gmail.com

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

REGISTRO FOTOGRAFICO CONSTRUCCIÓN NUEVA ESE LA UVITA

Recibidos ×

JEYSON ROMERO
para mi, residenteinteruvita

jue, 22 ago, 2:46 p.m.

Buenos Tardes

A Continuación, adjunto el registro fotográfico de obra del Contrato No 2023-045 "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA".

Cordialmente

JEYSON ROMERO
Ingeniero Civil
Residente de obra
Cerom de Colombia SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO ESE LA UVITA.rar

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

COMITE OBRA MES DE AGOSTO

Recibidos ×

E

E.S.E LA UIVTAS¿ E.S.E LA UVITA

mar, 27 ago, 5:09 p.m. (hace 13 días)

para alcaldia, planeacion, ceromlimitada@hotmail.com, mí, Oscarrodriguez0310@gmail.com

Buenas tardes

envio invitacion al comite de obra del mes de agosto. por favor confirmar el recibido

Muchas gracias

Atentamente

Andrea Catalina Pinzón Botia
GERENTE E.S.E. CENTRO DE SALUD
LA UVITA
TEL. 320-448-58-29.


...

[Mensaje acortado] Ver mensaje completo

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**	**319 días**	**mié 16/08/23**	**mié 13/11/24**
2		**PRELIMINARES DE OBRA**	**12 días**	**mié 16/08/23**	**jue 31/08/23**
3		LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	5 días	mié 16/08/23	mar 22/08/23
4		DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	7 días	mié 23/08/23	jue 31/08/23
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAMINA	0 días	mar 22/08/23	mar 22/08/23
6		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE ZINC	7 días	mié 23/08/23	jue 31/08/23
7		DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	5 días	mié 23/08/23	mar 29/08/23
8		**MOVIMEINTO DE TIERRAS**	**48 días**	**vie 1/09/23**	**mar 7/11/23**
9		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	14 días	jue 21/09/23	mar 10/10/23
10		EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	14 días	vie 1/09/23	mié 20/09/23
11		CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	6 días	vie 1/09/23	vie 8/09/23
12		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CONPLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	20 días	mié 11/10/23	mar 7/11/23
13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	19 días	mié 11/10/23	lun 6/11/23
14		**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**194 días**	**mié 11/10/23**	**mié 17/07/24**
15		SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	8 días	mié 11/10/23	vie 20/10/23
16		CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	15 días	mié 1/11/23	mar 21/11/23
17		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	15 días	mié 22/11/23	mar 12/12/23
18		MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 2.01MTS H 3,5 MTS	20 días	jue 20/06/24	mié 17/07/24
19		PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	8 días	vie 16/02/24	mar 27/02/24
20		COLUMNASENCONCRETO21MPa(3000PSI),ALTURAMAYORA3mtsFORM	15 días	mié 27/12/23	jue 25/01/24
21		VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	15 días	vie 26/01/24	jue 15/02/24
22		ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	8 días	mié 20/03/24	vie 29/03/24
23		CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21MPa-(3000PSI)	3 días	vie 26/01/24	mar 30/01/24
24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS	4 días	mié 28/02/24	lun 4/03/24
25		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa(3000PSI)RELACIÓN60C/40P	15 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23
26		PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI	20 días	mié 29/11/23	mar 26/12/23
27		SUMINISTRO EI NSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000PSI)PARAPLACA DE TANQUE E=10CM	1 día	mié 28/02/24	mié 28/02/24
28		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	2 días	jue 29/02/24	vie 1/03/24
29		CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	2 días	jue 29/02/24	vie 1/03/24
30		**ACERO DE REFUERZO Y MALLAS**	**61 días**	**mié 29/11/23**	**vie 1/03/24**
31		MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 MD=6MM (INCLUYESUMINISTROFIJACIONEINSTALACION)	45 días	mié 29/11/23	jue 8/02/24
32		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	45 días	jue 21/12/23	vie 1/03/24
33		**ESTRUCTURA METÁLICA**	**45 días**	**lun 20/05/24**	**vie 19/07/24**
34		SUMINISTRO,TRANSPORTE,FABRICACION,ENSAMBLAJEYMONTAJEDE METALICA	45 días	lun 20/05/24	vie 19/07/24
35		SUMINISTROEINSTALACIÓNPERFILERIAMETALICAPARAESTRUCTURA DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA)	45 días	lun 20/05/24	vie 19/07/24
36		**CIELOS RASOS**	**0 días**	**mié 16/08/23**	**mié 16/08/23**
37		SUMINISTROEINSTALACIONDECIELORASORETICULARENPANELESEN INCLUYE PERFILERÍA EN ALUMINIO	0 días	mié 16/08/23	mié 16/08/23
38		SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)	0 días	mié 16/08/23	mié 16/08/23
39		**MAMPOSTERIA**	**160 días**	**lun 4/03/24**	**vie 11/10/24**

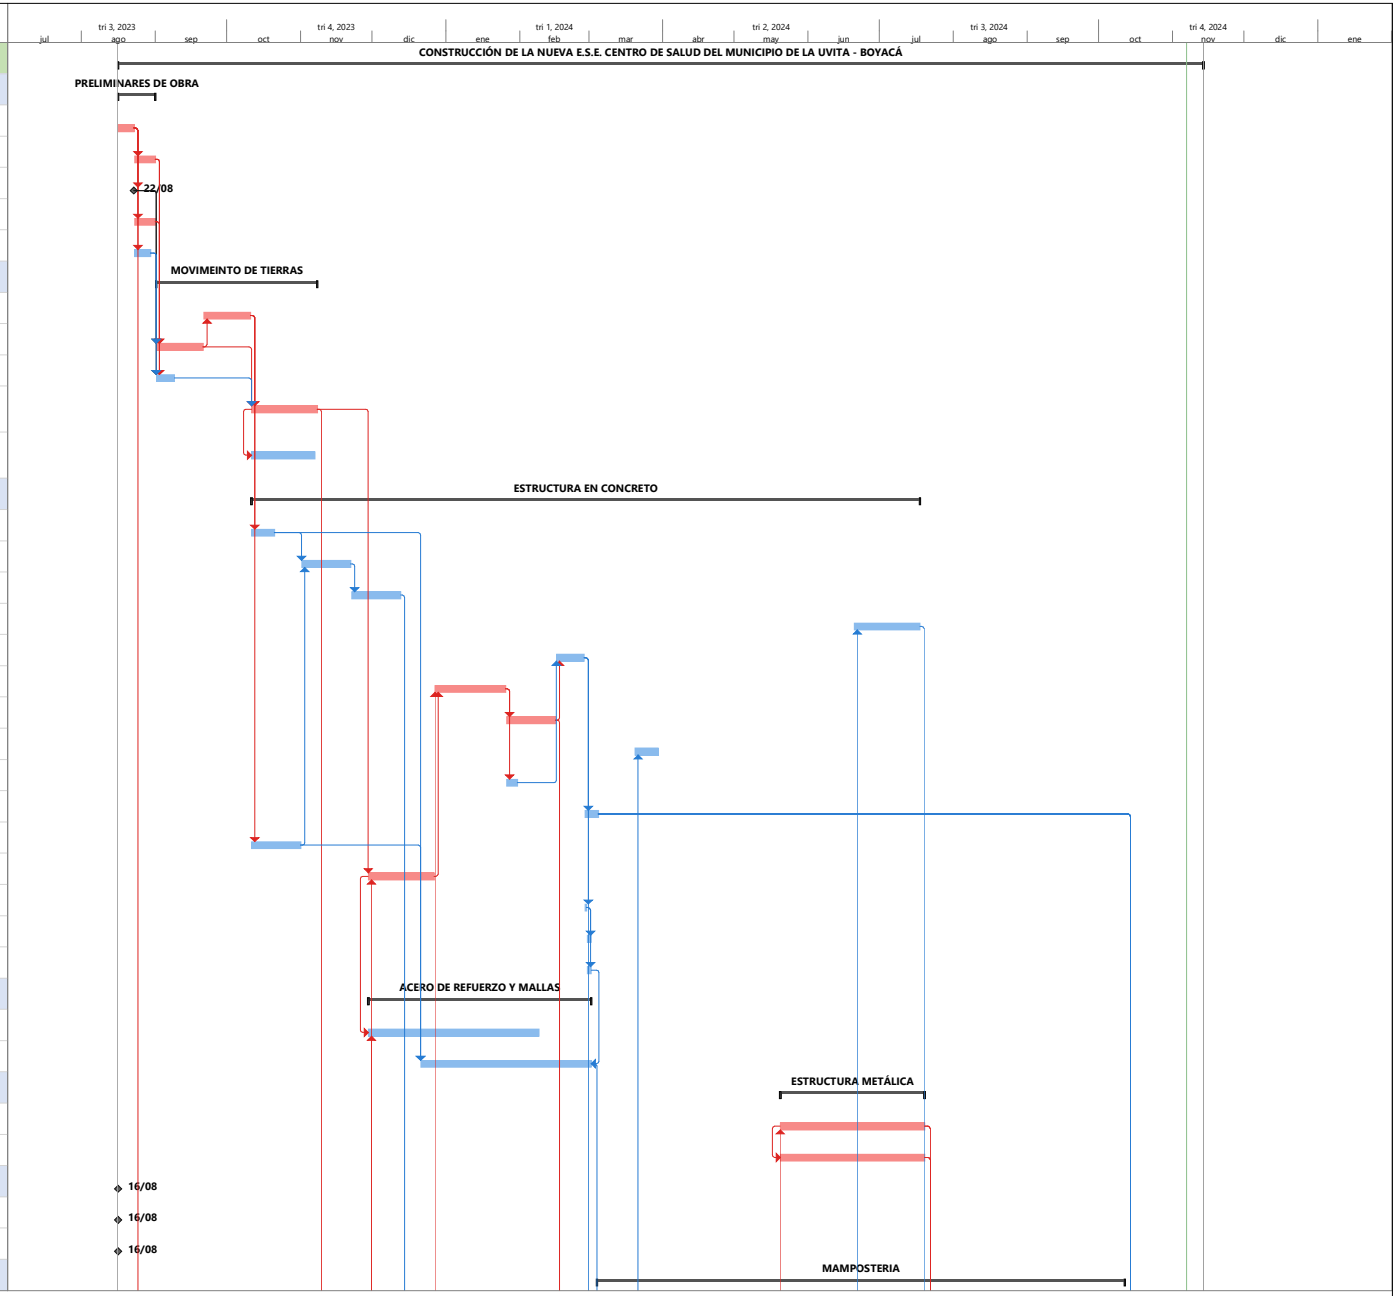

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
40		MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	12 días	lun 4/03/24	mar 19/03/24
41		PAÑETE LISO MUROS 1:4	10 días	lun 1/04/24	vie 12/04/24
42		PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	2 días	jue 19/09/24	vie 20/09/24
43		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	15 días	lun 1/04/24	vie 19/04/24
44		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	15 días	lun 23/09/24	vie 11/10/24
45		SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROCEMENTO / MICROSTONE - O SIMILAR	0 días	vie 20/09/24	vie 20/09/24
46		**CUBIERTA**	**20 días**	**lun 22/07/24**	**vie 16/08/24**
47		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC CAL26TIPOSANDUCHE,CONPOLIURETANOEXPANDIDODEALTADENSID	20 días	lun 22/07/24	vie 16/08/24
48		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	15 días	lun 22/07/24	vie 9/08/24
49		**RECUBRIMIENTO Y ENCHAPES**	**8 días**	**mié 30/10/24**	**lun 11/11/24**
50		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA O LIMPIA20X20OSIMILAR(SOBRE MUROS ÁREA BASURAS, BAÑOS Y POCETAS)	8 días	jue 31/10/24	lun 11/11/24
51		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL PVC EKOWOD COLOR MADERA O SIMILAR	0 días	mié 30/10/24	mié 30/10/24
52		**PISOS**	**50 días**	**jue 5/09/24**	**mié 13/11/24**
53		PULIDA MECANICA SUPERFICIE EN CONCRETO (INCLUY ECORTE Y SELLADO DE JUNTAS)	5 días	jue 5/09/24	mié 11/09/24
54		ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	5 días	jue 12/09/24	mié 18/09/24
55		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO EN ROLLO	2 días	lun 14/10/24	mar 15/10/24
56		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA 0.338*0.338 (DUROPISO) O SIMILAR	5 días	lun 14/10/24	vie 18/10/24
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM (COLOR)	10 días	lun 14/10/24	vie 25/10/24
58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM (BLANCO)	10 días	lun 14/10/24	vie 25/10/24
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES FORMATO 30*30 CM	2 días	lun 14/10/24	mar 15/10/24
60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA PREPULIDA PARA EXTERIORES 30X30 CM	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
61		SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN PVC	0 días	mar 15/10/24	mar 15/10/24
62		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	3 días	lun 28/10/24	mié 30/10/24
63		**PINTURA**	**1 día**	**jue 5/09/24**	**jue 5/09/24**
64		ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
65		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
66		PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
67		**CARPINTERIA METALICA**	**2 días**	**mar 12/11/24**	**mié 13/11/24**
68		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA DOBLE NAVE APERSIANADA PARA SUBESTACION	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24
69		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA CAL 16INC.CHAPA Y ACCESORIOS	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24
70		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 16 - (BARRA ANTIPÁNICO)	2 días	mar 12/11/24	mié 13/11/24
71		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DOBLE EN TUBULAR METALICO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
72		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA CERRAMIENTO TUBO ESTRUCTURAL CALIBRE SEGÚN DISEÑO	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
73		**CARPINTTERIA ALUMINIO**	**2 días**	**mar 12/11/24**	**mié 13/11/24**
74		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
75		SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPUERTAENMARCOALUMINIOYVIDRIOTE HOJA	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
76		SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPUERTAVENTANAENMARCOALUMINIOY	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
77		**CARPINTERIA EN MADERA**	**0 días**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
78		SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPUERTAENTANBORADAENMADERABAT MARCO INCLUYE PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE Y MANIJA DE SEGURIDAD (UNA HOJA)	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24

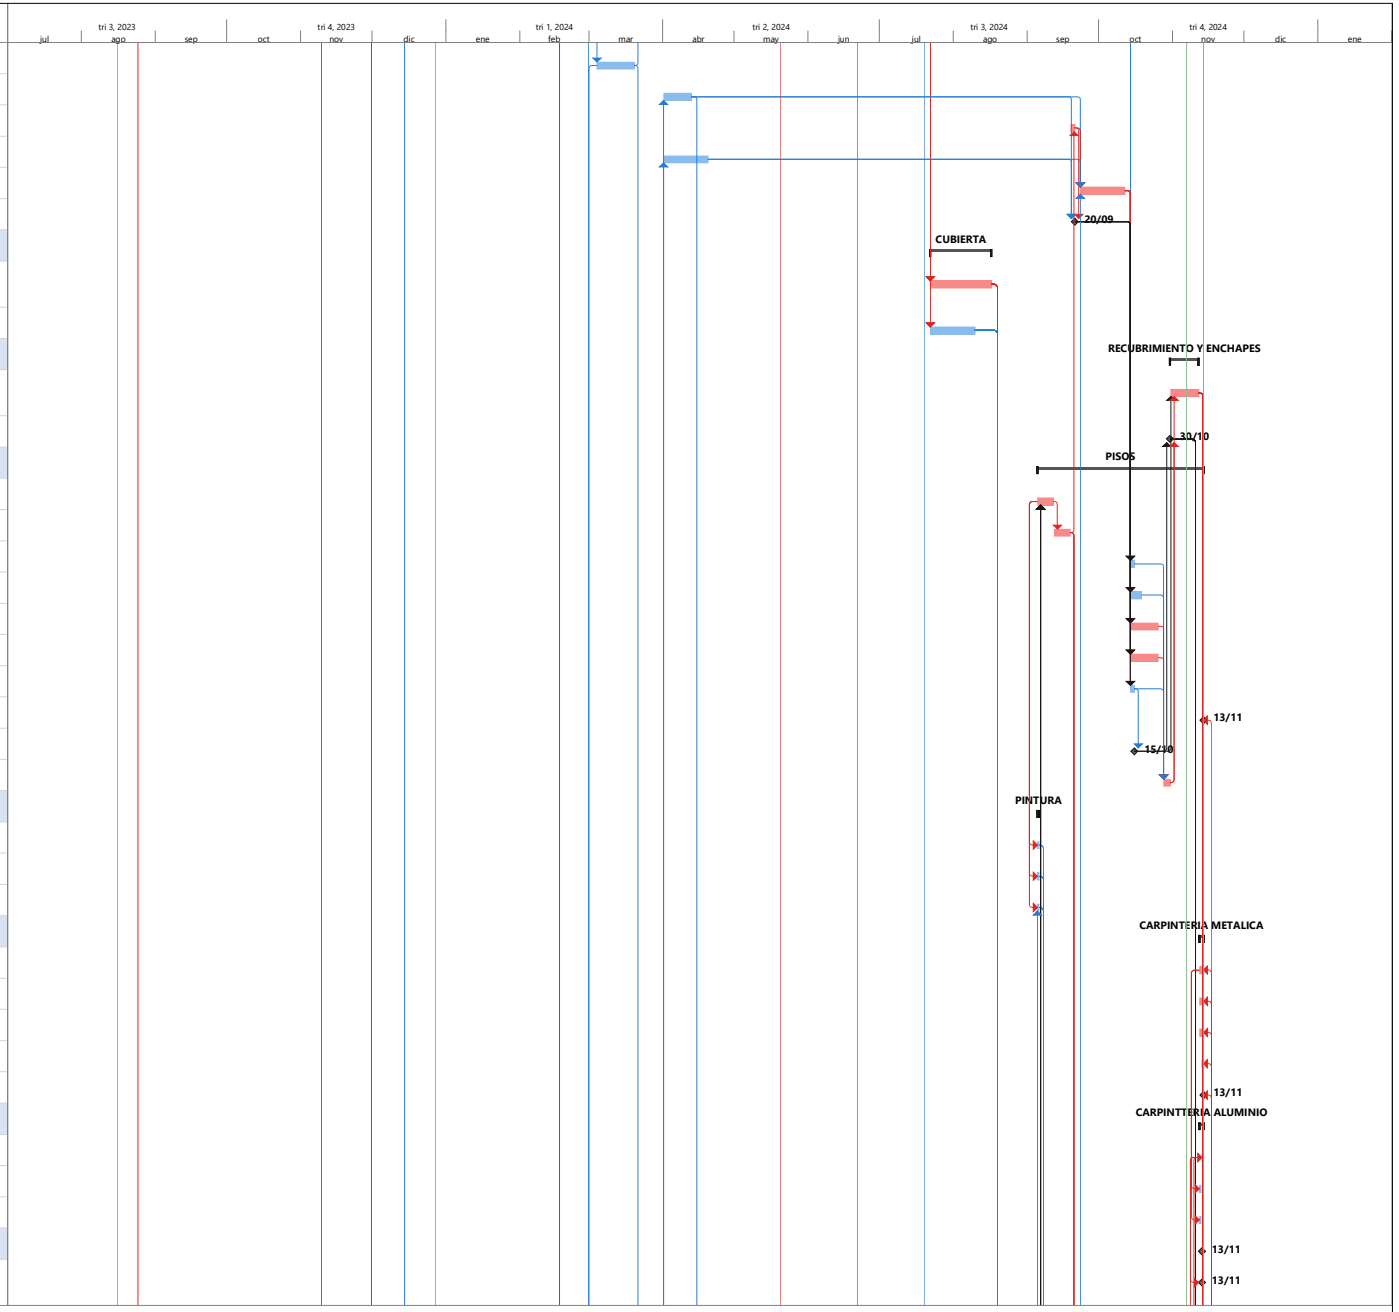

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
79		SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPUERTAENTAMBORADAENMADERABAT MARCO INCLUYE PROTECTOR DE ACERO INOXIDABLE Y MANIJA DE SEGURIDAD (DOBLE HOJA)	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
80		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGUES)**	**63 días**	**lun 19/08/24**	**mié 13/11/24**
81		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN	2 días	lun 19/08/24	mar 20/08/24
82		RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
83		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
84		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
85		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
86		TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
87		SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
88		SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=3" x 2"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
89		SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24
90		SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
91		SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
92		SUMINISTRO EI NSTALACION DE ACCESORIO CODO90° 1/4CXC SANITARIO EN PVC4"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
93		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO90° 1/4CXC SANITARIO EN PVC2"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
94		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4CXC SANITARIO EN PVC4"X2"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
95		SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D=2"x2"x2"	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24
96		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4"	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
97		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRENAJE 4"	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
98		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DRENAJE 6"	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
99		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DRENAJE 2"	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
100		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA ADRIATICA CON FLUXOMETRO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
101		SUMINISTRO EI NSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJE T(INCLUYE GRIFERIA SENSOR)	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
102		SUMINISTRO E INSTALACIÓN D ECOMBO SANITARIO AQUAPRO .INCLUYE LAVAMANOS Y ACCESORIOS	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
103		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30"	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
104		SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
105		SUMINISTROEINSTALACIÓNDESECADORELÉCTRICOPARAMANOS,AUT ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
106		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
107		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (AGUAS LLUVIAS DESAGUES)**	**4 días**	**mié 21/08/24**	**lun 26/08/24**
108		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24
109		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24
110		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24
111		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24
112		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24
113		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6"	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24
114		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24
115		SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24
116		CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=6"	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24
117		CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=4"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
118		CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24

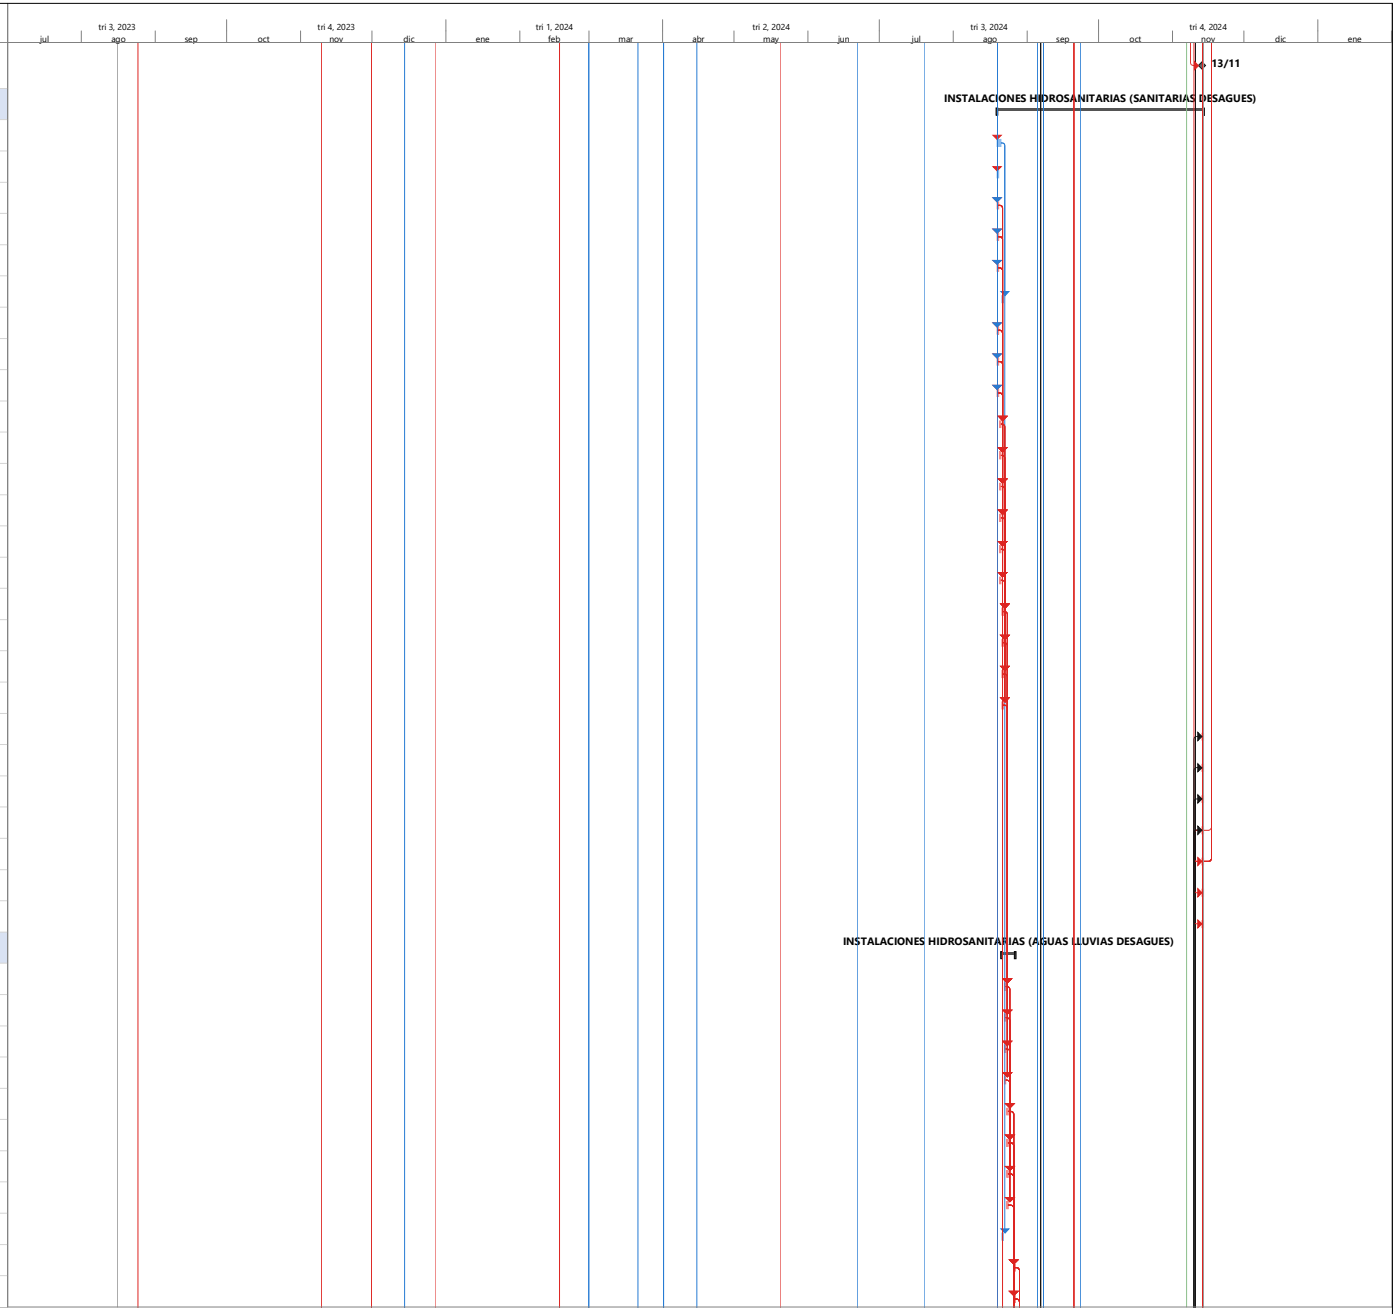

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
119		CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=6"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
120		CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
121		UNION PVC MECANICA D = 8"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
122		UNION PVC MECANICA D = 6"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
123		UNION PVC MECANICA D = 4"	1 día	lun 26/08/24	lun 26/08/24
124		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)**	**2 días**	**mar 27/08/24**	**mié 28/08/24**
125		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 E.L	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
126		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
127		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
128		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 9	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
129		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
130		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
131		SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/4"	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
132		SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1/2"	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
133		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
134		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=4"	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
135		CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1/2"	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
136		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACÓMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
137		CÓNEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE CAJA Y MEDIDÓR	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
138		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (OBRA CIVIL HIDROSANITARIAS)**	**1 día**	**jue 29/08/24**	**jue 29/08/24**
139		CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	1 día	jue 29/08/24	jue 29/08/24
140		**RED CONTRAINCENDIOS (CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIOS)**	**0 días**	**lun 11/11/24**	**lun 11/11/24**
141		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
142		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
143		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
144		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (TEE Y CODOS) HD RANURADOS DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
145		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS) HD RANURADOS DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
146		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (UNIÓN Y CODOS) HD ROSCADOS DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
147		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 6"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
148		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
149		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
150		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO R.W. P.D. DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
151		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
152		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
153		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
154		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
155		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ANTIVIBRATORIA DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
156		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ANTIBORDICE DE 4" ACERO AL CARBÓN	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
157		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24

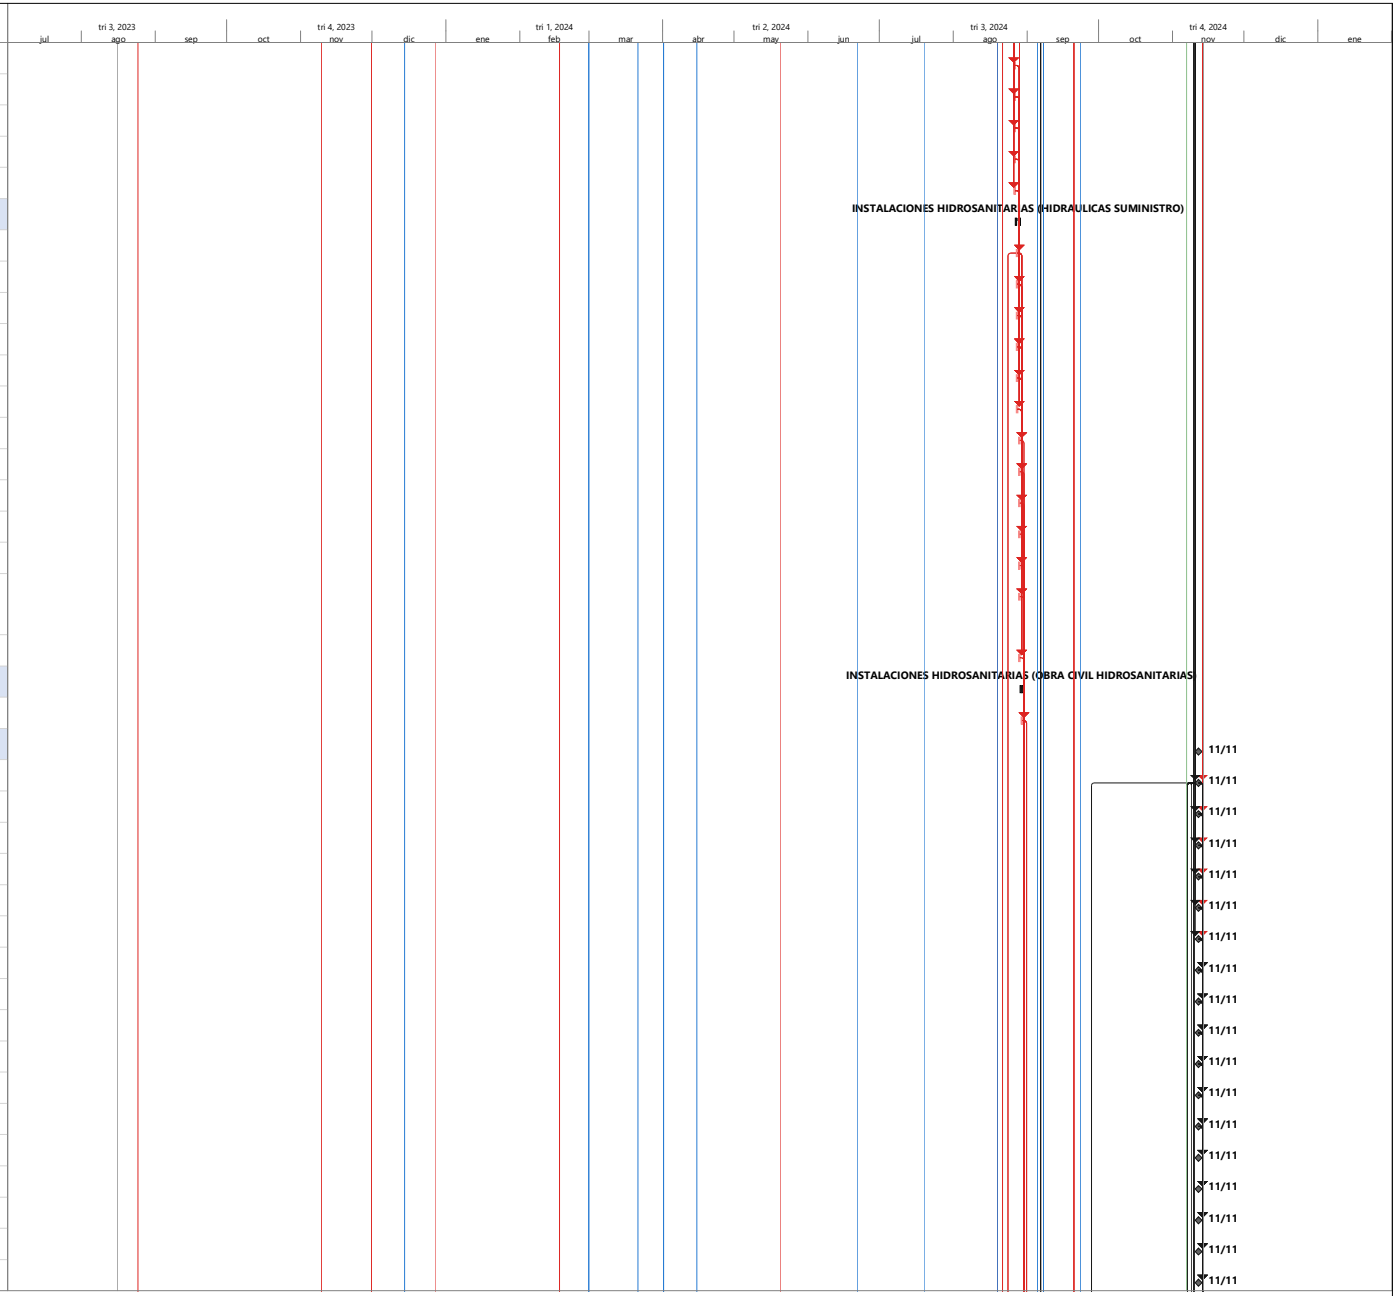

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
158		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
159		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
160		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
161		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBAS 2 X 2.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
162		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO DE 2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
163		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH SUPERVISOR	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
164		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO ANTIVIBRATORIO	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
165		**RED CONTRAINCENDIOS**	**32 días**	**mar 1/10/24**	**mié 13/11/24**
166		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C900 DE 4"	5 días	mar 1/10/24	lun 7/10/24
167		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
168		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 2.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
169		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
170		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 RANURADA DE 1.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
171		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 ROSCADA DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
172		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 ROSCADA DE 1"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
173		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO PVC C900 DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
174		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE MATERIAL DE PVC A ACERO DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
175		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE VELOCIDAD DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
176		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
177		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 2.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
178		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
179		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO TEE RANURADO DE 1.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
180		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
181		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 2.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
182		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
183		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE UNIÓN RIGIDO DE 1.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
184		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
185		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
186		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 1.1/2"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
187		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRAP DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
188		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE ACERO ROSCADOS DE 1.1/4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
189		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE ACERO ROSCADOS DE 1"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
190		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2"	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
191		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE (UL/FM) DE 4"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
192		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
193		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADORES PENDENT TEMP. ESTANDAR K=5.6	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
194		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA ROCIADORES	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
195		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE CO2 DE 10lb	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
196		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 3"	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24
197		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 2.1/2"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24

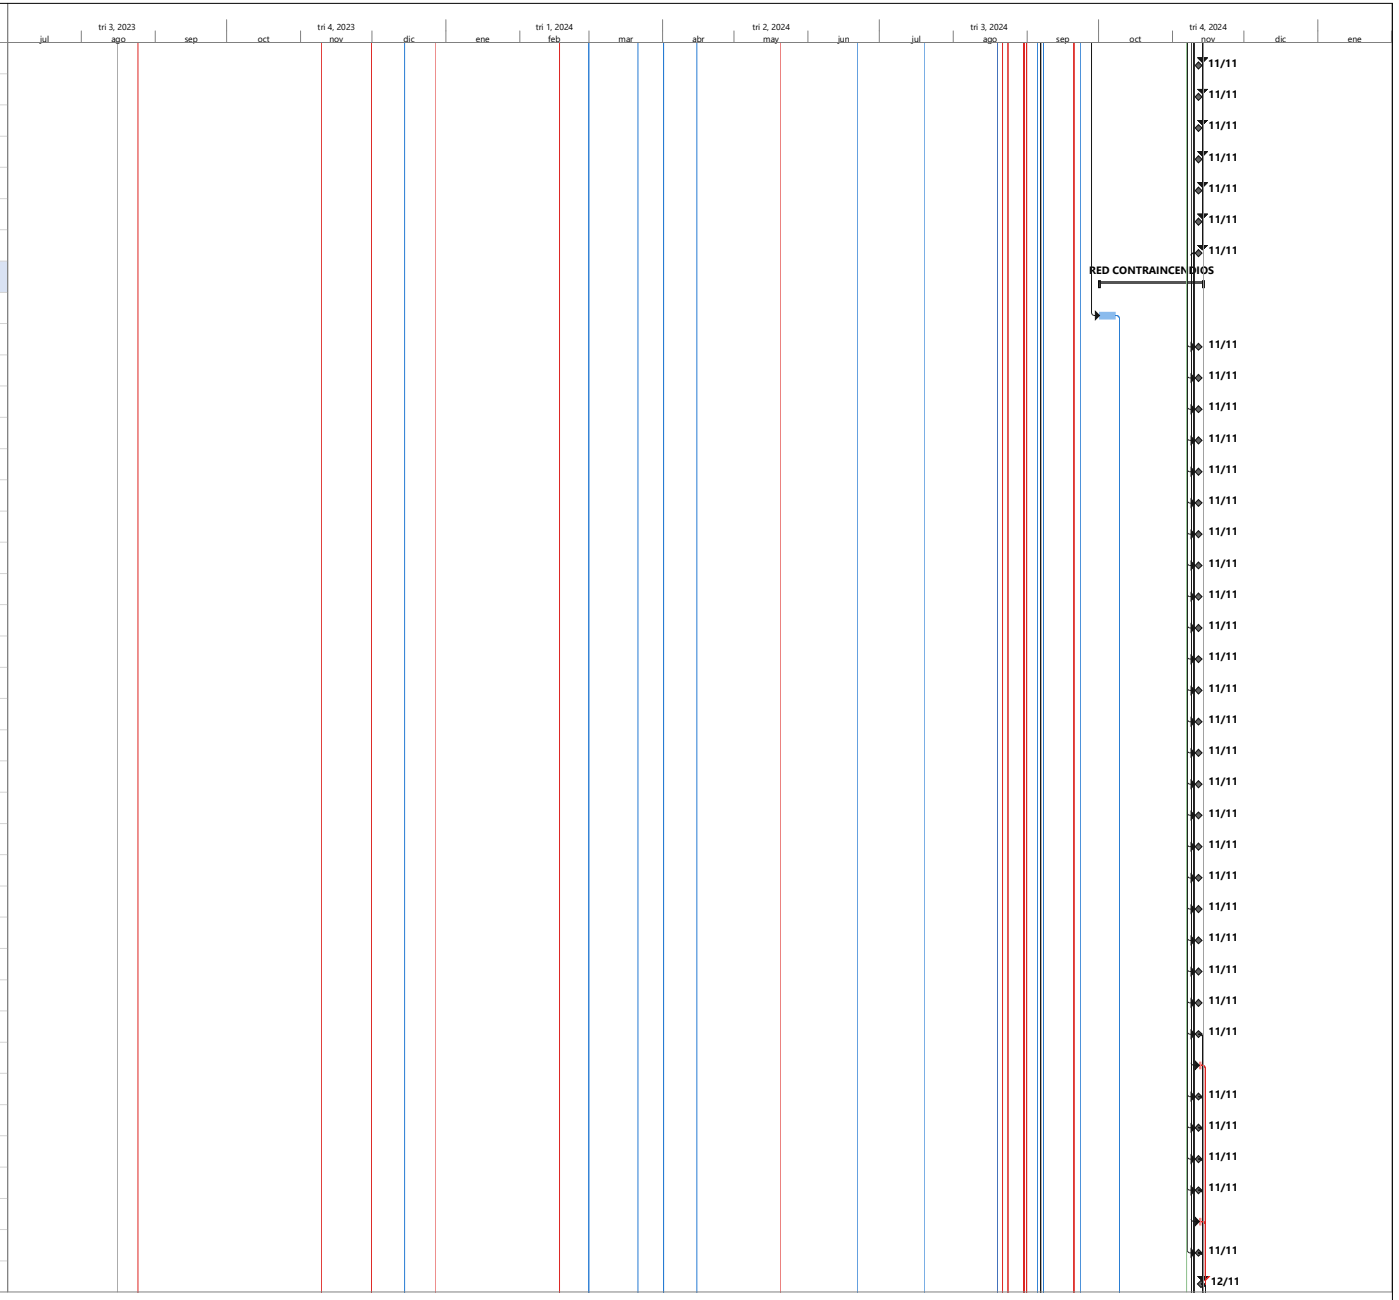

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
198		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 2"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
199		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1.1/2"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
200		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1.1/4"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
201		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO UL/FM DE 1"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
202		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL UL/FM DE 3"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
203		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL UL/FM DE 3"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
204		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL UL/FM DE 2.1/2"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
205		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL UL/FM DE 2"	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
206		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE II	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24
207		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
208		SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
209		SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON ESTROBO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
210		SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR MANUAL	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
211		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Civil de Media Tensión)**	**1 día**	**mar 12/11/24**	**mar 12/11/24**
212		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 6X6" PVC TDP ANDEN EN CONCRETO	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
213		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DERIVACION SUBTERRANEA EN CONTRUCCION TANGENCIAL PARA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
214		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION PARA RED DE MEDIA TENSION TIPO VEHICULAR (SUJETO A CAMBIO SEGÚN PROYECTO APROBADO)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
215		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA RED DE MEDIA TENSION (SUJETO A CAMBIO SEGÚN PROYECTO APROBADO)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
216		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Eléctrica de Media Tensión)**	**1 día**	**mar 12/11/24**	**mar 12/11/24**
217		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (CARCAMO) 5CMX30CM	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
218		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 120MM2 AL XLPE 15KV (*ESTIMACION SUJETA A CAMBIO SEGÚN PROYECTO SERIE 3 APROBADO)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
219		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR PARA CABLE 120MM AL 15KV (JUEGO X 3 UNIDADES)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
220		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGADOR DE SOBRE TENSIONES DPS 12KV, 10KA (JUEGO X 3 UNIDADES)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24
221		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Civil En Baja Tensión)**	**1 día**	**jue 29/08/24**	**jue 29/08/24**
222		CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	1 día	jue 29/08/24	jue 29/08/24
223		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Canalizaciones)**	**2 días**	**vie 30/08/24**	**lun 2/09/24**
224		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+1X1") PVC	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
225		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (2X1") / (1X1")PVC	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
226		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+3X1") PVC	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
227		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+3X1"+1X3/4") PVC	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
228		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION (1X1 1/4"+4X1"+1X3/4") PVC	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
229		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1 1/4")PVC	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
230		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X 1 1/4"+2X1") PVC	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
231		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1 1/4"+5X1")PVC	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
232		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X1"+1 1/4")PVC	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
233		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN (2X2"IMC)	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
234		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Acometidas Electricas En Baja Tensión)**	**1 día**	**mar 3/09/24**	**mar 3/09/24**
235		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL PLANTA-GM.TGAG(3X2+1X2+1X8T) CU LSHF FR POR CARCAMO	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24

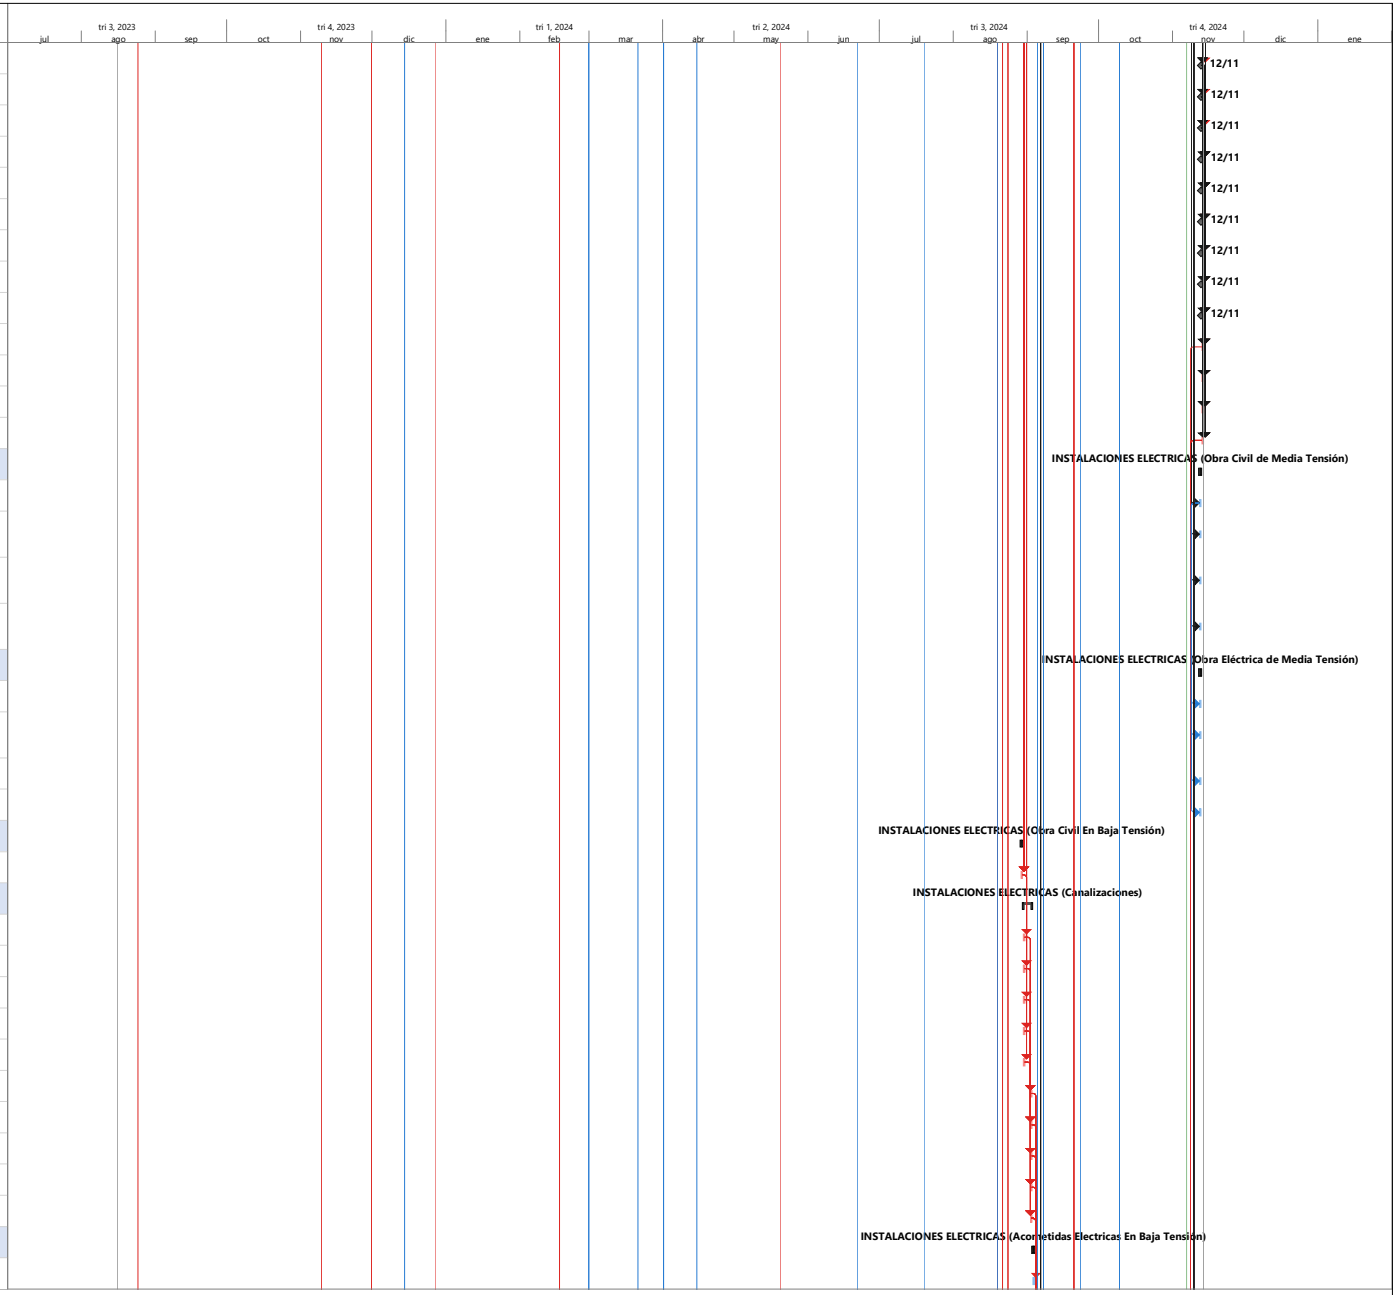

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
236		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRAFO-GM.TGA/GM.TGA-TGA(3X2/0+1X2/0+1X6T) CU LSHF FR POR CARCAMO	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
237		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRANSF.TGAESC-TGAESC/TGAG-TRANSF.TGAESC/GA-TRANSF.TGAESC (3X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR, POR CARCAMO	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
238		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TRANSF.TGAEQ-TGAEQ/TGAG-TRANSF.TGAEQ/TGA-TRANSF.TGAEQ (3X4+1X4+1X8T) CU LSHF FR, POR CARCAMO	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
239		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGA-TN.1/TGA-TN.2/TGAEQ-PTALL/TGAEQ-T.BMB/TGAESC-TEC (3X8+1X8+1X10T) CU LSHF FR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
240		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGA-T.SM (1X10+1X10+1X10T) CU LSHF FR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
241		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAEQ-TR (2X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
242		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAEQ-T.SE (1X10+1X10+1X10T) 1X3/4"EMT CU LSHF FR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
243		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TGAESC-TEV (1X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
244		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Tableros De Distribución Final En Baja Tensión)**	**1 día**	**mar 3/09/24**	**mar 3/09/24**
245		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER (T.BMB)-INCLUYE BREAKER 3X20A /(PTALL)-INCLUYE BREAKER 3X40A	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
246		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION TCIL, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
247		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS 1F (T.EV) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 4 /TABLERO TIPO ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS 1F (TSM) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 3	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
248		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS 1F (T.R) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 5	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
249		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS 1F (T.SE) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 2	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
250		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 24 CIRCUITOS 3F, 5H (TEC) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 11	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
251		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 18 CIRCUITOS 3F, 5H (TN1) BREKAERS ENCHUFABLES 1X20: 8. BREAKERS ENCHUFABLES 2X20: 1	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
252		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE XXA, PUERTA Y CHAPA 18 CIRCUITOS 3F, 5H (TN2) BREAKERS ENCHUFABLES 1X20: 13	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
253		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA SEMI-DIRECTA EN BAJA TENSION TGA NORMALIZADA EBSA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
254		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL (TGA) DE ACOMETIDAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
255		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS GENERADOR (TGAG) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
256		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS SISTEMA DE EQUIPOS (TGAEQ) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
257		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS SISTEMA ESCENCIAL (TGAESC) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
258		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SISTEMA ESCENCIAL (TRANFS.ESC) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
259		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA SISTEMA EQUIPOS (TRANFS.EQ) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
260		SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE MEDIDA EN BT NORMA ET914-AE319	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
261		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGA, SEGÚN ET908-AE311	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
262		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS GENERADOR TGAG	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
263		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL SISTEMA DE EQUIPOS TGAEQ	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
264		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL SISTEMA ESCENCIAL TGAESC	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
265		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 50A-USO INTERIOR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
266		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 70A-USO INTERIOR	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
267		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Iluminacion Zonas Verdes, Fachadas Y Senderos)**	**0 días**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
268		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR JETTA 20W	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
269		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROL LED OPERA 80W	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
270		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR JETTA 30W	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24

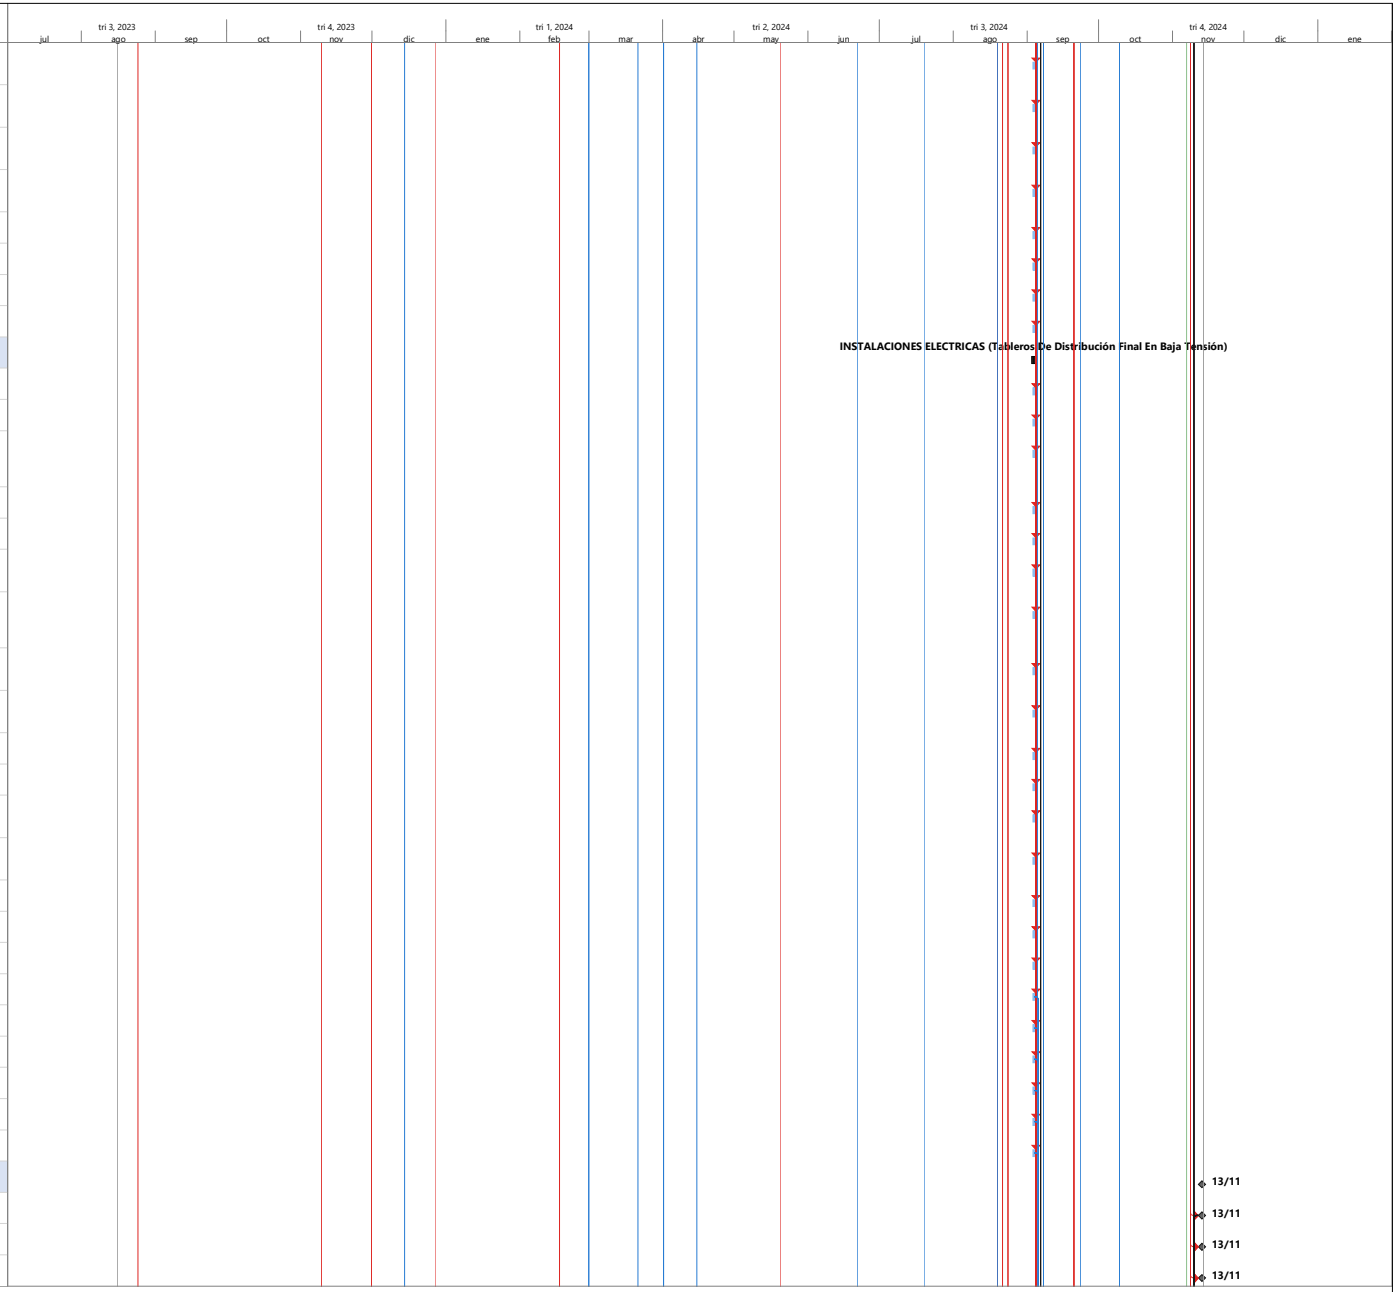

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
271		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ALUMBRADO EXTERIOR 3(1X10+1X10)+10T CU THHN	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
272		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION ALUMBRADO EXTERIOR TUBERÍA 1 1/2" PVC	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
273		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Interruptores para iluminación)**	**1 día**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
274		SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR SENCILLO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
275		SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR DOBLE	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
276		SUMINISTRO E INSTALACIÓN - INTERRUPTOR TRIPLE	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
277		SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-200 LEVITON O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
278		SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR PIR 360 ODCOS L1W LEVITON O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
279		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W SYLVANIA O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
280		SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT LED PANEL SQ 45W SYLVANIA P37459 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
281		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED SYLVANIA 15W JUPITER SYLVANIA P27931 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
282		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL RD SYLVANIA P24628 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
283		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL SQ 18W SYLVANIA P24975 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
284		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA ECO KIT 7W SYLVANIA P27868 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
285		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA (P33718) SYLVANIA O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
286		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 50W SYLVANIA P26728 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
287		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED MINI CONTINUUM 40W SYLVANIA P28318 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
288		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W SYLVANIA P37562 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
289		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 12W P27479 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
290		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 30W P26449 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
291		SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMERGENCIA P24023 18W O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
292		SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA LED DECO PISO P26960 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
293		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Tomacorrientes)**	**1 día**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
294		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA LUMINEX FUTURA 686533 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
295		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R, GFCI CON LED INDICADOR LUMINEX FUTURA 686535 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
296		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA LUMINEX FUTURA 686538 O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
297		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
298		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA AISLADO GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
299		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F GFCI CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO O SIMILAR	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
300		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE BIFASICO	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
301		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 5-20R 1F CON POLO A TIERRA CON TAPA TIPO INTEMPERIE	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
302		**INSTALACIONES ELECTRICAS (Salidas De Alumbrado Y Tomacorrientes)**	**51 días**	**mar 3/09/24**	**mié 13/11/24**
303		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (SISTEMA NORMAL-EMERGENCIA) 5CMX15CM	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
304		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA E90 (SISTEMA REGULADO Y NORMAL) 5CMX10CM	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
305		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTACABLES EN (2X12+1X12+12T) CU LSHF FR CT-SISTEMA CRITICO Y NORMAL	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
306		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA PORTACABLES EN (2X12+1X12+12TA) CU LSHF FR CT-SISTEMA REGULADO	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
307		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W, TUBERÍA 3/4" EMT, NO INCLUYE LUMINARIA, CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	mié 4/09/24	mié 4/09/24

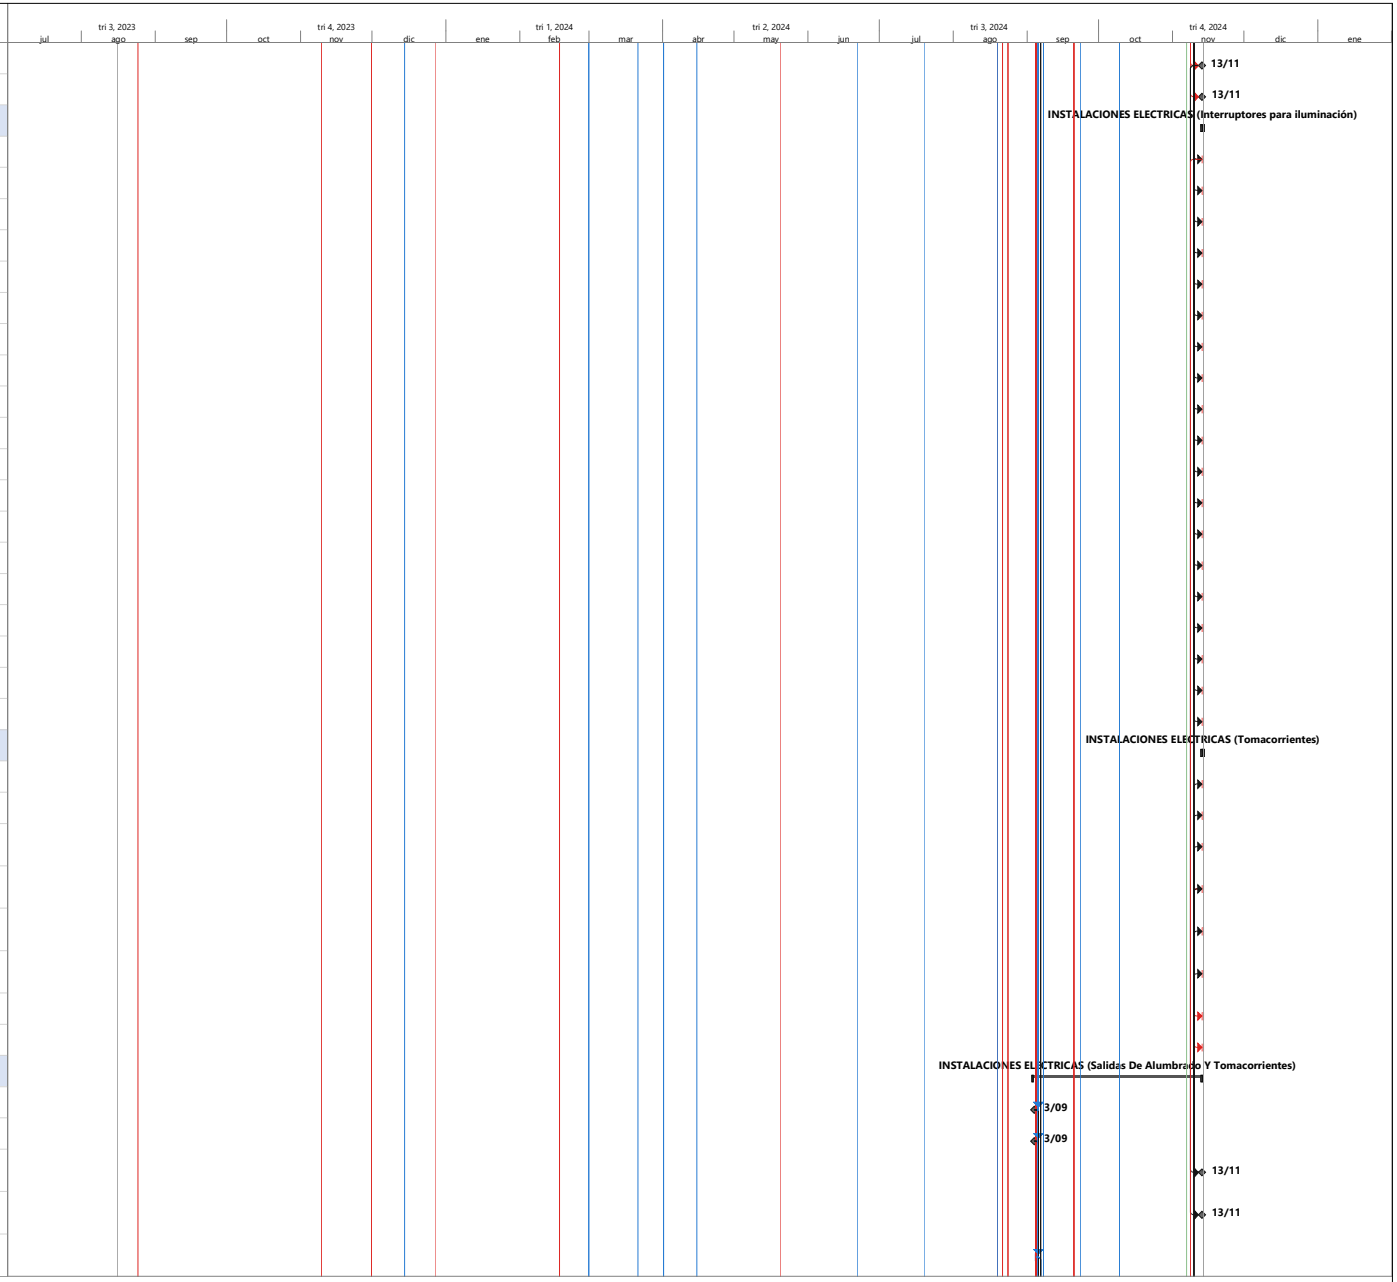

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
308		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE TUBERÍA 3/4" EMT/SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-200, TUBERIA 3/4"PVC NO INCLUYE SENSOR, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN/SENSOR PIR 360 ODCOS	1 día	mié 4/09/24	mié 4/09/24
309		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F POLO A TIERRA, NO INCLUYE TOMACORRIENTE DE COLOR BLANCO ROJO Y NARANJA INCLUYE TUBERIA 3/4" EMT, CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
310		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA KIT LED PANEL SQ 45W/ BALA LED 15W JUPITER/ LUMINARIA LED PANEL RD/ LUMINARIA LED PANEL SQ 18W / BALA ECO KIT 7W/ LUMINARIA LED EMERGENCIA (P33718), TUBERÍA 3/4" PVCSCH40, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CAB	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
311		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA REFLECTOR LED JETTA 50W-LUMINARIA LED MINI CONTINUM 40W, TUBERÍA 3/4" PVC, NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
312		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, TUBERÍA 3/4" PVC NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
313		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, TUBERÍA 3/4" PVC NO INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE CABLEADO EN 3X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
314		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 12W P27479, TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R/ TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F POLO A TIERRA MONTAJE EN PISO / TOMACORRIENTE DOBLE1F 5-20R/ TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R / SECAMANOS TUBERÍA 3/4" PVC/	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
315		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SECAMANOS TUBERÍA 3/4"-UNIDAD TIPO MINI SPLIT 3/4 PVC , INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
316		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 1F CON POLO A TIERRA AISLADA COLOR NARANJA y rojo, TUBERÍA 3/4"PVC, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T+12TA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
317		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F / + 1F POLO A TIERRA MONTAJE EN CANALETA, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
318		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METALICA CALIBRE 22 EN LAMINA COLD ROLLED 4X12 CON DIVISIÓN (INCLUYE ACCESORIOS Y TROQUELES)	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
319		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 1F -TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R- TOMACORRIENTE DOBLE 1F CON POLO A TIERRA AISLADA COLOR NARANJA, TUBERÍA 3/4"PVC SCH40, NO INCLUYE TOMACORRIENTE, INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE CON	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
320		**INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA PUESTA A TIERRA)**	**1 día**	**mar 3/09/24**	**mié 4/09/24**
321		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLAJE Y CABLEADO PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN INCLUYE ACCESORIOS COPPERWELD DE 5/8" X 8'(2,44M) SOLDADURA Y CABLE Nº 2/0 AWG DESNUDO	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
322		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN PLATINA DE COBRE (50X5X300 MM) DE LARGO CON 2 AISLADORES DE FIBRA TIPO BARRIL PARA SUBESTACION	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
323		MEDICIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA POST CONSTRUCCION	0 días	mié 4/09/24	mié 4/09/24
324		**INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS)**	**1 día**	**mar 3/09/24**	**mié 4/09/24**
325		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA AL H=0.6M, 5/8"	0 días	mié 4/09/24	mié 4/09/24
326		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD Ø 5/8" X 2,4 ML	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
327		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" PARA BAJANTE (DESDE CUBIERTA)	1 día	mié 4/09/24	mié 4/09/24
328		SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM (CUBIERTA) Y VARILLAJE COPPERWELD 2,4M	0 días	mar 3/09/24	mar 3/09/24
329		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPAS DE CONEXIÓN 8 MM A JUNTA DE DILATACION - PUNTA CAPTADORA - ALAMBRON - BAJANTE	0 días	mié 4/09/24	mié 4/09/24
330		**INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS**	**1 día**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
331		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MULTITOMAS VERTICALES Y CLAVIJA DE SEGURIDAD L5-30 PARA GABINETE RACK DE 19"	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
332		SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL 24 PUERTOS, CAT 6A BLINDADO+24 JACKS RJ45 CAT6A PARA CABLEADO HORIZONTAL.	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
333		SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45 CAT 6AX3 ADMINISTRACIÓN EN RACK Y PUESTOS DE TRABAJO	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
334		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CATEGORÍA 6A LIBRE DE HALOGENOS	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
335		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA RJ45 DOBLE PARA VOZ Y DATOS. INCLUYE FACEPLATE SENCILLO, JACK RJ45 CAT 6A	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
336		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA RJ45 SENCILLA PARA DATOS.INCLUYE FACE PLATE SENCILLO, JACK RJ45 CAT 6A	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24

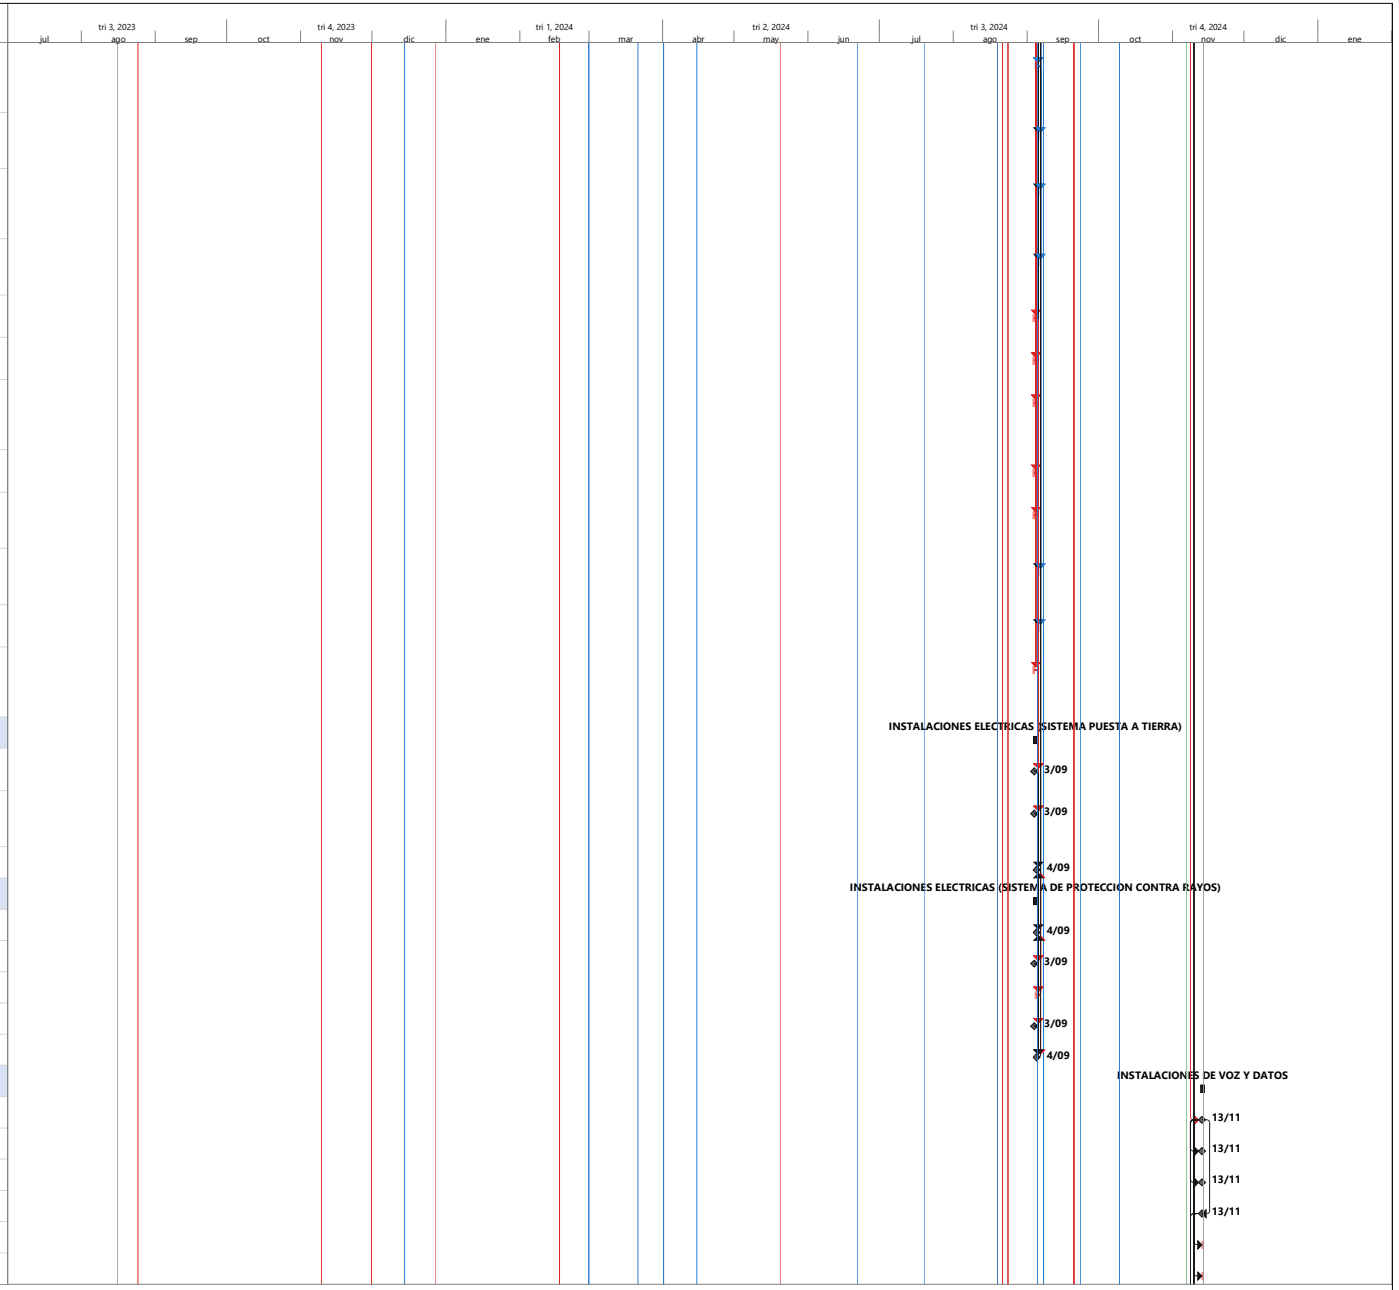

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
337		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA PARA RED DE DATOS 200X100MM EZ CABLOFIL INCLUYE SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIGURACIÓN , ATTERRIZAJE EN CALIBRE 4 CU Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
338		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PERIMETRAL 12X5CM, FABRICADO EN LAMINA CR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, DIVISION CENTRAL, TAPA TIPO ATORNILLABLE, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
339		SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL LOGICO PARA CANALETA DE 12X5CM FABRICADO EN LAMINA CR	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
340		**INSTALACIONES CCTV**	**1 día**	**mié 13/11/24**	**mié 13/11/24**
341		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CAMARA CCTV EN TUBERÍA 3/4" EMT, INCLUE TERMINALES, UNIONES, CURVAS, CAJAS Y SOPORTERÍA.	1 día	mié 13/11/24	mié 13/11/24
342		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CATEGORÍA 6A LIBRE DE HALOGENOS	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
343		SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT CCTV HIK VISION 4K 5MP: INCLUYE: A) 1DVR REF DS7216HUHI-K1 16 CANALES TURBO 4.0, COPRESIÓN H.265+TURBO 8MP LITE/5MP 1BAHIA/10TB H.265+30FPS HDMI 4K/VGA METAL HIK VISION SALIDA A 4K. B) 5 CAMARAS TIPO DOMO REF.DS2CE56H0T-ITP	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
344		**EXTERIORES Y ZONAS VERDES**	**0 días**	**jue 5/09/24**	**jue 5/09/24**
345		PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
346		PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
347		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS DE PERMANENCIA EN CONCRETO Y MADERA	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
348		ASEO GENERAL ENTREGA	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
349		**VÍAS Y PARQUEDADEROS**	**48 días**	**jue 5/09/24**	**mié 13/11/24**
350		CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
351		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
352		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUÉS DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
353		SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24
354		**EQUIPOS ESPECIALES**	**0 días**	**jue 5/09/24**	**jue 5/09/24**
355		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE TELECOMUNICACIONES. INCLUYE (10 SALIDAS CON POLO A TIERRA AISLADA, CONEXIÓN MEDIANTE CLAVIJA DE SEGURIDAD L5-30 Y DOS ORGANIZADORES VERTICALES)	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
356		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINTS	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
357		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA CABINADA DIESEL, TIPO STAND BY 208/120V 60KW,75KVA. INCLUYE DESFOGUE, SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y CUARTO ISONORIZADO	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
358		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESIÓN (ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA) Y TANQUE HIDROACUMULADOR PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
359		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA, RED CONTRA INCENDIOS. INCLUYE: BOMBA JOCKEY DIESEL, TABLERO JOCKEY, TABLERO PRINCIPAL Y ACCESORIOS	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
360		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ON LINE, 5KVA 2F CON BY PASS AUTOMATICO Y TIEMPO MINIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
361		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,2KV/208V, 112.5KVA SECO CLASE H EN CELDA NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
362		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASE INTERCONEXIÓN CELDA-TRANSFORMADOR 3X120MM2 XLPE AL 15KV	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
363		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA TRIPLEX DE ENTRADA-SALIDA-PROTECCION NORMA EBSA, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	0 días	jue 5/09/24	jue 5/09/24
364		**NO PREVISTOS (VARIOS)**	**259 días**	**mié 23/08/23**	**mié 28/08/24**
365		CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	3 días	mié 23/08/23	vie 25/08/23
366		SOBRERCIMIENTO DE ALTURA HASTA 30CM E=0.20 MTS	20 días	mié 13/12/23	jue 18/01/24
367		AFINADO EN CUBIERTAS PLANAS E=6CM	3 días	mié 28/02/24	vie 1/03/24
368		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	5 días	lun 19/08/24	vie 23/08/24
369		DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	1 día	lun 28/08/23	lun 28/08/23

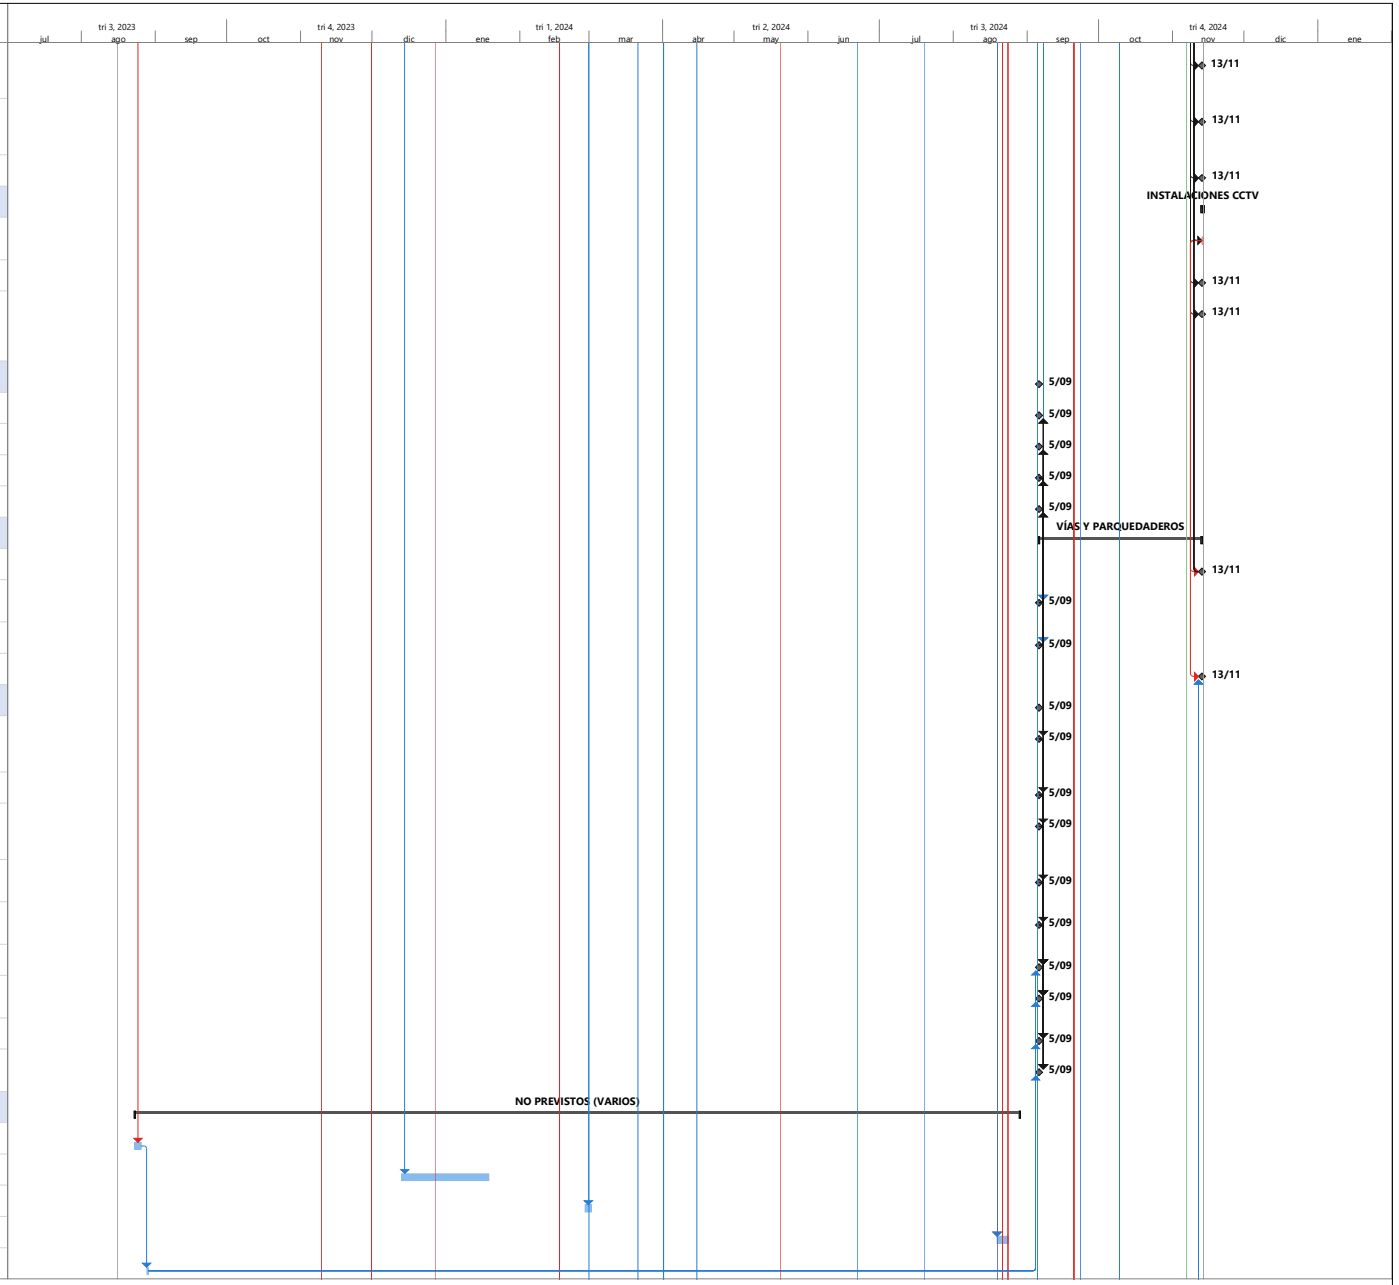

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
370		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO IMPERMEHABILIZANTE CALIBRE 4 PARA AISLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	15 días	mié 8/11/23	mar 28/11/23
371		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	8 días	lun 19/08/24	mié 28/08/24
372		**NO PREVISTOS (MAMPOSTERIA)**	**50 días**	**vie 16/02/24**	**jue 25/04/24**
373		COLUMNETA CONFINAMIENTO 0.12X0.25 (INCLUYE REFUERZO DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	20 días	lun 4/03/24	vie 29/03/24
374		VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO Y SOPORTE DE CORREAS 0.12X0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	15 días	lun 11/03/24	vie 29/03/24
375		COLUMNETA CONFINAMIENTO 0.12X0.20 (INCLUYE REFUERZO DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	16 días	vie 16/02/24	vie 8/03/24
376		VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 0.12X0.15 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	15 días	vie 8/03/24	jue 28/03/24
377		MURO CULATA EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS	15 días	vie 16/02/24	jue 7/03/24
378		PAÑETE DE CULATA IMPERMEABILIZADO 1:3	20 días	vie 29/03/24	jue 25/04/24
379		FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	8 días	lun 15/04/24	mié 24/04/24
380		REGATA SOBRE MUROS EN CONCRETO LADRILLO Y BLOQUE	8 días	mié 20/03/24	vie 29/03/24
381		**NO PREVISTOS (ESTRUCTURA METALICA)**	**15 días**	**lun 1/04/24**	**vie 19/04/24**
382		ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE PERFILERIA METALICA Y ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE ANCLAJE Y FIJACION DE PLATINA O ANGULO	15 días	lun 1/04/24	vie 19/04/24
383		ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE PERFILES METALICOS Y ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE ANCLAJE DE HASTA 4 PERNOS Y FIJACION DE PLATINA	10 días	lun 1/04/24	vie 12/04/24
384		ACCESORIO DE ANCLAJE PARA UNION ENTRE PERFILES METALICOS Y ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE ANCLAJE DE HASTA 6 PERNOS Y FIJACION DE 2 PLATINAS	10 días	lun 1/04/24	vie 12/04/24
385		**TANQUES Y ESTACION DE BOMBEO (ITEM NO PREVISTOS)**	**5 días**	**mar 30/07/24**	**lun 5/08/24**
386		ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1"	1 día	mar 30/07/24	mar 30/07/24
387		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS PLASTICOS EN POLIPROPILENO PARA ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO	1 día	mié 31/07/24	mié 31/07/24
388		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÀLICO, BISAGRA Y SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	1 día	jue 1/08/24	jue 1/08/24
389		CINTA SIKA PVC. V=0.15	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24
390		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=2"	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
391		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=1"	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
392		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
393		PASES DE TANQUE DE HASTA 3" NIPLADOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ESPIGOS DE FIJACIÓN	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
394		PASES DE TANQUE DE HASTA 6" NIPLADOS DE HG, INCLUYE ESPIGOS DE FIJACIÓN	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
395		IMPERMEHABILIZACION DE ZONAS HUMEDAS	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
396		SUMIDERO LONGITUDINAL EN MAMPOSTERIA DE 20CM X40CM INTERNOS (INCLUYE REJILLA METALICA Y MARCO)	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24
397		**MURO DE CONTENCION (ITEM NO PREVISTOS)**	**50 días**	**jue 30/05/24**	**mié 7/08/24**
398		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	1 día	jue 18/07/24	jue 18/07/24
399		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	15 días	jue 18/07/24	mié 7/08/24
400		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	15 días	jue 30/05/24	mié 19/06/24
401		EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA	3 días	jue 20/06/24	lun 24/06/24
402		**PISOS (ITEM NO PREVISTOS)**	**7 días**	**jue 19/09/24**	**vie 27/09/24**
403		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN MORTERO Y PEGACOR PARA PISOS VINILICOS	7 días	jue 19/09/24	vie 27/09/24
404		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO	7 días	jue 19/09/24	vie 27/09/24
405		**HIDRAULICO (ITEM NO PREVISTO)**	**9 días**	**mar 27/08/24**	**vie 6/09/24**
406		PUNTO DE HIDRAULICO 1/2"	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24

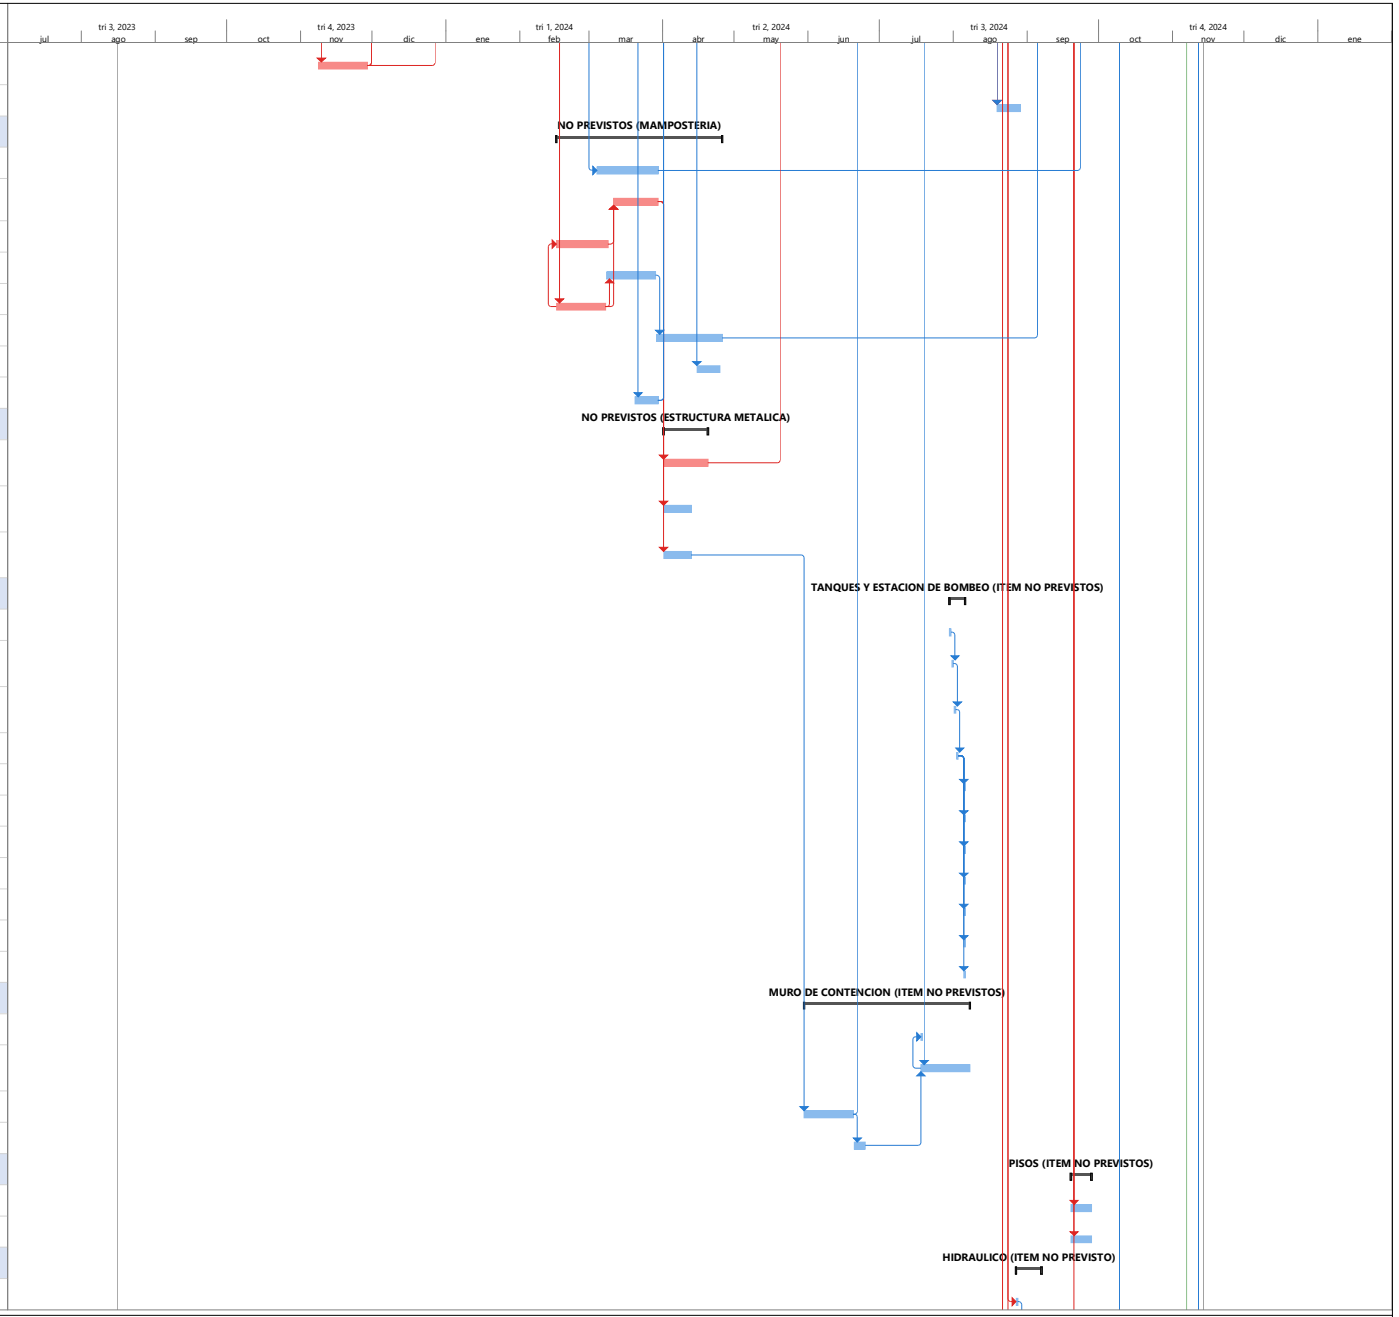

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
407		PUNTO DE HIDRAULICO 1-1/4"	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
408		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	1 día	jue 29/08/24	jue 29/08/24
409		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
410		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 " TIPO PESADO	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
411		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 -1/4" TIPO PESADO	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
412		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 2" TIPO PESADO	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
413		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE MANGUERA 1/2" INCLUYE ACOPLE HEMBRA ROSCADO	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24
414		CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	1 día	jue 29/08/24	jue 29/08/24
415		CAJAS DE LLAVEMANGUERA DE 0.35 X 0.35 X 0.35 MTS LADRILLO	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24
416		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=2 1/2"	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24
417		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=2"	1 día	mar 3/09/24	mar 3/09/24
418		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 1/2"	1 día	mié 4/09/24	mié 4/09/24
419		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 1/4"	1 día	jue 5/09/24	jue 5/09/24
420		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PRESIÓN PVC D=1 "	1 día	vie 6/09/24	vie 6/09/24
421		**SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y REVENTILACION (ITEM NO PREVISTO)**	**20 días**	**mar 20/08/24**	**lun 16/09/24**
422		PUNTO DE DESAGUES D=2"	15 días	mar 20/08/24	lun 9/09/24
423		PUNTO DE DESAGUES D= 3" Y 4"	1 día	mar 10/09/24	mar 10/09/24
424		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6"4	1 día	lun 16/09/24	lun 16/09/24
425		SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	1 día	mié 11/09/24	mié 11/09/24
426		SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE AIRE MINI-VENT 2"	1 día	mar 10/09/24	mar 10/09/24
427		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC VENTILACION 2"	1 día	mié 11/09/24	mié 11/09/24
428		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC VENTILACION 2"	1 día	jue 12/09/24	jue 12/09/24
429		SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC VENTILACION 2"	1 día	vie 13/09/24	vie 13/09/24
430		**RED CONTRA INCENDIOS - NO PREVISTOS**	**14 días**	**mar 8/10/24**	**vie 25/10/24**
431		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 DE 6"	5 días	mar 8/10/24	lun 14/10/24
432		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C900 DE 6"	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24
433		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (CODO) HD C900 DE 6"	1 día	mié 16/10/24	mié 16/10/24
434		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (SEMICODO) HD C900 DE 6"	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24
435		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (TEE) HD C900 DE 6"x6"x4"	1 día	vie 18/10/24	vie 18/10/24
436		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOR BRIDA PVC A AC DE 6"	2 días	jue 24/10/24	vie 25/10/24
437		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE HD DE PVC A PVC 6"	3 días	lun 21/10/24	mié 23/10/24
438		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (CODO) HD C900 DE 4"	1 día	mar 8/10/24	mar 8/10/24
439		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (SEMICODO) HD C900 DE 4"	1 día	mié 9/10/24	mié 9/10/24
440		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (TEE) HD C900 DE 4"x4"x4"	1 día	jue 10/10/24	jue 10/10/24
441		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOR BRIDA PVC A AC DE 4"	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24
442		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR DE HD DE PVC A PVC 4"	3 días	vie 11/10/24	mar 15/10/24
443		**PLACAS DE ACCESO VEHICULAR Y OBRAS EXTERIORES - (NO PREVISTOS)**	**7 días**	**jue 19/09/24**	**vie 27/09/24**
444		CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	7 días	jue 19/09/24	vie 27/09/24

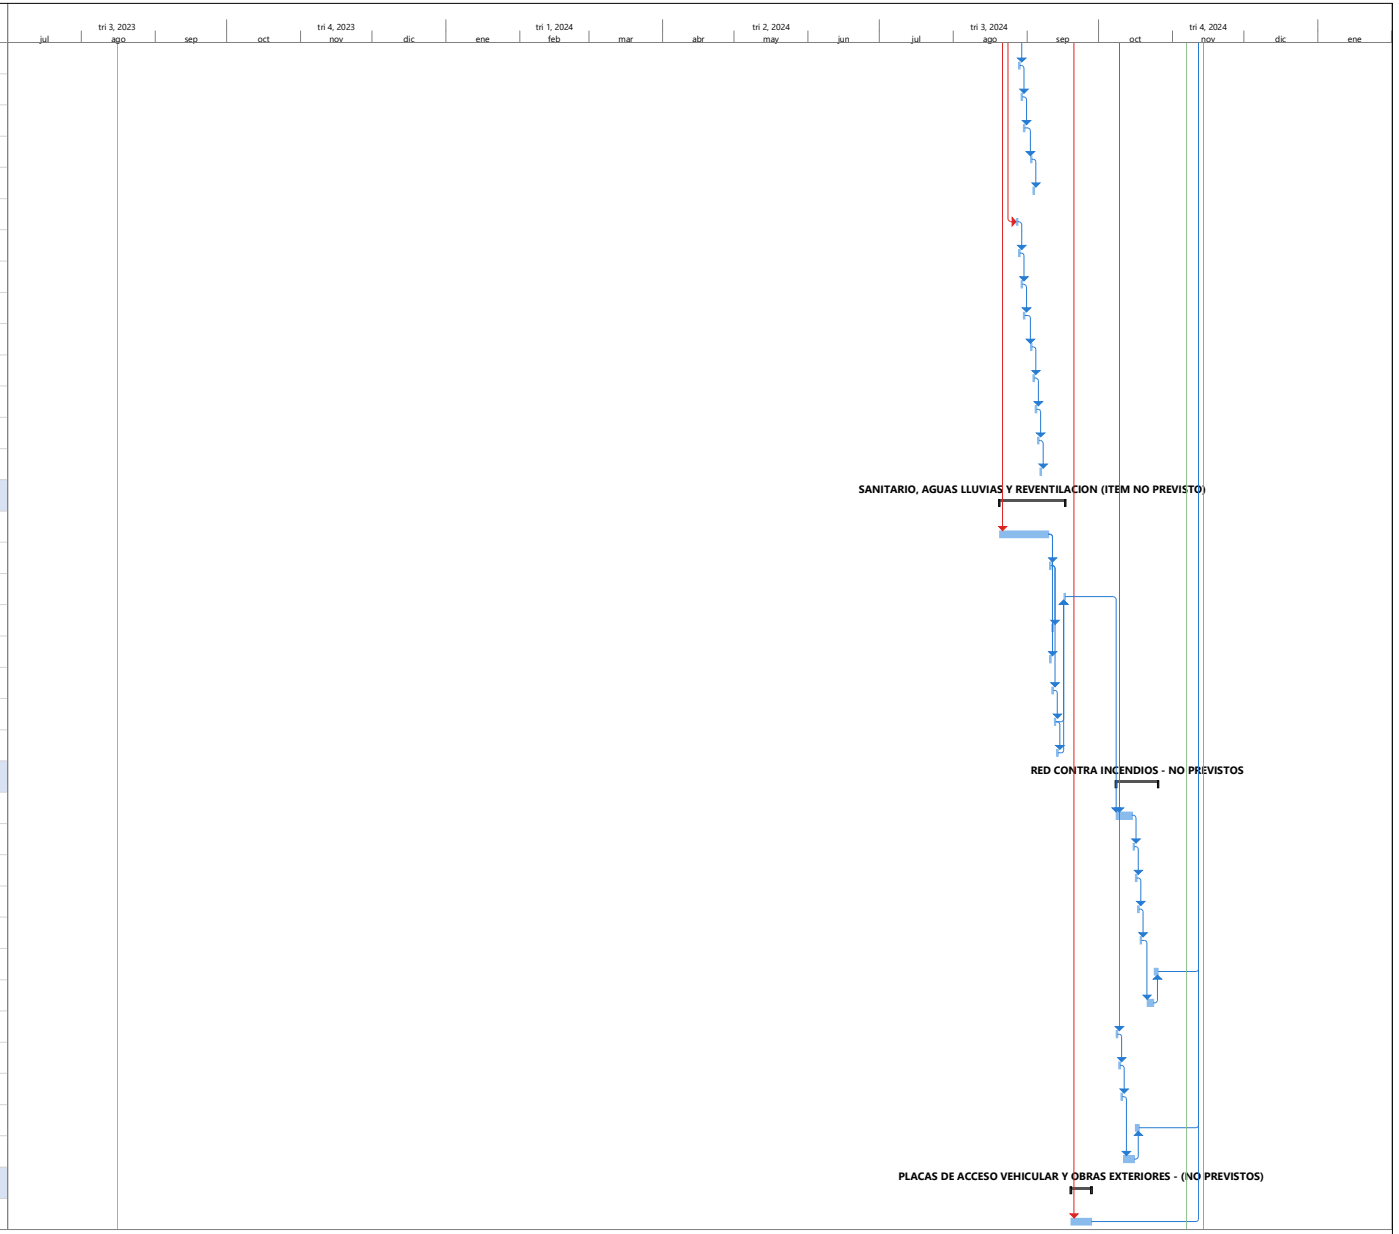

Proyecto: PROGRAMACION E.S
Fecha: jue 7/11/24

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual
