INFORME FINAL

CONTRATO DE OBRA 917 DE 2023

OBJETO CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023.

INFORME TÉCNICO, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Tabla de Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5

1.1 INTRODUCCIÓN 7

1.2 JUSTIFICACIÓN 9

2 ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES 10

3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 14

4 MATRIZ 15

5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 28

6 PRÁCTICAS SOSTENIBLES 37

7 PÓLIZAS 40

8 MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS 46

9 COMPROBANTES DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIÓN Y ARL 47

10 INFORME CONSOLIDADO COMPONENTE SOCIAL 59

10.1 INFORME DE ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL 60

10.1.1 ANALISIS CARACTERIZACIÓN SOCIAL HOGAR CUANTITATIVA FAMILIA CUALITATIVA 60

10.1.2 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 97

10.1.2.1 FASE DE VALIDACIÓN 99

10.1.2.1.1 UBICACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD- PAC 100

10.1.2.1.2 REUNIÓN DE INICIO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS BENEFICIARIOS 107

10.1.2.1.3 CARACTERIZACIÓN SOCIAL DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 112

10.1.2.1.4 ELABORACIÓN DE HISTORIA DE VIDA 123

10.1.2.2 FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS 125

10.1.2.2.1 APERTURA DE OBRA 126

10.1.2.2.2 VISITAS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 126

10.1.2.2.3 ENTREGA DE LA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 134

10.1.2.3 RENUNCIAS 145

10.1.3 ANALISIS DE MATRIZ DE ATENCIÓN PQRS, Posventas y atención a comunicación en el PAC 146

10.1.4 ANALISIS Y RESULTADO DE LA VALIDACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIAL DE LAS FAMILIAS VARIACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN Y DE LA VALIDACIÓN 151

10.1.5 LECCIONES APRENDIDAS 152

11 REGISTROS AUDIOVISUALES 154

12 PAZ Y SALVOS DE TRABAJADORES Y PROVEEDORES 154

13 ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 156

14 INFORME AMBIENTAL Y SST 157

15 LISTADO DE ANEXOS 158

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 MV por Desarrollo 29
Ilustración 2 MV Cubiertas 30
Ilustración 3 MV Cocinas 31
Ilustración 4 MV Baños 32
Ilustración 5 Combos Sanitarios 32
Ilustración 6 Enchape de Pisos 33
Ilustración 7Intervención Pañetes 34
Ilustración 8 Intervención Pintura en Muros 35
Ilustración 9 Instalación de Puertas 36
Ilustración 10 Estado Civil 61
Ilustración 11 Años de Habitar en el predio 62
Ilustración 12 Tenencia del Predio 63
Ilustración 13 Tipología de Familia 64
Ilustración 14 Número de personas por vivienda 65
Ilustración 15 Número beneficiario por sexo 66
Ilustración 16 Número de persona por sexo 67
Ilustración 17 Número de persona por género 68
Ilustración 18 Ciclo de Vida 69

Ilustración 19 Escolaridad..... 70
Ilustración 20 Afiliación a SSGS..... 71
Ilustración 21 Ocupación..... 72
Ilustración 22 Mujeres Cabeza de Hogar..... 73
Ilustración 23 Víctimas del conflicto..... 74
Ilustración 24 Discapacidad..... 75
Ilustración 25 Tipos de discapacidad..... 76
Ilustración 26 Grupo Étnico..... 77
Ilustración 27 Reconocimiento Étnico..... 78
Ilustración 28 Ingresos..... 79
Ilustración 29 Egresos..... 80
Ilustración 30 Responsabilidad Económica..... 81
Ilustración 31 Uso de la vivienda..... 82
Ilustración 32 Número de pisos de la vivienda..... 83
Ilustración 33 Número de dormitorios..... 84
Ilustración 34 Servicios Públicos..... 85
Ilustración 35 Relación con el entorno..... 86
Ilustración 36 Condiciones de saneamiento..... 87
Ilustración 37 Impedimentos para mejoras..... 88
Ilustración 38 Situaciones de la vivienda..... 90
Ilustración 39 Aportes a la familia..... 91
Ilustración 40 Conocimiento sobre SDHT..... 92
Ilustración 41 Participación Comunitaria..... 93
Ilustración 42 Organización Comunitaria..... 94
Ilustración 43 Disposición para participar..... 95
Ilustración 44 Disposición Actividades de SDHT..... 96
Ilustración 45 Tipo de solicitantes..... 147
Ilustración 46 Año de radicación..... 148
Ilustración 47 Tipo de solicitud..... 149
Ilustración 48 Hogares..... 152

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información General del Contrato..... 5
Tabla 2 Matriz de Intervención Técnica..... 15
Tabla 3Indicadores de manejo ambiental PMA primera versión..... 38
Tabla 4 Indicadores de manejo ambiental PMA actualización..... 38

Tabla 5 Resultado de Indicadores de gestión 39
Tabla 6 Pólizas 40
Tabla 7Ajuste de Pólizas por acta de inicio 41
Tabla 8 Actualización por Adición y Prorroga 42
Tabla 9 Actualización por Adición y Prorroga 43
Tabla 10 Actualización 44
Tabla 11 Actualización de Prorroga No. 2 por 2 meses y 15 días 45
Tabla 12 Ajuste a la vigencia del amparo 46
Tabla 13 Equipo Mínimo 47
Tabla 14 Personal Operativo 48
Tabla 15 Atención PAC 100
Tabla 16 Caracterización Social 112
Tabla 17 Historias de Vida postuladas 123
Tabla 18 Historias de Vida seleccionadas 125
Tabla 19 Seguimientos Relevantes 127
Tabla 20 Entregas de Mejoramiento de Vivienda 135
Tabla 21 Renuncias 145
Tabla 22 Paz y Salvos 155

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1 Información General del Contrato

ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT -SDHT
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTEREL 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS-EGR
NIT	901721094-4
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
CONTRATO	917-2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Siete (7) meses.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 5.762.880.000.00)
ADICIÓN Y PRORROGA No. 1	Dos meses quince días (2.5) meses
VALOR DE LA ADICIÓN	DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 2.505.600.000)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($8.268.480.000)
SUSPENSIÓN No. 1	SUSPENSION DESDE 17 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 01 DE MAYO DE 2024, CON FECHA DE REINICIO EL 02 DE MAYO DE 2024
AMPLIACIÓN No. 1	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN A PARTIR DEL 02 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 13 DE MAYO DE 2024, CON FECHA DE REINICIO EL 14 DE MAYO DE 2024.

PRORROGA No. 2	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS APARTIR DEL 14 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024.
CORREO ELECTRONICO	consorciobuenavivienda@hotmail.com
NUMERO DE VIVIENDAS INTERVENIDAS	TRECIENTAS NOVENTA Y CINCO (395)
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	6 DE JULIO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME	1 DE SEPTIEMBRE

1.1 INTRODUCCIÓN

La secretaria Distrital del Hábitat -SDHT con el fin de garantizar más y mejores viviendas de calidad en la ciudad de Bogotá, puso en marcha el programa de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados, para lo cual contó con cuatro (4) grupos para la ejecución de los mejoramientos.

Las obras de mejoramiento en la modalidad de habitabilidad correspondieron a aquellas que se señala en el artículo 21 del Decreto Distrital 145 de 2021.- "Subsidio distrital de vivienda en la modalidad de habitabilidad es un aporte distrital en dinero o en especie adjudicado a los hogares en condición de vulnerabilidad social y económica para facilitar aquellas obras tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes. Estas reparaciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a la habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, reemplazo de cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de fachadas de una vivienda, con el objeto de alcanzar progresivamente las condiciones básicas de una vivienda digna. Igualmente, este tipo de soluciones deberán procurar la implementación de elementos de construcción sostenibles, especialmente las referidas a la adaptabilidad de la crisis climática y la eficiencia en el manejo de los recursos".

El valor del subsidio en la modalidad de habitabilidad tuvo una asignación máxima de dieciocho (18) salarios mínimos legales mensuales vigentes -SMLMV.

Conforme lo anterior y teniendo en cuenta la magnitud del proyecto que se realizó y atendiendo la necesidad de la entidad para culminar la implementación de los mejoramientos de vivienda en la vigencia 2023, la SDHT estableció adelantar el proceso a través de cuatro (4) grupos de ejecución para un total de VEINTITRES MIL CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($23.114.160.000) M/Cte. Este valor incluyó costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio y demás impuestos de ley. De esta manera la entidad mitigó el riesgo de concentrar la ejecución en un solo contratista de obra, por cuanto con cuatro (4) grupos simplifica la logística y el tiempo de ejecución, de esta manera se logró adelantar en el tiempo estimado por la entidad, distribuidos de la siguiente manera:

Tres (3) grupos de 277 mejoramientos - Grupo 1, 2 y 3, cada uno con un presupuesto a monto agotable de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SECECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($5.783.760.000,00) M/Cte.

Un (1) grupo de 276 mejoramientos - Grupo 4, con un presupuesto a monto agotable de CINCO MIL SETECIENTOS SESEBTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($5.762.880.000,00) M/Cte.

La Subdirección de Barrios, aclaró que los territorios en los que se realizó los mejoramientos de vivienda fueron aquellos priorizados por la secretaria Distrital del Hábitat denominados Territorio Priorizado de Mejoramiento TPM, la Entidad incluyó mejoramientos en los territorios que fueron objeto de estructuración según la necesidad y hasta agotar el monto del contrato de obra en mención teniendo en cuenta que se ejecutó inicialmente en el grupo CUATRO (4) 276 mejoramientos.

Después de un proceso licitatorio la SDHT suscribió el contrato de obra 917 de 2023 con el Consorcio Buenas Viviendas – Empresa Grupo Romero SAS, cuyo objeto es Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la secretaria Distrital del Hábitat – Grupo 4 – 2023.

Inicialmente se asignaron un total de doscientos setenta y seis (276) mejoramientos de vivienda por valor de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCENTA MIL PESOS ($ 5.762.880.000.00) y en aras de asegurar el acceso de más personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y mejorar los barrios marginados, objeto de las soluciones habitacionales, así como alcanzar las metas establecidas tanto para el cuatrienio como para las metas establecidas en zonas que cuentan con una focalización de potenciales beneficiarios del Programa para el Mejoramiento de Vivienda. La SDHT evidenció la conveniencia de la modificación del contrato 917 de 2023, con el propósito de contribuir en el cumplimiento de los fines y metas propuestas por la administración, dando cumplimiento a los objetivos previsto en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, adicionando 189 mejoramientos de vivienda en dos grupos. Para el contrato de obra 917-2023 se adicionó CIENTO VEINTE (120) mejoramientos de vivienda, los cuales ascendió a un valor de DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.505.600.000). La SDHT, consideró que persistía la necesidad definida en los estudios previos, por lo que dio continuidad a los servicios prestados por el contratista, en aras de mantener el correcto funcionamiento de los procesos institucionales, garantizando de

esta manera, la ejecución permanente de actividades, durante el primer trimestre del año 2024.

1.2 JUSTIFICACIÓN

El Programa de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad buscó asegurar que las familias más vulnerables del distrito pudieran acceder a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y mejorar los territorios priorizados por la SDHT.

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR celebró el contrato 917 de 2023 con la Secretaría Distrital del Hábitat – (SDHT) con el objeto de contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat. Grupo 4 – 2023.

La ejecución del Programa de Mejoramiento de Vivienda de Grupo 4 inicialmente tuvo un total de doscientos setenta y seis (276) mejoramientos de vivienda, la SDHT en una primera etapa hizo entrega de un total de ciento trece (113) mejoramientos en la localidad de Usme, distribuidos en el TPM Alfonso López en los barrios Altos del Pino (10 Mejoramientos de Viviendas - MV); Casaloma II (1 MV), Casaloma (2 MV); Compostela I (46 MV) Compostela II (23 MV); Compostela III (1 MV); San Felipe (9 MV), San Isidro (1 MV) y San Isidro Sur (20 MV) para un total de 113 Mejoramientos de viviendas. En esta primera etapa se presentaron un total de tres (3) renuncias, las cuales fueron radicadas por contratista de obra a interventoría y estos a SDHT.

La SDHT realizó una segunda entrega de ciento sesenta y nueve (169) mejoramientos de viviendas, los cuales están ubicados en la localidad de Usme, distribuidos en el TPM Alfonso López en los barrios Villa Hermosa (118 MV) y El Curubo (51 MV). Se precisa que en esa segunda entrega la SDHT realizó una adición de tres (3) mejoramientos de viviendas, para un total de doscientos setenta y nueves (279) mejoramientos de viviendas.

Así mismo la SDHT realizó entrega de cuatro (4) MV dos en el desarrollo El Curubo y dos en el desarrollo Villa Hermosa, para un total de doscientos ochenta y seis (286) MV entregados. Debido a las renuncias presentadas la SDHT hace entrega de dos (2) MV para reemplazo de las renuncias que se presentaron durante la ejecución. En total la SDHT hace entrega de doscientos ochenta y ocho (288) MV y de esta forma el contratista de obra realizó las doscientos setenta y seis (276) MV del contrato 917 de 2023.

La SDTH realizó adición al contrato 917 de 2023 de ciento veinte (120) MV mejoramientos en la localidad de Usme, distribuidos en el TPM Alfonso López en los barrios Alfonso López sector el progreso (14); Altos del Pino (3 MV); Bulevar del Sur (19 MV); Casaloma (1 MV); El Bosque (1 MV); El Curubo (1 MV); El Portal II Etapa (1 MV); El Rosal (22 MV); La Esperanza (32 MV); Rincón del Bulevar (2 MV); San Andrés Alto (15 MV); San Felipe (5 MV) y Villa Hermosa (4 MV).

Durante la ejecución del contrato de obra se presentaron un total de dieciséis (16) renuncias y tres (3) desistimientos.

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR ejecutó un total de trescientas noventa y cinco (395) mejoramientos de vivienda de los trescientas noventa y seis (396) MV esto debido a que la SDHT no realizó cambio de una de las renuncias presentadas.

En este informe se describirán cada una de las acciones que realizó el contratista de obra en los componentes técnico, social, SST y ambiental.

2 ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES

La SDHT realizó adición y prorroga No. 1 al contrato de obra 917 de 2023 Consorcio Buenas Viviendas – EGR, adicionó CIENTO VEINTE (120) mejoramientos de vivienda, los cuales tienen un valor de DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.505.600.000) con un tiempo de ejecución de dos meses quince días (2.5 meses), el periodo de ejecución comprendió del 6 de febrero de 2024 al 20 de abril de 2024.

La SDHT en aras de asegurar el acceso de más personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y mejorar los barrios marginados, objeto de las soluciones habitacionales, así como alcanzar las metas establecidas tanto para el cuatrienio como para las metas establecidas en zonas que cuentan con una focalización de potenciales beneficiarios del Programa para el Mejoramiento de Vivienda. La SDHT evidenció la conveniencia de la modificación del contrato 917 de 2023, con el propósito de contribuir en el cumplimiento de los fines y metas propuestas por la administración, dando cumplimiento a los objetivos previsto en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, adicionando 189 mejoramientos de vivienda a dos grupos. Para el contrato de obra 917-2023 se adicionó CIENTO VEINTE (120) mejoramientos de vivienda, los cuales ascendió a un valor de DOS MIL QUINIENTOS

CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.505.600.000). Por lo tanto, consideró que persistía la necesidad definida en los estudios previos, por lo que fue importante dar continuidad a los servicios prestados por el contratista, en aras de mantener el correcto funcionamiento de los procesos institucionales, garantizando de esta manera, la ejecución permanente de actividades, durante el primer trimestre del año 2024.

Por las razones expuestas anteriormente la SDHT realizó una adición de DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 2.505.600.000) para la ejecución de ciento veinte (120) mejoramientos de vivienda.

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR realizó en el mes de abril solicitud de suspensión del contrato de obra 917 de 2023 a través de oficio CBV-EGR-917-2023-115 a la interventoría por hechos de fuerza mayor, sustentado en las amenazas contra la vida e integridad del personal, las cuales fueron enviadas a través de la plataforma de WhatsApp y que motivaron a una denuncia ante la fiscalía general de la nación. De igual forma la interventoría también fue objeto de amenazas informando a la SDHT a través de los oficios 984-2023-182 cuyo asunto Comunicado Riesgo Publico – amenazas a la integridad del personal profesional de interventoría con radicado 1-2024-13688 y 984-2023-186 con asunto Requerimiento seguridad integral en territorio con radicado 1-2024-14073.

Esta suspensión del contrato se solicitó por quince (15) días calendario a partir del 17 de abril de 2024 hasta el día 2 de mayo de 2024, la cual tuvo el aval por parte de la interventoría y SDHT.

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR a través de oficio CVB-EGR-917-2023-108 de 4 de abril de 2024 solicitó a la interventoría se realizara una prórroga al contrato de obra 917 de 2023 por un término de 60 días calendarios contados a partir del día 21 de abril de 2024 fecha en la que se vencía el plazo inicial del contrato, esto con el objetivo de que contratista de obra analizará y determinará la pertinencia de continuar o no con la ejecución de las cubiertas tenido en cuenta la metodología de instalación de cubiertas que se llevaba a cabo.

A través de oficio CBV-EGR-917-2023-126 del 3 de mayo de 2024 el Consorcio Buenas Viviendas radicó oficio con asunto “Solicitud de prórroga contrato de obra No. 917-2023”, donde informa a interventoría de las razones por las cuales está solicitando la prórroga del contrato 917-2023, en las cuales expone unas **justificaciones técnicas** (Consecución de personal de obra y Disponibilidad de materiales); además **otras circunstancias que dieron origen a la solicitud de Prórroga** (Aspectos de seguridad,

Vendaval del 21 de marzo de 2024 y Medida cautelar decretada en contra de uno de los integrantes del Consorcio Buenas Viviendas) y **las circunstancias para determinar el tiempo de la prórroga** (Efectos de la temporada invernal). De acuerdo a los argumentos anteriormente expuestos y ante la necesidad de dar un total alcance a las actividades establecidas contractualmente, se solicitó aprobación de la prórroga por dos meses y quince (15) días calendario al plazo establecido contractualmente que tenía como fecha el 17 de mayo de 2024, tiempo en el cual se consideró pertinente la ejecución de los noventa y siete (97) mejoramientos de vivienda faltantes por culminar y las intervenciones en las treinta (30) casas afectadas por el vendaval de marzo, para finalizar la ejecución de los trescientos noventa y seis (396) mejoramientos de vivienda establecidos en la ejecución del contrato 917 de 2023. Por lo anterior, la prórroga se desarrollaría desde el 18 de mayo de 2024 hasta el 31 de julio de 2024.

Ante la anterior solicitud la interventoría a través de oficio 984-223-207 y número de radicado 1.2024-19607 presentó a la SDHT solicitud con asunto “Respuesta de aprobación a oficio CVB-EGR-917-2023-126 Solicitud de prórroga contrato de obra contrato de obra No. 917-2023” exponiendo los siguientes antecedentes y su justificación:

Los argumentos estipulados por el contratista de obra presentados durante la fase de ejecución del contrato se identifican como situaciones no solo verídicas sino también totalmente fundamentadas que conllevan a la necesidad de ampliar las obligaciones contractuales por el término indicado, ello es, dos (2) meses y quince (15) días calendario contados a partir de la terminación del plazo contractual pactado.
Se hace necesario plantear que la posibilidad de la prórroga se encuentra enmarcada no solo dentro del principio de la libre autonomía de las partes, sino que dicha posibilidad se desprende de lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual “En los contratos que celebren entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes.”

Teniendo en cuenta, la solicitud de prórroga No. 02 del contratista de obra presentada a la interventoría con numeración propia CBV-EGR- 917-2023-126, y, avalada por interventoría por encontrarse justificada técnica, social y jurídicamente radicada ante la SDHT oficio con numero interno No. 984-2023-207 y número de radicado No. 1-2024-19607, presentada solicitud con asunto: “Respuesta de aprobación a oficio CBV-EGR-917-2023-126 “solicitud de prórroga contrato de obra No. 917-2023”

De acuerdo con lo anterior, esta supervisión encuentra que los argumentos técnicos, sociales y jurídicos presentados por el contratista de obra así mismo evidenciándose la

necesidad de dar trámite a la solicitud de prorroga y avalados por la interventoría, teniendo en cuenta que se encuentran justificados a la luz de las estipulaciones contractuales, por las razones expuestas con anterioridad y presentadas durante la ejecución del proyecto.

Dicho lo anterior y una vez analizados los documentos allegados se encuentra que aún persiste la necesidad que dieron origen al contrato, y, que, en la solicitud de prórroga y la reprogramación presentada por el contratista de obra, garantiza la ejecución y la culminación del mismo con el fin de satisfacer el interés general y el cumplimiento del objeto contractual.

Sobre el particular, el actual Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en materia de modificación del contrato estatal, con el fin de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de estos, atribuye a las entidades, la potestad de introducir de manera unilateral o de forma consensuada, modificaciones al contrato 1, así como, prórroga el plazo de ejecución del contrato.

Se entiende entonces por mutabilidad, la potestad que tiene la administración de variar, ciertas condiciones del contrato, siempre que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y de los fines a cargo de la entidad pública2, siendo este un instrumento jurídico para alcanzar los fines propios de la contratación, dentro de los límites legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto.

3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las obras de mejoramiento en la modalidad de habitabilidad correspondieron a aquellas que se señalan el artículo 21 del Decreto Distrital 145 de 2021.-"***Subsidio distrital de vivienda en la modalidad de habitabilidad*** *Es un aporte distrital en dinero o en especie adjudicado a los hogares en condición de vulnerabilidad social y económica para facilitar aquellas obras tendientes a mejorar las condiciones básicas de las viviendas, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes. Estas reparaciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a la habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, reemplazo de cubiertas…"*

De acuerdo con los lineamientos anteriormente descritos, las obras adelantadas dentro del alcance del contrato No. 917 de 2023 se desarrollaron atendiendo las necesidades prioritarias respecto a la habitabilidad que cada una de las viviendas en la etapa de validación se identificaron, en todos los casos se buscó invertir el 100% del subsidio, situación que en la gran mayoría de los predios beneficiados se cumplió debido a que las necesidades superan el monto del subsidio asignado.

Las obras se desarrollaron garantizando el cumplimiento del SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) y el SG-CALIDAD (Sistema de Gestión de Calidad), y las demás normas vigentes en lo que a esta área se refiere.

Durante la ejecución del proyecto se implementó y ejecutó el PMA (Plan de Manejo Ambiental), como también se cumplió con las condiciones ambientales exigidas por las normativas vigentes.

En cuanto al tipo de intervenciones realizadas, las obras se ejecutaron contando con materiales que cumplen con los estándares de calidad exigidos y la mano de obra calificada para cada una de las actividades ejecutadas. Las intervenciones se concentraron principalmente en las siguientes actividades:

- Desmonte de cubierta existente e instalación de cubierta nueva, incluyendo perfilería metálica para su soporte.
- Intervención en baños, incluye: Reparación o instalación de redes hidrosanitarias, pañetes de muros, instalación de enchape de muros y pisos, suministro e instalación de combo sanitario (sanitario con cisterna y lavamanos con grifería).

- Intervención en cocina. Incluye: Reparación o instalación de redes hidrosanitarias, pañetes de muros, instalación de enchape de muros y pisos, construcción de mesón con entrepaño enchapado y suministro e instalación de lavaplatos con grifería.
- Pañetes en habitaciones y áreas sociales
- Pintura con vinilo tipo 1 en todas las áreas de la vivienda
- Suministro e instalación de cielo rasos en tablilla PVC en las áreas que el presupuesto y las condiciones de la vivienda permitieran, dando prioridad a las habitaciones.

El contratista de obra ejecutó un total de trecientos noventa y cinco mejoramientos de viviendas, por ello hace entrega por medio magnético de los expedientes y con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada ver el anexo uno (1) denominado expedientes.

Así mismo, se hace entrega por medio magnético de los trecientos noventa y cinco formatos de acta de entrega física y recibo a satisfacción y con el objetivo de que se verifique la información enunciada ver el anexo dos (2) denominado acta de entrega a satisfacción.

4 MATRIZ

En la siguiente tabla se especifican las fechas de inicio de ejecución, fecha de terminación de la ejecución y presupuesto que se ejecutó en cada uno de los mejoramientos de viviendas.

Tabla 2 Matriz de Intervención Técnica

ID_DMV	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA INICIO EJECUCION VIVIENDA	FECHA TERMINACION EJECUCION VIVIENDA	PRESUPUESTO C.D. EJECUTADO SEGÚN CONTRATO (FASE 4)
MVAL_07731	YUBICEY CARDENAS GARZON	28/08/2023	28/09/2023	20.880.000,00
MVAL_07709	LUZ STELLA GONZALEZ RODRIGUEZ	18/08/2023	8/09/2023	20.880.000,00
MVAL_07711	NAYDILIA MONCADA LEON	17/08/2023	14/09/2023	20.685.999,14
MVAL_07719	JOSE GABRIEL DUITAMA GARCIA	28/08/2023	27/09/2023	20.880.000,00

MVAL_07937	DORA INES VEGA CHACON	1/09/2023	27/09/2023	20.880.000,00
MVAL_07933	PEDRO OSWALDO MORA DIAZ	17/10/2023	24/11/2023	20.880.000,00
MVAL_07915	EDUBINA MIRANDA GOMEZ	22/08/2023	14/09/2023	20.778.000,00
MVAL_07954	ANGIE JULLIET CASTELLANOS SANCHEZ	31/08/2023	29/09/2023	20.880.000,00
MVAL_07935	CECILIA APACHE DE LEON	23/08/2023	14/09/2023	20.880.000,00
MVAL_07575	ROCIO RIVERA HERRERA	19/09/2023	6/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07581	JOHN JAIRO GARCIA PUENTES	19/10/2023	11/11/2023	20.880.000,00
MVAL_07588	SANDRA CONSUELO ACUÑA ESPITIA	22/09/2023	12/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07586	MARILUZ BENITEZ FIRIGUA	4/10/2023	7/11/2023	20.880.000,00
MVAL_07592	JOHN ALEXANDER REYES JIMENEZ	2/10/2023	21/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07675	LIDA OFELIA URREGO UBATE	11/09/2023	11/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07557	ANDRES ANTONIO RIVAS MOLINA	13/09/2023	12/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07042	JOSE MANUEL RAMIREZ BUITRAGO	22/09/2023	24/10/2023	20.880.000,00
MVAL_06998	AMADEO CIFUENTES ORJUELA	19/09/2023	24/10/2023	20.880.000,00
MVAL_06337	MARIA BENILDA HERNANDEZ BAEZ	29/09/2023	24/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07035	PEDRO HUMBERTO QUINTANA SANCHEZ	22/09/2023	12/10/2023	20.880.000,00
MVAL_06941	FABIO ANTONIO LOPEZ SALAZAR	19/09/2023	9/10/2023	20.880.000,00
MVAL_08076	SANDRA JEANNETTE GUERRERO DAZA	24/10/2023	14/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08104	JOSE PABLO ROMERO MENGUAN	27/10/2023	10/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08081	CLARA RITA LOPEZ SANTAMARIA	21/10/2023	10/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08101	MARIBEL GARCIA HERNANDEZ	3/11/2023	29/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08084	AMELIA DE JESUS SOTO LLANEZ	27/10/2023	10/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08099	ANA MILENCY MOSQUERA MOSQUERA	10/11/2023	24/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08088	YOLANDA LOPEZ GUACANEME	3/11/2023	22/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08046	ALCIRA SOTO LLANES	3/11/2023	22/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08065	SANDRA MILENA CAMARGO VELASCO	26/10/2023	22/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08051	ERNESTINA FONTECHA SANTAMARIA	26/10/2023	29/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08052	JACKELINE OMES MORALES	3/11/2023	29/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08029	DIOSELINA SANCHEZ ROMERO	15/11/2023	5/12/2023	20.880.000,00
MVAL_08000	MARIA ANUNCIACION SANCHEZ BELLO	15/11/2023	5/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04204	BLANCA CECILIA DIAZ PEÑA	20/11/2023	5/12/2023	20.880.000,00

MVAL_04430	FERNANDO LEGUIZAMON ROJAS	23/11/2023	7/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04419	FABIOLA CAMPOS	5/12/2023	13/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04420	MARIA ESTELLA AGUDELO CASAS	3/01/2024	26/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04296	LUIS ALONSO GRACIANO CASTAÑO	21/11/2023	13/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04335	ANA LUCIA CASTRO DE COLMENARES	30/11/2023	13/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04327	MARIA ROSA HERNANDEZ BOHORQUEZ	20/11/2023	13/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04326	RUTH STELLA RAMIREZ RIVERA	13/12/2023	27/11/2023	20.880.000,00
MVAL_04674	EFRAIN CONTRERAS COLMENARES	30/12/2023	13/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04675	MARIA TERESA GUIO PINZON	22/12/2023	18/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04742	VICTOR MANUEL CHINGATE	20/12/2023	15/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04297	EMILIO GUTIERREZ	12/12/2023	20/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04442	MARIA TERESA TORRES	5/01/2024	26/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04691	YOLA DEL CARMEN GUERRERO MARTINEZ	5/12/2023	27/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04741	JOSE RAFAEL MARTIN GORDILLO	27/12/2023	15/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04773	MYRIAM INES JIMENEZ SALINAS	4/01/2024	22/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04421	ANSELMO GARZON ECHEVERRI	27/12/2023	18/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04746	JULIA VERONICA VEGA VEGA	6/01/2024	24/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04747	ROSA HERMINDA ALONSO CRUZ	15/12/2023	19/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04404	DORIS ACOSTA MARTINEZ	9/01/2024	27/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04437	LUZ EDIT INFANTE OSORIO	19/12/2023	28/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04673	GRACIELA CUELLAR GRASS	20/12/2023	9/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04774	LUZ MARINA MONTAÑEZ AVENDAÑO	28/01/2024	19/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04785	JOSE RAMIRO TOVAR PRIETO	20/12/2023	25/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04792	HILDA CECILIA FORERO ARIAS	5/12/2023	28/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04807	MARIA DEL PILAR SALGADO GONZALEZ	27/12/2023	25/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04356	MARIO EMILIO DAZA HERNANDEZ	23/11/2023	13/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04799	ROSA MARIA LOPEZ DE LOPEZ	27/12/2023	22/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04802	ELVIRA VALERO DE FONSECA	14/12/2023	29/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04408	NOHORA ALBA ACOSTA FERNANDEZ	29/12/2023	2/02/2024	20.880.000,00
MVAL_04320	LUCIRIS CHARRY MARTINEZ	25/01/2024	25/01/2024	20.880.000,00
MVAL_08424	JUAN DAVID MARTIN PIEDRAHITA	7/02/2024	26/02/2024	20.880.000,00

MVAL_08390	NOHEMI NEIRA SABOYA	22/05/2024	26/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08381	NIRSA ELVIRA RODRIGUEZ TARAZONA	23/05/2024	19/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08538	MAGDA BEATRIZ AMEZQUITA CASTILLO	14/02/2024	5/03/2024	20.880.000,00
MVAL_08722	ELIZABETH PATIÑO USSA	20/02/2024	16/04/2024	20.880.000,00
MVAL_08635	MARIA ELENA BOHORQUEZ CABALLERO	31/05/2024	18/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08513	DINA MARIA MARROQUIN	17/02/2024	5/03/2024	20.880.000,00
MVAL_08758	JORGE ELIECER SALAZAR HERNANDEZ	17/02/2024	27/05/2024	20.880.000,00
MVAL_08717	EDILSA ADELA CHAPARRO CASTILLO	15/02/2024	5/03/2024	20.880.000,00
MVAL_08262	JOHN JAROL HERRERA BOBATIVA	14/02/2024	6/03/2024	20.880.000,00
MVAL_08398	URIEL BELLO SANCHEZ	9/02/2024	23/05/2024	20.880.000,00
MVAL_05224	JEISSON OSWALDO ESCOBAR SARMIENTO	14/06/2024	30/07/2024	20.880.000,00
MVAL_04984	JOSE DANIEL SUAREZ	17/06/2024	4/07/2024	20.880.000,00
MVAL_05279	MARIA CECILIA CAMARGO LINARES	6/06/2024	2/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08476	FABIOLA PINILLOS GARCIA	13/06/2024	10/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08678	LUIS ANGEL RAMIREZ BARRAGAN	20/02/2024	6/03/2024	20.880.000,00
MVAL_08644	MARIA HERMINIA CORTES SANTANA	29/05/2024	18/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08571	CELMIRA JIMENEZ BLANCO	7/02/2024	17/02/2024	20.880.000,00
MVAL_08725	SERGIO RAMIREZ	15/05/2024	11/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08393	HUGO ALEJANDRO PARRA SANTOS	19/06/2024	24/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08650	SARA ROSA VALENCIA BETANCUR	17/05/2024	13/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08620	LORENA OLIVEROS AROCA	7/06/2024	24/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08629	SANDRA MARITZA RUIZ PARRA	20/05/2024	7/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08604	MARLENY FERNANDEZ PARRA	27/06/2024	16/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08698	NATIVIDAD DE JESUS DIAZ DIAZ	22/05/2024	7/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08442	HERNAN ARAQUE PRADA	9/02/2024	16/04/2024	20.880.000,00
MVAL_08422	BLANCA MARLENE ROMERO BERNAL	12/02/2024	23/02/2024	20.880.000,00
MVAL_08653	MARIA CECILIA ARAQUE BONILLA	3/07/2024	25/07/2024	20.880.000,00
MVAL_05352	JAVIER BUSTOS	20/06/2024	17/07/2024	20.880.000,00
MVAL_05334	YOLANDA MONROY CASALLAS	17/05/2024	7/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08447	MARIA ELENA ALARCON	6/06/2024	26/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08495	LUIS FELIPE RODRIGUEZ CESPEDES	6/06/2024	19/06/2024	20.880.000,00

MVAL_08478	ELEUTERIO SESQUILE PUERTA	19/06/2024	11/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08593	MARIA YOLANDA TOVAR RAYO	28/05/2024	29/07/2024	20.880.000,00
MV_00456	BENJAMIN TOLOSA OSORIO	3/07/2024	24/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08440	VICTOR HELY ESPITIA SANCHEZ	6/02/2024	17/02/2024	20.880.000,00
MVAL_08264	ESMERALDA RIOS VIDUEÑEZ	6/02/2024	18/02/2024	20.880.000,00
MVAL_08543	BLANCA MARTTA ABREU	7/02/2024	16/04/2024	20.880.000,00
MVAL_08542	ROSA ELENA ANGEL PINILLA	13/02/2024	28/05/2024	20.880.000,00
MVAL_08535	MARIA ALCIRA VILLAMIL PINILLA	13/02/2024	7/03/2024	20.880.000,00
MVAL_07716	STERNS FRANCI PORTELA HERRERA	22/08/2023	14/09/2023	20.880.000,06
MVAL_07699	MARIA DE LAS MERCEDES VILLARRAGA	22/08/2023	14/09/2023	20.880.000,06
MVAL_07708	BELLA RUTH OSORIO FLORIDO	5/10/2023	3/11/2023	20.880.000,00
MVAL_ 07697	MARIA SILVIA ALVAREZ	18/08/2023	13/09/2023	20.880.000,06
MVAL_07718	MARINA MORENO ROJAS	23/10/2023	8/11/2023	20.880.000,00
MVAL_07874	LUIS EDILSON SUAREZ GONZALEZ	4/10/2023	8/11/2023	20.880.000,00
MVAL_07876	FABIAN ANDRES SALAMANCA SILVA	14/09/2023	6/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07837	FLOR MARINA COBOS SORIANO	18/09/2023	3/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07834	ROSALBA HERNANDEZ	28/08/2023	6/10/2023	20.852.975,77
MVAL_07832	LUZ MYRIAM ESCOBAR	1/09/2023	6/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07712	RAFAEL TOVAR BAUTISTA	10/11/2023	28/11/2023	20.880.000,00
MVAL_07619	ANA ELVIA MARTINEZ MORALES	18/08/2023	14/09/2023	20.880.000,06
MVAL_07600	JAIRO IVAN GARCIA REYES	17/10/2023	8/11/2023	20.822.566,44
MVAL_07603	JOSE ALIRIO CAICEDO MORENO	28/08/2023	6/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07609	CONCEPCION RODRIGUEZ MARTIN	31/08/2023	28/09/2023	20.880.000,00
MVAL_07660	MARLENI RAGA HURTADO	20/11/2023	4/12/2023	20.880.000,00
MVAL_07543	JORGE MAURICIO SALCEDO	20/11/2023	22/12/2023	20.880.000,00
MVAL_07476	PEDRO ALONSO RIVERA CASTAÑEDA	20/09/2023	12/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07466	MARIA FABIOLA CASTAÑEDA HIDALGO	20/09/2023	11/10/2023	20.639.715,87
MVAL_07463	BLANCA LEONOR VILLAMARIN JIMENEZ	22/09/2023	24/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07478	MARTHA FUERTE	25/09/2023	12/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07434	WILLINTON ASCENCIO MONTIEL	11/10/2023	3/11/2023	20.830.178,48
MVAL_07433	ANA PATRICIA LANZA OURIZA	28/09/2023	8/11/2023	20.880.000,00

MVAL_07364	EIMMY YESSENIA MEDINA RAMIREZ	5/10/2023	24/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07410	LUIS ANTONIO TRIANA TORRES	20/09/2023	6/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07411	MARCO TULIO GONZALEZ	25/09/2023	10/10/2023	20.869.071,48
MVAL_07472	MARIA DOLORES HINESTROZA CUESTA	25/09/2023	1/11/2023	20.880.000,00
MVAL_07377	YEIMY YAGUARA TAPIA	3/10/2023	24/10/2023	20.405.617,28
MVAL_08113	MARIA ISMAELINA SALAZAR HERNANDEZ	26/10/2023	28/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08119	CLARA INES VARGAS AGUILAR	26/10/2023	24/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08137	GLADYS OFELIA SOLORZANO LOPEZ	21/10/2023	24/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08140	CLAUDIA YANETH CHAPARRO BERNAL	23/10/2023	14/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08142	LUZ MARY BAQUERO ESCOBAR	21/10/2023	24/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08133	JESUS DAVID ARIAS BETANCOURT	21/10/2023	11/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08184	MARIA DEL CARMEN FAJARDO	23/10/2023	14/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08126	MYRIAM STELLA GUTIERREZ MORENO	7/11/2023	7/12/2023	20.880.000,00
MVAL_08227	EDISON FERNANDO ROJAS MEDINA	7/11/2023	10/12/2023	20.880.000,00
MVAL_08226	HILDA ALCIRA CASTIBLANCO HERNANDEZ	3/11/2023	28/11/2023	20.880.000,00
MVAL_07983	NELSON ANDRES HERNANDEZ CARDENAS	3/11/2023	28/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08120	MARIA LUZ DARY HERRERA GIRALDO	21/10/2023	11/11/2023	20.880.000,00
MVAL_04310	ARMELIDA TRUJILLO ANDRADE	1/12/2023	12/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04257	ROSA ELENA BORDA MORENO	5/12/2023	12/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04252	MAXIMILIANO RAMOS MARTINEZ	4/12/2023	11/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04385	ANA LUCIA RAMOS LINARES	4/12/2023	11/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04376	ANA CLOTILDE MORENO BERNAL	18/12/2023	16/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04379	JOSE MARCEL TOVAR LAGUNA	27/11/2023	8/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04382	JOSE DAVID VASQUEZ SANCHEZ	6/01/2024	3/02/2024	20.880.000,00
MVAL_04699	MELBA NORA RAMOS MONTOYA	5/12/2023	10/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04455	OLGA CECILIA CARANTON	30/11/2023	22/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04655	ROSA BERTA COBOS	19/12/2023	25/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04658	FREDY ALBERTO GUZMAN AREVALO	30/11/2023	22/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04697	JHON FAIVER DUQUE PRECIADO	5/12/2023	6/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04727	RUBY LILIANA PARRA	4/01/2024	31/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04613	JORGE RIAÑO	30/11/2023	22/12/2023	20.880.000,00

MVAL_04630	ROSALBINA HERRERA BAUTISTA	3/01/2024	18/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04554	JOHN ALEXANDER AREVALO VARGAS	11/12/2023	16/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04838	MYRIAM AREVALO HERRERA	10/01/2024	23/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04859	CARMEN GONZALEZ ANDRADE	15/12/2023	16/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04713	HENRY ALFONSO AGUILAR	20/12/2023	18/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04716	ANGIE MILENA CHINGATE	20/12/2023	10/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04856	YESID SOLANO LUCAS	3/01/2024	31/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04247	JESUS ALFONSO BELTRAN BARRERA	19/12/2023	23/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04459	FLORA CHAPARRO DE ORTIZ	18/12/2023	29/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04304	VIRGELINA ROJAS DE HERNANDEZ	9/01/2024	24/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04391	SERGIO ELADIO OSPINA GOMEZ	8/12/2023	10/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04473	PABLO RAMIREZ	15/12/2023	12/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04475	EDUARDO GRANADOS	19/12/2023	16/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04848	MARLENY GONZALEZ MORA	9/01/2024	2/02/2024	20.880.000,00
MVAL_04620	MARIA DEL CARMEN MORENO CASTILLO	3/01/2024	31/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04366	ELVIRA SOTO DIAZ	23/11/2023	8/12/2023	20.880.000,00
MVAL_08715	YESENIA SILDANIA FRANCISCONI	15/05/2024	24/05/2024	20.880.000,00
MVAL_08760	SENEN MARTINEZ CASTAÑEDA	15/05/2024	13/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08723	SEGUNDO MELQUISEDEC PEREZ MEDINA	17/05/2024	7/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08567	RUPERTO QUEVEDO MORENO	6/02/2024	7/03/2024	20.880.000,00
MVAL_05185	GINA PAOLA LOZANO CORREAL	30/05/2024	28/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08472	ROSA ALBINA CASTELLANOS MARTINEZ	28/06/2024	29/07/2024	20.880.000,00
MVAL_07154	NANCY GIRALDO RAMIREZ	2/07/2024	29/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08400	MARTHA LUCIA ROMERO	9/02/2024	7/03/2024	20.880.000,00
MVAL_08590	MARIA OLINDA ESTUPIÑAN AGUDELO	8/02/2024	16/04/2024	20.878.638,70
MVAL_08652	MARIA LUCILA TEZ CHINDOY	31/05/2024	24/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08510	MARIA INEZ ROMERO DE CAMPOS	9/02/2024	22/05/2024	20.880.000,00
MVAL_05281	MARIA INES ROJAS CUERVO	29/05/2024	8/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08411	MARIA GRACIELA DIAZ VERA	12/02/2024	28/05/2024	20.880.000,00
MVAL_08477	MARIA ARACELIA VILLAMARIN CRUZ	28/05/2024	13/07/2024	20.135.737,92
MVAL_05263	MAGNOLIA MOLINA CARDONA	3/07/2024	27/07/2024	20.880.000,00

MVAL_08587	MAGNOLIA ARROYAVE BONILLA	8/02/2024	7/03/2024	20.880.000,00
MVAL_08469	LUZ MARY CIFUENTES CASTAÑO	5/06/2024	10/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08415	LUIS ARNULFO PACHON ALONSO	16/02/2024	20/05/2024	20.880.000,00
MVAL_08617	JULIO ALBERTO VALBUENA GUTIERREZ	5/06/2024	11/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08449	JOSE EDWIN AGUIRRE MORENO	16/02/2024	16/04/2024	20.880.000,00
MVAL_08230	JEISSON ALONSO ARDILA CHASOY	18/06/2024	11/07/2024	20.880.000,00
MVAL_05193	HELIODORO SOSA FANDIÑO	18/06/2024	18/07/2024	20.880.000,00
MVAL_06599	FLOR ELBA CORTES VELANDIA	17/06/2024	24/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08508	FABIO REY GUTIERREZ	12/02/2024	16/04/2024	20.880.000,00
MVAL_08570	EZEQUIEL RODRIGUEZ AYA	7/02/2024	22/02/2024	20.880.000,00
MVAL_06731	ESTEBAN VALBUENA GARCIA	19/06/2024	12/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08263	ELENA DIAZ OYOLA	20/02/2024	29/05/2024	20.880.000,00
MVAL_08291	EDITH HERNANDEZ PINTO	19/02/2024	16/04/2024	20.880.000,00
MVAL_08462	EDELMIRA TOBAR GUITIERREZ	17/06/2024	17/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08547	DORA ALBA MARTIN CONTRERAS	8/02/2024	29/05/2024	20.880.000,00
MVAL_08624	DANICELA GIRALDO NOVOA	14/06/2024	17/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08439	CLARA INES CARO ALARCON	18/06/2024	18/07/2024	20.880.000,00
MVAL_05195	CECILIA CHACON	6/06/2024	28/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08265	CARLOS CELINO ROJAS PINZON	7/02/2024	7/03/2024	20.880.000,00
MVAL_08713	CARLOS ANIBAL SALAZAR RUBIO	14/06/2024	11/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08467	ARMANDO VARGAS RINCON	17/06/2024	30/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08436	ANA MERCEDES PINZON DE MARTINEZ	7/02/2024	23/02/2024	20.880.000,00
MVAL_05222	ANA JULIA ESPETIA	19/06/2024	29/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08507	ALFONSO BAUTISTA SANTAMARIA	6/02/2024	20/02/2024	20.725.259,63
MVAL_08749	ADRIANA LUCIA CRUZ PEÑA	2/07/2024	24/07/2024	20.880.000,00
MVAL_07826	ROSA MARIA AGUILERA DIAZ	9/08/2023	11/09/2023	20.583.718,18
MVAL_07824	ADOLFO CARO PIRATEQUE	10/08/2023	12/09/2023	20.854.058,22
MVAL_07742	MAYURI BENITEZ FIRIGUA	11/08/2023	13/09/2023	20.821.035,57
MVAL_07720	TILCIA ADARME DE SANCHEZ	28/08/2023	14/09/2023	20.605.731,49
MVAL_07725	BLANCA MARINA DIAZ DE SASTOQUE	23/08/2023	14/09/2023	20.530.595,79
MVAL_07884	LUIS EDUARDO QUINTERO BOJACA	1/09/2023	26/09/2023	20.879.163,04

MVAL_07921	ANA LUCIA ROA RODRIGUEZ	19/09/2023	29/09/2023	20.837.270,61
MVAL_07911	MYRIAM PILAR CARVAJAL ALVARADO	31/08/2023	20/09/2023	20.484.677,14
MVAL_07900	HERMES MENDOZA CUBIDES	19/09/2023	11/10/2023	20.875.437,97
MVAL_07908	FREDY RICARDO BONILLA SUAZA	13/09/2023	29/09/2023	20.878.598,05
MVAL_07641	JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	22/09/2023	6/10/2023	20.879.725,33
MVAL_07644	BLANCA AMERICA QUINTERO CORREDOR	20/09/2023	4/10/2023	18.796.991,14
MVAL_07645	JORGE LOZANO GARZON	27/09/2023	12/10/2023	20.798.721,33
MVAL_07636	ERICSON LAVERDE HERNANDEZ	20/09/2023	12/10/2023	20.670.768,27
MVAL_07639	GLORIA STELLA SANCHEZ PARRA	20/09/2023	6/10/2023	20.852.350,23
MVAL_07657	HERNANDO ADARME PAEZ	29/09/2023	12/10/2023	20.868.716,18
MVAL_07658	DINACELI CARDONA VALENCIA	27/09/2023	12/10/2023	18,729,663,568
MVAL_07652	LUIS ALVARO RODRIGUEZ GIRALDO	3/10/2023	12/10/2023	20.793.650,42
MVAL_07650	MARILUZ MARTINEZ RODRIGUEZ	29/09/2023	12/10/2023	20.228.492,59
MVAL_06838	EUSTACIO ALVAREZ	5/10/2023	24/11/2023	20.850.583,60
MVAL_06837	JINETH PAOLA MELO DONOSO	9/10/2023	1/11/2023	20.723.042,03
MVAL_06833	YUDY ESPERANZA ALFONSO BARRETO	6/10/2023	9/11/2023	20.740.894,94
MVAL_06824	OLGA LUCIA RODRIGUEZ	9/10/2023	3/11/2023	20.857.318,94
MVAL_06832	CLARA CARLOTA VILLARRAGA MARTINEZ	5/10/2023	9/11/2023	20.877.504,03
MVAL_06874	RAFAEL HUMBERTO PRIETO ORJUELA	11/10/2023	31/10/2023	20.872.208,90
MVAL_06683	GLADYS GONZALEZ SABOGAL	13/10/2023	27/10/2023	20.810.464,75
MVAL_06700	MARIA ESTELA MOJICA DE QUINTERO.	11/10/2023	27/10/2023	20.858.826,91
MVAL_06724	ALBA NURY TORRES MORALES	19/10/2023	9/11/2023	20.869.380,22
MVAL_06749	DIEGO RENE DIAZ RIVERA	13/10/2023	7/11/2023	20.790.926,46
MVAL_06750	YENY ANDREA MARTINEZ GARCIA	13/10/2023	1/11/2023	20.579.242,99
MVAL_08143	DORALBA MURCIA CHAPARRO	3/11/2023	23/11/2023	20.806.646,78
MVAL_08144	LEONOR CHAPARRO CARRILLO	26/10/2023	27/11/2023	19.839.185,52
MVAL_08148	JESUS ANTONIO BUSTACARA FUENTES	26/10/2023	27/11/2023	20.878.111,41
MVAL_08150	ROSA CELIA LOBATON HERNANDEZ	1/11/2023	14/11/2023	20.864.910,53
MVAL_08151	REGULO LOPEZ DIAZ	23/10/2023	9/11/2023	20.878.547,54
MVAL_08037	PEDRO JULIO ORTIZ MUÑOZ	10/11/2023	24/11/2023	20.857.530,85
MVAL_08031	JOSE FREDY RODRIGUEZ	23/10/2023	8/11/2023	20.858.069,23
MVAL_07973	BENILDA PATIÑO USSA	3/11/2023	15/11/2023	20.826.977,25

MVAL_07999	DOLORES LONDOÑO AGUILAR	7/11/2023	24/11/2023	20.165.427,74
MVAL_08224	MARIA YOLANDA MATTA MONROY	15/11/2023	11/12/2023	20.850.050,14
MVAL_08206	ERNESTO MEDINA CLAROS	16/11/2023	24/11/2023	20.864.107,26
MVAL_08196	MARIA XIMENA RODRIGUEZ FAJARDO	10/11/2023	27/11/2023	20.872.621,62
MVAL_08109	CARLOS ARTURO ARIZALA FAGUA	20/12/2023	10/01/2024	20.874.728,34
MVAL_08124	SAMUEL VIGUES	21/12/2023	15/01/2024	20.879.619,38
MVAL_04189	ANA BRICEIDA AMADO TRASLAVIÑA	2/12/2023	12/12/2023	20.874.260,18
MVAL_04207	MANUEL HERNAN RIVERA RIAÑO	27/11/2023	12/12/2023	20.838.234,03
MVAL_04209	WILSON ALFONSO DIAZ LEMUS	20/11/2023	12/12/2023	20.859.691,78
MVAL_04213	RAUL ANTONIO PINEDA SUAREZ	30/11/2023	12/12/2023	20.875.056,05
MVAL_04269	MARIA MELBA GARCIA	30/11/2023	12/12/2023	20.874.151,76
MVAL_04270	JAVIER ARMANDO QUIMBAY URREGO	30/11/2023	0812/2023	20.875.487,25
MVAL_04273	LUZ PERLA DUCUARA	23/11/2023	12/12/2023	20.857.602,30
MVAL_04275	PILAR ALVARADO SIERRA	20/11/2023	8/12/2023	20.868.118,66
MVAL_04278	HECTOR RUBIO MARTINEZ	24/11/2023	12/12/2023	20.865.819,74
MVAL_04210	OTILIA RIVERA GARCIA	21/11/2023	12/12/2023	20.878.243,23
MVAL_04600	EMILIA PATIÑO	21/11/2023	12/12/2023	20.853.053,76
MVAL_04488	MARIA PRISCILA TORRES DE MARTINEZ	21/11/2023	6/12/2023	20.876.968,11
MVAL_04571	GENOVEVA MACHADO	2/12/2023	17/01/2024	20.879.446,90
MVAL_04578	ALEJANDRO ROJAS GAONA	27/12/2023	15/01/2024	20.876.513,50
MVAL_04586	GILBER ANTONIO MORA ORTIZ	22/12-/2023	11/01/2024	20.877.941,39
MVAL_04588	NORA MIDIA COSME VIAFARA	29/12/2023	15/01/2024	20.879.009,54
MVAL_04597	SANTOS VARGAS	22/12/2023	9/01/2024	20.865.558,56
MVAL_04598	ANGELA MARIA PATIÑO DE ROJAS	2/12/2023	17/01/2024	20.879.784,46
MVAL_04599	OLIVIA ANACONA BENAVIDES	5/12/2023	5/01/2024	20.856.815,06
MVAL_04603	MARIA HELENA GOMEZ PEREZ	29/11/2023	7/12/2023	20.836.700,19
MVAL_04604	ADIELA MARIA QUIROZ SANCHEZ	19/12/2023	12/01/2024	20.878.107,71
MVAL_04632	ANA SILVIA PARADA GOMEZ	19/12/2023	5/01/2024	20.865.169,25
MVAL_04634	ANA LUCIA GONZALEZ TORRES	21/12/2023	26/01/2024	20.879.303,98
MVAL_04469	ANA CELIA GAMBOA SALAMANCA	5/12/2023	9/01/2024	20.870.931,31
MVAL_04487	ARGELIA GOMEZ CARVAJAL	3/01/2024	31/01/2024	20.879.126,58

MVAL_04502	ZONIA PATRICIA VARGAS HERNANDEZ	2/12/2023	20/01/2024	20.879.709,31
MVAL_04569	JESUS MARIA MONTAÑO VALENCIA	9/01/2024	24/01/2024	20.878.503,18
MVAL_04240	DOLLY MYRIAM BARBOSA NOVOA	21/12/2023	17/01/2024	20.879.652,64
MVAL_04244	ANA FRANCELINA PEÑA SUAREZ	3/01/2024	15/01/2024	20.876.910,21
MVAL_04245	BRIGITTE ANDREA ALVAREZ RIVERA	27/12/2023	24/01/2024	20.879.892,88
MVAL_04306	MARYLU RINCON VALENZUELA	21/12/2023	12/01/2024	20.875.280,27
MVAL_03888	LUIS LABREAN GOMEZ FRAILE	6/06/2024	26/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08431	LUIS GABRIEL LOPEZ GIRALDO	17/06/2024	27/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08466	JULIO CESAR VELANDIA LOPEZ	28/06/2024	31/07/2024	20.880.000,00
MVAL_03880	JHON ROGER VARGAS VARGAS	19/06/2024	11/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08416	IBETH ROA GARZON	20/06/2024	12/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08487	FAVIO HENRRIQUE CORDERO ARAQUE	14/06/2024	3/07/2024	20.880.000,00
MVAL_06600	EVELIO MAYORGA FONSECA	17/06/2024	11/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08276	EVANGELISTA GONZALEZ CUTIVA	12/02/2024	24/05/2024	20.880.000,00
MVAL_08480	ENRIQUE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	21/06/2024	10/07/2024	20.880.000,00
MVAL_06286	CLARA INES SEGURA TORRES	19/06/2024	22/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08511	CARLOS ALIRIO DAZA SERRANO	13/02/2024	11/03/2024	20.880.000,00
MVAL_05255	CARLOS ALFREDO CANCELADO SANCHEZ	6/06/2024	18/07/2024	20.880.000,00
MVAL_06932	BLANCA CECILIA PINEDA SIERRA	19/06/2024	11/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08474	BETULIA CORDOBA GARCIA	17/06/2024	12/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08414	BARBARA ARENAS VELA	27/06/2024	25/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08446	AURA ROSA MARTINEZ ARANGO	7/02/2024	26/02/2024	20.880.000,00
MVAL_08413	ANABEYBA MENDEZ LOZANO	2/07/2024	30/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08514	ANA SILVIA MARTINEZ BEJARANO	28/06/2024	18/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08598	ALVEIRO TAPIERO FLOREZ	15/02/2024	29/05/2024	20.880.000,00
MVAL_06929	ADEODATO ZAMBRANO	27/06/2024	22/07/2024	20.880.000,00
MVAL_07690	ANA VICTORIA MENDOZA TIBATA	28/08/2023	11/10/2023	20.876.886,80
MVAL_07692	MARIA DEL CARMEN OCAMPO MELGAREJO	18/08/2023	29/09/2023	20.879.790,62
MVAL_ 07693	BERLY AZUCENA PASTRAN ANTONIO	25/08/2023	11/10/2023	20.875.472,46
MVAL_07792	CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ	18/08/2023	14/09/2023	20.876.656,17
MVAL_07791	LUIS ANTONIO BUITRAGO ZAMBRANO	28/08/2023	11/10/2023	20.874.849,70

MVAL_07852	MARIA EUGENIA BETANCUR JIMENEZ	5/09/2023	16/11/2023	20.784.298,30
MVAL_07817	IRMA LUCIA ROZO ROZO	22/09/2023	16/11/2023	20.807.969,95
MVAL_07855	MARTHA LUCERO GIRALDO ROJAS	13/09/2023	17/10/2023	20.872.593,56
MVAL_07866	JOSE DE JESUS LOPEZ ROMERO	29/09/2023	17/10/2023	20.831.416,14
MVAL_07810	LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR	14/09/2023	6/10/2023	20.880.000,00
MVAL_07774	ANA ELIN JEREZ	31/08/2023	12/09/2023	20.869.975,09
MVAL_07779	MARCO ANTONIO ALIPIO PATIÑO	24/08/2023	13/09/2023	20.878.927,04
MVAL_07777	OSCAR ALEXANDER MONROY BALAGUERA	13/09/2023	6/10/2023	20.857.086,10
MVAL_07770	LUIS DOMINGO PEREZ ROMERO	22/09/2023	18/10/2023	20.711.178,29
MVAL_07786	VERONICA CASTAÑEDA VILLAMIL	7/08/2023	14/09/2023	20.877.096,75
MVAL_07341	DIOSELINA OCHOA DE BARON	29/09/2023	3/11/2023	20.810.881,17
MVAL_07339	ANA STELLA GARZON CUCARIANO	5/10/2023	9/11/2023	20.763.477,50
MVAL_07336	GABRIEL GARZON	2/10/2023	10/11/2023	20.782.518,06
MVAL_07332	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA	23/10/2023	23/11/2023	20.880.000,00
MVAL_07510	SANDRA MILENA RIVERA CASTILLO	29/09/2023	19/10/2023	20.878.333,43
MVAL_07516	DANIEL RICARDO VARGAS	9/10/2023	9/11/2023	20.789.939,63
MVAL_07509	HORACIO HERNANDEZ MARTINEZ	4/10/2023	2/11/2023	20.848.808,29
MVAL_07436	EDMY YANNET MUNERA VERGARA	13/10/2023	14/11/2023	20.797.180,10
MVAL_07445	SERVANDO BUSTOS GRANADOS	5/10/2023	23/11/2023	20.446.806,69
MVAL_07444	ANA DOLORES NOVOA VARGAS	2/10/2023	3/11/2023	20.869.542,85
MVAL_06613	DIEGO ANDRES MORA NIEVES	23/10/2023	14/11/2023	20.879.833,40
MVAL_06646	ROSALBA ZAMBRANO HERNANDEZ	20/10/2023	30/11/2023	20.426.986,52
MVAL_06648	ELIZABETH RIVERA ROJAS	23/10/2023	30/11/2023	20.773.758,54
MVAL_06169	ALBA MERY GARCIA HERNANDEZ	23/10/2023	6/12/2023	20.879.905,40
MVAL_06249	MARIA HERCILIA FLOREZ ROMERO	20/10/2023	30/11/2023	20.871.537,97
MVAL_06816	MARIELA RIOS BARBOSA	20/10/2023	30/11/2023	20.870.684,48
MVAL_08174	ANA ADELAIDA GAMBOA CUERVO	3/11/2023	11/12/2023	20.879.189,78
MVAL_08212	MARIA NANCY DIAZ HERRERA	15/11/2023	14/12/2023	20.879.625,55
MVAL_08170	MARIA ZENAIDA GOMEZ MIRANDA	3/11/2023	27/11/2023	20.880.000,00
MVAL_08167	CARLOS HERNANDO LOBATON HERNANDEZ	16/11/2023	11/12/2023	20.876.188,45
MVAL_08165	MARIA ADELA GONZALEZ FUNEME	15/11/2023	13/12/2023	20.878.719,74

MVAL_08219	MARIA MARLENY HERRERA LOPEZ	3/11/2023	13/12/2023	20.880.000,00
MVAL_08161	JOSE ARNOBI HERRERA LOPEZ	3/11/2023	7/12/2023	20.879.758,54
MVAL_08160	DORA BAQUERO ESCOBAR	17/11/2023	7/12/2023	20.873.946,94
MVAL_08028	LUIS EDUARDO AMAYA PULIDO	16/11/2023	7/12/2023	20.876.288,61
MVAL_08008	GLORIA ROCIO RINCON PEÑUELA	15/11/2023	11/12/2023	20.879.868,78
MVAL_08023	GINA PAOLA APONTE GARCIA	20/11/2023	11/12/2023	20.879.752,16
MVAL_08019	MYRIAM YESENIA GONZALEZ RUIZ	17/11/2023	14/12/2023	20.879.248,98
MVAL_08014	ELOISA MORA DE CASTILLO	20/11/2023	14/12/2023	20.249.569,86
MVAL_04494	MARIA FRANCY YATE GIRON	27/12/2023	2/02/2024	20.880.000,00
MVAL_04496	ENRIQUE JIMENEZ RODRIGUEZ	29/12/2023	23/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04504	ANA ELIZABETH MARANTA VARGAS	24/11/2023	14/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04505	FLOR EMILCE AVILA QUIROGA	24/11/2023	14/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04201	JUAN CARLOS PULIDO ARIAS	4/12/2023	27/12/2023	20.828.248,67
MVAL_04202	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ ANTONIO	6/12/2023	10/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04196	VICTOR MANUEL BELTRAN GUZMAN	20/12/2023	24/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04199	SONIA JUDITH CASTRO	13/12/2023	19/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04503	ERIBERTO CUADROS CUADROS	23/11/2023	12/11/2023	20.878.015,77
MVAL_04498	ANA MERCEDES VILLAMIL	6/12/2023	10/01/2024	20.845.338,98
MVAL_04510	CECILIA MONJE RODRIGUEZ	6/12/2023	28/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04513	ANA ISABELINA SORIA RODRIGUEZ	22/12/2023	23/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04515	AVEDULIO SOLANO LOZANO	20/12/2023	19/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04543	ANA ROSA VENEGAS MARTINEZ	15/12/2023	16/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04552	ALCIRA ISABEL MARTINEZ URREGO	27/12/2023	22/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04575	LUIS EDUARDO MARTIN LEON	7/12/2023	10/01/2024	20.812.812,94
MVAL_04512	MARGARITA ACUÑA RIVERA	6/12/2023	28/12/2023	20.880.000,00
MVAL_04566	CARMEN INES CAMARGO NAVARRO	20/12/2023	24/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04534	JUAN ARTURO LUQUE ROBERTO	29/12/2023	19/01/2024	20.880.000,00
MVAL_04538	JOSE WILLIAM MENDEZ MORENO	15/12/2023	10/01/2024	20.880.000,00
MVAL_03902	SILVIO ROJAS BARRERA	5/01/2024	23/01/2024	20.880.000,00
MVAL_08270	SARA ISABEL CLAVIJO DE ARAQUE	7/02/2024	23/05/2024	20.880.000,00
MVAL_08461	RUBIELA MARTINEZ VERA	20/02/2024	30/05/2024	20.880.000,00

MVAL_08505	ROSA AURORA MENDEZ	13/02/2024	16/04/2024	20.880.000,00
MVAL_08406	OSCAR CASTRO GARZON	7/02/2024	26/02/2024	20.880.000,00
MVAL_08389	OMAIRA LINEY PASTRANA VILLALBA	23/05/2024	17/06/2024	20.880.000,00
MVAL_05351	NELSI PEREZ GUZMAN	23/05/2024	7/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08585	MARTHA ISABEL ROJAS HERNANDEZ	16/02/2024	10/05/2024	20.880.000,00
MVAL_03890	MARIBEL SANDOVAL LOZANO	31/05/2024	19/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08405	MARIA OLIVA IBAÑEZ	7/02/2024	16/04/2024	20.880.000,00
MVAL_08562	MARIA NERY RODRIGUEZ DE COLO	9/02/2024	23/02/2024	20.880.000,00
MVAL_04191	MARIA MARINA SANCHEZ DE ALGUTRIA	24/05/2024	21/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08425	MARIA ISABEL MORENO LOZANO	28/05/2024	18/06/2024	20.880.000,00
MVAL_08402	MARIA ESTELA CASTRO TORRES	7/02/2024	16/04/2024	20.880.000,00
MVAL_05330	MARIA ELSA GONZALEZ BOHORQUEZ	27/06/2024	22/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08499	MARIA DORALBA SABOGAL DE CHILATRA	14/02/2024	20/05/2024	20.880.000,00
MVAL_08515	MARIA BERTA GORDILLO	12/02/2024	15/05/2024	20.880.000,00
MVAL_06649	MARIA AMPARO CAJICA DE GARCIA	6/06/2024	10/07/2024	20.880.000,00
MVAL_06636	LUZ MIRYAM VILLAMIL DE VALENCIA	6/06/2024	10/07/2024	20.880.000,00
MVAL_08486	LUZ MARINA BEJARANO BELTRAN	16/02/2024	29/05/2024	20.880.000,00
MVAL_03894	NELSON ENRIQUE CASTRO MELO	18/01/2024	29/01/2024	20.879.934,77

5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

Durante la ejecución del contrato 917 de 2023 se llevaron a cabo actividades de obra en trecientas noventa y cinco (395) viviendas.

A continuación, se describirán el número de mejoramientos que se realizaron por cada uno de los desarrollos y las actividades de obra que se ejecutaron en los mejoramientos de vivienda.

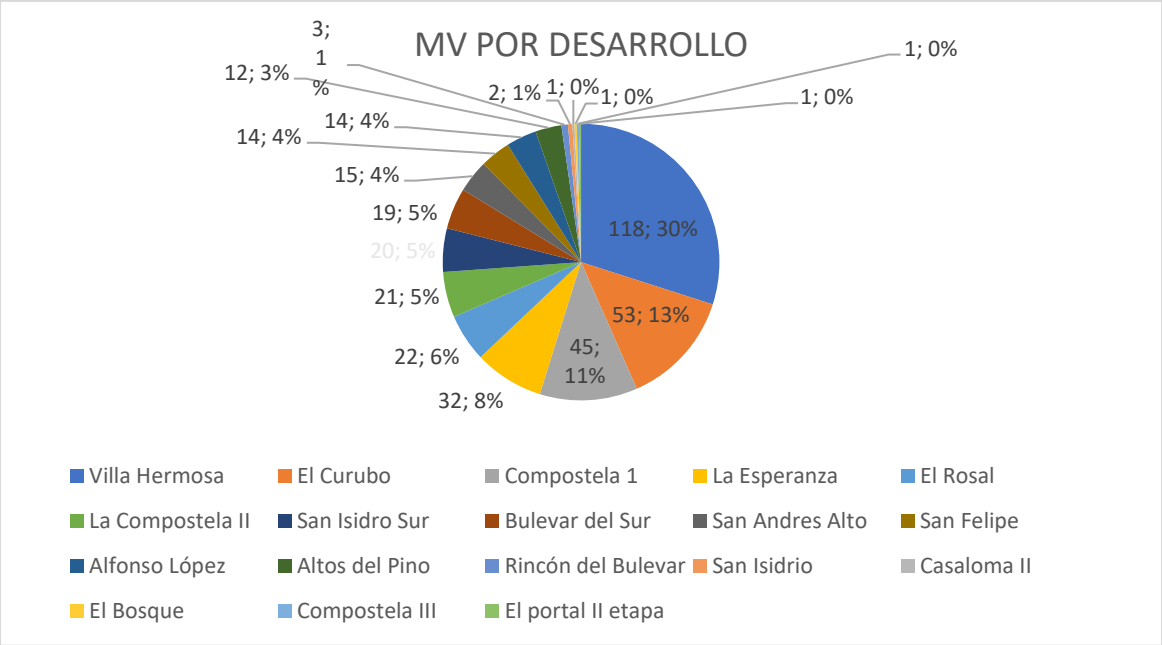


Ilustración 1 MV por Desarrollo

Los trecientos noventa y cinco (395) mejoramientos de vivienda – MV se ejecutaron en la localidad de Usme en el territorio priorizado Alonso López, de estos 118 MV correspondiente al 30% se ejecutaron en el desarrollo de Villa Hermosa; 53 MV correspondiente al 13% en el desarrollo El Curubo; 45 MV correspondiente al 11% se ejecutaron en el desarrollo Compostela 1; 32 MV correspondiente al 8% se ejecutaron en el desarrollo La Esperanza: 21 MV correspondiente al 6% se ejecutaron en el desarrollo El Rosal; 21 MV correspondiente al 5% se ejecutaron en el desarrollo La Compostela II; 20 MV correspondiente al 5% se ejecutaron en el desarrollo San Isidro Sur; 19 MV correspondiente al 5% se ejecutaron en el desarrollo Bulevar del Sur; 15 MV correspondiente al 4% se ejecutaron en el desarrollo San Andrés Alto; 14 MV correspondiente al 4% se ejecutaron en el desarrollo San Felipe; 14 MV correspondiente al 4% se ejecutaron en el desarrollo Alfonso López sector El Progreso; 12 MV correspondiente al 3% se ejecutaron en el desarrollo Altos del Pino; 3 correspondiente a 1% se ejecutaron en el desarrollo Rincón del Bulevar; 2 correspondiente al 1% se ejecutaron en el desarrollo San Isidro y un mejoramiento correspondiente al 0% se ejecutaron en los desarrollos Casaloma II, El Bosque, Compostela III y Portal II etapa.

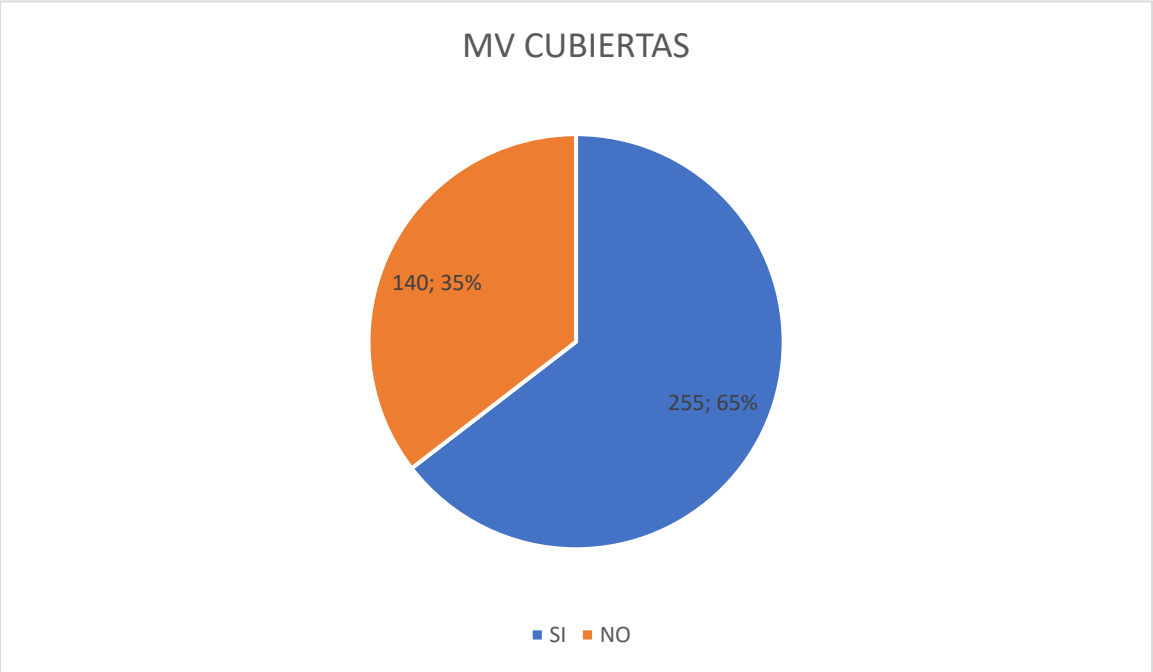


Ilustración 2 MV Cubiertas

De los trescientos noventa y cinco (395) MV doscientos cincuenta y cinco (255) MV correspondiente a 65% se realizaron intervención en la cubierta y a ciento cuarenta (140) MV correspondiente a 35% no se realizó intervención en cubierta.

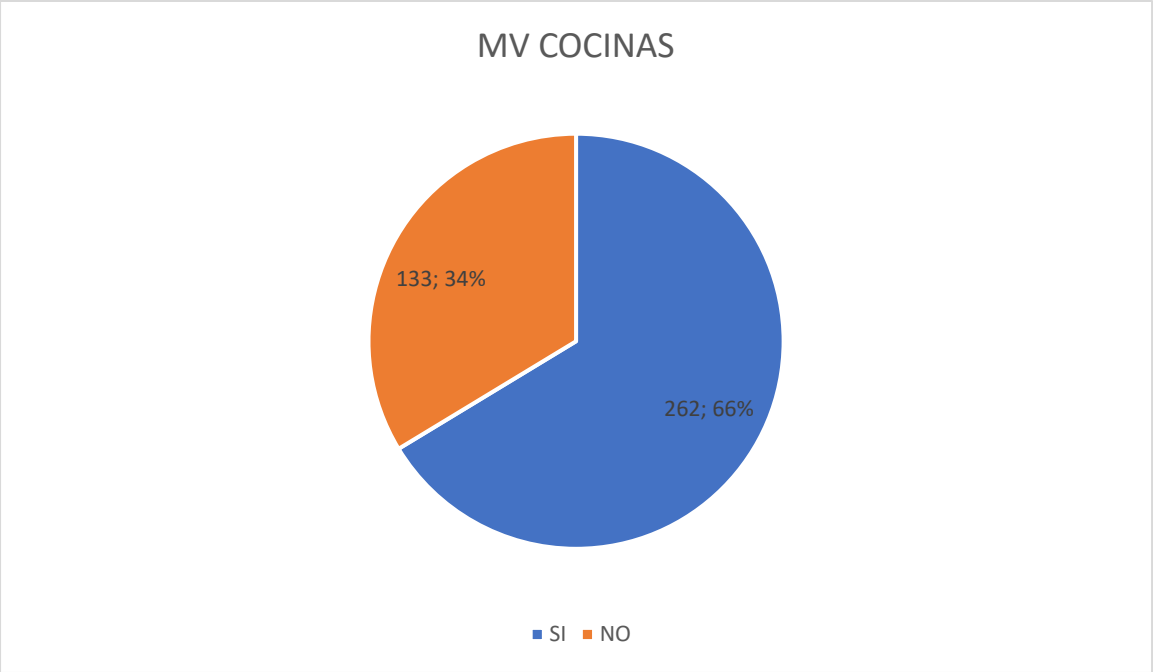


Ilustración 3 MV Cocinas

De los trescientos noventa y cinco (395) MV doscientos sesenta y dos (262) MV correspondiente a 66% se realizaron intervención en la cocina y a ciento treinta y tres (133) MV correspondiente a 34% no se realizó intervención en cocina.

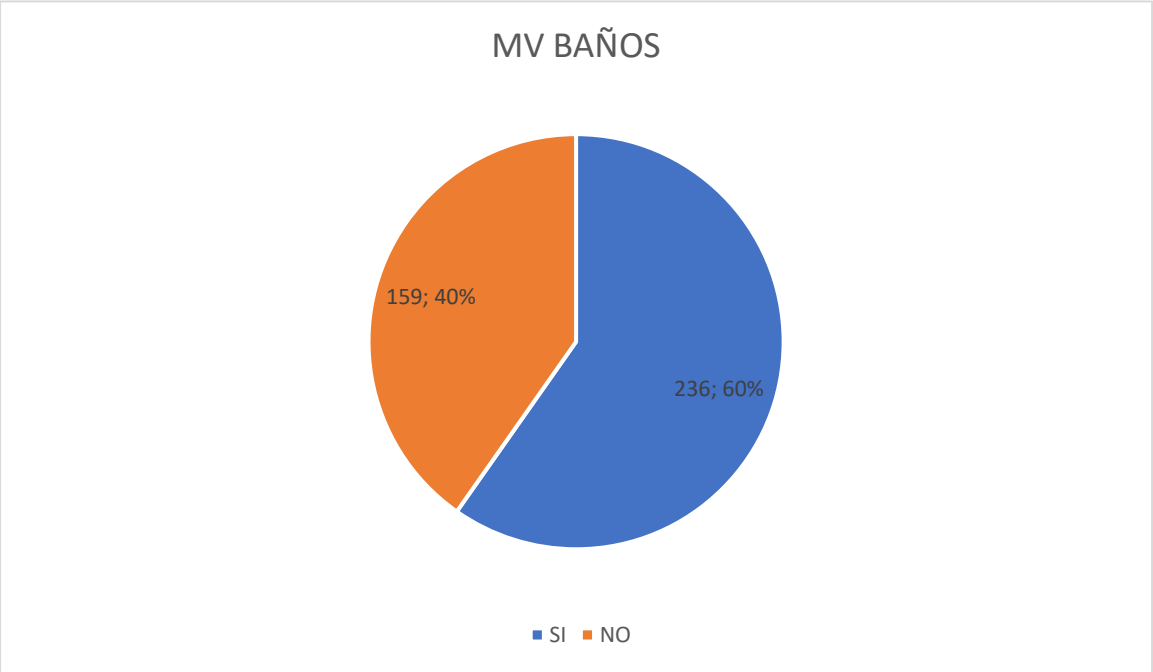


Ilustración 4 MV Baños

De los trescientos noventa y cinco (395) MV doscientos treinta y seis (236) MV correspondiente a 60% se realizaron intervención en el baño y a ciento cincuenta y nueve (159) MV correspondiente a 40% no se realizó intervención en baño.

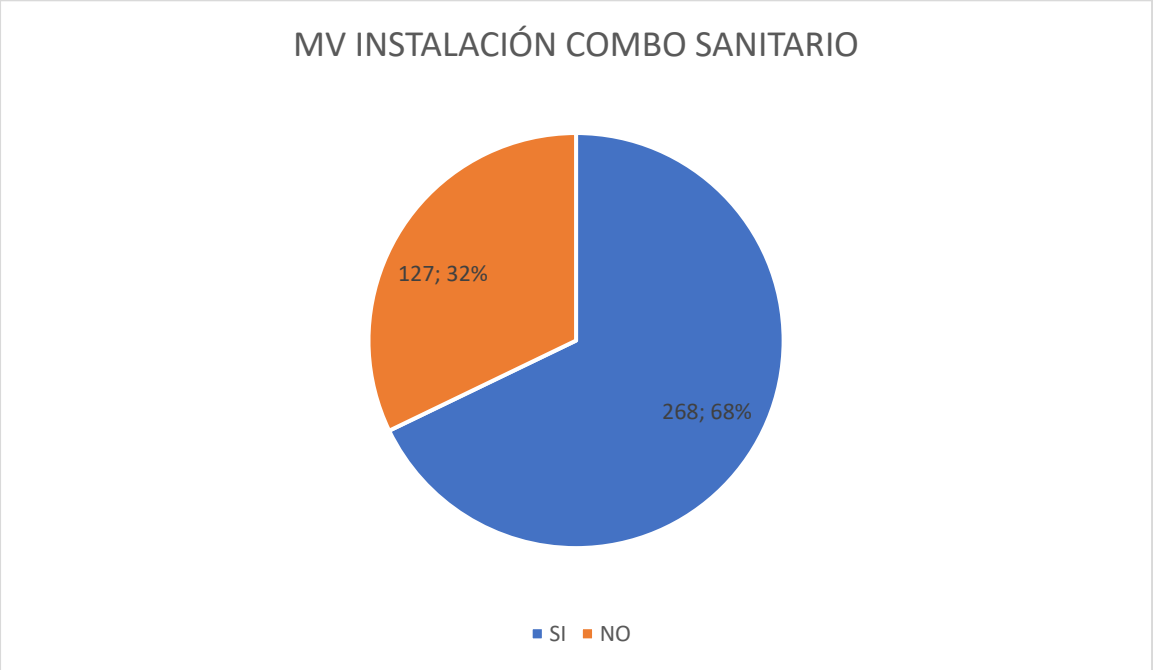


Ilustración 5 Combos Sanitarios

De los trescientos noventa y cinco (395) MV doscientos sesenta y ocho (268) MV correspondiente a 68% se realizaron instalación de combos sanitarios y a ciento veintisiete (127) MV correspondiente a 32% no se realizó instalación de combos sanitarios.

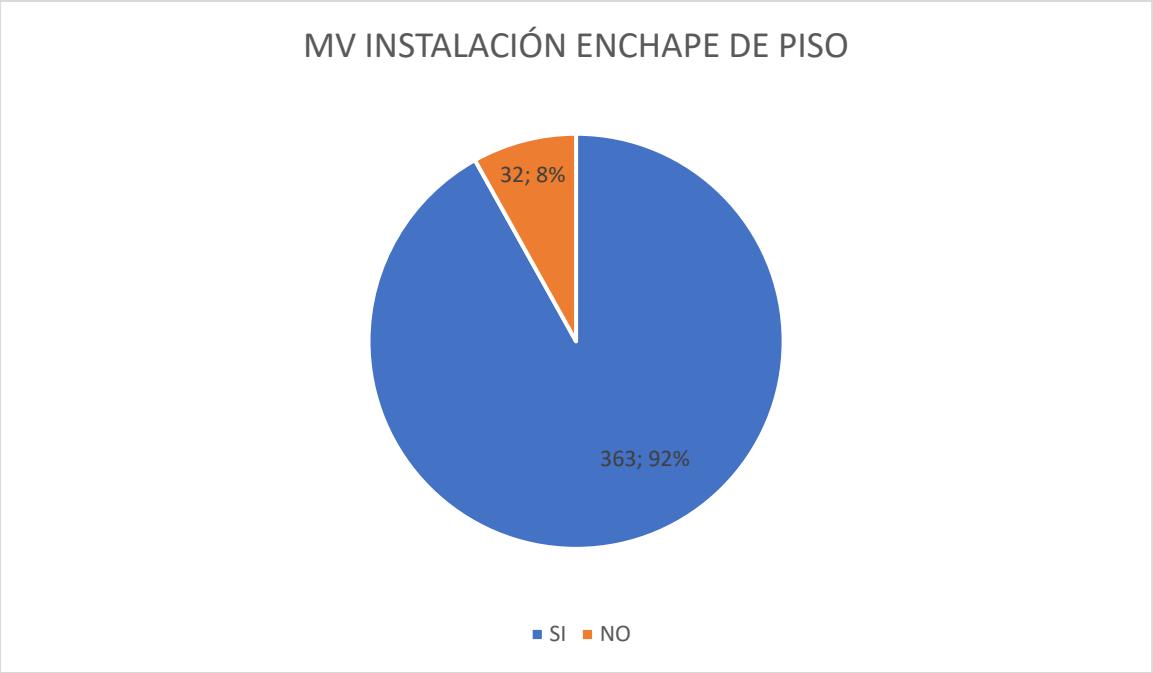


Ilustración 6 Enchape de Pisos

De los trescientos noventa y cinco (395) MV trescientos sesenta y tres (363) MV correspondiente a 92% se realizaron instalación de enchape de pisos y a treinta y dos (32) MV correspondiente a 8% no se realizó instalación de enchapes de pisos.

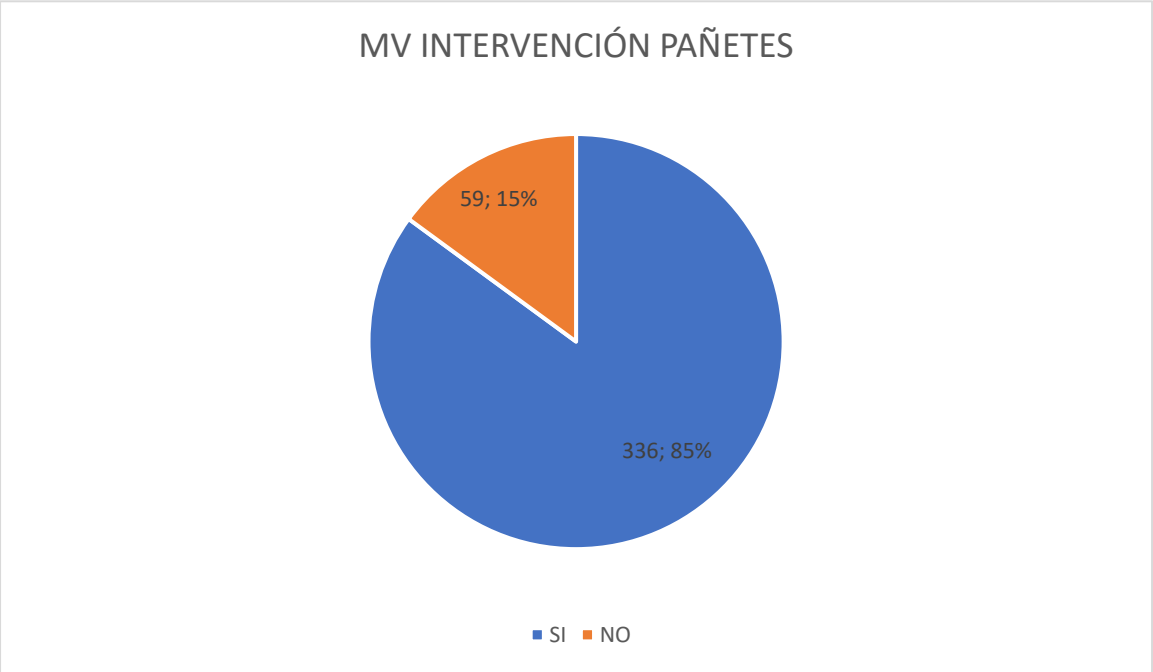


Ilustración 7Intervención Pañetes

De los trescientos noventa y cinco (395) MV trescientos treinta y seis (336) MV correspondiente a 85% se realizaron intervención de pañetes y a cincuenta y nueve (59) MV correspondiente a 15% no se realizó intervención de pañetes.

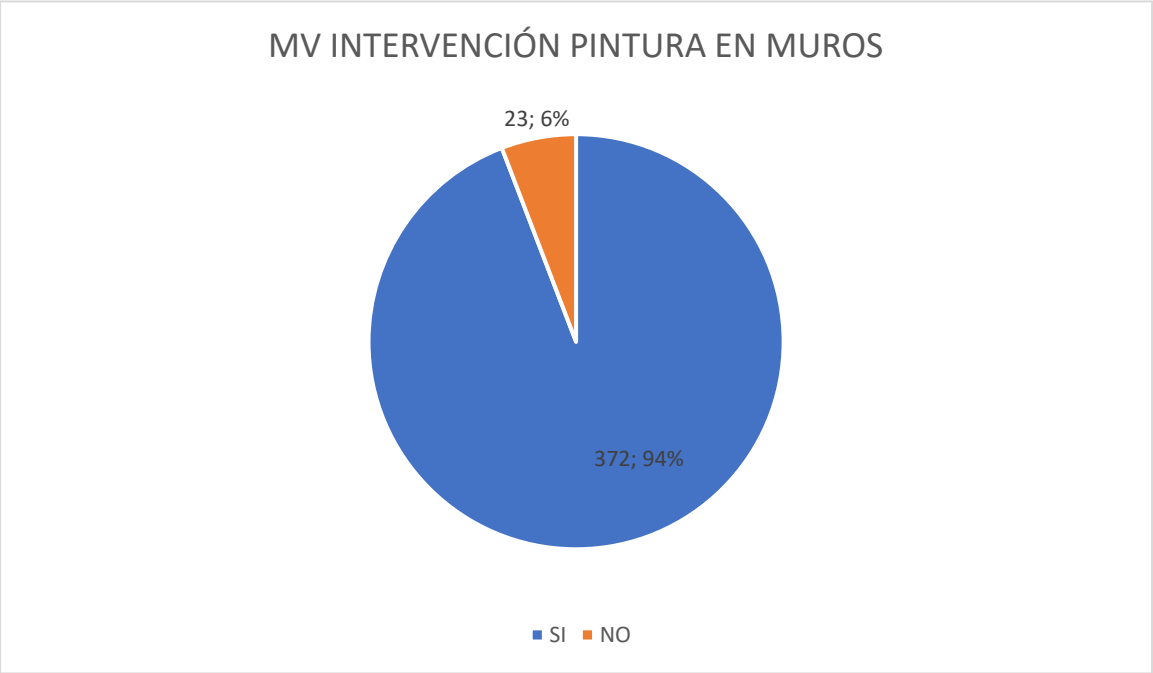


Ilustración 8 Intervención Pintura en Muros

De los trescientos noventa y cinco (395) MV trescientos setenta y dos (372) MV correspondiente a 94% se realizaron intervención de pintura en muros y a veintitrés (23) MV correspondiente a 6% no se realizó intervención de pintura en muros.

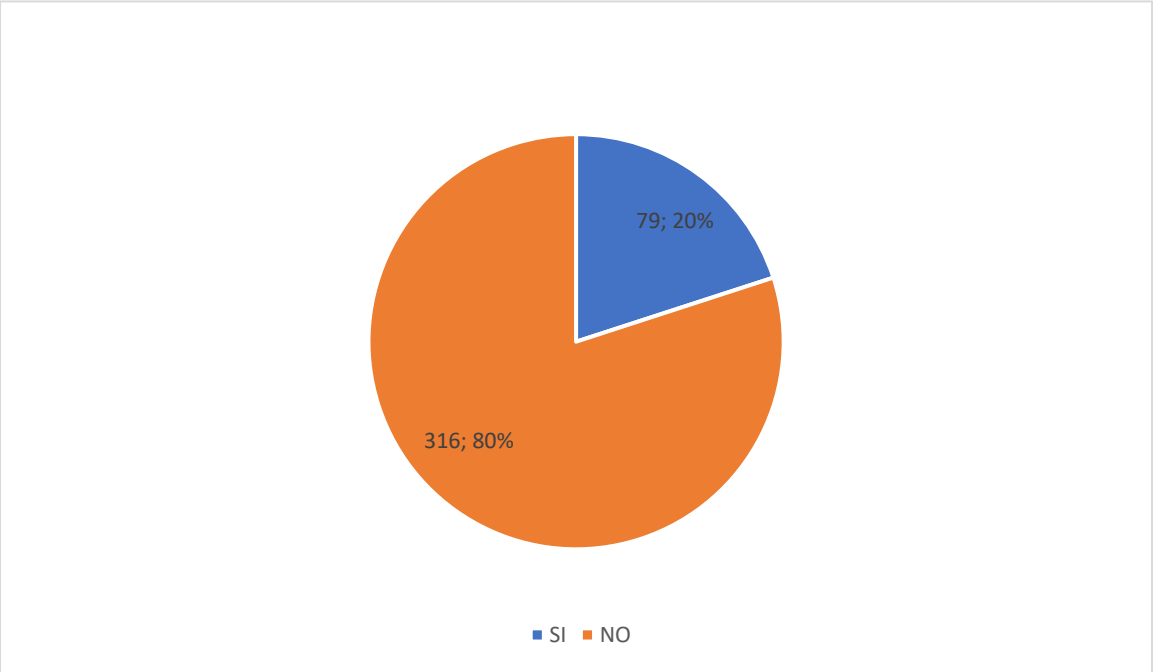


Ilustración 9 Instalación de Puertas

De los trescientos noventa y cinco (395) MV setenta y nueve (79) MV correspondiente a 20% se realizaron instalación de puertas y a trescientas dieciséis (316) MV correspondiente a 80% no se realizó instalación de puertas.

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe la matriz de la Base Técnica, que corresponde al anexo número tres (3) denominado Matriz base técnica.

6 PRÁCTICAS SOSTENIBLES

En el contexto actual de desarrollo sostenible y responsabilidad ambiental, los indicadores de gestión ambiental juegan un papel fundamental como herramientas de medición y evaluación del desempeño ambiental de proyectos, el cual obedece al mejoramiento de vivienda en territorios susceptibles de mejoramiento. Estos indicadores permiten cuantificar y monitorear aspectos clave como la eficiencia en el uso de recursos naturales, la reducción de impactos ambientales negativos, el cumplimiento de normativas ambientales, y la alineación en las fichas de manejo ambiental presentadas al inicio de la obra en el Plan de Manejo Ambiental inicial y en la actualización del mismo. Además, proporcionan una base objetiva para la toma de decisiones informadas, la identificación de áreas de mejora y la comunicación transparente con todas las partes interesadas. En este sentido, entender y aplicar adecuadamente los indicadores de gestión ambiental se vuelve crucial para verificar el cumplimiento en las actividades de gestión, monitoreo y control que no solo sean económicamente viables, sino también socialmente justas y ambientalmente responsables. Para el manejo del proyecto el contratista de obra presentó, dentro del Plan de Manejo Ambiental (en su primera versión) 9 fichas de manejo ambiental con 17 indicadores de gestión. Para la segunda versión se presentó 7 fichas de manejo con 7 indicadores de gestión.

A continuación, se presentan:

Tabla 3Indicadores de manejo ambiental PMA primera versión

Medición / Fichas de manejo	Indicador
A1 Capacitación ambiental	$\frac{\text{No. de capacitaciones planeadas}}{\text{No. de capacitaciones ejecutadas en el periodo}} x100$
A2 Punto de atención al usuario	$\frac{\text{No. de PQR recepcionados}}{\text{No. de PQR atendidos y cerrados}} x100$
A3 Cumplimiento de requisitos legales	$\frac{\text{No. de proveedores contratadas con permisos vigentes}}{\text{No. de proveedores requeridos}} x100$
B1 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio (NO APLICA)	$\frac{\text{No. de sitios de uso temporal dispuesto}}{\text{No. de sitios requeridos}} * 100$ $\frac{\text{No. de sitios de uso temporal finalizado}}{\text{No. de sitios temporales desmantelados}} * 100$ $\frac{\text{No. de medidas ambientales ejecutadas}}{\text{No. de medidas ambientales programadas}} * 100$
B2 Manejo de materiales de construcción	$\frac{\text{Número fuentes de material autorizadas}}{\text{Número de fuentes utilizadas en el proyecto durante el periodo reportado}} x100$ $\frac{\text{Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción}}{\text{Número de acciones establecidas}} x100$ $\frac{\text{Volumen mes de fuentes de materiales licenciada}}{\text{Volumen de material usado en el mes}} x100$
B3 Manejo integral de residuos sólidos y especiales	$\frac{\text{Kg de residuos reciclables producidos}}{\text{Kg de residuos reciclables aprovechados}} x100$ $\frac{\text{Kg de residuos no aprovechables producidos}}{\text{Kg de residuos no aprovechables entregados a la empresa que presta el servicio de aseo}} x100$ $\frac{\text{Cantidad de residuos peligrosos dispuestos}}{\text{Cantidad de residuos peligrosos generados}} x100$
B4 Manejo de RCD	$\frac{\text{Volumen de RCD dispuesto adecuadamente}}{\text{Volumen de RCD generado}} x100$
B5 Manejo de agua y sumideros	$\frac{\text{No. de sumideros protegidos}}{\text{No. total de sumideros}} x100$
B6 Control de emisiones atmosféricas	$\frac{\text{Número de volquetas con carpa}}{\text{Número de volquetas en el proyecto}} x100$ $\frac{\text{Número de vehículos en óptimas condiciones}}{\text{Número de vehículos en la obra}} x100$ $\frac{\text{Número de mantenimientos realizados}}{\text{Número de mantenimientos programados}} x100$

En la coyuntura entre la suspensión del contrato de obra y el reinicio de actividades se hicieron ajustes a la documentación inicialmente presentada por requerimiento del grupo interventor, actualizando los indicadores de gestión relacionados con el PMA, los cuales se presentan a continuación:

Tabla 4 Indicadores de manejo ambiental PMA actualización

Medición / Fichas de manejo	Indicador
Manejo y disposición final de RCD	$\frac{\text{Cantidad de RCD reutilizado en obra}}{\text{Cantidad de RCD generado en obra}} * 100$
Manejo de residuos sólidos convencionales	$\frac{\text{Cantidad de residuos clasificados}}{\text{Cantidad de residuos generados}}$
Manejo integral de sustancias químicas	$\frac{\text{Volumen de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas en obra}}{\text{Volumen de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas dispuestas}} x100$
Emisiones atmosféricas y mantenimiento	$\frac{\text{Número de equipos con certificación técnico – mecánica}}{\text{Número de equipos empleados}}$
Materiales e insumos	$\frac{\text{Volumen de insumos utilizados}}{\text{Volumen de insumos proyectados}} x100$
Manejo publicidad exterior	$\frac{\text{No conformidades ambientales}}{\text{No conformidades totales}}$
Manejo mejoramiento de competencias	$\frac{\text{personal capacitado}}{\text{personal programado}} * 100$

Cada uno de estos indicadores fueron herramientas fundamentales que orientaron la inspección, vigilancia, control y evaluación realizada para el componente ambiental en la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en el marco del objeto contractual.

A partir de los entregables se estableció el cumplimiento de metas e indicadores de gestión para el desarrollo del componente ambiental dentro del objeto contractual. Estas evaluaciones se lograron teniendo en cuenta los requerimientos y avales de la interventoría de obra, quien constató que las labores realizadas, los indicadores proyectados y los resultados llegaron a un grado optimo de satisfacción.

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación de los indicadores de gestión para el ciclo de vida del proyecto:

Tabla 5 Resultado de Indicadores de gestión

Métrica / FMA	Valor	Interpretación
1	100%	Los residuos de construcción y demolición generados en el ciclo de vida del proyecto fueron transportados por volquetas con pin ambiental vigente y dispuestos en sitios autorizados, soportado con la documentación de los transportadores, los certificados de recepción de material y de disposición, según el gestor.
2	100%	Todos los residuos ordinarios producidos en obra han sido dispuestos con los gestores adecuados según la naturaleza del residuo.
3	100%	Los remanentes y contenedores de sustancias químicas fueron dispuestos con los gestores avalados para tal fin.
4	100%	Todos los vehículos que ingresaron a la obra (para transporte de personal, material o traslado de residuos) se han verificado con la documentación correspondiente, constatando que cuenten con las certificaciones
		necesarias para el tránsito en el distrito (SOAT, TECNO MECÁNICA, CERT. GASES), evaluando el control requerido para el material particulado.
5	100%	Las materias pétreas utilizadas en el proyecto fueron adquiridas por medio de proveedores que contaron con el RUCOM y/o licenciamiento ambiental vigente.
6	0%	No fueron recepcionadas PQR o NC mayores en todo el ciclo de vida del proyecto relacionado con el componente ambiental.
7	100%	Las capacitaciones realizadas en todo el tiempo contractual fueron ejecutadas a cabalidad, según el temario programado
85.7%		Cumplimiento
14.3%		No cumplimiento u omisión
100%		Total de evaluación de indicadores

7 PÓLIZAS

A continuación, se enlistan las pólizas y actualizaciones de las mismas que se llevó a cabo durante la ejecución del contrato 917 de 2023

Tabla 6 Pólizas

ASEGURADORA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	**VALOR**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22/06/2023 al 22/05/2024	$ 1.728.864.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	22/06/2023 al 22/05/2024	$ 1.152.576.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	22/06/2023 al 22/01/2027	$ 576.288.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Estabilidad y calidad de la obra	2 años 0 meses y 1 día	$ 1.152.576.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL.**		
	Responsabilidad civil extracontractual	22/06/2023 al 22/01/2024	$ 464.000.000.00
	Predios laborales y operacionales	22/06/2023 al 22/01/2024	$ 464.000.000.00
	Contratistas y subcontratistas	22/06/2023 al 22/01/2024	$ 464.000.000.00
	Vehículos propios y no propios	22/06/2023 al 22/01/2024	$ 464.000.000.00

Pólizas donde se ajustó las vigencias de los amparos de acuerdo con el acta de inicio de fecha 6/07/2024

Tabla 7Ajuste de Pólizas por acta de inicio

ASEGURADORA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	**VALOR**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	06/07/2023 al 05/06/2024	$ 1.728.864.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	06/07/2023 al 05/06/2024	$ 1.152.576.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	06/07/2023 al 05/02/2027	$ 576.288.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Estabilidad y calidad de la obra	2 años 0 meses y 1 día	$ 1.152.576.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL.**		
	Responsabilidad civil extracontractual	6/07/2023 al 5/02/2024	$ 464.000.000.00
	Predios laborales y operacionales	06/07/2023 al 05/02/2024	$ 464.000.000.00
	Contratistas y subcontratistas	06/07/2023 al 05/02/2024	$ 464.000.000.00
	Vehículos propios y no propios	06/07/2023 al 05/02/2024	$ 464.000.000.00

Actualización por Adición y Prorroga

Tabla 8 Actualización por Adición y Prorroga

ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	06/07/2023 al 5/06/2024	$ 1.728.864.000.00	$ 1.728.864.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	06/07/2023 al 5/06/2024	$ 1.152.576.000.00	$ 1.653.696.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	06/07/2023 al 5/02/2027	$ 576.288.000.00	$ 826.848.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Estabilidad y calidad de la obra	2 años 0 meses y 1 día	$ 1.152.576.000.00	$ 1.653.696.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL.**			
	Responsabilidad civil extracontractual	6/07/2023 al 20/04/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00
	Predios laborales y operacionales	06/07/2023 al 20/04/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00
	Contratistas y subcontratistas	06/07/2023 al 20/04/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00
	Vehículos propios y no propios	06/07/2023 al 20/04/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00

Actualización por Adición y Prorroga

Tabla 9 Actualización por Adición y Prorroga

ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	06/07/2023 al 19/08/2024	$ 1.728.864.000.00	$ 1.728.864.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	06/07/2023 al 19/08/2024	$ 1.653.696.000.00	$ 1.653.696.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	06/07/2023 al 21/04/2027	$ 826.848.000.00	$ 826.848.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Estabilidad y calidad de la obra	2 años 0 meses y 1 día	$ 1.653.696.000.00	$ 1.653.696.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL.**			
	Responsabilidad civil extracontractual	22/06/2023 al 20/0174/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00
	Predios laborales y operacionales	06/07/2023 al 20/04/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00
	Contratistas y subcontratistas	06/07/2023 al 20/04/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00
	Vehículos propios y no propios	06/07/2023 al 20/04/2024	$ 464.000.000.00	$ 464.000.000.00

Actualización por:

Suspensión No. 1 del 17/04/2024 al 1/05/2024

Ampliación Suspensión No. 1 del 2/05/2024 al 13/02/2024

Prorroga No. 2 por 2 meses y 15 días

Tabla 10 Actualización

ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	06/07/2023 al 3/12/2024	$ 1.728.864.000.00	$ 1.728.864.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	06/07/2023 al 19/08/2024	$ 1.653.696.000.00	$ 1.653.696.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	06/07/2023 al 4/08/2027	$ 826.848.000.00	$ 826.848.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Estabilidad y calidad de la obra	2 años 0 meses y 1 día	$ 1.653.696.000.00	$ 1.653.696.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL.**			
	Responsabilidad civil extracontractual	6/07/2023 al 29/08/2024	$ 520.000.000.00	$ 520.000.000.00
	Predios laborales y operacionales	06/07/2023 al 29/08/2024	$ 520.000.000.00	$ 520.000.000.00
	Contratistas y subcontratistas	06/07/2023 al 29/08/2024	$ 520.000.000.00	$ 520.000.000.00
	Vehículos propios y no propios	06/07/2023 al 29/08/2024	$ 520.000.000.00	$ 520.000.000.00

Actualización de Prorroga No. 2 por 2 meses y 15 días

ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	06/07/2023 al 3/12/2024	$ 1.728.864.000.00	$ 1.728.864.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	06/07/2023 al 29/12/2024	$ 1.653.696.000.00	$ 1.653.696.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	06/07/2023 al 4/08/2027	$ 826.848.000.00	$ 826.848.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Estabilidad y calidad de la obra	2 años 0 meses y 1 día	$ 1.653.696.000.00	$ 1.653.696.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL.**			
	Responsabilidad civil extracontractual	22/06/2023 al 29/08/2024	$ 464.000.000.00	$ 520.000.000.00
	Predios laborales y operacionales	06/07/2023 al 29/08/2024	$ 464.000.000.00	$ 520.000.000.00
	Contratistas y subcontratistas	06/07/2023 al 29/08/2024	$ 464.000.000.00	$ 520.000.000.00
	Vehículos propios y no propios	06/07/2023 al 29/08/2024	$ 464.000.000.00	$ 520.000.000.00

Tabla 11 Actualización de Prorroga No. 2 por 2 meses y 15 días

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe las pólizas, que corresponde al anexo número cuatro (4) denominado Pólizas.

8 MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR una vez finalizado la ejecución del contrato 917 de 2023 y con la constancia de terminación y cumplimiento firmada por la interventoría procedió a realizar las modificación y actualización de las garantías.

Las cuales se detallan a continuación

Ajuste a la vigencia del amparo de estabilidad de acuerdo con el acta final de recibo de obra de fecha 31/07/2024

Tabla 12 Ajuste a la vigencia del amparo

ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ANTERIOR	VALOR ACTUAL
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	06/07/2023 al 3/12/2024	$ 1.728.864.000.00	$ 1.728.864.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	06/07/2023 al 29/12/2024	$ 1.653.696.000.00	$ 1.653.696.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	06/07/2023 al 4/08/2027	$ 826.848.000.00	$ 826.848.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Estabilidad y calidad de la obra	31/07/2024 al 31/07/2026	$ 1.653.696.000.00	$ 1.653.696.000.00

9 COMPROBANTES DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIÓN Y ARL

Durante la ejecución del contrato 917 de 2023 el contratista de obra tuvo el siguiente equipo mínimo requerido establecido en el anexo técnico para la prestación del servicio y/o entrega del bien, esto fue con el fin de garantizar la idoneidad, conocimiento, experiencia y experticia para el desarrollo del objeto contractual. De igual manera el contratista de obra tuvo personal adicional idóneo al mínimo requerido para la entrega de productos a desarrollar durante la ejecución del contrato.

Tabla 13 Equipo Mínimo

ITEM	TIPO DOC	No CEDÚLA	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	CC	1121833673	JOSE LUIS CERON CERON	DIRECTOR DE OBRA	2/08/2023	31/07/2024
2	CC	86044862	JUAN CARLOS LEON BRITO	RESIDENTE DE OBRA	4/08/2023	31/07/2024
3	CC	1030581349	IVAN DARIO SOSA LOZANO	RESIDENTE DE OBRA	22/07/2023	31/10/2023
4	CC	1075260380	DANNY AMEZQUITA TOVAR	RESIDENTE DE OBRA	24/07/2023	31/10/2023
5	CC	1030592378	JULIAN HERNAN GUARIN PENAGOS	RESIDENTE DE OBRA	19/08/2023	29/02/2024
6	CC	1057514748	JUAN CARLOS DELGADO PARDO	APOYO TÉCNICO	21/07/2023	29/02/2024
7	CC	1121946141	OMAR FELIPE LIZCANO GARZON	APOYO TÉCNICO	2/09/2023	30/11(2023
8	CC	1120380899	SERGIO OVIEDO SOLANO	RESIDENTE DE OBRA	7/11/2023	31/01/2024
9	CC	1121920796	VICTOR EDUARDO CRUZ SASTOQUE	RESIDENTE DE OBRA	28/11/2023	31/01/2024
10	CC	1121846959	CARLOS ALBERTO PARRA BETANCOURTH	RESIDENTE DE OBRA	9/02/2024	29/02/2024
11	CC	57297562	KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO	COORDINADORA SOCIAL	21/07/2023	31/07/2024
12	CC	1020769445	CATHERINE LIZETH MONROY NAVARRETE	RESIDENTE SOCIAL	21/07/2023	29/02/2024
13	CC	1026278704	LEIDY PAOLA SERRANO FUNEME	RESIDENTE SOCIAL	21/07/2023	29/02/2024
14	CC	52343396	SANDRA VIVIANA FRESNEDA GOMEZ	RESIDENTE SOCIAL	21/07/2023	29/02/2024
15	CC	64564969	JULIA ELENA GUZMAN SANJUAN	RESIDENTE SOCIAL	21/07/2023	29/02/2024
16	CC	80831744	DIEGO FERNANDO GONZALES SALAZAR	PROFESIONAL AMBIENTAL	21/07/2023	29/02/2024
17	CC	52079276	LUZ HELENA HERRERA MAHECHA	PROFESIONAL SST	21/07/2023	29/02/2024
18	CC	1010028577	LAURA ALEJANDRA DIAZ JIMENEZ	APOYO TÉCNICO	7/11/2023	29/02/2024
19	CC	1024479570	CARLOS ENRIQUE VARGAS MORALES	INSPECTOR	13/02/2024	29/02/2024
20	CC	1102870684	MARIA HELENA MENCO COLON	INSPECTOR	3/02/2024	29/02/2024
21	CC	1014256912	ERICK ALEXANDER VELOZA DIAZ	RESIDENTE DE OBRA	14/05/2024	24/05/2024
22	CC	1032475285	DIANA CATALINA RIOS BRAVO	RESIDENTE	4/12/2023	13/12/2023

23	CC	1057514748	JUAN CARLOS DELGADO PARDO	RESIDENTE DE OBRA	14/05/2024	31/07/2024
24	CC	1120380899	SERGIO OVIEDO SOLANO	RESIDENTE DE OBRA	14/05/2024	31/07/2024
25	CC	23115742	MARIA DEL CARMEN OSORIO YANCES	RESIDENTE SOCIAL	14/05/2024	31/07/2024
26	CC	64564969	JULIA ELENA GUZMAN SANJUAN	RESIDENTE SOCIAL	14/05/2024	31/07/2024
27	CC	1020769445	CATHERINE LIZETH MONROY NAVARRETE	RESIDENTE SOCIAL	14/05/2024	31/07/2024
28	CC	1121953269	LADY STHEFANIA CUELLAR ROLDAN	RESIDENTE SOCIAL	22/05/2024	31/07/2024
29	CC	1013600630	CINDY JOHANNA DUSSAN OLIVEROS	INGENIRO AMBIENTAL	21/05/2024	31/07/2024
30	CC	1121831432	MARIA SHIRLEY PRIETO MARTINEZ	RESIDENTE SST	23/05/2024	31/07/2024

Durante la ejecución del contrato 917 de 2023 el contratista de obra tuvo el siguiente personal operativo quienes fueron los encargados de la ejecución de las actividades de obras en cada uno de los mejoramientos de viviendas.

Tabla 14 Personal Operativo

ITEM	CC/PPT	No CEDÚLA	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	CC	86089068	OMAR HERNAN HERRERA	OFICIAL DE OBRA	15/08/2023	30/08/2023
2	CC	1123566380	ANDRES FELIPE BONILLA PINTO	AYUDANTE DE OBRA	15/08/2023	30/07/2024
3	CC	87492033	CARLOS ANDRES VERA ERAZO	INSPECTOR	15/08/2023	30/07/2024
4	CC	1023941292	JEISSON MIGUEL CUCHIA DAMIAN	OFICIAL DE OBRA	16/08/2023	1/02/2024
5	CC	80912906	WILLIAM ALBERTO ROMERO CHAPARRO	OFICIAL DE OBRA	16/08/2023	18/09/2023
6	CC	79048021	CARLOS EDUARDO ONTIBON RINCON	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	1/09/2023
7	CC	1000801542	CARLOS MAURICIO BLANCO	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	12/09/2023
8	CC	1122116173	DUVIAN ENRIQUE MORENO SERRATO	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	29/02/2024
9	CC	1121530192	JALDER DE JESUS VALETH ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	1/09/2023
10	CC	1124056901	ANYELO JOSE VALETH ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	17/08/2023	2/11/2023
11	CC	1010212911	JHONATAN STIVEN HEREDIA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	17/08/2023	6/10/2023
12	CC	1007704750	JOSE REINEL BOCANEGRA ALVAREZ	OFICIAL DE OBRA	17/08/2023	1/01/2024
13	CC	1024576148	JONNATAN ESNEIDER CUCHIA DAMIAN	AYUDANTE DE OBRA	17/08/2023	6/01/2024
14	CC	80859564	ALGEMIRO RANGEL GIL	OFICIAL DE OBRA	17/08/2023	18/09/2023
15	CC	1042466959	JESUS RAFAEL INFANTE PAYARES	OFICIAL DE OBRA	17/08/2023	1/02/2024
16	CC	12126866	RODRIGO QUINTERO CONDE	AYUDANTE DE OBRA	17/08/2023	9/09/2023
17	CC	79651188	VICTOR JULIO CUCHIA MONROY	OFICIAL DE OBRA	17/08/2023	1/12/2023
18	CC	8321917	EDWIN ERNEY HERNANDEZ ZULUAGA	MAESTRO DE OBRA	17/08/2023	29/02/2024
19	CC	1001152990	JAIME ANDRES HERNANDEZ LEDEZMA	AYUDANTE DE OBRA	17/08/2023	29/02/2024

20	CC	19435148	VICTOR JULIO CUERVO CUERVO	MAESTRO DE OBRA	17/08/2023	30/08/2023
21	CC	17267359	RUBEN DARIO MORENO HUERTAS	MAESTRO DE OBRA	17/08/2023	5/10/2023
22	CC	79822522	ORLANDO CADENA CANCHON	MAESTRO DE OBRA	17/08/2023	1/02/2024
23	CC	1023952776	DUVAN ORLANDO CADENA CANCHON	OFICIAL DE OBRA	17/08/2023	18/11/2023
24	CC	80100072	JUAN CARLOS RODRIGUEZ SOTO	AYUDANTE DE OBRA	17/08/2023	1/02/2024
25	CC	1143251965	ARLEY ALVARINO GUZMAN	AYUDANTE DE OBRA	18/08/2023	30/08/2023
26	CC	77176052	FREDIS MATUTE RICARDO	OFICIAL DE OBRA	18/08/2023	1/02/2024
27	CC	17266895	JOSE SALOMON MORENO HUERTAS	OFICIAL DE OBRA	19/08/2023	5/10/2023
28	CC	79348740	EDIER SABOGAL VERA	OFICIAL DE OBRA	23/08/2023	1/01/2024
29	CC	1000223606	EDUWIN YESID ROMERO MOYA	AYUDANTE DE OBRA	23/08/2023	12/09/2023
30	CC	1023963971	WILLIAM ANDREY LEON LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	23/08/2023	1/11/2023
31	CC	1022978062	FABIAN ANDRES BARBOSA CERPA	OFICIAL DE OBRA	23/08/2023	21/01/2024
32	CC	3214242	PEDRO ANTONIO AGUILERA DIAZ	OFICIAL DE OBRA	23/08/2023	1/01/2024
33	CC	19307530	CESAR QUIMBAYO ALZATE	OFICIAL DE OBRA	23/08/2023	1/10/2023
34	CC	17391267	GIOVANNY SEBASTIAN VELAZCO PEDROZO	OFICIAL DE OBRA	23/08/2023	4/09/2023
35	CC	1023867473	LEYTON DUVIAN SABOGAL ROLDAN	AYUDANTE DE OBRA	23/08/2023	25/11/2023
36	CC	80775723	ELKIN JOHAN LEON	OFICIAL DE OBRA	23/08/2023	1/11/2023
37	PPT	5485486	JESUS DAVID SON DIAZ	OFICIAL DE OBRA	24/08/2023	30/08/2023
38	PPT	6924469	JORGE ENRIQUE PEREZ NAVAS	OFICIAL DE OBRA	24/08/2023	30/08/2023
39	CC	1000616864	SERGIO ANDRES MONTAÑA MORENO	AYUDANTE DE OBRA	24/08/2023	30/08/2023
40	CC	79113287	LUIS GERARDO AGUILLON BARON	AYUDANTE DE OBRA	24/08/2023	30/08/2023
41	CC	1000330305	JHON ESTIVEN PRIETO LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	24/08/2023	30/08/2023
42	CC	19489467	CARLOS JULIO PRIETO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	24/08/2023	18/09/2023
43	CC	1023000293	CARLOS JULIO PRIETO LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	24/08/2023	18/09/2023
44	CC	1022992055	LUIS FELIPE OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	24/08/2023	22/12/2023
45	CC	1033791926	JEFERSON STEVEN HOYOS SALAZAR	AYUDANTE DE OBRA	24/08/2023	1/09/2023
46	CC	1013602566	JOHAN SEBASTIAN VELASCO CHANTRE	AYUDANTE DE OBRA	24/08/2023	16/09/2023
47	CC	79991296	CARLOS MAURICIO CUERVO FORERO	OFICIAL DE OBRA	24/08/2023	30/08/2023
48	CC	1024496057	JOSE ARLES MOTTA ZAMBRANO	AYUDANTE DE OBRA	24/08/2023	1/11/2023
49	PPT	6402268	CARLOS ALFONSO TORRES OCHOA	OFICIAL DE OBRA	24/08/2023	30/11/2023
50	PPT	5956352	EDGAR RONALD MOYA FLORES	OFICIAL DE OBRA	24/08/2023	13/10/2023
51	CC	4130958	JOSE MANUEL RUBIANO JUEZ	OFICIOS VARIOS	25/08/2023	12/09/2023
52	PPT	5152975	LUIS RINCON HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	25/08/2023	1/11/2023
53	CC	79819042	WILMA FREDY PARDO OJEDA	OFICIAL DE OBRA	25/08/2023	30/08/2023
54	CC	80723130	DANY CADIR PINILLA FONTECHA	OFICIAL DE OBRA	25/08/2023	15/01/2024
55	CC	1067030568	LUIS JOSE GOMEZ PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	25/08/2023	30/08/2023
56	CC	1031162390	ANDREY DAVID MONTALVO CORTES	AYUDANTE DE OBRA	25/08/2023	1/01/2024
57	CC	1028660167	BRAYAN DAVID MORENO LONDOÑO	AYUDANTE DE OBRA	25/08/2023	1/02/2024

58	CC	1001202250	GONZALO ERNESTO CORDERO ESTEVEZ	OFICIAL DE OBRA	25/08/2023	10/10/2023
59	CC	80366590	MARIO ALFONSO JEREZ PARDO	OFICIAL DE OBRA	26/08/2023	2/11/2023
60	CC	1000227921	ARNOLD YAMYTH GONZALES LINARES	AYUDANTE DE OBRA	29/08/2023	18/10/2023
61	CC	1023918191	FREYZZER YONATAN TORRES RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	29/08/2023	14/09/2023
62	CC	6768943	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	OFICIAL DE OBRA	29/08/2023	12/01/2024
63	CC	79752494	CARLOS SAMUEL VILLAMIL ROJAS	OFICIAL DE OBRA	29/08/2023	1/12/2023
64	CC	1063481260	JAIME LUIS ACUÑA VILLALOBO	AYUDANTE DE OBRA	29/08/2023	4/11/2023
65	CC	1003088775	MIGUEL ANGEL CUENTA PACHECO	AYUDANTE DE OBRA	30/08/2023	1/02/2024
66	CC	79605080	ELVER TORRES CENDALES	OFICIAL DE OBRA	30/08/2023	14/09/2023
67	CC	1022981022	CRISTIAN DARIO PEREZ MACIAS	AYUDANTE DE OBRA	30/08/2023	1/02/2024
68	CC	403856	JESUS BAYARDO ACOSTA MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	30/08/2023	4/11/2023
69	PPT	1394006	LUIS ALBERTO DEMEY	OFICIAL DE OBRA	30/08/2023	1/12/2023
70	PPT	5319870	OTSIR CARABALLO CHANCHAMIRE	AYUDANTE DE OBRA	30/08/2023	1/12/2023
71	CC	1115727132	RONALD ARENAS CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	31/08/2023	11/11/2023
72	CC	79923478	YIMMY EMBUS ACOSTA	AYUDANTE DE OBRA	01/09/024	12/09/2024
73	CC	80810518	YESID BELTRAN AROCA	AYUDANTE DE OBRA	1/09/2023	12/01/2024
74	CC	79444231	ARNULFO SALVADOR CHINCHILLA	AYUDANTE DE OBRA	3/09/2023	1/01/2024
75	CC	37525017	CIELO AIDE OLIVEROS PINTO	AYUDANTE DE OBRA	3/09/2023	1/01/2024
76	CC	72242029	ROBERTO SAMUEL OROZCO MORELO	AYUDANTE DE OBRA	5/09/2023	22/01/2024
77	PPT	4512883	EUDIS RAMON DEMEY HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	5/09/2023	11/11/2023
78	CC	1023903067	GILBERTO JUNIOR RUIZ ROMERO	OFICIAL DE OBRA	5/09/2023	15/01/2024
79	CC	79322714	JOSE ALEJANDRO BERMUDEZ	AYUDANTE DE OBRA	5/09/2023	6/09/2023
80	CC	1079990211	ARGENIS FONSECA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	6/01/2024
81	CC	1026308030	BRAYAN ESTEBAN GALEANO LEON	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	4/11/2023
82	CC	1077856356	EDWIN ALVEIRO MOLINA GOMEZ	OFICIAL DE OBRA	6/09/2023	1/02/2024
83	CC	5750912	HELI FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	5/01/2024
84	CC	79615860	ISIDRO GALINDO BARON	OFICIAL DE OBRA	6/09/2023	23/09/2023
85	CC	5750805	JESUS ESTEPA PALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	3/01/2024
86	CC	1041259902	NEFTALY FIDEL GOMEZ RAMOS	OFICIAL DE OBRA	6/09/2023	1/02/2024
87	CC	1105690579	TEOFILO ALEXANDER MOLINA GOMEZ	OFICIAL DE OBRA	6/09/2023	6/01/2024
88	CC	1079990212	JUNIOR SANTIAGO MARTINEZ CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	6/09/2023	18/10/2023
89	CC	79832823	WILSON SERERE GONZALEZ	MAESTRO DE OBRA	7/09/2023	1/01/2024
90	CC	1070324687	CRISTIAN CAMILO SERERE MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	7/09/2023	1/01/2024
91	CC	16702606	CRUZ ADOLFO MORENO IBARGUEN	OFICIAL DE OBRA	7/09/2023	9/10/2023
92	PPT	5196690	ELIGIO ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA	7/09/2023	12/09/2023
93	CC	1116809278	JONATAN ARLEY BUSTOS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	8/09/2023	6/10/2023
94	CC	1013630769	WILLIAM GERNAN TORRES GOMEZ	OFICIAL DE OBRA	8/09/2023	1/11/2023
95	CC	1023029649	YEISSON DANIEL SILVA GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	8/09/2023	15/09/2023

96	CC	19448211	RAMON RICARDO SANTAMARIA PASTRANA	OFICIAL DE OBRA	9/09/2023	1/11/2023
97	CC	1032391095	LUIS GUILLERMO SALAMANCA NIÑO	AYUDANTE DE OBRA	9/09/2023	1/11/2023
98	CC	15341474	GERLEY DE JESUS CASTRILLON PEREZ	OFICIAL DE OBRA	10/09/2023	29/09/2023
99	CC	1000747064	MARLON CASTRILLON QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	10/09/2023	29/09/2023
100	PPT	6878227	ALBERTO ANTONIO ALVAREZ PEROZO	AYUDANTE DE OBRA	12/09/2023	14/09/2023
101	CC	80114736	CARLOS JULIO NIÑO RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA	12/09/2023	1/01/2024
102	CC	1094885746	JEYSON BRAIAN GONZALEZ CARDONA	OFICIAL DE OBRA	12/09/2023	14/09/2023
103	CC	1007698811	JUAN ANDRES CASTRILLON QUINTERO	OFICIAL DE OBRA	12/09/2023	29/09/2023
104	CC	1022997328	CRISTIAN ANTONIO BECERRA GOMEZ	OFICIAL DE OBRA	13/09/2023	1/02/2024
105	CC	1020795200	YONI ESTEBAN CARABALLO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	13/09/2023	16/09/2023
106	CC	1000575544	KEVIN ANDRES RONDON	OFICIAL DE OBRA	13/09/2023	1/11/2023
107	CC	80452582	LUIS ALEJANDRO TALERO REYES	OFICIAL DE OBRA	13/09/2023	1/11/2023
108	PPT	7231014	LIBARDO DE JESUS SANCHEZ VILORIA	OFICIAL	14/09/2023	1/12/2023
109	CC	1101386682	FABIO DAVID MOLINA RODRIGUEZ	RESIDENTE TÉCNICO	13/09/2023	1/02/2024
110	PPT	793600	MAXIMILIANO ZAVALA OLLARVES	OFICIAL	14/09/2023	1/02/2024
111	CC	1001043629	SANTIAGO MORENO URIZA	AYUDANTE DE OBRA	15/09/2023	1/01/2024
112	PPT	6580239	ALIS JOSE RODRIGUEZ PIÑA	AYUDANTE DE OBRA	15/09/2023	27/10/2023
113	CC	1085101887	JORGE LUIS SOLANO VILLALOBO	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023	1/01/2024
114	CC	80489620	JOSE ANGEL ALAYON SANTAMARIA	OFICIAL DE OBRA	19/09/2023	1/01/2024
115	CC	80452932	EDGAR POVEDA CORREDOR	OFICIAL DE OBRA	19/09/2023	15/12/2023
116	CC	1023931668	JUAN SEBASTIAN GALEANO MENDEZ	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023	21/09/2023
117	CC	80202371	YON ALEJANDRO CRUZ BELTRAN	OFICIAL DE OBRA	19/09/2023	15/12/2023
118	PPT	3780288	JOSE GREGORIO ZAVALA ZAVALA	OFICIAL DE OBRA	19/09/2023	1/02/2024
119	PPT	4662709	RICHAR JESUS FUENMAYOR ESPAÑOL	OFICIAL DE OBRA	19/09/2023	21/09/2023
120	PPT	1239369	ANDRO ELCIDES PEREZ CHIRINO	OFICIAL DE OBRA	20/09/2023	12/10/2023
121	CC	85469924	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	OFICIAL DE OBRA	20/09/2023	1/02/2024
122	CC	13958942	GONZALO ARIZA SERRANO	MAESTRO DE OBRA	20/09/2023	1/01/2024
123	CC	1002498842	JOSE MIGUEL MIRANDA FLOREZ	OFICIAL DE OBRA	20/09/2023	12/10/2023
124	CC	80895536	JUAN GUILLERMO MORALES COJO	OFICIAL DE OBRA	20/09/2023	1/02/2024
125	PPT	7440536	LEONARDO JOSE RUIZ FINOL	OFICIAL DE OBRA	20/09/2023	1/02/2024
126	CC	1052998837	MARIO ALBERTO GARRIDO MORA	AYUDANTE DE OBRA	20/09/2023	21/09/2023
127	CC	73153504	MARLON ANTONIO DIMAS HERNANDEZ	OFICIAL DE OBRA	20/09/2023	1/02/2024
128	PPT	5315607	MAXIMO RUIZ	OFICIAL DE OBRA	20/09/2023	15/11/2023
129	PPT	6880187	PABLO MANUEL VARGAS MONTES	OFICIAL DE OBRA	20/09/2023	1/01/2024
130	CC	91363289	PEDRO JOSE CAVANZO ORTIZ	OFICIAL DE OBRA	20/09/2023	1/01/2024
131	CC	1119816908	YOSSIMAR RAFAEL MUÑOZ MARTINEZ	AUXILIAR DE OBRA	20/09/2023	20/10/2023
132	CC	1049925733	ALEXANDER TERAN MALDONADO	OFICIAL DE OBRA	21/09/2023	1/02/2024
133	CC	1057785899	ESTEBAN DAVID FLOREZ AGUIRRE	OFICIAL DE OBRA	21/09/2023	9/11/2023

134	CC	1047504078	YAIDER ENRIQUE MUÑOZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	21/09/2023	21/10/2023
135	CC	1007426963	YONATANN DAVID MONTEALEGRE CAPERA	OFICIAL DE OBRA	21/09/2023	9/11/2023
136	CC	1070927501	FABIAN STIVEN NIÑO RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	23/09/2023	12/10/2023
137	CC	79780214	FABIO HUMBERTO NIÑO	OFICIAL DE OBRA	23/09/2023	12/10/2023
138	PPT	6536026	PEDRO ALBERTO CALDERA CHIRINOS	OFICIAL DE OBRA	23/09/2023	1/02/2024
139	CC	79779076	JOSE MAURICIO ROMERO RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	27/09/2023	1/12/2023
140	CC	19488176	BLAS IGNACIO CUEVAS SANABRIA	ENCHAPADOR	27/09/2023	12/10/2023
141	CC	3213906	DANIEL MARIA AGUILERA DIAZ	OFICIAL DE OBRA	27/09/2023	1/01/2024
142	CC	80363486	JORGE ERNESTO BARBOSA SANCHEZ	OFICIAL DE OBRA	27/09/2023	21/01/2024
143	PPT	6039163	JOSE ALEJANDRO ACOSTA ZAVALA	OFICIAL DE OBRA	27/09/2023	1/02/2024
144	CC	18919068	RUBEN DARIO CHAVERRA PEDROZO	OFICIAL DE OBRA	28/09/2023	1/02/2024
145	CC	1022971649	CRISTIAN ENRIQUE ROSAS NARANJO	OFICIAL DE OBRA	28/09/2023	1/10/2023
146	PPT	4689645	ANGEL ASDRUBAL FUENMAYOR DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2023	30/11/2023
147	CC	79809395	LUIS ALEJANDRO CABALLERO SANCHEZ	OFICIAL DE OBRA	3/10/2023	1/11/2023
148	CC	80229226	LUIS ALFONSO CASTAÑEDA VILLAMIL	OFICIAL DE OBRA	3/10/2023	23/02/2024
149	CC	1003626016	JAVIER FORERO MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	4/10/2023	1/01/2024
150	CC	1000623010	JAROL ESTIBEN CERERE SALVADOR	OFICIAL DE OBRA	4/10/2023	21/10/2023
151	CC	80248262	EDGAR GONZALEZ GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	4/10/2023	1/02/2024
152	CC	1044004786	GEFERSON DIMAS RAMOS	AYUDANTE DE OBRA	4/10/2023	6/01/2024
153	CC	1053796764	EDWAR BENJAMIN SUAREZ OTALVARO	OFICIAL DE OBRA	5/10/2023	22/01/2024
154	CC	1193578475	FERNANDO ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	5/10/2023	18/01/2024
155	CC	1106332413	LEIDER ALIRIO RUIZ MORENO	AYUDANTE DE OBRA	5/10/2023	30/12/2023
156	CC	1033777524	MIGUEL ANGEL CARDENAS GOMEZ	MAESTRO DE OBRA	5/10/2023	27/02/2024
157	CC	79653423	HERMES MENDOZA CUBIDES	OFICIAL DE OBRA	9/10/2023	1/01/2024
158	CC	1014856856	MICHELL STIVEN MORENO GARAY	AYUDANTE DE OBRA	9/10/2023	1/11/2023
159	CC	79700717	EDGAR HUMBERTO CABALLERO SANCHEZ	OFICIAL DE OBRA	9/10/2023	1/11/2023
160	CC	1034280739	DAVID ALEJANDRO MARTINEZ NEIRA	AYUDANTE DE OBRA	11/10/2023	27/10/2023
161	CC	1019089539	JOSE ADOLFO RODRIGUEZ NIETO	OFICIAL DE OBRA	11/10/2023	27/10/2023
162	CC	1028780916	ERICK ESNEIDER BERNAL SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	11/10/2023	27/10/2023
163	CC	1077082809	JAIME ANDRES TINJACA SANCHEZ	OFICIAL DE OBRA	11/10/2023	27/10/2023
164	PPT	5348928	ERNESTO JESUS RUIZ PIRELA	AYUDANTE DE OBRA	13/10/2023	1/02/2024
165	CC	16452060	LUIS GOMEZ BEDOYA	AYUDANTE DE OBRA	13/10/2023	9/11/2023
166	CC	85459699	ROBERTO JESUS VARGAS CUELLO	OFICIAL DE OBRA	14/10/2023	1/11/2023
167	CC	1014736994	DEIBY JOAN SAMUDIO LIZARASO	AYUDANTE DE OBRA	14/10/2023	29/12/2023
168	CC	80767157	DAVID DARIO PINILLA FONTECHA	AUXILIAR DE OBRA	19/10/2023	1/02/2024
169	CC	1033686078	DADDY SANTIAGO PINILLA CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA	19/10/2023	15/01/2024
170	PPT	5623699	JULIO CESAR EPIEYU MONTIEL	OFICIAL DE OBRA	21/10/2023	1/02/2024
171	CC	92447738	ELADIO MANUEL DIAZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	21/10/2023	1/01/2024

172	CC	1140371927	RICHELL JOSE FERNANDEZ GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA	21/10/2023	1/02/2024
173	PPT	6353981	LUIS ARTURO EPIEYU MONTIEL	OFICIAL DE OBRA	21/10/2023	1/01/2024
174	CC	1023880617	BYRON YESID PARRA DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	21/10/2023	2/01/2024
175	CC	1022941563	JOHAN ALEXIS CONTRERAS GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2023	22/10/2023
176	CC	3963722	DOUGLAS JOSE TORRES RAGAS	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2023	22/10/2023
177	PPT	2874474	RENNY JOSE MONTERO ZAMORA	OFICIAL DE OBRA	22/10/2023	1/01/2024
178	CC	79477829	LUIS FELIPE ROMERO LOPEZ	OFICIAL DE OBRA	22/10/2023	1/01/2024
179	CC	1024604236	EDSON JOHAN ROMERO LOPEZ	OFICIAL DE OBRA	22/10/2023	23/01/2024
180	CC	1022998350	JORGE LUIS BARBOSA CERPA	AYUDANTE DE OBRA	22/10/2023	4/11/2023
181	CC	1002947324	JHOHAN SEBASTIAN HURTADO IDARRAGA	AYUDANTE DE OBRA	24/10/2023	1/01/2024
182	CC	7170941	VICTOR MANUEL SAMUDIO ABRIL	OFICIAL DE OBRA	24/10/2023	29/12/2023
183	CC	1071914432	MISAEL FORERO MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	25/10/2023	1/01/2024
184	CC	1129533475	CAMILO RAFAEL PAEZ TORRES	AYUDANTE DE OBRA	25/10/2023	18/11/2023
185	CC	1000835291	JUAN DE JESUS CASTILLO MORENO	AYUDANTE DE OBRA	25/10/2023	22/12/2023
186	CC	79725387	LUIS ALBERTO CASTAÑEDA YELA	OFICIAL DE OBRA	25/10/2023	1/02/2024
187	CC	1085167981	ENEIDER JOSE CASTRO TRESPALACIOS	OFICIAL DE OBRA	26/10/2023	1/02/2024
188	CC	1072492363	JUAN SEBASTIAN FLOREZ ESTEPA	AUX BODEGA	2/11/2023	1/02/2024
189	CC	4865164	CARLOS ANTONIO BAEZ PIRONA	AYUDANTE DE OBRA	2/11/2023	2/11/2023
190	CC	79237324	LUIS ALFONSO CHIBATA VELASCO	MAESTRO DE OBRA	2/11/2023	2/11/2023
191	CC	1023872407	PEDRO ENRIQUE SANCHEZ BARBOSA	AYUDANTE DE OBRA	2/11/2023	1/02/2024
192	CC	79822610	JOSE MANUEL DAZA FLOREZ	MAESTRO DE OBRA	2/11/2023	3/12/2023
193	CC	1000786341	BRANDON FELIPE ENRIQUEZ LINARES	AYUDANTE DE OBRA	2/11/2023	2/11/2023
194	CC	1000728631	MIGUEL ANGEL PERALTA MORALES	AYUDANTE DE OBRA	2/11/2023	1/01/2024
195	CC	1004323963	JOSE ENRIQUE PEREZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	4/11/2023	4/01/2024
196	PPT	5319679	JORGE LEONARDO RUIZ PIRELA	OFICIAL DE OBRA	4/11/2023	1/02/2024
197	CC	1007678651	YAN CARLOS GONZALES MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA	9/11/2023	1/02/2024
198	CC	79492007	ANGEL MORALES QUINTIN	OFICIAL DE OBRA	9/11/2023	1/01/2024
199	CC	1002067582	BREINER JESUS ESCAMILLA YANCE	AYUDANTE DE OBRA	9/11/2023	10/11/2023
200	CC	72120459	RODRIGO MANUEL ESCAMILLA PEREZ	MAESTRO DE OBRA	10/11/2023	1/01/2024
201	CC	1001993367	ANDRES FELIPE JULIO MATUTE	OFICIAL DE OBRA	10/11/2023	1/01/2024
202	CC	1143251965	ARLEY ALVARINO GUZMAN	AYUDANTE DE OBRA	15/11/2023	1/02/2024
203	PPT	5095349	JHON ENDER TORRES BURGOS	OFICIAL DE OBRA	21/11/2023	1/01/2024
204	CC	1044935915	JOSE ADALBERTO RAMIREZ CAUSIL	OFICIAL DE OBRA	21/11/2023	1/02/2024
205	PPT	5957513	ROBERTO ANTONIO ZARRAGA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	21/11/2023	1/01/2024
206	PPT	6037609	MARIO JOSE PEREZ BURGOS	OFICIAL DE OBRA	21/11/2023	22/12/2023
207	PPT	2971611	YEXER JOHAN LABARCA GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	22/11/2023	1/01/2024
208	PPT	1145175	ANTONIO FRANCO FINOL	MAESTRO DE OBRA	22/11/2023	1/02/2024
209	CC	94525193	JOSE LALO VIVAS CASIERRA	OFICIAL DE OBRA	22/11/2023	22/12/2023

210	CC	74020015	PEDRO JUAN MENDIVELSO PARADA	AYUDANTE DE OBRA	22/11/2023	1/01/2024
211	CC	1052574574	JOSE GREGORIO MERCADO JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	22/11/2023	16/12/2023
212	CC	3830097	ALCIDES HERNANDEZ REALES	OFICIAL DE OBRA	25/11/2023	16/12/2023
213	CC	80858697	LUIS ALBERTO HERNANDEZ BARRERO	AYUDANTE DE OBRA	25/11/2023	1/01/2024
214	CC	1143228879	ARMANDO ELIAS GUZMAN MERIÑO	OFICIAL DE OBRA	25/11/2023	16/12/2023
215	CC	1001979999	STEVEN ANTONIO BLANCO GAMARRA	AYUDANTE DE OBRA	28/11/2023	1/02/2024
216	CC	1007296851	CARLOS ANDRES BARBOSA VILLALOBOS	AYUDANTE DE OBRA	28/11/2023	1/01/2024
217	CC	1000693921	LAURA ANGELINA ROJAS PINZON	AYUDANTE DE OBRA	28/11/2023	1/01/2024
218	CC	1019034560	EMANUEL BENITEZ TELLO	OFICIAL DE OBRA	28/11/2023	1/02/2024
219	CC	16480376	TEODORO BENITEZ GRUESO	OFICIAL DE OBRA	30/11/2023	1/01/2024
220	CC	14250617	CARLOS ARTURO ORTIZ RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	30/11/2023	1/01/2024
221	CC	79765763	FREDDY LOPEZ LOPEZ	OFICIAL DE OBRA	30/11/2023	1/01/2024
222	PPT	7211289	REINER JOSE SEQUERA ZAVALA	AYUDANTE DE OBRA	1/12/2023	22/01/2024
223	CC	1047512742	OSWALDO ENRIQUE RINCON VIZCAINO	OFICIAL DE OBRA	1/12/2023	1/01/2024
224	CC	1077430765	ALEXANDER PADILLA RIVAS	OFICIAL DE OBRA	1/12/2023	1/01/2024
225	PPT	6924445	JEAN CARLOS PEREZ NAVAS	MAESTRO DE OBRA	1/12/2023	1/01/2024
226	CC	1124545449	WILFRIDO DE JESUS DELGADO CUBILLAN	OFICIAL DE OBRA	1/12/2023	16/12/2023
227	CC	1032510255	WILLIANS JOSE MERIÑO BAEZ	OFICIAL DE OBRA	1/12/2023	1/01/2024
228	CC	1085037505	ANDRES FELIPE ZAMBRANO TORRES	AYUDANTE DE OBRA	4/12/2023	1/01/2024
229	PPT	6765140	LUIS RAMON PEREZ NAVAS	MAESTRO DE OBRA	4/12/2023	1/01/2024
230	PPT	6408697	JOAN GERARDO LOBO UZCATEGUI	MAESTRO DE OBRA	4/12/2023	1/01/2024
231	CC	1048435502	JOHN FREDY GAMARRA MATOS	OFICIAL DE OBRA	4/12/2023	22/01/2024
232	CC	1030571581	YEISON HERNANDO VARGAS NARVAEZ	OFICIAL DE OBRA	6/12/2023	1/01/2024
233	CC	80763829	JHON EDUARDO CABALLERO URRIAGO	OFICIAL DE OBRA	6/12/2023	1/01/2024
234	CC	1019014318	JORGE LUIS BENITEZ TELLO	OFICIAL DE OBRA	6/12/2023	15/12/2023
235	CC	19691364	JAIDER ALBERTO ACUÑA VILLALOBO	OFICIAL DE OBRA	7/12/2023	22/01/2024
236	CC	80771079	BERTHO ADRIANO CABALLERO URRIAGO	OFICIAL DE OBRA	12/12/2023	1/02/2024
237	CC	6402268	CARLOS ALFONSO TORRES OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	12/12/2023	1/01/2024
238	CC	1124056901	JOSE REINEL BOCANEGRA	AYUDANTE DE OBRA	12/12/2023	1/01/2024
239	CC	4689645	ANGEL ASDRUBAL FUENMAYOR DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	12/12/2023	1/01/2024
240	CC	1004062901	JORGE ELIECER ARTUNDUAGA TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	12/12/2023	1/01/2024
241	PPT	6580239	ALIS JOSE RODRIGUEZ PIÑA	AYUDANTE DE OBRA	12/12/2023	1/02/2024
242	CC	80418244	HECTOR JULIO CONTRERAS PACAVITA	AYUDANTE DE OBRA	1/12/2024	1/01/2024
243	CC	79819042	WILMA FREDY PARDO OJEDA	OFICIAL DE OBRA	14/12/2023	1/01/2024
244	CC	1048323277	JEAN CARLOS CARRASCAL LENGUA	AYUDANTE DE OBRA	14/12/2023	1/01/2024
245	CC	1129497079	JHON CARLOS MARTINEZ CANTILLO	OFICIAL DE OBRA	15/12/2023	1/01/2024
246	CC	79824688	OSCAR FARID CARRILLO CANTOR	OFICIAL DE OBRA	18/12/2023	29/02/2024

247	CC	52288506	CARMEN ARDELIA AREVALO CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	18/12/2023	29/02/2024
248	PPT	3963722	DOUGLAS JOSE TORRES RAGAS	OFICIAL DE OBRA	18/12/2023	1/02/2024
249	CC	77165310	MARTIN ENRIQUE GUZMAN COLLANTE	OFICIAL DE OBRA	3/01/2024	1/01/2024
250	PPT	4865164	CARLOS ANTONIO BAEZ PIRONA	OFICIAL DE OBRA	6/01/2024	1/02/2024
251	CC	1053822013	BALDWIN STHIVEN OTALVARO AGUDELO	OFICIAL DE OBRA	17/01/2024	22/01/2024
252	CC	1051655323	HERNANDO ORTIZ LENGUA	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024	10/02/2024
253	CC	1077872834	WILLINGTON ORTIZ PRADO	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024	10/02/2024
254	CC	1023946418	LUIS ALBERTO AVILA JIMENEZ	OFICIAL DE OBRA	9/02/2024	21/02/2024
255	CC	80808491	HERNAN CASTAÑEDA SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024	10/02/2024
256	CC	1007179635	TATIANA YULIETH OLIVEROS LOSADA	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024	10/02/2024
257	CC	17496437	BLADIMIR DE JESUS POLOCHE CACAIS	OFICIAL DE OBRA	9/02/2024	10/02/2024
258	CC	52456065	LUZ MERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	9/02/2024	10/02/2024
259	CC	80912851	WILSON SANCHEZ GUZMAN	CONTRATISTA	9/02/2024	10/02/2024
260	CC	1007105023	YURI KATERINE SANCHEZ CEPEDA	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2024	11/02/2024
261	CC	1022930473	BRAYAN STIVEN JIMENEZ RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	10/02/2024	10/02/2024
262	CC	80434719	JERSIS SALOMON LEON PRIETO	OFICIAL DE OBRA	10/02/2024	10/02/2024
263	CC	1033803647	DANIELA JIMENEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2024	10/02/2024
264	CC	79134083	LUIS FERNANDO NOVOA JARAMILLO	OFICIAL DE OBRA	10/02/2024	11/02/2024
265	CC	1022986243	PEDRO ELIAS SERRANO VALBUENA	MAESTRO DE OBRA	10/02/2024	11/02/2024
266	CC	79806500	JOSE ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	OFICIAL DE OBRA	10/02/2024	11/02/2024
267	PPT	5150157	DARWIN GREGORIO ZAVALA YANEZ	OFICIAL DE OBRA	13/02/2024	14/02/2024
268	CC	1023952776	DUVAN ORLANDO CADENA CANCHON	OFICIAL DE OBRA	13/02/2024	14/02/2024
269	CC	3830097	ALCIDES HERNANDEZ REALES	OFICIAL DE OBRA	14/02/2024	15/02/2024
270	CC	1019014318	JORGE LUIS BENITEZ TELLO	OFICIAL DE OBRA	14/02/2024	14/02/2024
271	CC	6460990	LUIS ALIRIO MELLIZO	AYUDANTE DE OBRA	15/02/2024	16/02/2024
272	CC	19362142	ORLANDO VARGAS MURILLO	OFICIAL DE OBRA	15/02/2024	16/02/2024
273	CC	79817732	JOSE ALVENIO SANCHEZ NOVOA	CONDUCTOR	15/02/2024	16/02/2024
274	CC	80253850	LUIS ALFONSO SANCHEZ NOVOA	AYUDANTE DE OBRA	15/02/2024	15/02/2024
275	CC	1000988220	DAVID ESTEBAN RODRIGUEZ TORRES	AYUDANTE DE OBRA	15/02/2024	15/02/2024
276	PPT	5409253	MARCOS ALEJANDRO ORTUÑO ALMANZA	AYUDANTE DE OBRA	15/02/2024	15/02/2024
277	PPT	5601216	ROQUE ANTONIO COLINA CAMPOS	OFICIAL DE OBRA	15/02/2024	15/02/2024
278	PPT	6683921	VICTOR MANUEL BLANCO	MAESTRO DE OBRA	15/02/2024	15/02/2024
279	PPT	5925129	ANGEL DAVID MARTINEZ	MAESTRO DE OBRA	15/02/2024	15/02/2024
280	CC	1004494816	ALFARO ORTIZ ALFREDO JOSE	OFICIAL DE OBRA	15/02/2024	16/02/2024
281	CC	1091810824	REINALDO GUERRERO CUEVAS	OFICIAL DE OBRA	15/02/2024	16/02/2024
282	CC	88306345	JESUS FABIAN ROZO BAUTISTA	AYUDANTE DE OBRA	15/02/2024	16/02/2024
283	CC	13173882	MISAEL ROJAS CASTRO	AYUDANTE DE OBRA	15/02/2024	16/02/2024
284	CC	80051778	ESTEBAN SANCHEZ GUZMAN	AYUDANTE DE OBRA	15/02/2024	16/02/2024

285	CC	80745781	WILLIAM YESID RAMOS SERRANO	AYUDANTE DE OBRA	16/02/2024	17/02/2024
286	CC	79698832	RICARDO ORTEGA CASTELLANOS	OFICIAL DE OBRA	17/02/2024	22/02/2024
287	CC	5689436	VICTOR JULIO DUARTE CARDENAS	AYUDANTE DE OBRA	17/02/2024	22/02/2024
288	CC	1022973388	MARLON GUSTAVO VANEGAS RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2024	20/02/2024
289	CC	6769104	SEGUNDO RAFAEL NARANJO PINEDA	OFICIAL DE OBRA	20/02/2024	20/02/2024
290	CC	1001272698	HAROLD ESMITH CIFUENTES MELLIZO	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2024	21/02/2024
291	PPT	6774178	JOHANDRY JAVIER FERNANDEZ SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2024	20/02/2024
292	CC	1127355831	RAFAEL HUMBERTO DAZA CARDENAS	OFICIAL DE OBRA	20/02/2024	20/02/2024
293	CC	73269251	HERIBERTO CARMELO ANAYA BARRIOS	OFICIAL DE OBRA	20/02/2024	20/02/2024
294	CC	80252923	CARLOS ANDRES GONZALEZ FRANCO	OFICIAL DE OBRA	20/02/2024	21/02/2024
295	PPT	6592957	YOSMAR OMAR MERCADO MERCADO	OFICIAL DE OBRA	20/02/2024	20/02/2024
296	CC	1033802236	BRAHIAN SEBASTIAN HERNANDEZ GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2024	21/02/2024
297	CC	6876475	CARLOS EDUARDO CASTRO YARA	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2024	20/02/2024
298	CC	1022935787	ANGEL DAVID MORENO ROMERO	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2024	20/02/2024
299	CC	1024468047	JOHAN SANTIAGO SANCHEZ PARRA	CONDUCTOR	20/02/2024	20/02/2024
300	CC	1023880937	ALBERTH AUGUSTO SANCHEZ BARBOSA	AYUDANTE DE OBRA	20/02/2024	22/02/2024
301	CC	79560903	ALVARO ORTEGA CASTELLANOS	MAESTRO OBRA	21/02/2024	22/02/2024
302	CC	1022955218	JOHN JAIRO FORERO MORALES	OFICIAL DE OBRA	21/02/2024	22/02/2024
303	CC	1143402526	ANGEL ANDRES BLANCO ALMENARES	AYUDANTE DE OBRA	22/02/2024	25/02/2024
304	CC	1043606888	DAIRO RAFAEL CARDENAS NARVAEZ	MAESTRO DE OBRA	23/02/2024	24/02/2024
305	PPT	1011838	ASTERIO SEGUNDO URDANETA	OFICIAL DE OBRA	23/02/2024	24/02/2024
306	CC	17829552	PEDRO JOSE GONZALES IPUANA	OFICIAL DE OBRA	23/02/2024	24/02/2024
307	CC	79512186	HERNAN MORENO ROJAS	CONDUCTOR	27/02/2024	27/02/2024
308	CC	1024576148	JONNATAN ESNEIDER CUCHIA DAMIAN	AYUDANTE DE OBRA	27/02/2024	29/02/2024
309	CC	1079990211	ARGENIS FONSECA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	27/02/2024	27/02/2024
310	CC	1105690579	TEOFILO ALEXANDER MOLINA GOMEZ	OFICIAL DE OBRA	27/02/2024	27/02/2024
311	CC	80810518	YESID BELTRAN AROCA	OFICIAL DE OBRA	27/02/2024	27/02/2024
312	CC	6768943	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	OFICIAL DE OBRA	27/02/2024	27/02/2024
313	CC	92447738	ELADIO MANUEL DIAZ CASTILLO	OFICIAL DE OBRA	27/02/2024	27/02/2024
314	PPT	6353981	LUIS ARTURO EPIAYU MONTIEL	OFICIAL DE OBRA	27/02/2024	27/02/2024
315	PPT	6408697	JOAN GERARDO LOBO UZCATEGUI	MAESTRO OBRA	28/02/2024	28/02/2024
316	CC	1079990212	JUNIOR SANTIAGO MARTINEZ CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	28/02/2024	28/02/2024
317	CC	1063564593	ARIEL CAMILO LOPEZ CUENTA	AYUDANTE DE OBRA	27/02/2024	28/02/2024
318	PPT	1145175	ANTONIO FRANCO FINOL	MAESTRO DE OBRA	15/05/2024	19/07/2024
319	PPT	7440536	LEONARDO JOSE RUIZ FINOL	OFICIAL DE OBRA	15/05/2024	19/07/2024
320	PPT	5348928	ERNESTO JESUS RUIZ PIRELA	AYUDANTE DE OBRA	15/05/2024	19/07/2024
321	PPT	5319679	JORGE LEONARDO RUIZ PIRELA	OFICIAL DE OBRA	15/05/2024	19/07/2024

322	CC	6768943	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	MAESTRO DE OBRA	15/05/2024	9/07/2024
323	PPT	5623699	JULIO CESAR EPIEYU MONTIEL	OFICIAL DE OBRA	15/05/2024	15/07/2024
324	PPT	6353981	LUIS ARTURO EPIEYU MONTIEL	OFICIAL DE OBRA	15/05/2024	15/07/2024
325	CC	1140371927	RICHELL JOSE FERNANDEZ GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA	15/05/2024	15/07/2024
326	CC	80248262	EDGAR GONZALEZ GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	16/05/2024	15/07/2024
327	CC	1007678651	YAN CARLOS GONZALES MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA	16/05/2024	15/07/2024
328	PPT	3780288	JOSE GREGORIO ZAVALA ZAVALA	OFICIAL DE OBRA	16/05/2024	15/07/2024
329	PPT	5601216	ROQUE ANTONIO COLINA CAMPOS	OFICIAL DE OBRA	16/05/2024	15/07/2024
330	CC	85469924	EMITZO JOSE FANDIÑO FLOREZ	OFICIAL DE OBRA	16/05/2024	15/07/2024
331	CC	1193578475	FERNANDO ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	16/05/2024	15/07/2024
332	PPT	4865164	CARLOS ANTONIO BAEZ PIRONA	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024	15/07/2024
333	PPT	6039163	JOSE ALEJANDRO ACOSTA ZAVALA	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024	30/07/2024
334	PPT	6536026	PEDRO ALBERTO CALDERA CHIRINOS	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024	30/07/2024
335	CC	18919068	RUBEN DARIO CHAVERRA PEDROZO	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024	15/07/2024
336	PPT	793600	MAXIMILIANO ZAVALA OLLARVES	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024	19/07/2024
337	CC	77176052	FREDIS MATUTE RICARDO	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024	19/07/2024
338	CC	1042466959	JESUS RAFAEL INFANTE PAYARES	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024	15/07/2024
339	CC	1019014318	JORGE LUIS BENITEZ TELLO	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024	15/07/2024
340	CC	16480376	TEODORO BENITEZ GRUESO	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024	15/07/2024
341	CC	1019034560	EMANUEL BENITEZ TELLO	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024	15/07/2024
342	PPT	6683921	VICTOR MANUEL BLANCO	MAESTRO DE OBRA	23/05/2024	15/07/2024
343	PPT	5925129	ANGEL DAVID MARTINEZ	MAESTRO DE OBRA	23/05/2024	19/07/2024
344	CC	1082837504	FRANCISCO JAVIER ARCE PUERTA	OFICIAL DE OBRA	23/05/2024	24/05/2024
345	CC	79134083	LUIS FERNANDO NOVOA JARAMILLO	OFICIAL DE OBRA	29/05/2024	15/07/2024
346	PPT	6592957	YOSMAR OMAR MERCADO MERCADO	OFICIAL DE OBRA	29/05/2024	15/07/2024
347	PPT	5957513	ROBERTO ANTONIO ZARRAGA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	29/05/2024	15/07/2024
348	CC	80808491	HERNAN CASTAÑEDA SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	29/05/2024	15/07/2024
349	CC	80912851	WILSON SANCHEZ GUZMAN	OFICIAL DE OBRA	29/05/2024	15/07/2024
350	CC	79806500	JOSE ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	OFICIAL DE OBRA	29/05/2024	15/07/2024
351	PPT	1011838	ASTERIO SEGUNDO URDANETA	OFICIAL DE OBRA	29/05/2024	15/07/2024
352	CC	1063564593	ARIEL CAMILO LOPEZ CUENTA	AYUDANTE DE OBRA	29/05/2024	9/07/2024
353	CC	1124536305	BRAYAN JOSE PALMAR EPIEYU	AYUDANTE DE OBRA	29/05/2024	15/07/2024
354	CC	1041259902	NEFTALY FIDEL GOMEZ RAMOS	OFICIAL DE OBRA	30/05/2024	9/07/2024
355	CC	1077856356	EDWIN ALVEIRO MOLINA GOMEZ	OFICIAL DE OBRA	30/05/2024	5/07/2024
356	CC	1079990211	ARGENIS FONSECA MARTINEZ	OFICIAL DE OBRA	30/05/2024	5/07/2024
357	CC	79477829	LUIS FELIPE ROMERO LOPEZ	OFICIAL DE OBRA	30/05/2024	15/07/2024
358	CC	1024604236	EDSON JOHAN ROMERO LOPEZ	OFICIAL DE OBRA	30/05/2024	15/07/2024
359	PPT	2971611	YEXER JOHAN LABARCA GONZALES	AYUDANTE DE OBRA	30/05/2024	15/07/2024

360	CC	52456065	LUZ MERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	30/05/2024	15/07/2024
361	CC	1026308030	BRAYAN ESTEBAN GALEANO LEON	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2024	7/06/2024
362	PPT	6774178	JOHANDRY JAVIER FERNANDEZ SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2024	15/07/2024
363	CC	1028660167	BRAYAN DAVID MORENO LONDOÑO	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2024	19/07/2024
364	CC	80100072	JUAN CARLOS RODRIGUEZ SOTO	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2024	19/07/2024
365	CC	5750912	HELI FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2024	19/07/2024
366	CC	1072492363	JUAN SEBASTIAN FLOREZ ESTEPA	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2024	19/07/2024
367	CC	1077435089	LUIS SEBASTIAN ARIAS MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2024	19/07/2024
368	CC	1007105023	YURI KATERINE SANCHEZ CEPEDA	AYUDANTE DE OBRA	6/06/2024	15/07/2024
369	CC	1022930473	BRAYAN STIVEN JIMENEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	6/06/2024	15/07/2024
370	PPT	2243346	JONNATHAN MORILLO CAMPOS	OFICIAL DE OBRA	7/06/2024	15/07/2024
371	CC	79556023	GUSTAVO ADOLFO ELEJALDE GONZALEZ	OFICIAL DE OBRA	7/06/2024	8/06/2024
372	PPT	2100970	ENDER EDUARDO ROJAS	OFICIAL DE OBRA	7/06/2024	17/06/2024
373	PPT	5092618	JOSE PEROZO PERAZA	OFICIAL DE OBRA	7/06/2024	9/07/2024
374	PPT	6091276	PEDRO RAFAEL SOTILLO LOPEZ	OFICIAL DE OBRA	9/06/2024	9/06/2024
375	CC	80771079	BERTHO ADRIANO CABALLERO URRIAGO	OFICIAL DE OBRA	13/06/2024	19/07/2024
376	CC	1079990212	JUNIOR SANTIAGO MARTINEZ CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	14/06/2024	15/06/2024
377	PPT	6967422	PATRICIO ANTONIO JIMENEZ COLMENARES	MAESTRO DE OBRA	19/06/2024	15/07/2024
378	PPT	5039669	JULIO JESUS PACHECO LUGO	OBRERO	19/06/2024	15/07/2024
379	PPT	1665944	MONTILVA RAMIREZ JAVIER JESUS	MAESTRO DE OBRA	19/06/2024	15/07/2024
380	PPT	5956435	JOESER GREGORIO MANAURE PARADA	OFICIAL DE OBRA	19/06/2024	15/07/2024
381	PPT	5503451	FRANNYS JOSE NAVAS GARCIA	OFICIAL DE OBRA	19/06/2024	15/07/2024
382	PPT	953752	JOSE ANTONIO ORTUNO ZAPATA	OFICIAL DE OBRA	19/06/2024	15/07/2024
383	CC	1000932800	BRAYAN STIVEN SANCHEZ MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	21/06/2024	15/07/2024
384	CC	1001077238	DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	21/06/2024	15/07/2024

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe las planillas pagadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, que corresponde al anexo número cinco (5) denominado Planillas seguridad social.

.

10 INFORME CONSOLIDADO COMPONENTE SOCIAL

La gestión social se enfocó en la línea de intervención que desarrolló el Consorcio Buenas Viviendas – EGR con el fin de implementar las actividades con los hogares beneficiarios en el marco de la ejecución del contrato de obra 917 de 2023 de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad.

El trabajo articulado entre las comunidades y las entidades distritales es una estrategia que permitió lograr resultados de gran impacto en la vida cotidiana de los habitantes de los territorios objeto de intervención distrital.

La gestión social se constituyó como el eje fundamental y transversal para lograr el acercamiento, dialogo y trabajo constante con los habitantes de las viviendas priorizadas.

A partir de la planeación e implementación de las acciones del componente social el contratista definió en su Plan de Gestión Social las estrategias, metodología u pautas para dar cumplimiento a los objetivos propuestos de cada una de las fases que hicieron parte de la ejecución del contrato.

Se precisa que son tres las fases: Fase de validación; Fase de ejecución de obras y fase de cierre del proyecto.

Es de resaltar que el componente social estuvo correlacionado con el cronograma de programación de validación y ejecución general del componente técnico, así mismo la gestión administrativa y logística que permitió el óptimo desarrollo del contrato.

A continuación, se describe cada una de las acciones que desde el componente social se realizaron en el marco del contrato de obra 917 de 2023.

10.1 INFORME DE ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL

El análisis de impacto social del Programa de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de Habitabilidad se realizó de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico para la prestación del servicio y/o entrega del bien. En este se hizo un análisis de las caracterizaciones sociales que se realizaron en cada uno de los hogares beneficiarios, se describió los resultados del plan de gestión social de contratista de obra; el análisis de la matriz de atención PQRS, Posventas y atención a la comunidad en el Punto de atención al ciudadano – PAC y el análisis y resultado de la validación o actualización de la caracterización social de las familias variación de los integrantes de la etapa de estructuración y de la validación.

Así mismo de las lecciones aprendidas que se forjaron durante la ejecución del contrato de obra 917 de 2023.

10.1.1 ANALISIS CARACTERIZACIÓN SOCIAL HOGAR CUANTITATIVA FAMILIA CUALITATIVA

La caracterización social permitió actualizar las condiciones sociodemográficas y diferenciales de cada uno de los hogares beneficiarios del Programa de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad Habitacional. Esta caracterización social se llevó a cabo en la fase de validación para ello el equipo social de contratista de obra convocó a cada uno de los hogares beneficiarios para concertar la visita y realizar la visita de validación.

La información del formato de caracterización social se sistematizó en la Matriz de Caracterización social, esta información se correlaciona en la pestaña Hogar- cuantitativa (hogar) y Familia – Cualitativa (integrantes).

A continuación, se realizó un análisis de los once (11) grupos generales de variables de la caracterización social.

1. Variable DATOS BASICOS DEL HOGAR ASPIRANTE

Este primer grupo general de variable está conformada por las siguientes variables: estado civil del beneficiario, años de habitar predio, relación con la tenencia del predio, tipología de familia y Numero de personas del hogar que habitan vivienda.

1.1 Variable ESTADO CIVIL DEL BENEFICIARIO

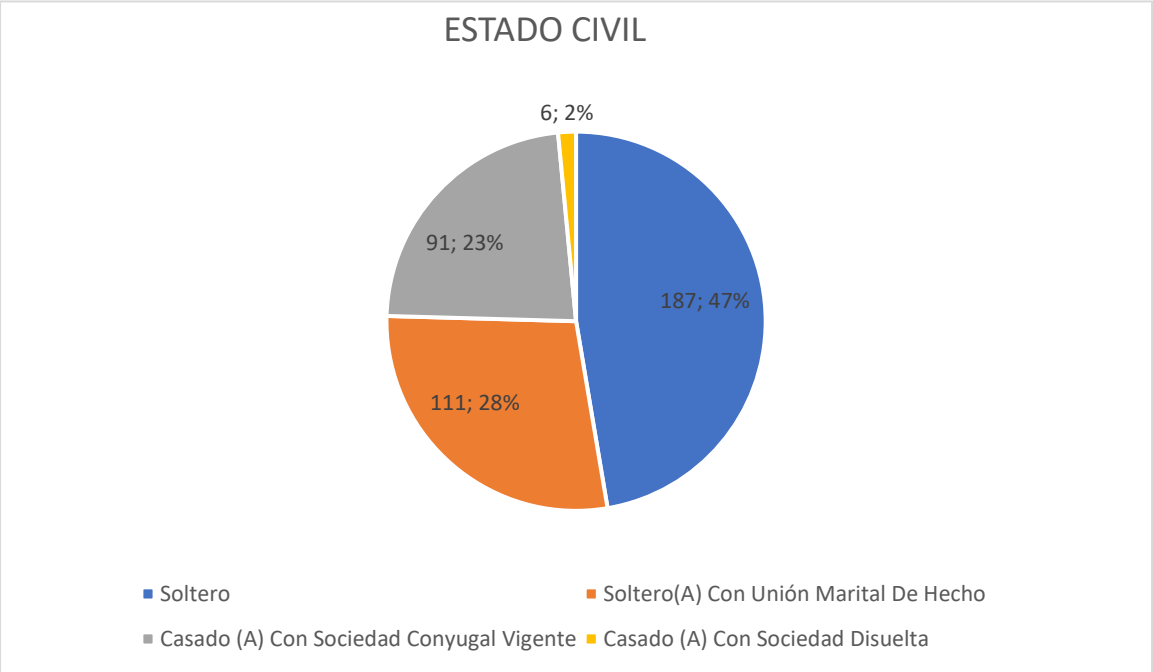


Ilustración 10 Estado Civil

El equipo social de contratista de obra con el acompañamiento del equipo social de interventoría realizó un total de 395 caracterizaciones sociales, donde se obtuvo que el 47% correspondiente a 187 beneficiarios su estado civil es soltero; el 28% correspondiente a 111 beneficiarios su estado civil es soltero (a) con unión marital de hecho; el 23% correspondiente a 91 beneficiarios su estado civil es casado (a) con sociedad conyugal vigente y el 2% correspondiente a 6 beneficiarios su estado civil es casado con sociedad disuelta.

1.2 Variable AÑOS DE HABITAR EN EL PREDIO

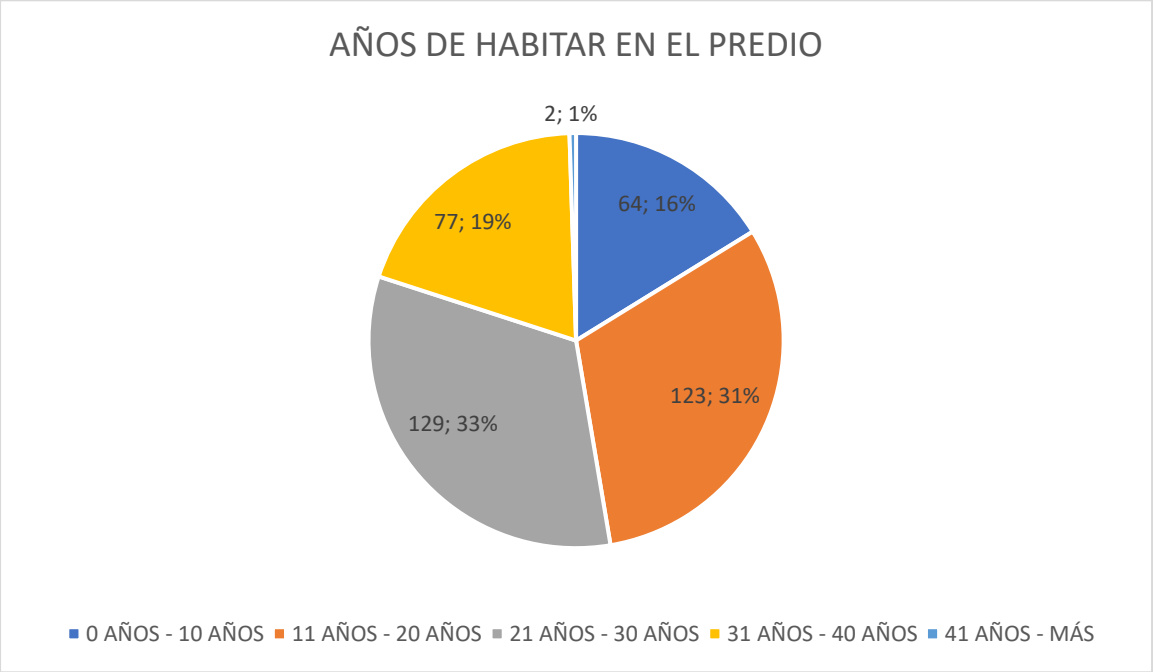


Ilustración 11 Años de Habitar en el predio

En la variable de años de habitar en el predio, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, donde se obtuvo que 16% correspondiente a 64 beneficiarios tenía de 0 a 10 años de habitar en el predio; el 31% correspondiente a 123 beneficiarios tenía 11 a 20 años de habitar en el predio; el 33% correspondiente a 129 beneficiarios tenía entre 21 a 30 años de habitar en el predio; el 19% correspondiente a 77 beneficiarios tenía entre 31 a 40 años de habitar en el predio y el 1% correspondiente a 2 beneficiarios tenía más de 41 años de habitar en el predio.

1.3 Variable RELACIÓN CON LA TENENCIA DEL PREDIO

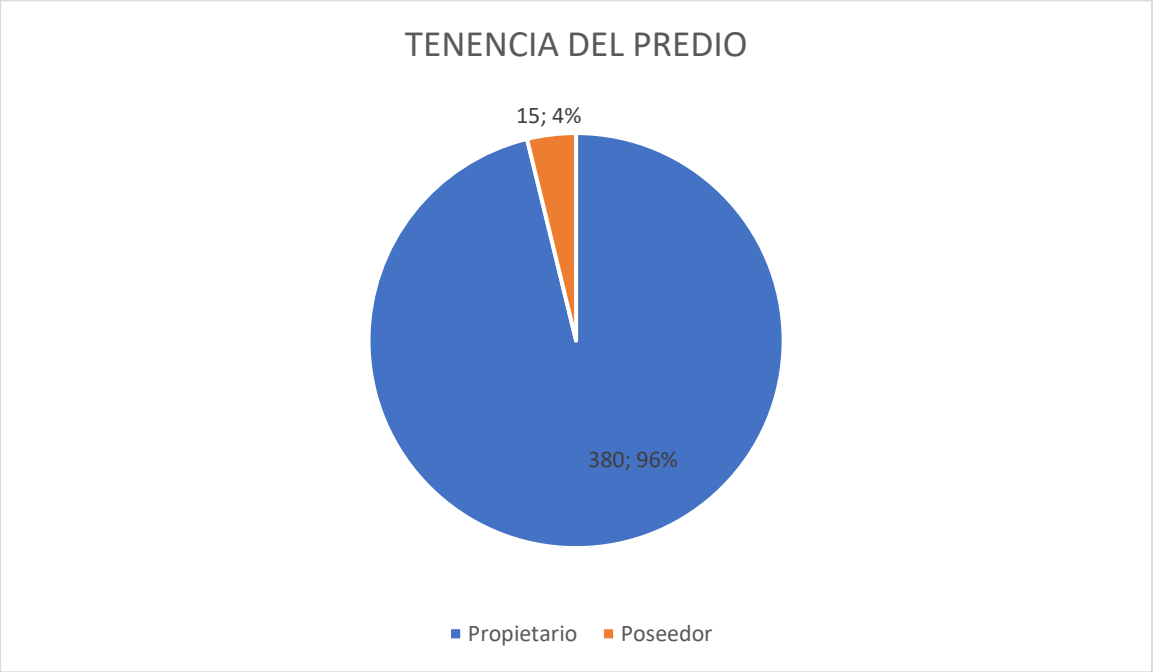


Ilustración 12 Tenencia del Predio

En la variable de la tenencia del predio, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, donde se obtuvo que el 96% correspondiente a 380 beneficiarios son propietarios de la vivienda y el 4% correspondiente a 15 beneficios son poseedores de sus viviendas.

1.4 Variable TIPOLOGÍA DE FAMILIA

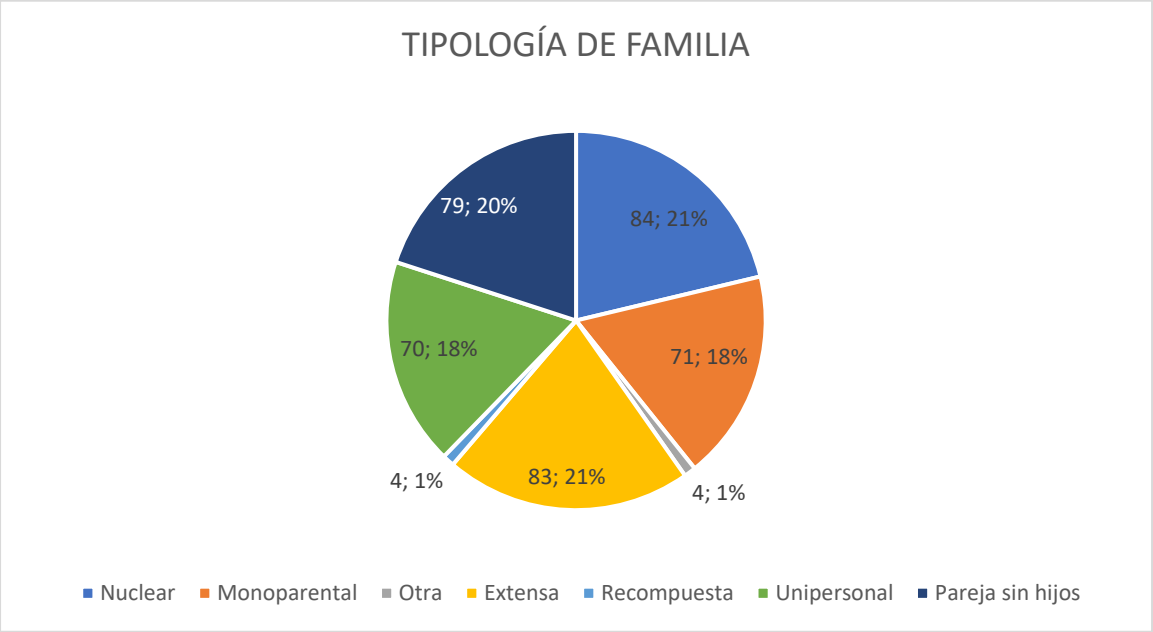


Ilustración 13 Tipología de Familia

En la variable de tipología de familia, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, donde se obtuvo que el 21% correspondiente a 84 familias beneficiaria son familias nucleares; el 21% correspondiente a 83 familias beneficiarias son familias extensas; el 20% correspondiente a 79 familias son familia de tipología pareja sin hijos; el 18% correspondiente a 71 familias beneficiarias son familias monoparentales; el 18% correspondiente a 70 familias beneficiarias son familia de tipología unipersonal; el 1% correspondiente a 4 familias beneficiarias son familias con tipología recompuesta y el otro 1% correspondiente a 4 familias beneficiarias son familias con tipología otra en estos casos son familias conformadas por hermanos.

1.5 Variable NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA

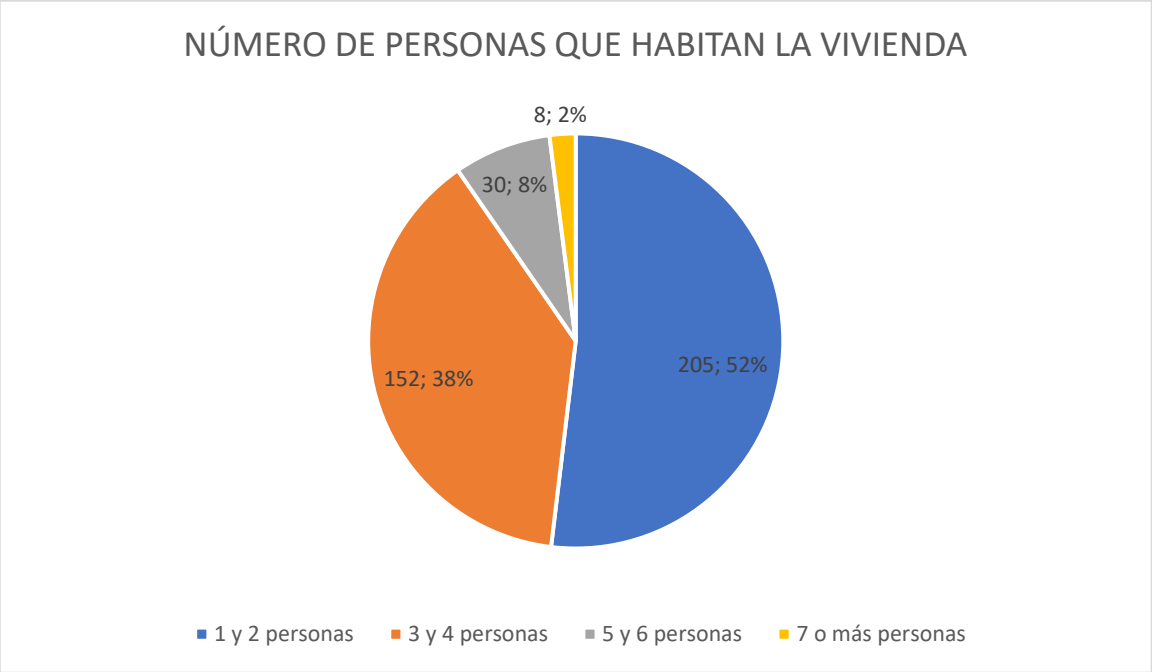


Ilustración 14 Número de personas por vivienda

En la variable de número de personas que habitan la vivienda, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, donde se obtuvo que el 52% correspondiente a 205 hogares viven entre 1 y 2 personas; el 38% correspondiente a 152 hogares viven entre 3 y 4 personas; el 8% correspondiente a 30 hogares viven entre 5 y 6 personas y el 2% correspondiente a 8 hogares viven en la vivienda más de 7 personas.

2. Variable IDENTIDADES DE GÉNERO – SEXO

2.1 Variable NÚMERO DE PERSONAS POR SEXO

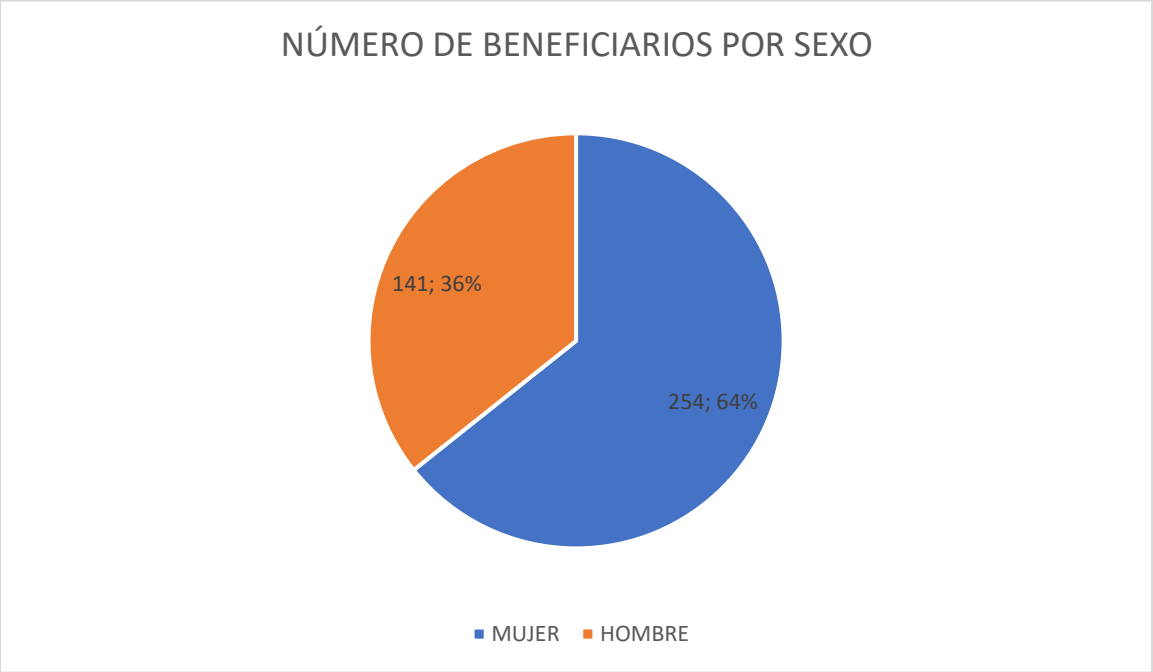


Ilustración 15 Número beneficiario por sexo

En la variable de número de personas por sexo, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientos noventa y cinco (395) beneficiarios, se obtuvo que el 64% correspondiente a 254 personas son mujeres y el 36% correspondiente a 141 personas son hombres.

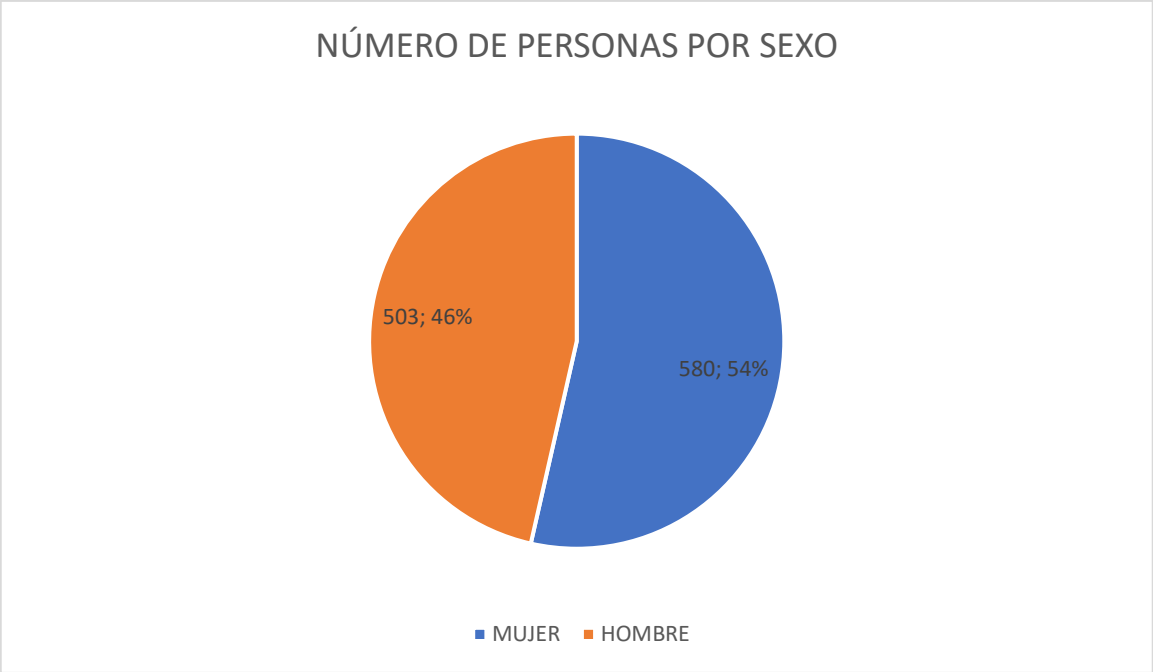


Ilustración 16 Número de persona por sexo

En la variable de número de personas por sexo, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que el total de personas que conforman los hogares beneficiarios es de 1083 persona, de estas el 54% correspondiente a 580 personas son mujeres y el 46% correspondiente a 503 personas son hombres.

2.2 Variable NUMERO DE PERSONAS POR GÉNERO

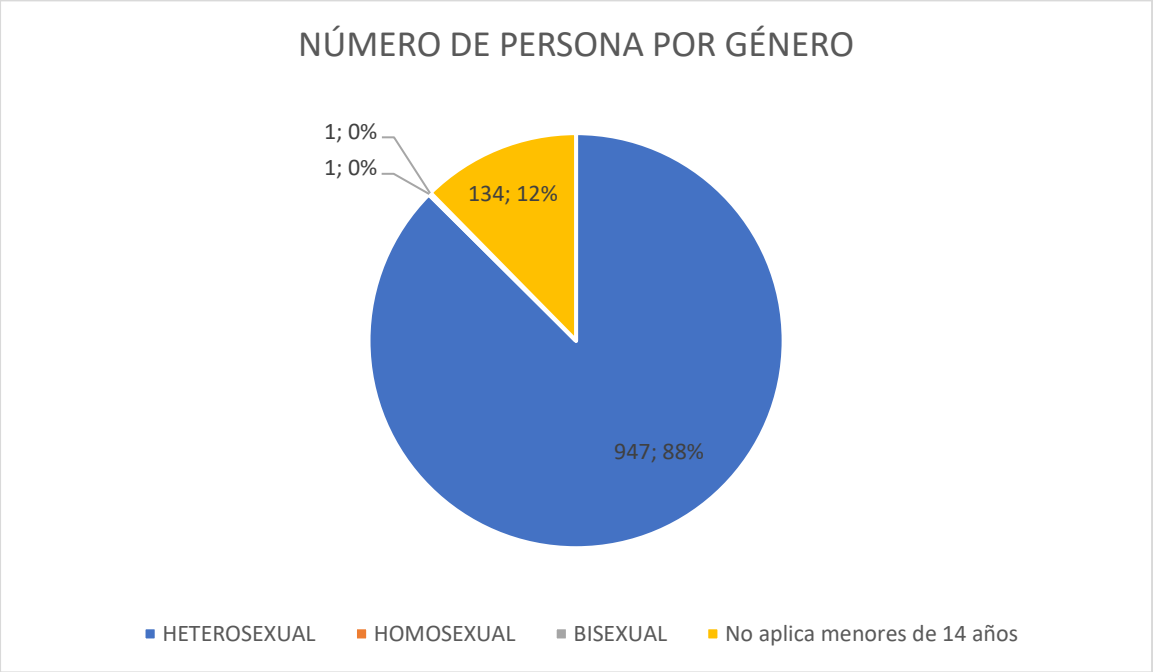


Ilustración 17 Número de persona por género

En la variable de número de personas por sexo, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que el total de personas que conforman los hogares beneficiarios es de 1083 persona, de ellas el 88% correspondiente a 947 personas su orientación sexual es heterosexual, el 12% correspondiente a 134 personas no aplica la variable de orientación sexual porque son menores de 14 años de edad, el 0% correspondiente a 1 persona su orientación sexual es homosexual y 0% correspondiente a una persona su orientación sexual es bisexual.

3. Variable CICLO VITAL Y GENERACIONAL

3.1 Variable NUMERO DE PERSONAS POR CATEGORIAS DE EDAD Y CICLO DE VIDA

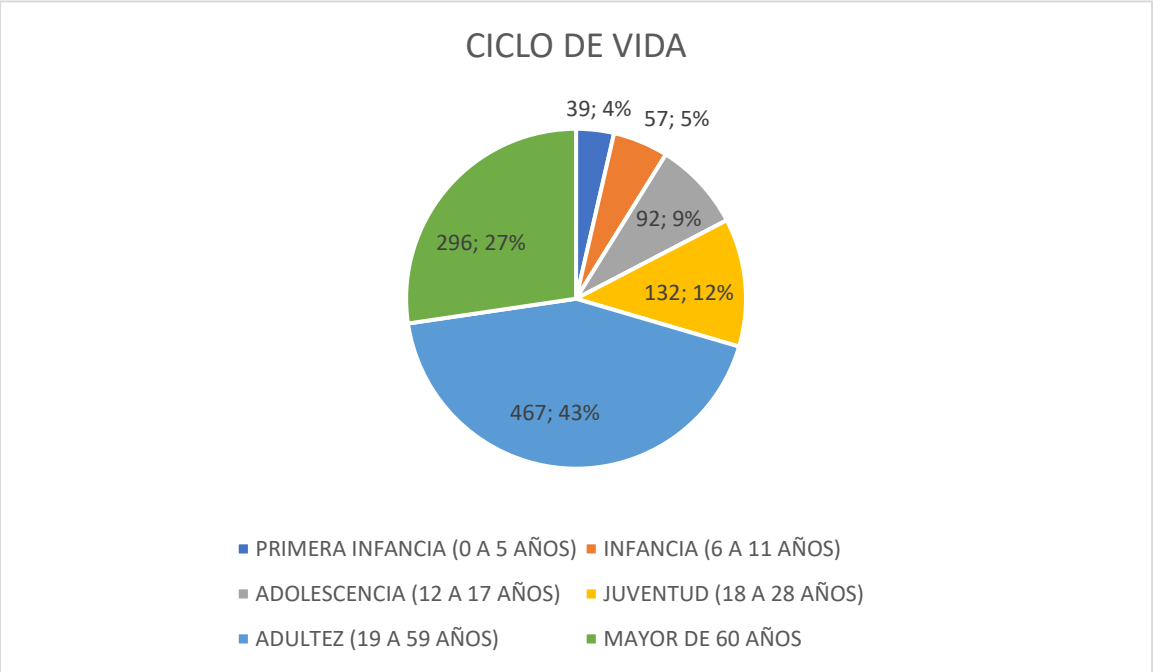


Ilustración 18 Ciclo de Vida

En la variable de ciclo de vida, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que el total de personas que conforman los hogares beneficiarios es de 1083 persona, de ellas el 43% correspondiente a 467 personas se encuentran en la adultez en edades entre los 19 y 59 años de edad; el 27% correspondiente a 296 personas se encuentran en la etapa de adulto mayor en edades mayores a 60 años de edad; el 12% correspondiente a 132 personas se encuentra en la etapa de la juventud en edades entre 18 y 28 años de edad; el 9% correspondiente a 92 personas se encuentran en la etapa de la adolescencia en edades comprendidas entre 12 a 17 años de edad; el 5% correspondiente a 57 personas se encuentran en la etapa de infancia en edades entre 6 a 11 años de edad y el 4% correspondiente a 39 personas se encuentran en la etapa de primera infancia en edades entre 0 a 5 años de edad.

4. Variable SISTEMA EDUCATIVO

4.1 Variable NÚMERO DE PERSONAS ESCOLARIDAD NÚCLEO FAMILIAR

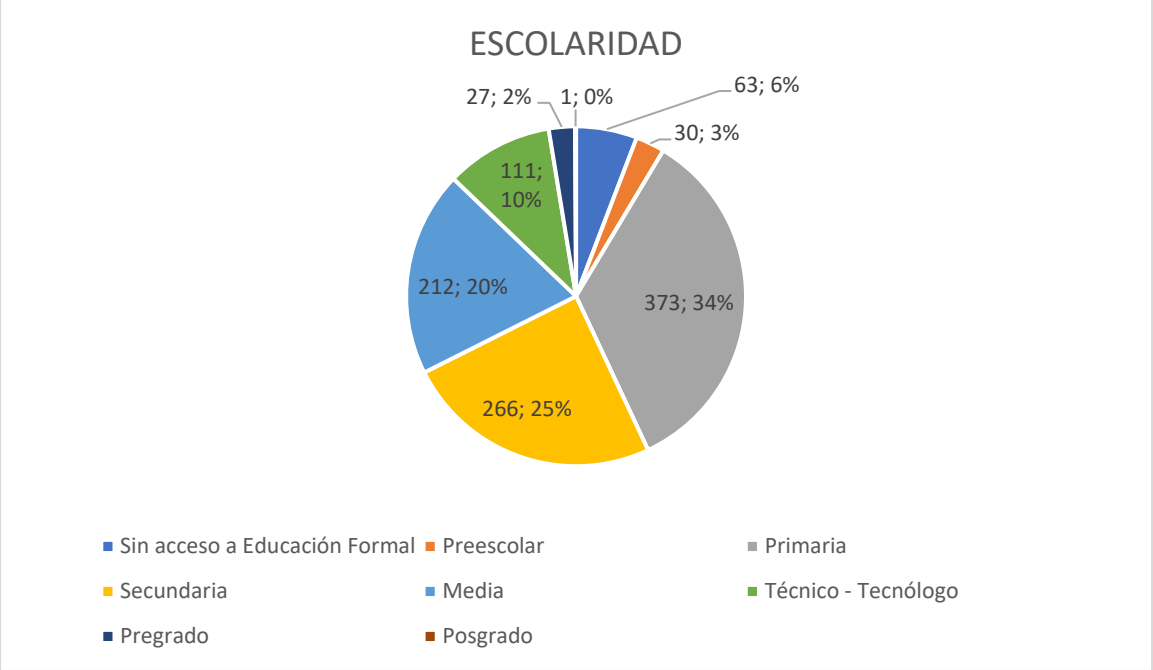


Ilustración 19 Escolaridad

En la variable de escolaridad del núcleo familiar, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que el total de personas que conforman los hogares beneficiarios es de 1083 persona, de ellas el 34% correspondiente a 373 personas cursaron o están cursando la primaria; el 25% correspondiente a 266 personas cursaron o están cursando la secundaria; el 20% correspondiente a 212 personas cursaron o están cursando la educación media; el 10% correspondiente a 111 personas cursaron o están cursando un técnico o tecnólogo; el 6% correspondiente a 63 personas están sin acceso a la educación formal de ellos 15 son niñas y niños que NO se encuentran vinculados a un sistema formal educativo en las edades de 0 a 5; el 3% correspondiente a 30 personas se encuentran cursando o cursaron preescolar; el 2% correspondiente a 27 personas se encuentran cursando el pregrado y el 0% correspondiente a una persona se encuentra en el nivel educativo de posgrado.

5. Variable SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

5.1 Variable NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN AFILIACIÓN A SALUD

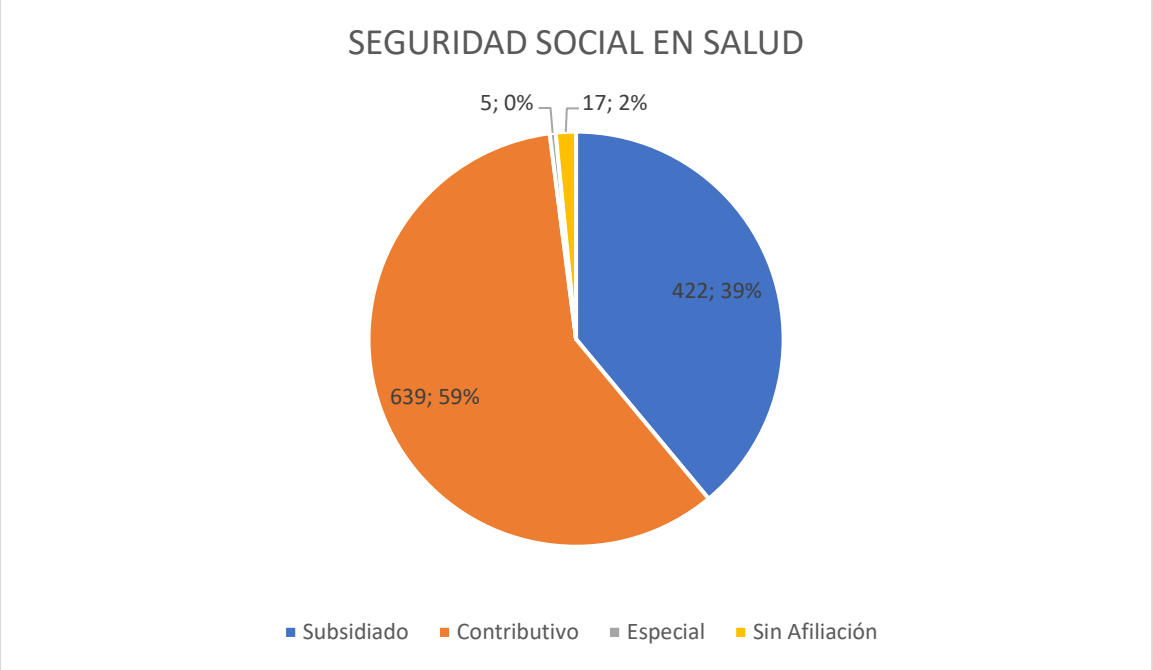


Ilustración 20 Afiliación a SSGS

En la variable de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que el total de personas que conforman los hogares beneficiarios es de 1083 persona, de ellas el 59% correspondiente a 638 personas se encontraban afiliadas al régimen contributivo; el 39% correspondiente a 422 personas se encontraban afiliadas al régimen subsidiado; el 2% correspondiente a 17 personas se encontraban sin afiliación al sistema general de seguridad social en salud y el 0% correspondiente a 5 personas se encuentran afiliadas al régimen especial.

6. Variable DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL

6.1 Variable NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN OCUPACIÓN

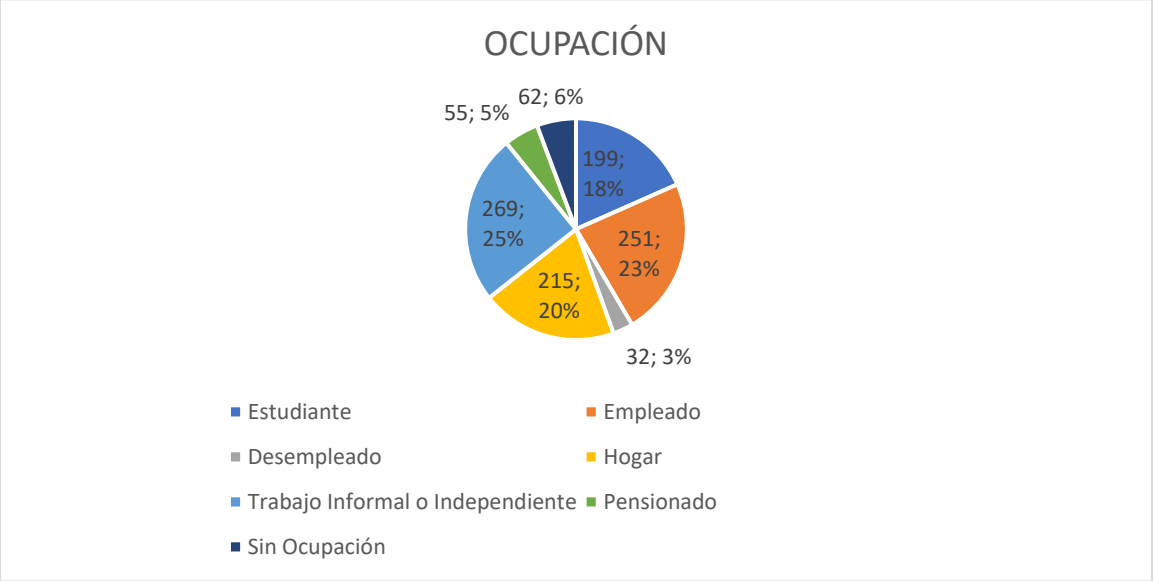


Ilustración 21 Ocupación

En la variable de número de persona según ocupación, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que el total de personas que conforman los hogares beneficiarios es de 1083 persona, de ellas el 25% correspondiente a 269 personas su ocupación era trabajo informal o independiente; el 23% correspondiente a 251 personas su ocupación era empleado; el 20% correspondiente a 215 personas se dedican a las actividades del hogar; el 18% correspondiente a 199 personas su ocupación era estudiante; el 6% correspondiente 62 personas se encontraban sin ocupación y el 5% correspondiente a 55 personas su ocupación era pensionado.

7. Variable SITUACIÓN Y/O CONDICIÓN

7.1 Variable MUJERES CABEZA DE FAMILIA

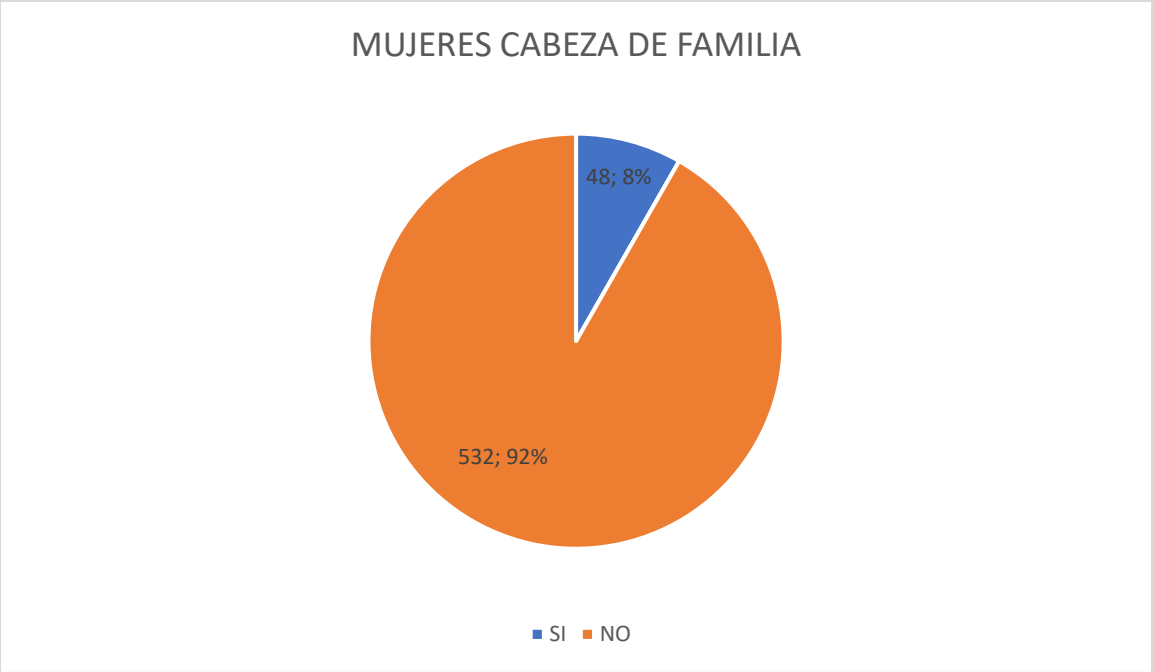


Ilustración 22 Mujeres Cabeza de Hogar

En la variable de mujeres cabeza de familia, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que el total de mujeres que conforman los hogares beneficiarios era de 532 de ellas el 8% correspondiente a 48 mujeres era mujeres cabeza de familia. Como lo estipula la ley 1232 de 2008 ley mujer cabeza de familia se refiere a una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.

En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces

o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.

En relación al parentesco con la persona beneficiaria de las 48 mujeres cabeza de familia, 24 eran beneficiarias, 21 eran hijas de las o los beneficiarios, 2 eran nietas de los o las beneficiarios y 1 era hermana de la beneficiaria.

7.2 Variable VICTIMAS DEL CONFLICTO POR NÚCLEO FAMILIAR



Ilustración 23 Víctimas del conflicto

En la variable de víctimas del conflicto por núcleo familiar, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de los 395 el 5% correspondiente a 21 núcleos familiares eran víctimas del conflicto. En estos 21 núcleos familiares 19 se encontraban registrados en el Registro Único de Victimas – RUV, en total eran 41 personas víctimas del conflicto. En relación al parentesco con la persona beneficiaria de ellos 17 eran beneficiarios, 6 eran cónyuges, 17 eran hijos y 1 era hermana de la persona beneficiaria.

7.3 Variable DISCAPACIDAD

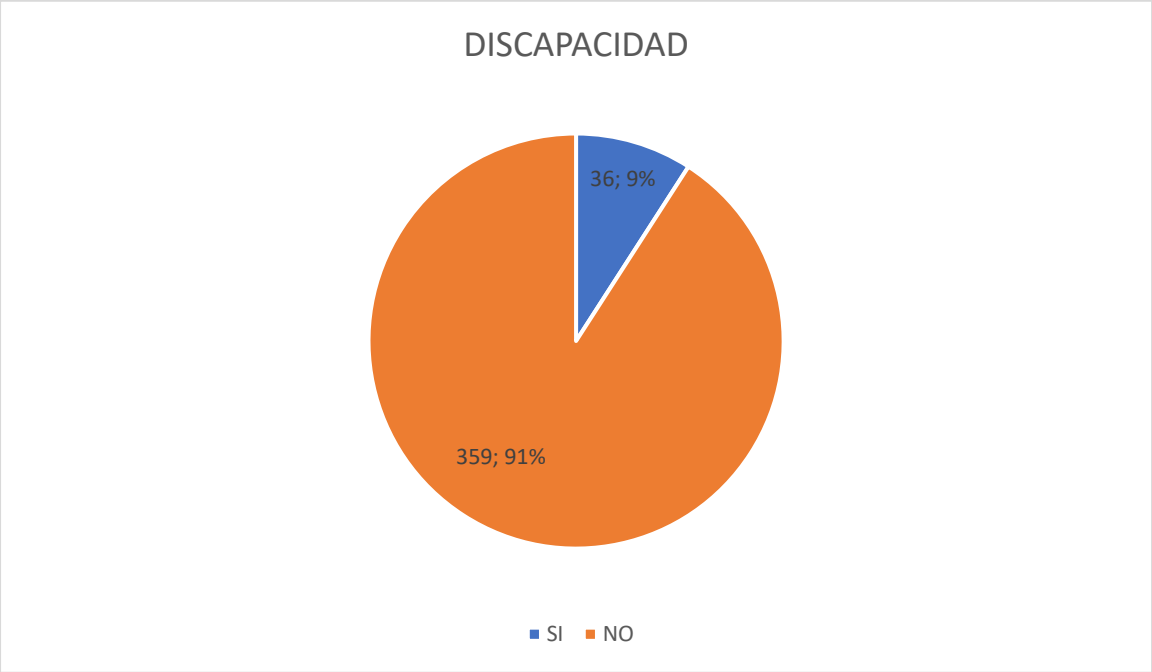


Ilustración 24 Discapacidad

En la variable discapacidad, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de los 395 el 9% correspondiente a 36 hogares tenían personas en situación de discapacidad. En estos 36 hogares había 37 personas en situación de discapacidad.

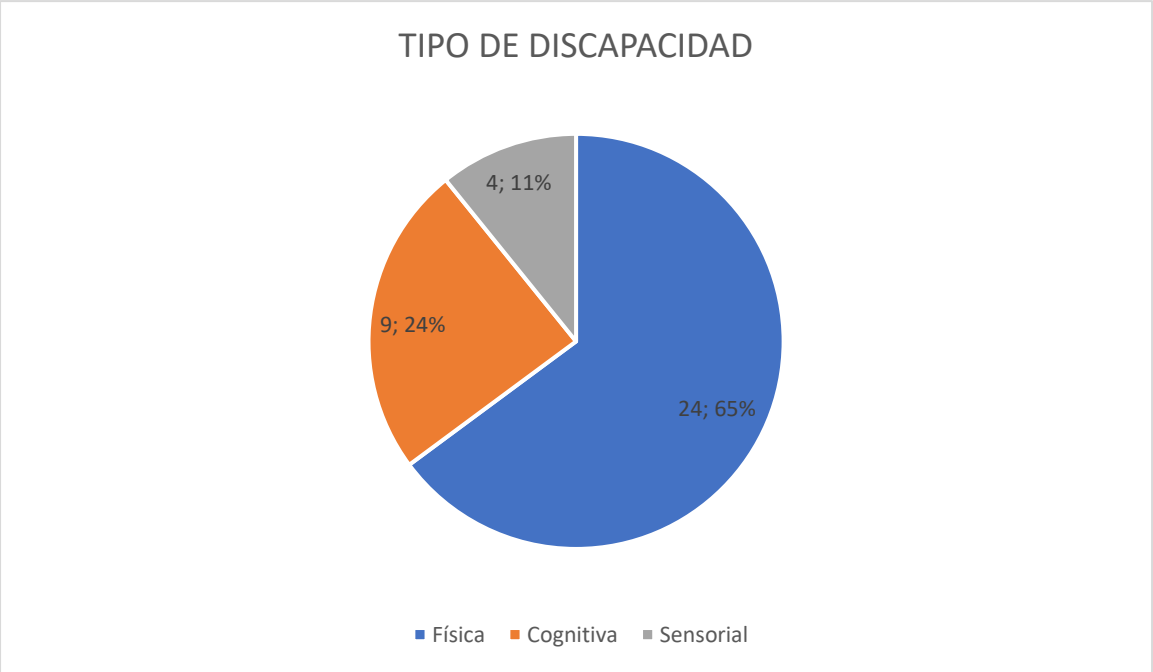


Ilustración 25 Tipos de discapacidad

De las 37 personas en situación de discapacidad se evidenció que el 65% correspondiente a 24 personas presentaban discapacidad física; el 24% correspondiente a 9 personas presentaba discapacidad cognitiva y el 11% correspondiente a 4 personas presentaban discapacidad sensorial. En relación al parentesco con la persona beneficiaria de ellos 13 eran beneficiarios; 6 eran cónyuges; 15 eran hijos; 1 era nieta; 1 era madre y 1 era suegra de la persona beneficiaria.

7.4 Variable GRUPO ÉTNICO

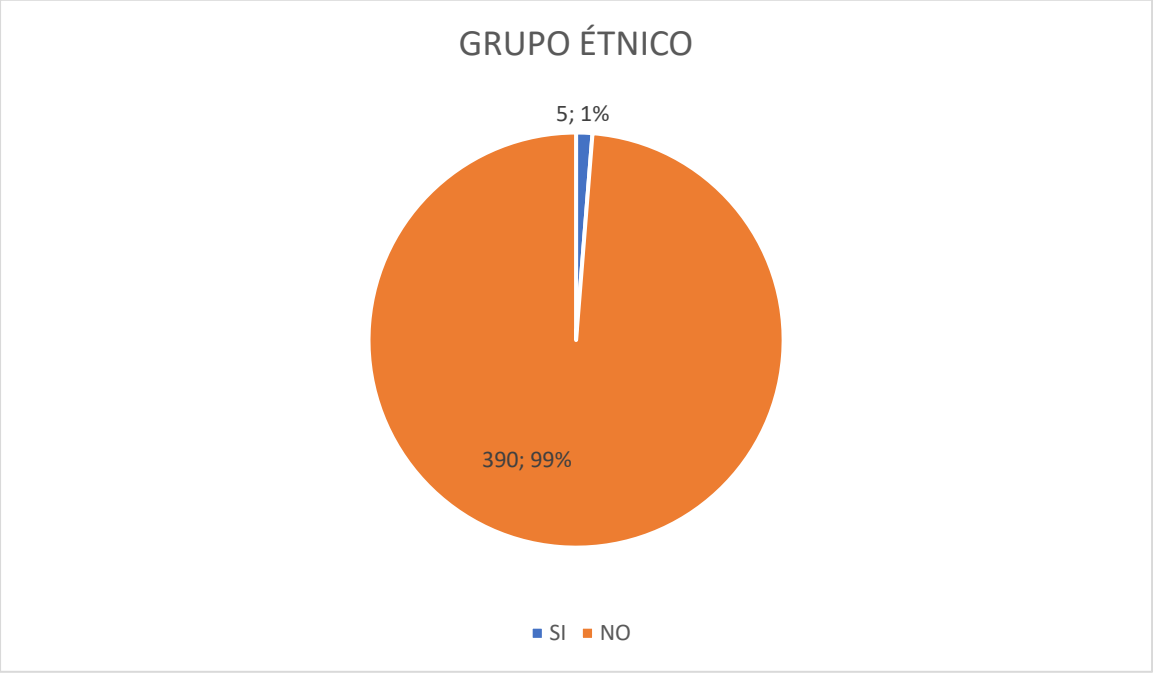


Ilustración 26 Grupo Étnico

En la variable del grupo étnico, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de los 395 hogares el 1% correspondiente a 5 hogares se auto reconocieron en un grupo étnico. En estos 5 hogares 11 personas que se auto reconocieron en un grupo étnico.

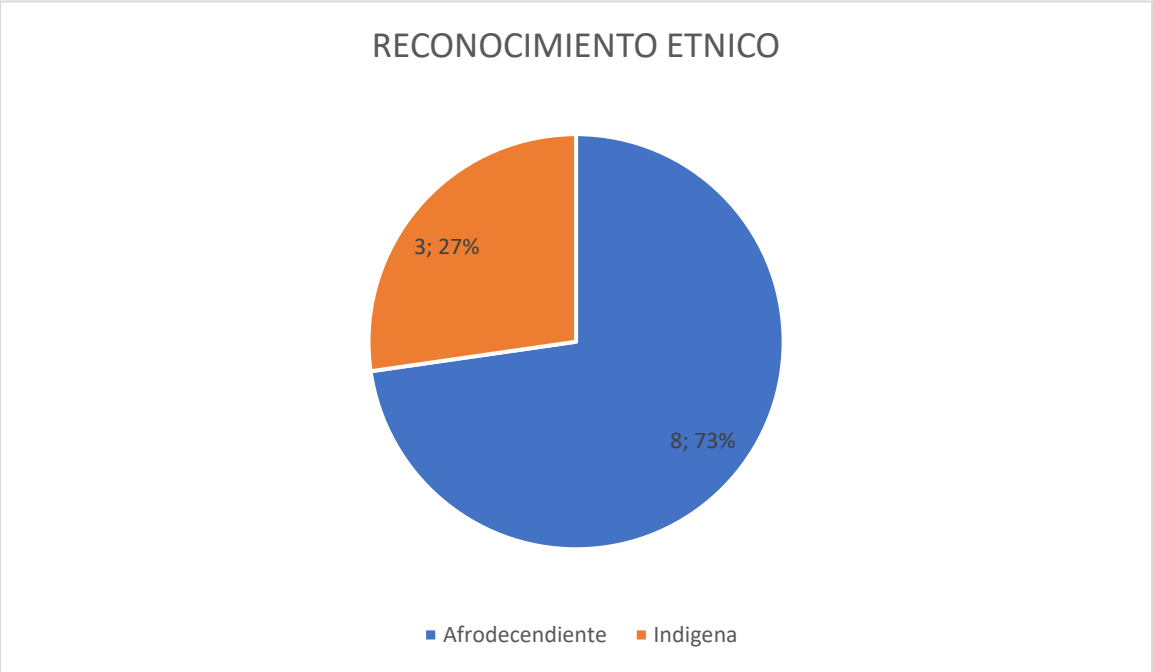


Ilustración 27 Reconocimiento Étnico

De las 11 personas que se auto reconocieron en un grupo étnico, se evidenció que el 73% correspondiente a 8 personas se auto reconocieron como afrodescendientes y el 27% correspondiente a 3 personas se auto reconocieron como indígenas.

8. Variable ECÓNOMIA DEL HOGAR

8.1 Variable RANGO DE INGRESO DEL HOGAR

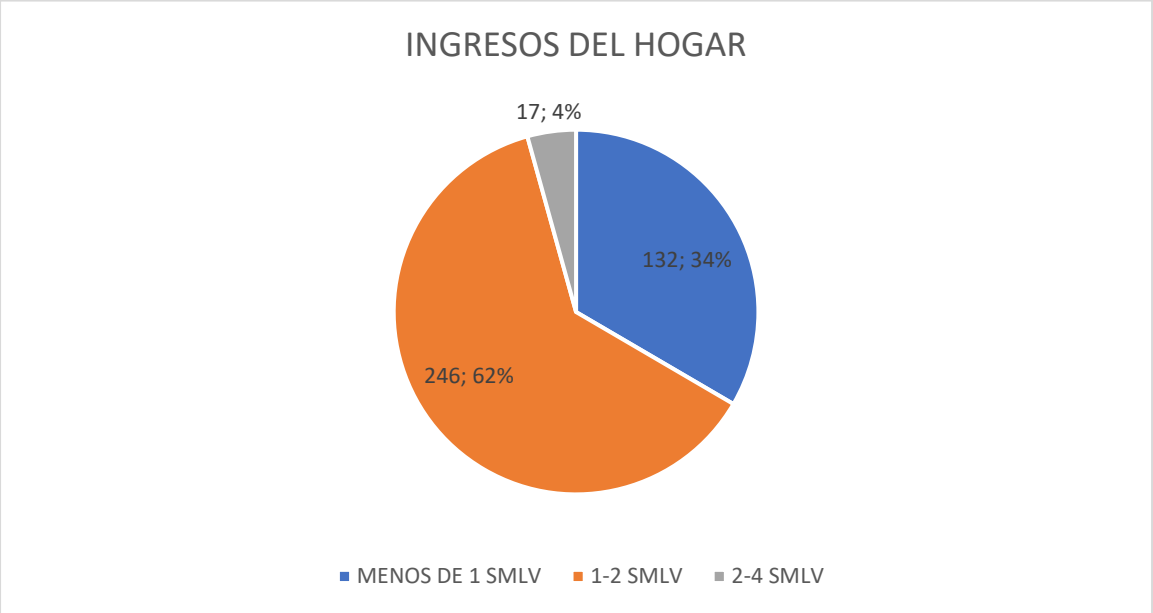


Ilustración 28 Ingresos

En la variable de rango de ingresos del hogar, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de los 395 hogares el 62% correspondiente a 246 hogares tenían ingresos económicos mensuales de entre 1 y 2 salarios mínimos mensual legales vigentes – SMLV; el 34% correspondiente a 132 hogares tenían ingresos económicos mensuales menor al SMLV y el 4% correspondiente a 17 hogares tenían ingresos económicos mensuales entre 2 y 4 SMLV.

8.2 Variable RANGO DE EGRESOS DEL HOGAR

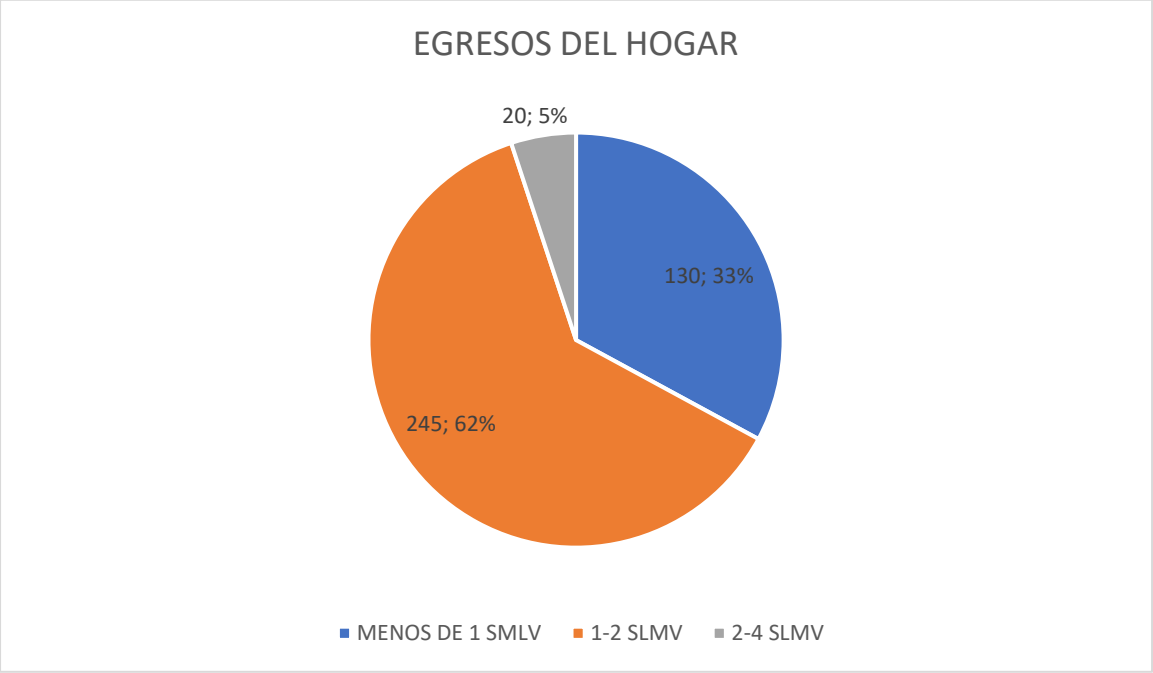


Ilustración 29 Egresos

En la variable de rango de egresos del hogar, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de los 395 hogares el 62% correspondiente a 245 hogares tenían egresos económicos mensuales de entre 1 y 2 salarios mínimos mensual legales vigentes – SMLV; el 33% correspondiente a 130 hogares tenían egresos económicos mensuales menor al SMLV y el 5% correspondiente a 20 hogares tenían egresos económicos mensuales entre 2 y 4 SMLV.

8.3 Variable RESPONSABILIDAD ECÓNOMICA



Ilustración 30 Responsabilidad Económica

En la variable de responsabilidad económica, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de los 395 hogares el 52% correspondiente a 204 hogares la responsabilidad económica era solo de una persona y el 48% correspondiente a 191 hogares la responsabilidad económica era compartida.

9. Variable SITUACIÓN Y/O CONDICIÓN DE LA VIVIENDA

9.1 Variable CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA

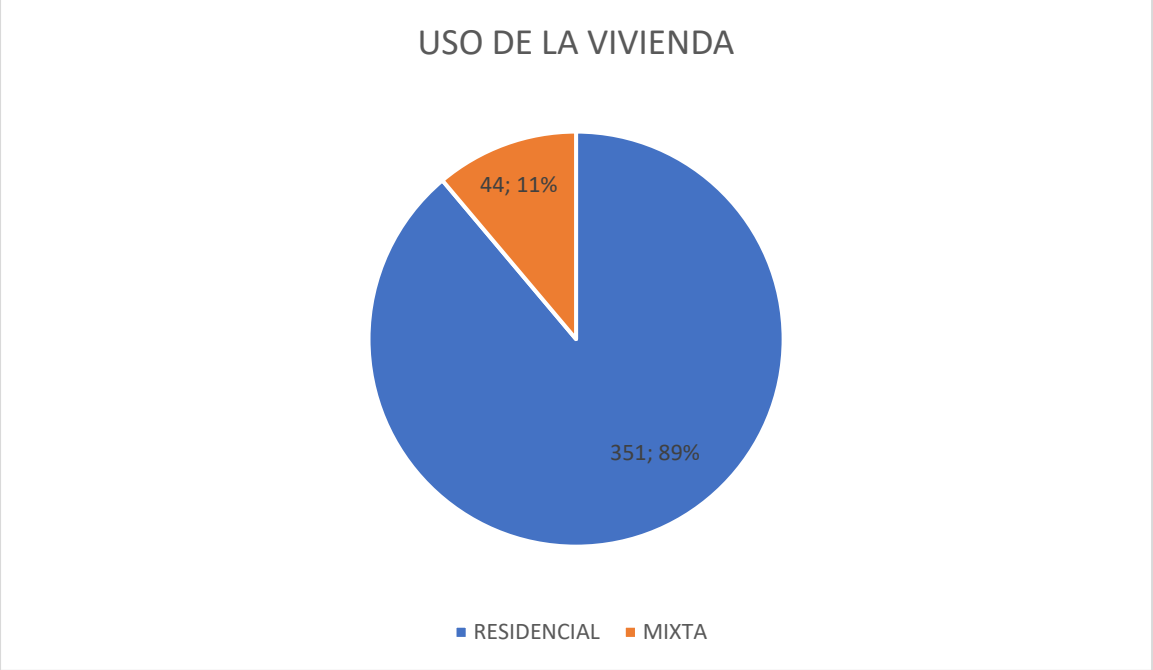


Ilustración 31 Uso de la vivienda

En la variable de características de la vivienda (uso de la vivienda), se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de los 395 hogares el 89% correspondiente a 351 viviendas eran de uso residencial y el 11% correspondiente a 44 viviendas eran de uso mixto.

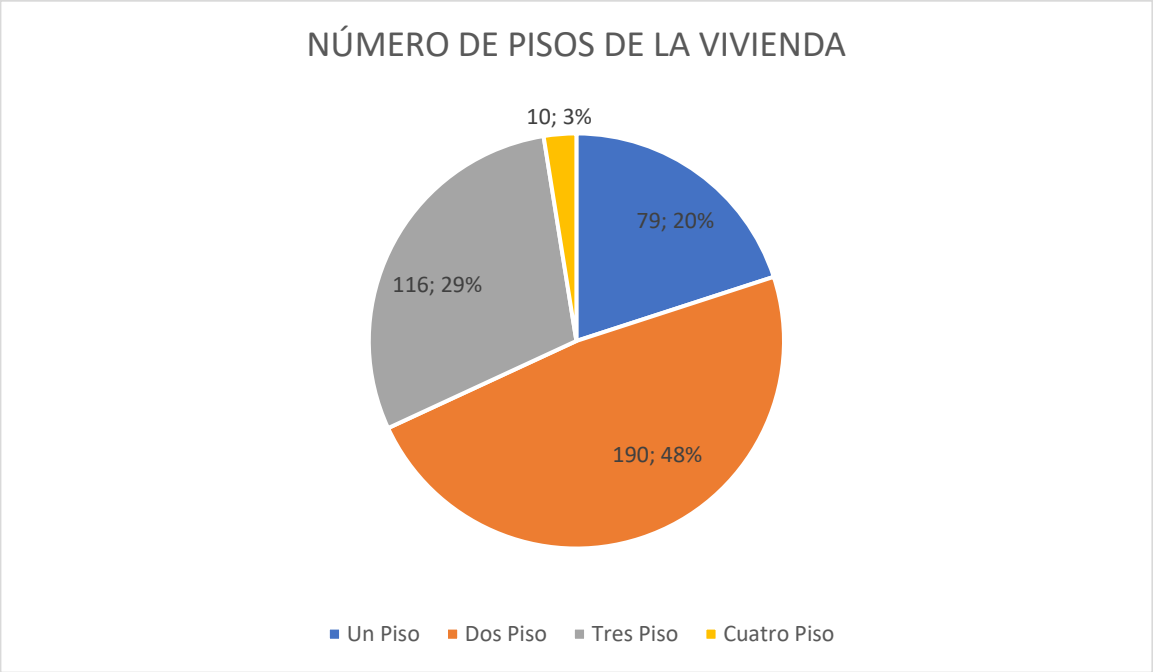


Ilustración 32 Número de pisos de la vivienda

En la variable de número de pisos de la vivienda, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 viviendas el 48% correspondiente a 190 viviendas eran de dos pisos; el 29% correspondiente a 116 viviendas eran de tres pisos; el 20% correspondiente a 79 viviendas eran de un piso y el 3% correspondiente a 10 viviendas eran de cuatro pisos.

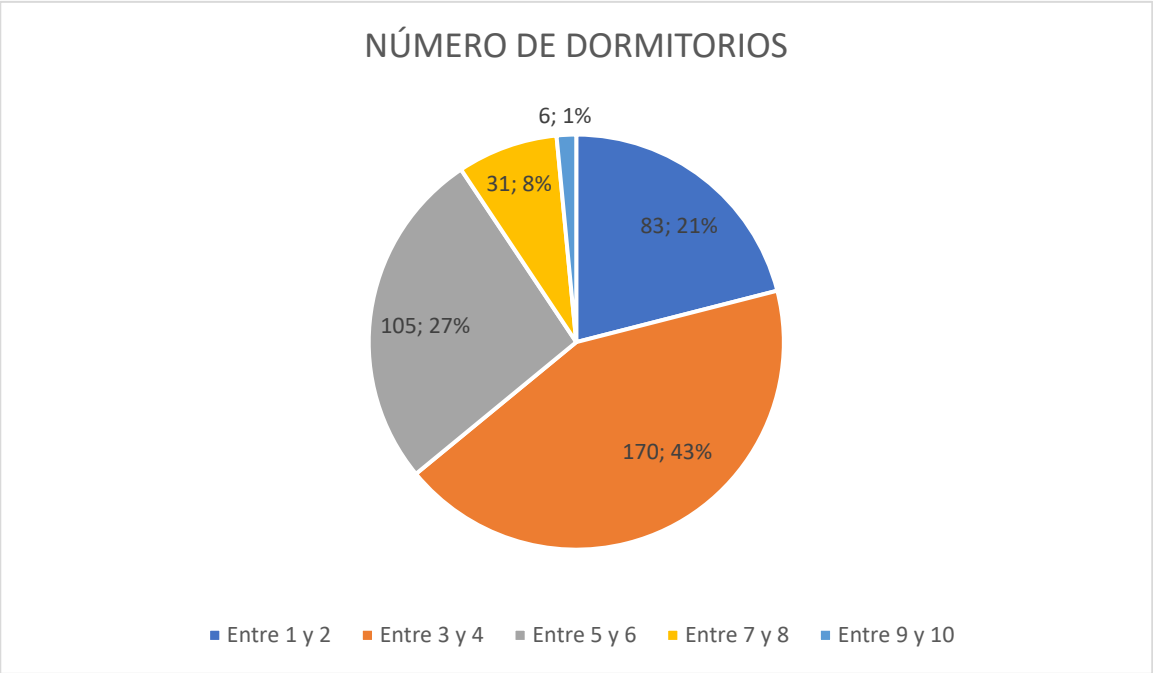


Ilustración 33 Número de dormitorios

En la variable de número de dormitorios, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 viviendas el 43% correspondiente a 170 viviendas tenían entre 3 y 4 habitaciones; el 27% correspondiente a 105 viviendas tenían entre 5 y 6 habitaciones; el 21% correspondiente a 83 viviendas tenían entre 1 y 2 habitaciones; el 8% correspondiente a 31 viviendas tenían entre 7 y 8 habitaciones y el 1% correspondiente a 6 viviendas tenían entre 9 y 10 habitaciones.

.

9.2 Variable SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES EN LA VIVIENDA

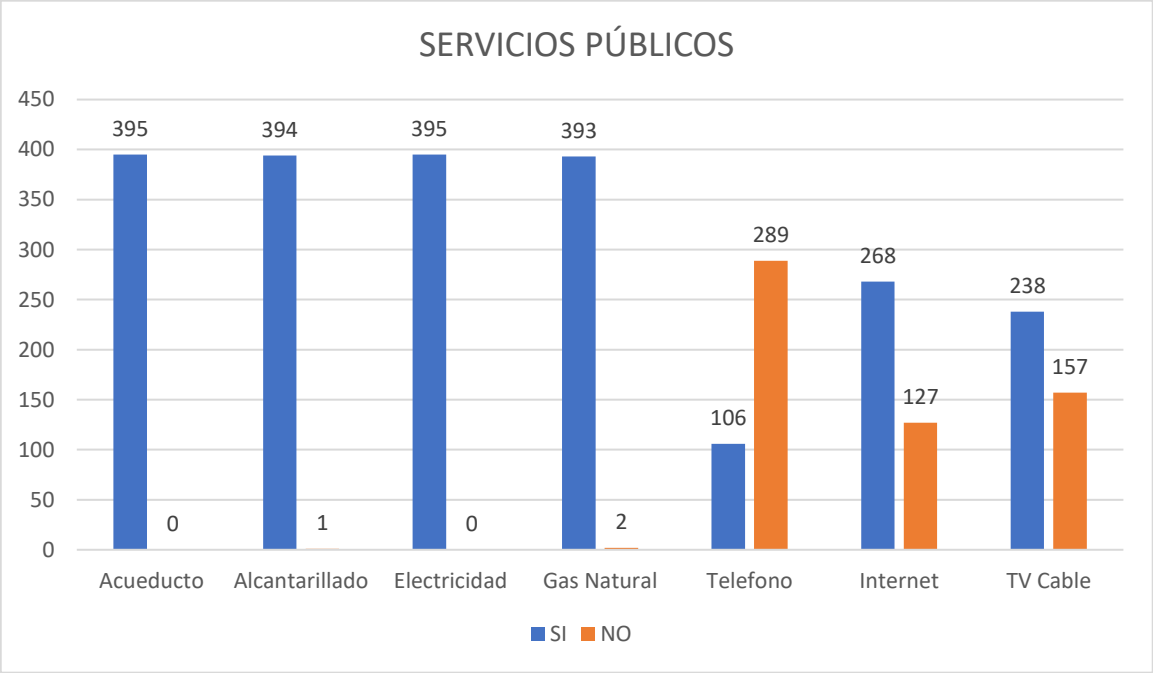


Ilustración 34 Servicios Públicos

En la variable de servicios públicos, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 viviendas contaban con los siguientes servicios públicos:

Las 395 viviendas contaban con servicio de acueducto y electricidad; 394 contaban con servicio de alcantarillado; 393 vivienda con servicio de gas natural domiciliario y 2 viviendas no contaban con este servicio; 106 viviendas contaban con servicio de telefonía fija mientras 289 viviendas no contaban con servicio de telefonía fija; 268 viviendas contaban con el servicio de internet y 127 no contaban con este servicio y 238 vivienda cuenta con el servicio de Tv Cable y 157 no contaban con este servicio.

9.3 Variable RELACIÓN CON EL ENTORNO

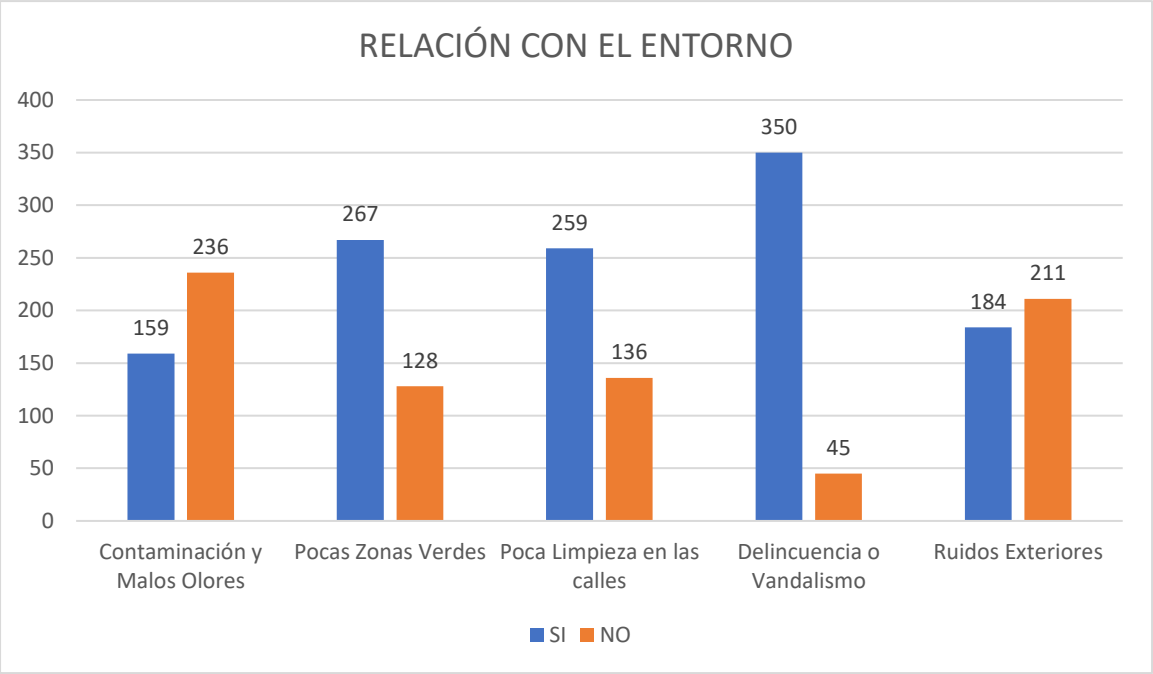


Ilustración 35 Relación con el entorno

En la variable de relación con el entorno, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 familias beneficiarias identifican las siguientes condiciones en relación al entorno donde se encuentran sus viviendas.

159 familias beneficiarias consideraban que existe contaminación y malos olores alrededor de la vivienda y 236 familias beneficiarias consideraban que no existe contaminación y malos olores.

267 familias beneficiarias consideraban que existe pocas zonas verdes alrededor de la vivienda y 128 consideraban que si existe zonas verdes alrededor de la vivienda.

259 familias beneficiarias consideraban que existe poca limpieza en las calles y 136 familias beneficiarias consideraban que si hay limpieza en las calles.

350 familias beneficiarias consideraban que existe delincuencia y vandalismo alrededor de sus viviendas y 45 familias consideraban que no hay delincuencia y vandalismo.

184 familias beneficiarias consideraban que si había ruidos fuertes alrededor de la vivienda y 211 familias beneficiarias consideraban que no había ruidos fuertes.

9.4 Variable CONDICIONES DE SANEAMIENTO

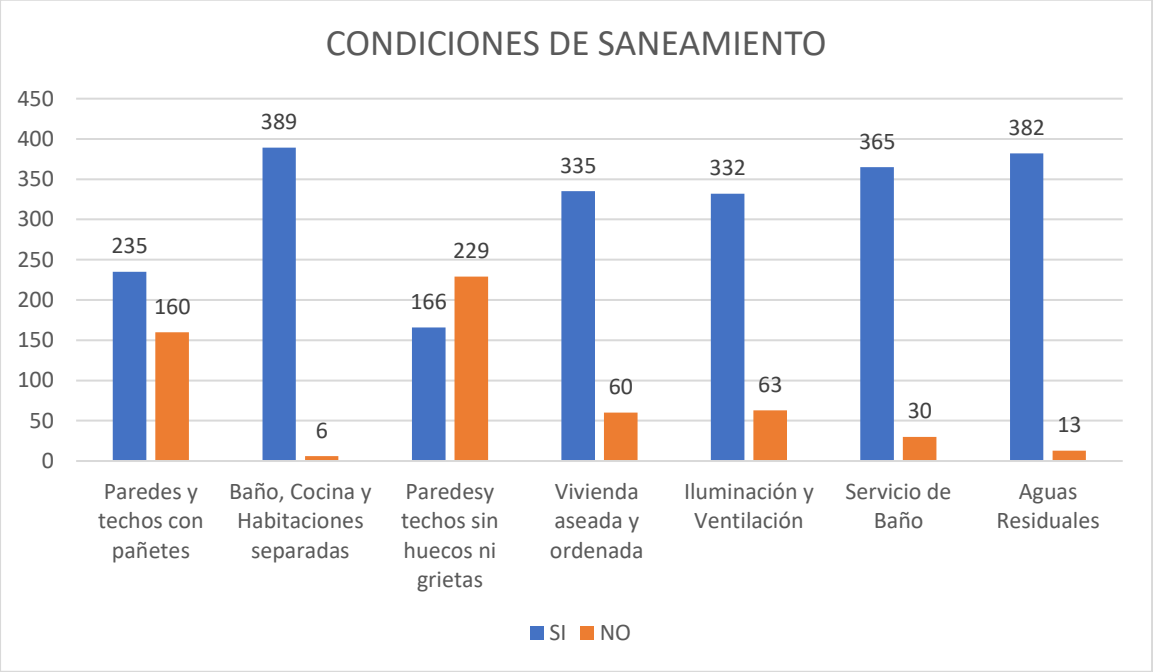


Ilustración 36 Condiciones de saneamiento

En la variable de condiciones de saneamiento, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 viviendas se encontraron las siguientes condiciones de saneamiento en sus viviendas.

235 viviendas tenían paredes y techos con pañetes mientras 160 viviendas no contaban con paredes y techos con pañete.

389 viviendas tenían baño, cocina y habitaciones separadas entre si mientras 6 viviendas carecían de estas separaciones.

166 viviendas tenían paredes y techos sin huecos ni gritas mientras 229 viviendas si presentaban paredes y techos son huecos y/o grietas.

335 viviendas estaban aseadas y ordenadas con los objetos ubicados acorde al uso y las necesidades del hogar mientras 60 viviendas se encontraban desaseadas y desordenadas.

332 viviendas contaban con iluminación y ventilación natural mientas 63 viviendas carecían de iluminación y ventilación natural.

365 viviendas contaban con el servicio de baño (retrete y ducha) mientras 30 viviendas carecían de servicio de baño.

382 vivienda las aguas residuales drenaban por canales o tubería mientras 13 viviendas carecían de drenaje por canales o tuberías.

10. Variable RECURSOS Y MOTIVOS FRENTE A LA HABITABILIDAD

10.1 Variable QUE HA IMPEDIDO REALIZAR MEJORAS EN LA VIVIENDA

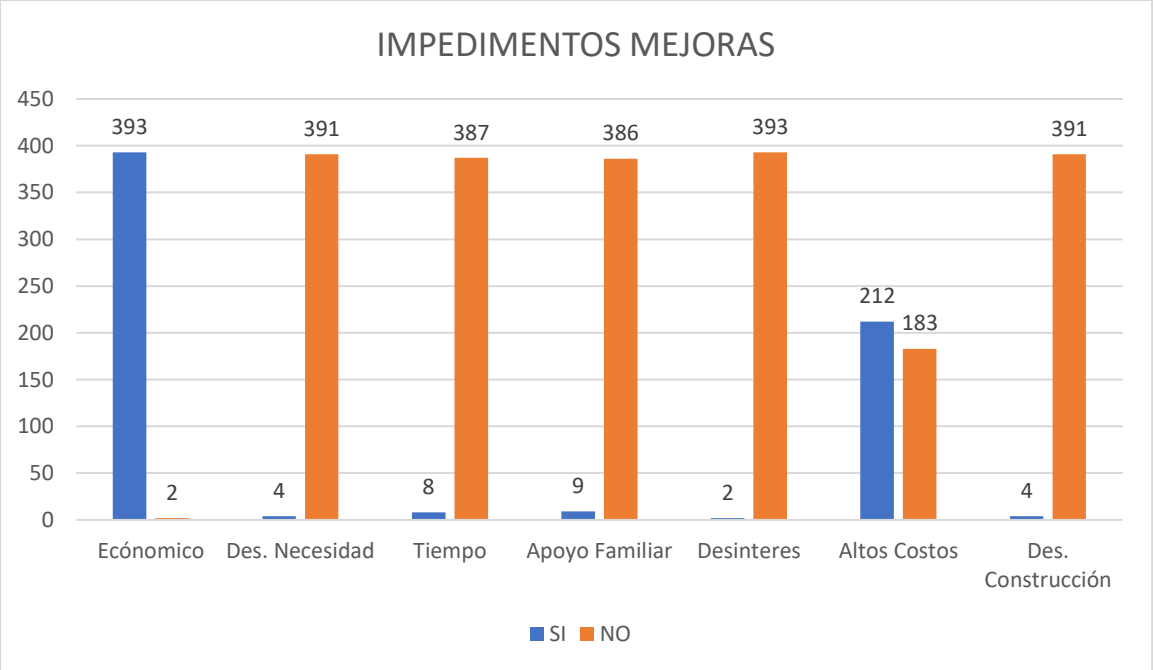


Ilustración 37 Impedimentos para mejoras

En la variable de que ha impedido hacer mejoras en la vivienda, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395)

caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 familias beneficiarias identificaron los siguientes impedimentos que tuvieron para realizar mejoras a sus viviendas.

393 familias beneficiarias consideraban que son impedimentos económicos mientras 3 consideraban que no ha habido impedimentos económicos para realizar mejoras en sus viviendas.

391 familias beneficiarias consideraban que no es por desconocimiento de las necesidades mientras 4 familias consideraban que si es por desconocimiento de las necesidades de mejoras en su vivienda.

387 familias beneficiarias consideraban que no es por tiempo que no habían realizado mejoras en su vivienda mientras 8 familias beneficiarias consideraban que no las habían realizado por tiempo.

386 familias beneficiarias consideraban que no habían tenido el apoyo familiar para realizar las mejoras en su vivienda mientras 9 familias beneficiarias consideraban que no habían realizado mejoras en la vivienda por falta de apoyo familiar.

393 familias beneficiarias consideraban que no es por desinterés que no habían realizado las mejoras en su vivienda mientras 3 familias consideraban que por desinterés no las habían realizado.

212 familias beneficiarias consideraban que por los altos costos de los materiales no habían realizado las mejoras a sus viviendas mientras 183 familias beneficiarias consideraban que el impedimento no era por los altos costos de los materiales.

391 familias beneficiarias consideraban que no por desconocimiento de construcción no habían realizado las mejoras en su vivienda mientras 4 familias beneficiarias consideraban que era por desconocimiento de construcción que no habían realizado mejoras en su vivienda.

10.2 Variable PRESENCIA DE SITUACIONES EN LA VIVIENDA

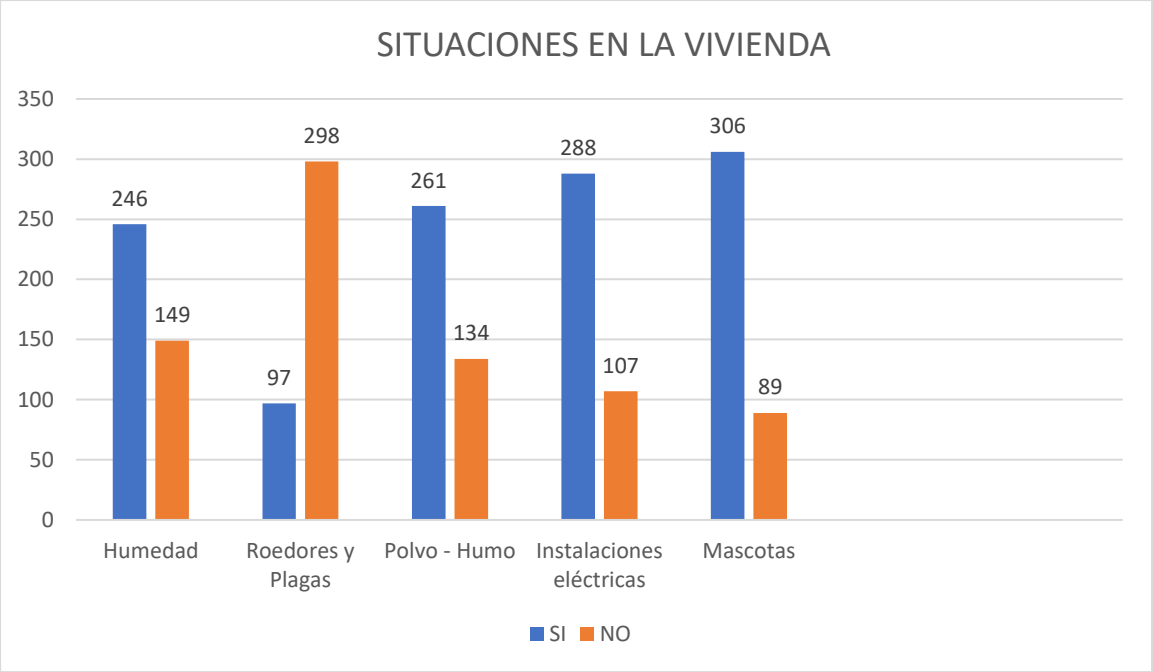


Ilustración 38 Situaciones de la vivienda

En la variable situaciones que se presentan en la vivienda, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 familias beneficiarias identificaban las siguientes situaciones en sus viviendas.

246 familias beneficiarias consideraban que en su vivienda se presentaba humedad, frio y/o malos olores mientras 149 familias beneficiarias consideraban que sus viviendas no se presentaban situaciones de humedad, frio y/o malos olores.

298 familias beneficiarias consideraban que en su vivienda no se presentaban presencia de roedores y plagas mientras 97 familias beneficiarias si consideraban que en su vivienda había presencia de roedores y plagas.

261 familias beneficiarias consideraban que en su vivienda había presencia de partículas en el aire (polvo – humo) mientras 134 familias beneficiarias consideraban que en su vivienda no había presencia de partículas en el aire (polvo – humo).

288 familias beneficiarias consideraban que en su vivienda había adecuadas instalaciones eléctricas mientras 107 familias beneficiarias consideraban que en su vivienda no había adecuadas instalaciones eléctricas.

306 familias beneficiarias tenían mascotas o animales de compañía mientras 89 familias beneficiarias no tenían animales de compañía. De las 306 familias beneficiarias que tenían mascotas o animales de compañía en su vivienda solo 253 permanecían en un lugar aseado y separado de los espacios de habitabilidad de la familia.

10.3 Variable LAS MEJORAS EN LA VIVIENDA, LE APORTARAN A USTED Y SU FAMILIA

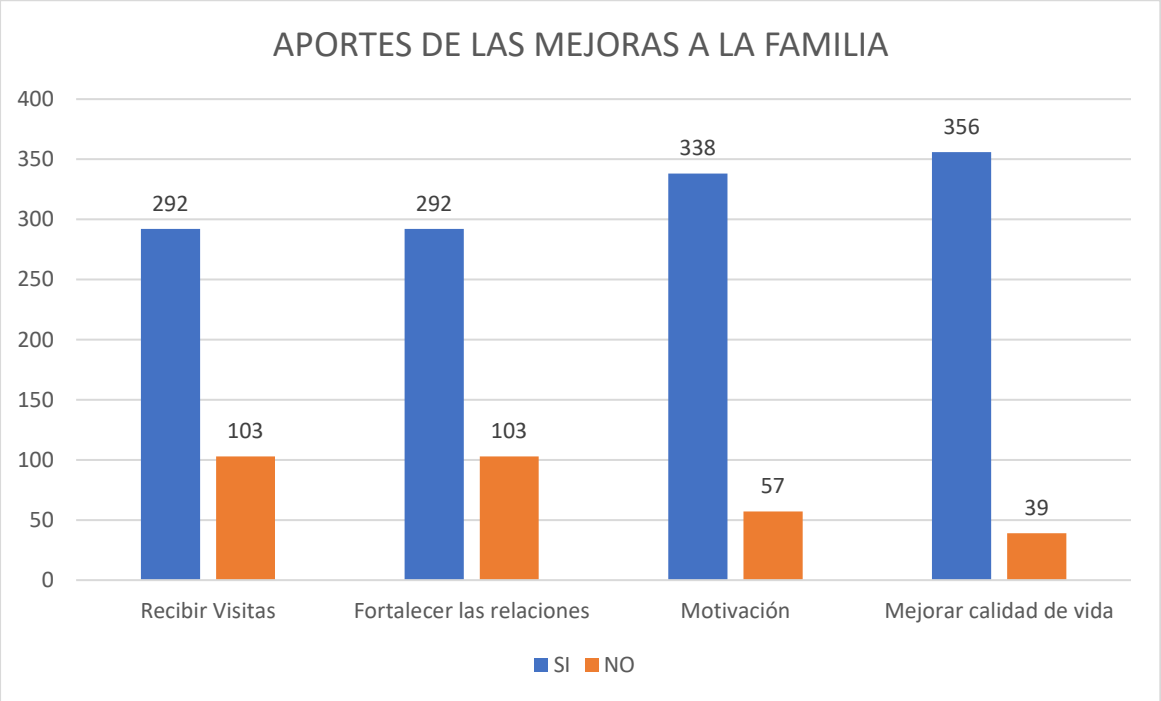


Ilustración 39 Aportes a la familia

En la variable aportes de las mejoras a la familia, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 familias beneficiarias consideraban que las actividades de mejoras en su vivienda le harían los siguientes aportes a su núcleo familiar.

292 familias beneficiarias consideraban que las mejoras de vivienda les permitirían recibir visitas de familiares y amigos con mayor frecuencia mientras que 103 familias

beneficiarias consideraban que las mejoras de vivienda no le aportarían a recibir visitas de familiares y amigos con mayor frecuencia.

292 familias beneficiarias consideraban que las mejoras de vivienda les permitirían fortalecer las relaciones de convivencia en la familia mientras que 103 familias beneficiarias consideraban que las mejoras de vivienda no le aportarían a fortalecer las relaciones de convivencia en la familia.

338 familias beneficiarias consideraban que las mejoras de vivienda les permitirían tener motivación para continuar otras mejoras en la vivienda mientras que 57 familias beneficiarias consideraban que las mejoras de vivienda no serían motivación para continuar otras mejoras en la vivienda.

356 familias beneficiarias consideraban que las mejoras de vivienda les permitirían mejorar la calidad de vida y salud mientras que 39 familias beneficiarias consideraban que las mejoras de vivienda no le aportarían a mejorar la calidad de vida y salud.

10.4 Variable CONOCIMIENTO SOBRE SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

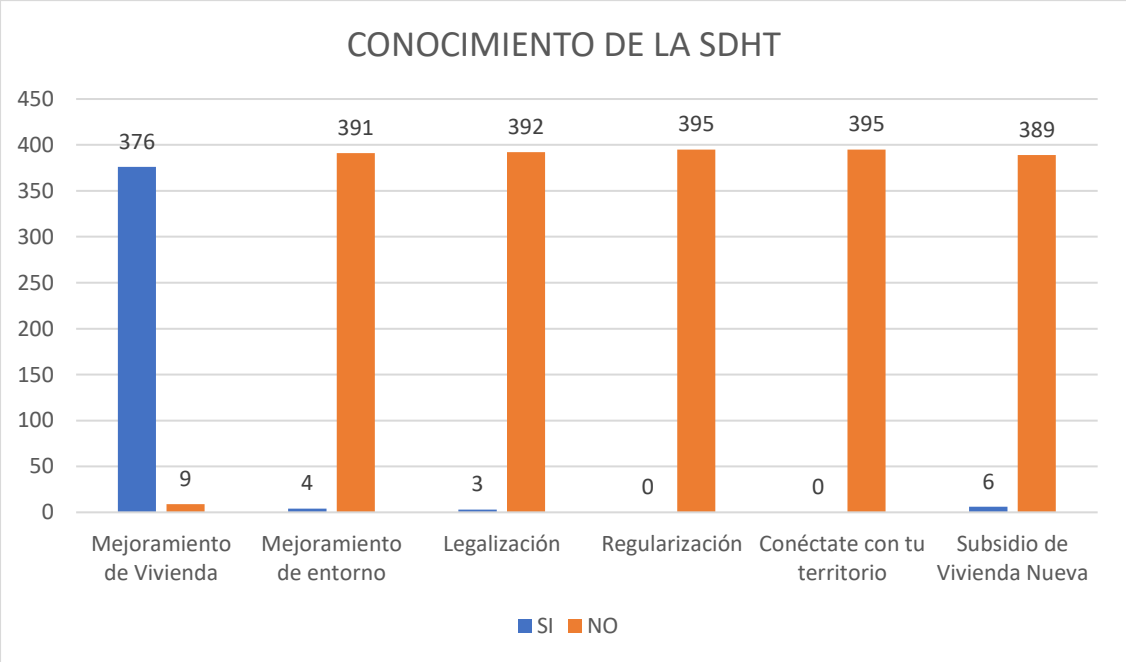


Ilustración 40 Conocimiento sobre SDHT

En la variable conocimiento sobre la SDHT, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 familias beneficiarias tenían conocimiento de los siguientes programas de la SDHT.

376 familias beneficiarias tenían conocimiento acerca del Programa de Mejoramiento de Vivienda frente a 9 familia beneficiarias que no tenían conocimiento de este programa.

391 familias beneficiarias no tenían conocimiento acerca del Programa de Mejoramiento de entorno frente a 4 familias que si tenían conocimiento de este programa.

392 familias beneficiarias no tenían conocimiento acerca del Programa de Legalización de la SDHT frente a 3 familias que si tenían conocimiento de este programa.

395 familias beneficiarias no tenían conocimiento de los programas de Regularización y Conéctate con tu territorio.

389 familias beneficiarias no tenían conocimiento acerca del Programa de Subsidio de vivienda nueva de la SDHT frente a 6 familias que si tenían conocimiento de este programa.

11. Variable RELACIÓN DE PARTICIPACIÓN

11.1 Variable PARTICIPACIÓN / ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

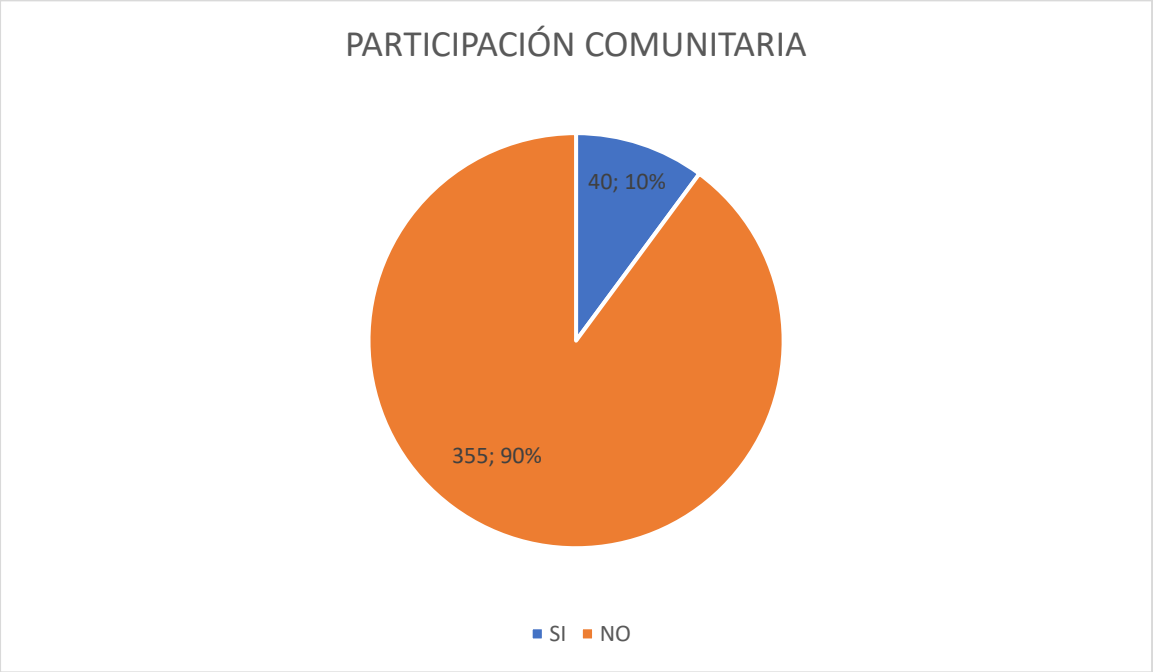


Ilustración 41 Participación Comunitaria

En la variable de participación/ organización comunitaria, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 familias beneficiarias el 90% correspondiente a 355 familias no hacían parte ni participaban en organizaciones comunicarías y el 10% correspondiente a 40 familias beneficiarias si hacían parte y participaban de organizaciones comunitarias.

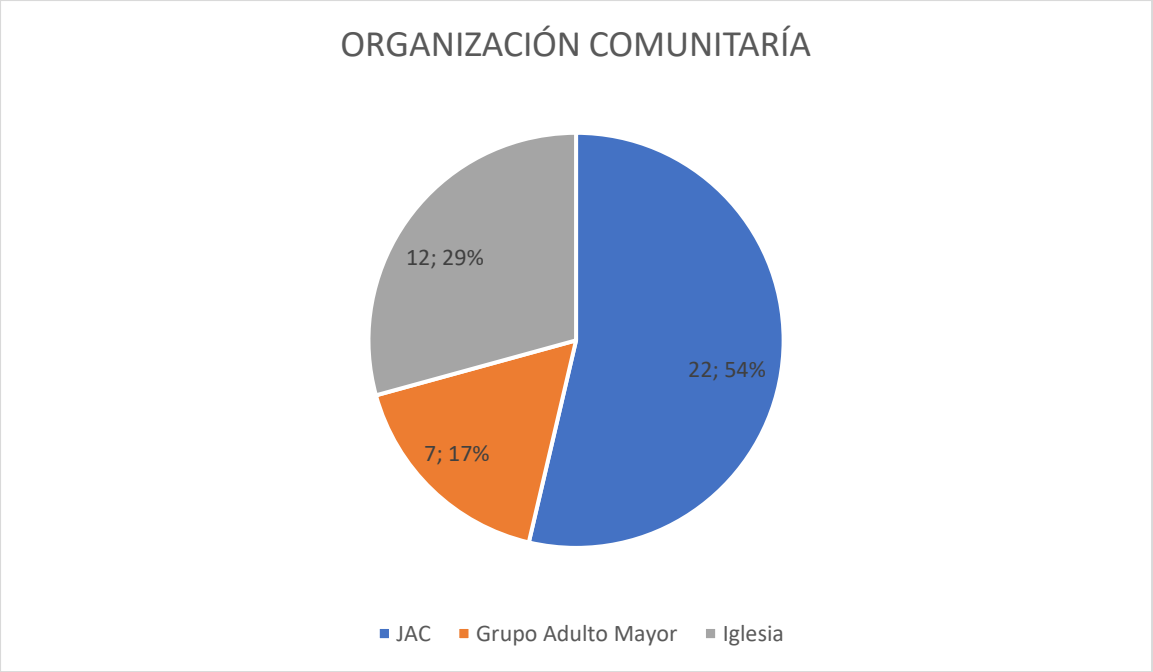


Ilustración 42 Organización Comunitaria

De las 40 familias beneficiarias que hacían parte y participaban en organizaciones comunitarias se evidenció que una familia beneficiaria hacía parte de dos organizaciones comunitarias mientras las otras 38 familias beneficiarias solo hacían parte de una organización comunitaria.

Se obtuvieron que el 54% correspondiente a 22 familias beneficiarias algunos de sus integrantes hacían parte de las Junta de Acción Comunal -JAC; el 29% correspondiente a 12 familias beneficiarias algunos de sus integrantes hacían parte de la iglesia y el 17% correspondiente a 7 familias beneficiarias algunos de sus integrantes hacían parte de Grupos de Adulto mayor.

11.2 Variable PARTICIPACIÓN / ORGANIZACIÓN COMUNITARIA SDHT

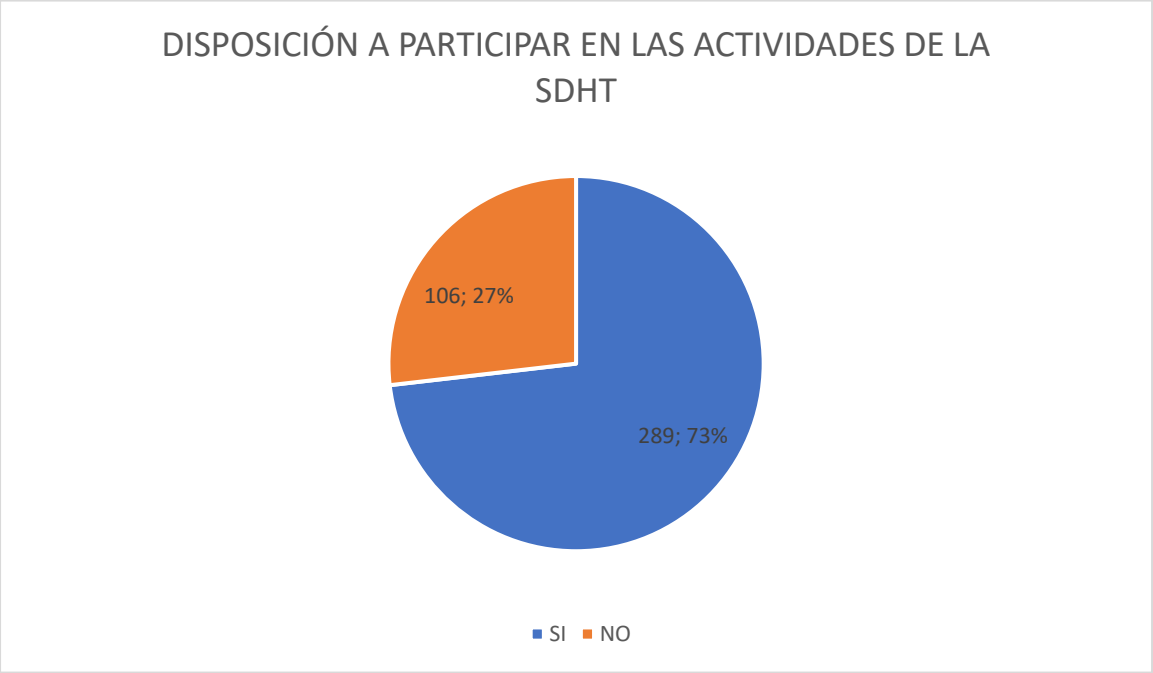


Ilustración 43 Disposición para participar

En la variable de participación/ organización comunitaria con SDHT, se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las trescientas noventa y cinco (395) caracterizaciones sociales, se obtuvo que de las 395 familias beneficiarias el 73% correspondiente a 289 familias beneficiarias estaban dispuesto a participar de las reuniones, encuentros y talleres en el marco de las Intervenciones de la Secretaria Distrital de Hábitat y el 27% correspondiente a 106 familias beneficiarias no estaban dispuestos a participar aduciendo 97 familias beneficiarias no tenían tiempo; 6 familias beneficiarias no interesarles y 3 familias beneficiarias manifestaron que era irrelevante para ellos participar.

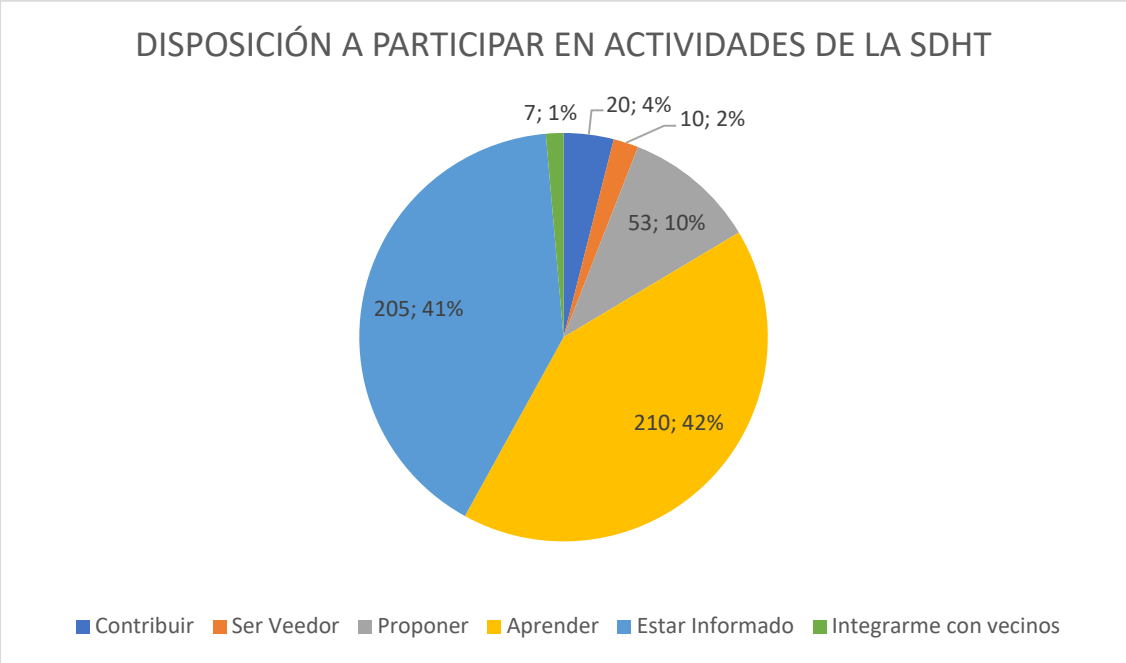


Ilustración 44 Disposición Actividades de SDHT

De las 289 familias beneficiarias que manifestaron estaban dispuestos a participar de las diferentes actividades que se pudieran realizar en el marco de las intervenciones de la secretaria Distrital del Hábitat – SDHT, se precisa que varias familias manifestaron varios roles dentro de las actividades. Las familias beneficiarias manifestaron lo siguiente:

42% correspondiente a 210 familias beneficiarias participaban para aprender

41% correspondiente a 205 familias beneficiarias participaban para estar informados.

10% correspondiente a 53 familias beneficiarias participaban para proponer.

4% correspondiente a 20 familias beneficiarias participaban para contribuir.

2% correspondiente a 10 familias beneficiarias participaban para ser veedores.

1% correspondiente a 7 familias beneficiarias participaban para integrarse con los vecinos.

10.1.2 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El Plan de Gestión Social- PGS del Consorcio Buenas Viviendas – EGR tenía la necesidad de ser garantes de los derechos en condiciones de igualdad, participación, decisión, consenso y concertación con los hogares beneficiarios de las viviendas priorizadas constituyéndose como el eje fundamental y transversal para lograr el acercamiento, dialogo, acompañamiento y trabajo constante con los beneficiarios de las viviendas priorizadas. Así mismo, se determinó la presencia de actores principales en el territorio priorizado (Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales de base, entidades del orden territorial, presencia de fuerza militares y de policía, entre otros actores) que permitieron potencializar el acompañamiento social y comunitario en los hogares beneficiarios y contribuyeron de forma eficaz y eficiente a la participación de la comunidad, divulgación, alcance del proyecto y atención del mismo.

El distrito capital por medio de la Secretaría Distrital del Hábitat, buscó adelantar obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, brindando a las familias beneficiadas la mejora de sus condiciones habitacionales y de vida. Es así que, para el alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato 917 de 2023 con Consorcio Buenas Viviendas-EGR, con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios definidos por la entidad.

De acuerdo a lo anterior el Plan de Gestión Social del Consorcio Buenas Viviendas -EGR contenía el planteamiento de las metodología, estrategias, procedimientos y actividades a ejecutarse por parte del área social en el marco del contrato 917 de 2023, el cual tuvo como objeto **CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 4 – 2023.** como mecanismo de participación ciudadana y control social implementados en la búsqueda de prevenir, minimizar, controlar y/o compensar los impactos que se pudieron presentar en la ejecución de las obras.

En este PGS se determinó cada una de las actividades que realizó el equipo social, en aras de dar cumplimiento y hacer acompañamiento en las diferentes fases (Fase de

Validación, Fase de Ejecución de Obras y Fase de Cierre de Obras) determinadas en el anexo técnico para la prestación del servicio y/o entrega del bien de la secretaria Distrital del Hábitat.

El PGS del Consorcio Buenas Viviendas – EGR tuvo como objetivo general Implementar la estrategia de acompañamiento social con el fin de mitigar, prevenir, corregir y reducir impactos negativos que se puedan presentar en la ejecución del programa de mejoramiento de vivienda y potenciar, optimizar e impulsar los impactos positivos que se generen en la ejecución del mismo a nivel familiar (en las viviendas) y comunitario (en el territorio priorizado).

Y como objetivos específicos los siguientes:

- Brindar información clara, oportuna y confiable acerca del proyecto a las familias beneficiarias y comunidad en general.
- Establecer la ruta de atención a las peticiones, solicitudes, quejas, sugerencias de las familias beneficiarias y comunidad en general, garantizando una atención oportuna y pertinente ante la recepción de PQRS.
- Propiciar en las familias beneficiarias la corresponsabilidad en el proceso de ejecución de sus viviendas, donde se brinde información idónea y genuina por parte de los beneficiarios.
- Impulsar la sostenibilidad de las mejoras realizadas en las viviendas e incentivar a las familias en la continuidad de mejora de otros espacios de la vivienda.
- Crear canales de comunicación entre las familias de los sectores priorizados y los diferentes actores institucionales y sociales, generando un ambiente adecuado para el buen desarrollo del mejoramiento de las viviendas.
- Involucrar a las familias dentro del proceso de sostenibilidad de las mejoras realizadas, con el fin de que tengan uso adecuado de los espacios y su entorno permanezca por tiempo indeterminado en óptimas condiciones.

La metodología que se implementó en las tres fases del Programa de Mejoramiento de vivienda: Fase de Validación; Fase de Ejecución de las obras y Fase de Cierre del Proyecto, son las técnicas de intervención social. Estas técnicas de intervención social que se implementaron fueron la Observación, visitas domiciliarias e Historias de vida.

- Observación: se realizó en las viviendas beneficiarias donde se desarrollaron los fenómenos observables. Fue un procedimiento que dirigió la atención a un hecho

de la realidad, encontrando sentido a lo observado, en el que el profesional social debió examinar, registrar, analizar y elaborar conclusiones.

- Visitas domiciliarias: atención que se realizó en cada uno de los hogares beneficiarios que permitió al profesional social realizar la caracterización sociodemográfica de los hogares beneficiarios, esta es una variante de la entrevista, que permitió al profesional completar la valoración del hogar utilizando la información obtenida en el contexto natural de la persona beneficiaria (vivienda del beneficiario). La información obtenida utilizando esta técnica permitió verificar la situación real del hogar beneficiario y esta se convirtió en un insumo para estimular la participación activa de los beneficiarios en el proceso de ejecución del programa de mejoramiento de vivienda.
- Historia de Vida: la historia de vida es una técnica documental de la intervención social la cual mediante su proceso de elaboración permitió adentramos en las vidas de las personas realizando un ejercicio comprensivo de la subjetividad de las vivencias descubiertas y su relación con el contexto sociocultural. Para la selección de las historias de vida se implementó las recomendaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat -SDHT.

A continuación, se describen cada una de las acciones que se realizaron en el plan de gestión social donde se describe el objetivo, metas, actividades y evidencias de cada una de las fases que permitió brindar acompañamiento integral a los hogares beneficiarios durante la ejecución del programa.

10.1.2.1 FASE DE VALIDACIÓN

En el PGS en la fase de validación su objetivo fue Validar la información entregada por la Secretaría Distrital del Hábitat -SDHT y verificar el estado actual de cada una de las viviendas (componente social y técnico).

Las metas que se propusieron realizar durante la fase de validación fueron las siguientes:

- Ubicación del Punto de Atención a la Comunidad- PAC
- Reunión de inicio para la socialización de los lineamientos del Programa de Mejoramiento de Vivienda a los beneficiarios.

- Caracterización Social de los hogares beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda.
- Elaboración de Historia de Vida

10.1.2.1.1 UBICACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD- PAC

Durante la ejecución del contrato de obra 917 de 2023 se tuvieron dos Puntos de atención a la comunidad – PAC, el objetivo del PAC fue Suministrar adecuadamente información, dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o sugerencias de la comunidad que se acerque al PAC. En estos lugares se fijó una valla informativa con la información del contrato de obra e interventoría (horario de atención, objeto del contrato, numero de contrato de obra e interventoría, correo electrónico de contratista de obra e interventoría y de la SDHT, número de contacto de contratista de obra e interventoría).

Los dos PAC estuvieron ubicados en la localidad de USME en el territorio priorizado Alfonso López, el primer PAC estuvo ubicado en la CRA 6C # 81C-19 Sur Compostela en donde se inició la atención desde el día 14 de agosto de 2023 hasta el 22 de agosto de 2023 y el segundo Punto de Atención a la Comunidad estuvo ubicado en la CARRERA 6 ESTE #97D – 33 barrio Villa Hermosa SUR donde se realizó atención desde el 25/11/2023 hasta el 31/07/2024.

El horario de atención fueron los días lunes y miércoles en horario de 8:30 a.m. a 12:00 m y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Tabla 15 Atención PAC

ATENCIÓN PAC			
FECHA	**PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA**	**PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA**	**OBSERVACIONES**
14/08/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BSR 	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	011

16/08/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
19/08/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SE RECEPCIONÓ SOLICITUD POR PARTE DE BENEFICIARIA MVAL_07697 MARÍA SILVIA ÁLVAREZ QUIEN SOLICITA SOCIALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA.
23/08/2023	SANDRA FRESNEDA	CRISTINA PÉREZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
26/08/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
28/08/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
4/09/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
6/09/2023	SANDRA FRESNEDA	CRISTINA PÉREZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
9/09/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
11/09/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
13/09/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
16/09/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
18/09/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL
20/09/2023	SANDRA FRESNEDA	CRISTINA PÉREZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL
23/09/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL
25/09/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL
27/09/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL
30/09/2023	SANDRA FRESNEDA	CRISTINA PÉREZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y/O COMUNIDAD EN GENERAL
2/10/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
4/10/2023	SANDRA FRESNEDA	CRISTINA PÉREZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BSR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	011

7/10/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
9/10/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
11/10/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
14/10/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
18/10/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
21/10/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
23/10/2023	SANDRA FRESNEDA	CLARA GARCIA GIRALDO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
25/10/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
28/10/2023	SANDRA FRESNEDA	CLARA GARCIA GIRALDO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
30/10/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
1/11/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
4/11/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
8/11/2023	SANDRA FRESNEDA	CLARA GARCIA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
11/11/2023	SANDRA FRESNEDA	CLARA GARCIA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
15/11/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
18/11/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
20/11/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BSR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	011

22/11/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
25/11/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
2/12/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
4/12/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
6/12/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
9/12/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
11/12/2023	SANDRA FRESNEDA	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
13/12/2023	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
16/12/2023	KARELLYS BRITO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
18/12/2023	JULIA GUZMAN	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
20/12/2023	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
23/12/2023	SANDRA FRESNEDA	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
27/12/2023	SANDRA FRESNEDA	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
3/01/2024	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
6/01/2024	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
10/01/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
13/01/2024	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BSR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	011

15/01/2024	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
17/01/2024	SANDRA FRESNEDA	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
20/01/2024	SANDRA FRESNEDA	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
22/01/2024	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
24/01/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
27/01/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
29/01/2024	SANDRA FRESNEDA	JESSICA SEPÚLVEDA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
31/01/2024	LEIDY SERRANO	DORA AREVALO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
5/02/2024	LEIDY SERRANO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
7/02/2024	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
10/02/2024	SANDRA FRESNEDA	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
12/02/2024	SANDRA FRESNEDA	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
14/02/2024	LEIDY SERRANO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
17/02/2024	LEIDY SERRANO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
19/02/2024	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
21/01/2024	SANDRA FRESNEDA	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
24/01/2024	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BSR 	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	011

26/02/2024	LEIDY SERRANO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
28/02/2024	CATHERINE MONROY	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
2/03/2024	SANDRA FRESNEDA	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
4/03/2024	SANDRA FRESNEDA	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
6/03/2024	LEIDY SERRANO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
9/03/2024	KARELLYS BRITO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
11/03/2024	KARELLYS BRITO	YESSENIA GAMEZ	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
15/05/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
18/05/2024	MARIA DEL CARMEN OSORIO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
20/05/2024	MARIA DEL CARMEN OSORIO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
22/05/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
25/05/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
27/05/2024	CATHERINE MONROY	BLEIDIS DOLUGAR	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
29/05/2024	LADY CUELLAR	SANDRA GARCIA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
1/06/2024	MARIA DEL CARMEN OSORIO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
5/06/2024	MARIA DEL CARMEN OSORIO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
8/06/2024	JULIA GUZMAN	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – BSR	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	011

12/06/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
15/06/2024	MARIA DEL CARMEN OSORIO	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
17/06/2024	CATHERINE MONROY	BLEIDIS DOLUGAR	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
19/06/2024	LADY CUELLAR	SANDRA GARCIA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
22/06/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
24/06/2024	CATHERINE MONROY	BLEIDIS DOLUGAR	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
26/06/2024	LADY CUELLAR	SANDRA GARCIA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
29/06/2024	MARIA DEL CARMEN OSORIO	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
1/07/2024	CATHERINE MONROY	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
3/07/2024	CATHERINE MONROY	PAOLA MOJICA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
6/07/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN	No hubo atención presencial en el PAC por problemas de salud de equipo social de contratista de obra.
8/07/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
10/07/2024	MARIA DEL CARMEN OSORIO	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
13/07/2024	CATHERINE MONROY	BLEIDIS DOLUGAR	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
15/07/2024	LADY CUELLAR	SANDRA GARCIA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
17/07/2024	JULIA GUZMAN	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
22/07/2024	CATHERINE MONROY	BLEIDIS DOLUGAR	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.

24/07/2024	LADY CUELLAR	SANDRA GARCIA	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.
27/07/2024	CATHERINE MONROY	KATY LEÓN BRITO	SIN RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE PERSONA BENEFICIARIA Y/O COMUNIDAD EN GENERAL.

.

En los días 13, 16, 18, 20, 23, 27 y 30 del mes de marzo y durante el mes abril no se realizaron atenciones en el Punto de Atención al Ciudadano – PAC ubicado en la CRA 6 Este # 97D – 33 Sur Villa Hermosa, esto debido a las situaciones de amenazas contra la integridad del equipo mínimo y también por la suspensión del contrato 917 de 2023, las atenciones presenciales en el Punto de atención al ciudadano se restablecieron el día 15 de mayo de 2024.

Sin embargo, el equipo social de obra estuvo en comunicación con los beneficiarios a través de llamadas telefónicas y/o vía WhatsApp.

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe la bitácora de atención al PAC, que corresponde al anexo número seis (6) denominado Bitácora.

10.1.2.1.2 REUNIÓN DE INICIO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS BENEFICIARIOS.

Durante la ejecución del contrato de obra 917 de 2023 contratista de obra realizó un total de cinco (5) reuniones de inicio para la socialización de los lineamientos del Programa de Mejoramiento de Vivienda.

Previo a la realización de las reuniones de inicio el equipo social de contratista de obra realizaba la logística necesaria para la realización de la misma (búsqueda de salón, video beam, sonido, silletería, mesas y refrigerios para los participantes)

Una vez se contaba con el espacio el equipo social de contratista de obra convocaba a los beneficiarios a la reunión de inicio de obras, a través de llamadas telefónicas y vía

WhatsApp, donde se informaba del lugar y fecha de la reunión de inicio. En esta se informaba que en caso que el beneficiario no pudiera asistir podría enviar a una persona autorizada mayor de edad con carta de autorización y documentos de identidad del beneficiario y el o la autorizada.

A continuación, se describirá cada una de las reuniones que se realizó en la ejecución del contrato 917 de 2023.

- **Primera reunión de socialización**

Fecha: 19/07/2023

Lugar: Transversal 8E # 85-10 Sur Salón Comunal Casaloma

Beneficiarios convocados: 113 beneficiarios de los barrios Altos del Pino: 10; Casaloma II: 1; Casaloma: 2; Compostela I: 46; Compostela III: 1; La Compostela II: 23; San Felipe: 9; San Isidro: 1 y San Isidro sur: 20.

Conclusiones Generales: en esta primera reunión de socialización se contó con la participación de 98 beneficiarios de 113 convocados es decir se obtuvo el 86.7% de participación.
La estrategia de convocatoria a los beneficiarios fue a través de llamadas telefónicas, no hubo necesidad de enviar correos certificados. Se evidencio un alto nivel de aceptación y participación de los beneficiarios, lo que garantizó un ejercicio de información y divulgación del proceso.

Entregables: se hizo entrega a la interventoría Consorcio Interel 2023 los siguientes documentos: Ficha de metodología de reunión de inicio de obra; listado de registro de las invitaciones y llamadas realizadas; Acta de reunión de inicio con registro fotográfico y listados de asistencia.

- **Segunda reunión de socialización**

Fecha: 18/10/2023

Lugar: Dg 98 sur 51 Este 28 Salón Comunal Nuevo Porvenir.

Beneficiarios convocados: 118 beneficiarios del Barrio Villa Hermosa

Conclusiones Generales: se contó con la participación de 85 beneficiarios de 118 convocados es decir se obtuvo el 72% de participación.
La estrategia de convocatoria empleada para la reunión de socialización fue llamadas telefónicas y vía WhatsApp, no fue necesario él envió de correos certificados. Se evidencio un alto nivel de aceptación y participación de los beneficiarios, lo que garantizó un ejercicio de información y divulgación del proceso.

Entregables: se hizo entrega a la interventoría Consorcio Interel 2023 los siguientes documentos: Ficha de metodología de reunión de inicio de obra; listado de registro de las invitaciones y llamadas realizadas; Acta de reunión de inicio con registro fotográfico y listados de asistencia.

- **Tercera reunión de socialización**

Fecha: 18/10/2023

Lugar: Cr 2 Este 79ª -15 Sur Salón Comunal del Conjunto Senderos Barrio El Curubo.

Beneficiarios convocados: 51 beneficiarios del barrio El Curubo.

Conclusiones Generales: se contó con la participación de 47 beneficiarios de 51 convocados es decir se obtuvo el 92% de participación.
La estrategia de convocatoria a los beneficiarios fue a través de llamadas telefónicas, no hubo necesidad de enviar correos certificados. Se evidencio un alto nivel de aceptación y participación de los beneficiarios, lo que garantizó un ejercicio de información y divulgación del proceso.

Entregables: se hizo entrega a la interventoría Consorcio Interel 2023 los siguientes documentos: Ficha de metodología de reunión de inicio de obra; listado de registro de las invitaciones y llamadas realizadas; Acta de reunión de inicio con registro fotográfico y listados de asistencia.

- **Cuarta reunión de socialización**

Fecha: 3/02/2024

Lugar: Calle 83 Sur # 1-10 Este Salón Comunal Barrio La Esperanza

Beneficiarios convocados: 120 beneficiarios de los barrios Alfonso López sector el Progreso: 14; Altos del Pino: 3; Bulevar del Sur: 19; Casaloma: 1; El Bosque: 1; El portal II Etapa 1: 1; El Rosal: 22; La Esperanza: 32; Rincón del Bulevar: 2; San Andrés Alto: 15; San Felipe: 5 y Villa Hermosa: 4.

Conclusiones Generales: se contó con la participación de 113 beneficiarios de 120 convocados es decir se obtuvo el 94.16% de participación.
La estrategia de convocatoria empleada para la reunión de socialización se desarrolló a través de llamadas telefónicas, mensajes vía WhatsApp, convocatoria a través de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los Barrios La Esperanza y El Rosal; no fue necesario el envío de correo certificado ya que fue posible comunicarse con los 120 beneficiarios.
Se reconoció de manera positiva el interés que mostraron los beneficiarios por participar y asistir a la reunión, se realizó énfasis en la asistencia de una única persona por grupo familiar y en el caso de no poder asistir la persona beneficiaria se les informó que podía enviar a una persona mayor de edad con carta de autorización y documentos de identidad.
Se pudo identificar alto nivel de aceptación de la comunidad beneficiada con respecto al programa de Mejoramiento de Vivienda.
Se contó con un buen nivel de asistencia, con lo que se garantizó un amplio ejercicio de información y divulgación del proceso, lo cual incide directamente en claridad y disminución de expectativas o dudas qué estuviesen del alcance del programa.

Entregables: se hizo entrega a la interventoría Consorcio Interel 2023 los siguientes documentos: Ficha de metodología de reunión de inicio de obra; listado de registro de las invitaciones y llamadas realizadas; Acta de reunión de inicio con registro fotográfico y listados de asistencia.

- **Quinta reunión de socialización**

Fecha: 11/05/2024

Lugar: CL 82ª Sur # 0-47 Este Salón Comunal Bulevar del Sur

Beneficiarios convocados: 97 beneficiarios de los barrios Alfonso López sector el Progreso: 14; Altos del Pino: 2; Bulevar del Sur: 16; Casaloma: 1; El Bosque: 1; El portal

II Etapa 1: 1; El Rosal: 2; La Esperanza: 11; Rincón del Bulevar: 1; San Andrés Alto: 12; San Felipe: 5 y Villa Hermosa: 4.

Conclusiones Generales: esta reunión se organizó con el objetivo de informar el estado actual del proyecto y anunciar el reinicio de las actividades para la ejecución de las obras de mejora en los hogares beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda grupo 4. Asimismo, detallar el alcance de las intervenciones, presentar los equipos profesionales de SDHT, Obra e Interventoría, y abordar otros aspectos generales del proyecto con el propósito de aclarar dudas relacionadas con el proceso de mejora de vivienda en la modalidad de habitabilidad

Se contó con la participación de 62 beneficiarios, lo que corresponde al 63.91% de los 97 hogares beneficiados convocados a la reunión de resocialización de la sesión de inicio. La estrategia de convocatoria empleada para la reunión de socialización se desarrolló a través de llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp y a través de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los Barrios Bulevar del Sur y San Andrés Alto. No fue necesario el envío de correo certificado, ya que fue posible comunicarse con los 97 beneficiarios.

Se convocaron a 26 beneficiarios cuyas viviendas ya están aperturadas, la mayoría de ellos manifestaron su ausencia a la reunión, ya que estaban al tanto de que en sus viviendas se reiniciarían las obras a partir del 14 de mayo. Además, se informó a 71 beneficiarios cuyas viviendas ya han sido validadas acerca de la reunión de resocialización, y se evidenció una buena receptividad por parte de los beneficiarios.

Se reconoció de manera positiva el interés que mostraron los beneficiarios por participar y asistir a la reunión. Se hizo énfasis en la asistencia de una única persona por grupo familiar, y en caso de que la persona beneficiaria no pudiera asistir, se les informó que podía enviar a la persona autorizada en el momento de la validación.
Se puede identificar un alto nivel de aceptación por parte de la comunidad beneficiada con respecto al programa de Mejoramiento de Vivienda.

Se contó con un buen nivel de asistencia, con lo que se garantizó un amplio ejercicio de información y divulgación del proceso, lo cual incide directamente en claridad y disminución de expectativas o dudas qué estuviesen del alcance del programa y participación de los beneficiarios, lo que garantizó un ejercicio de información y divulgación del proceso.

Entregables: se hizo entrega a la interventoría Consorcio Interel 2023 los siguientes documentos: Ficha de metodología de reunión de inicio de obra; listado de registro de las invitaciones y llamadas realizadas; Acta de reunión de inicio con registro fotográfico y listados de asistencia.

10.1.2.1.3 CARACTERIZACIÓN SOCIAL DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

El equipo social de contratista de obra con el acompañamiento del equipo social de interventoría durante la ejecución del contrato 917 de 2023 realizó acercamiento con cuatrocientas diez (410) personas beneficiarias con el objetivo programar las visitas de validación y caracterización social y actualizar la información de condiciones sociodemográficas y diferenciales de los hogares beneficiarios.

Durante la fase de validación se realizaron un total de 395 caracterizaciones sociales las cuales fueron sistematizadas en la Base de Caracterización Social, de estas 395 caracterizaciones sociales 336 correspondiente al 85% fueron atendidas directamente por la persona beneficiaria y 59 correspondiente al 15% fueron atendidas por una persona autorizada por el beneficiario a través de oficio de autorización y copias de documentos de identidad de la persona beneficiaria y de la persona autorizada.

Tabla 16 Caracterización Social

ID_DMV	*NOMBRE BENEFICIARIO (A) - SEGÚN RESOLUCION DE ASIGNACION DEL SUBSIDIO - BASE DE DATOS ENTREGADA*	*FECHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL*	*VISITA ATENDIDA POR*
MVAL_07731	YUBICEY CÁRDENAS GARZÓN	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07720	TILCIA ADARME DE SÁNCHEZ	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07716	STERNS FRANCI PORTELA HERRERA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07826	ROSA MARÍA AGUILERA DIAZ	24/07/2023	Beneficiario (a)

MVAL_07712	RAFAEL TOVAR BAUTISTA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07711	NAYDILIA MONCADA LEÓN	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07742	MAYURI BENÍTEZ FIRIGUA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07718	MARINA MORENO ROJAS	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07697	MARÍA SILVIA ÁLVAREZ	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07692	MARÍA DEL CARMEN OCAMPO MELGAREJO	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07699	MARÍA DE LAS MERCEDES VILLARRAGA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07709	LUZ STELLA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07791	LUIS ANTONIO BUITRAGO ZAMBRANO	24/07/2023	Autorizada Martha Gómez
MVAL_07719	JOSÉ GABRIEL DUITAMA GARCÍA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07792	CATALINA LÓPEZ RODRÍGUEZ	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07725	BLANCA MARINA DIAZ DE SASTOQUE	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07693	BERLY AZUCENA PASTRAN ANTONIO	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07708	BELLA RUTH OSORIO FLORIDO	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07690	ANA VICTORIA MENDOZA TIBATA	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07824	ADOLFO CARO PIRATEQUE	24/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07834	ROSALBA HERNÁNDEZ	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07911	MYRIAM PILAR CARVAJAL ALVARADO	26/07/2023	Autorizada Yuri González
MVAL_07855	MARTHA LUCERO GIRALDO ROJAS	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07852	MARÍA EUGENIA BETANCUR JIMÉNEZ	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07832	LUZ MYRIAM ESCOBAR	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07884	LUIS EDUARDO QUINTERO BOJACÁ	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07874	LUIS EDILSON SUAREZ GONZÁLEZ	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07810	LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07866	JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ROMERO	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07817	IRMA LUCIA ROZO ROZO	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07900	HERMES MENDOZA CUBIDES	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07908	FREDY RICARDO BONILLA SUAZA	26/07/2023	Autorizada Jurley Pico Verdugo
MVAL_07837	FLOR MARINA COBOS SORIANO	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07876	FABIAN ANDRÉS SALAMANCA SILVA	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07937	DORA INÉS VEGA CHACÓN	26/07/2023	Autorizado Juan Jiménez Vega
MVAL_07921	ANA LUCIA ROA RODRÍGUEZ	26/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07915	EDUBINA MIRANDA GÓMEZ	27/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07935	CECILIA APACHE DE LEÓN	27/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07954	ANGIE JULLIET CASTELLANOS SÁNCHEZ	27/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07786	VERÓNICA CASTAÑEDA VILLAMIL	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07588	SANDRA CONSUELO ACUÑA ESPITIA	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07575	ROCÍO RIVERA HERRERA	28/07/2023	Beneficiario (a)

MVAL_07777	OSCAR ALEXANDER MONROY BALAGUERA	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07586	MARILUZ BENÍTEZ FIRIGUA	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07779	MARCO ANTONIO ALIPIO PATIÑO	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07770	LUIS DOMINGO PÉREZ ROMERO	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07641	JOSÉ EURIPIDES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07603	JOSÉ ALIRIO CAICEDO MORENO	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07645	JORGE LOZANO GARZÓN	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07581	JOHN JAIRO GARCÍA PUENTES	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07592	JOHN ALEXANDER REYES JIMÉNEZ	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07639	GLORIA STELLA SÁNCHEZ PARRA	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07636	ERICSON LAVERDE HERNÁNDEZ	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07609	CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MARTIN	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07644	BLANCA AMÉRICA QUINTERO CORREDOR	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07619	ANA ELVIA MARTÍNEZ MORALES	28/07/2023	Beneficiario (a)
MVAL_07774	ANA ELIN JEREZ	28/07/2023	Autorizado José Guarín
MVAL_07476	*PEDRO ALONSO RIVERA CASTAÑEDA*	*8/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07478	*MARTHA FUERTE*	*8/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07650	*MARILUZ MARTINEZ RODRIGUEZ*	*8/08/2023*	*Autorizada Claudia Martinez*
MVAL_07466	*MARIA FABIOLA CASTAÑEDA HIDALGO*	*8/08/2023*	*Autorizado Juan Carlos Vargas*
MVAL_07675	*LIDA OFELIA URREGO UBATE*	*8/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07657	*HERNANDO ADARME PAEZ*	*8/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07336	*GABRIEL GARZON*	*8/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07341	*DIOSELINA OCHOA DE BARON*	*8/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07658	*DINACELI CARDONA VALENCIA*	*8/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07463	*BLANCA LEONOR VILLAMARIN JIMENEZ*	*8/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07339	*ANA STELLA GARZON CUCARIANO*	*8/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07434	*WILLINTON ASCENCIO MONTIEL*	*9/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07510	*SANDRA MILENA RIVERA CASTILLO*	*9/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07410	*LUIS ANTONIO TRIANA TORRES*	*9/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_06838	*EUSTACIO ALVAREZ*	*9/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07364	*EIMMY YESSENIA MEDINA RAMIREZ*	*9/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07436	*EDMY YANNET MUNERA VERGARA*	*9/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07516	*DANIEL RICARDO VARGAS*	*9/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07557	*ANDRES ANTONIO RIVAS MOLINA*	*9/08/2023*	*Autorizado Andres Felipe Rivas*
MVAL_07433	*ANA PATRICIA LANZA OURIZA*	*9/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07444	*ANA DOLORES NOVOA VARGAS*	*9/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_06833	*YUDY ESPERANZA ALFONSO BARRETO*	*10/08/2023*	*Beneficiaria*

MVAL_06646	*ROSALBA ZAMBRANO HERNANDEZ*	*10/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_06874	*RAFAEL HUMBERTO PRIETO ORJUELA*	*10/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07035	*PEDRO HUMBERTO QUINTANA SANCHEZ*	*10/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07660	*MARLENI RAGA HURTADO*	*10/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_06249	*MARIA HERCILIA FLOREZ ROMERO*	*10/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07472	*MARIA DOLORES HINESTROZA CUESTA*	*10/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07411	*MARCO TULIO GONZALEZ*	*10/08/2023*	*Autorizada Betty Segura*
MVAL_07652	*LUIS ALVARO RODRIGUEZ GIRALDO*	*10/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07042	*JOSE MANUEL RAMIREZ BUITRAGO*	*10/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_06837	*JINETH PAOLA MELO DONOSO*	*10/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07600	*JAIRO IVAN GARCIA REYES*	*10/08/2023*	*Autorizada Irma Bernate*
MVAL_06648	*ELIZABETH RIVERA ROJAS*	*10/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_06832	*CLARA CARLOTA VILLARRAGA MARTINEZ*	*10/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_06998	*AMADEO CIFUENTES ORJUELA*	*10/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_06169	*ALBA MERY GARCIA HERNANDEZ*	*10/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_06750	*YENY ANDREA MARTINEZ GARCIA*	*11/08/2023*	*Autorizada Yaqueline Martinez*
MVAL_07445	*SERVANDO BUSTOS GRANADOS*	*11/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_06700	*MARIA ESTELA MOJICA DE QUINTERO.*	*11/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07509	*HORACIO HERNANDEZ MARTINEZ*	*11/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_06683	*GLADYS GONZALEZ SABOGAL*	*11/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_06749	*DIEGO RENE DIAZ RIVERA*	*11/08/2023*	*Autorizada Jessica Hernández*
MVAL_07332	*CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA*	*11/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_06724	*ALBA NURY TORRES MORALES*	*11/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_06337	*MARIA BENILDA HERNANDEZ BAEZ*	*14/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_06824	*OLGA LUCIA RODRIGUEZ*	*16/08/2023*	*Autorizada Lucia Catalina Garzón*
MVAL_06941	*FABIO ANTONIO LOPEZ SALAZAR*	*16/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_06816	*MARIELA RIOS BARBOSA*	*17/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_06613	*DIEGO ANDRES MORA NIEVES*	*17/08/2023*	*Beneficiario*
MVAL_07377	*YEIMY YAGUARA TAPIA*	*18/08/2023*	*Beneficiaria*
MVAL_07933	*PEDRO OSWALDO MORA DIAZ*	*18/08/2023*	*Autorizada Alejandria Rivera*
MVAL_08148	JESÚS ANTONIO BUSTACARA FUENTES	19/10/2023	*Autorizada Blanca Largo*
MVAL_08144	LEONOR CHAPARRO CARRILLO	19/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08150	ROSA CELIA LOBATÓN HERNÁNDEZ	19/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08104	JOSÉ PABLO ROMERO MENGUAN	19/10/2023	Beneficiario
MVAL_08101	MARIBEL GARCÍA HERNÁNDEZ	19/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08140	CLAUDIA YANETH CHAPARRO BERNAL	19/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08000	MARÍA ANUNCIACIÓN SÁNCHEZ BELLO	19/10/2023	Beneficiaria

MVAL_08120	MARÍA LUZ DARY HERRERA GIRALDO	19/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08165	MARÍA ADELA GONZÁLEZ FUNEME	19/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08174	ANA ADELAIDA GAMBOA CUERVO	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08133	JESÚS DAVID ARIAS BETANCOURT	20/10/2023	Beneficiario
MVAL_08143	DORALBA MURCIA CHAPARRO	20/10/2023	Autorizada Erika Fernández
MVAL_08170	MARÍA ZENAIDA GÓMEZ MIRANDA	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08219	MARÍA MARLENY HERRERA LÓPEZ	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08137	GLADYS OFELIA SOLORZANO LÓPEZ	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08065	SANDRA MILENA CAMARGO VELASCO	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08008	GLORIA ROCÍO RINCÓN PEÑUELA	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08142	LUZ MARY BAQUERO ESCOBAR	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_07973	BENILDA PATIÑO USSA	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08023	GINA PAOLA APONTE GARCÍA	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08167	CARLOS HERNANDO LOBATÓN HERNÁNDEZ	20/10/2023	Beneficiario
MVAL_07999	DOLORES LONDOÑO AGUILAR	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08019	MYRIAM YESENIA GONZÁLEZ RUIZ	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08037	PEDRO JULIO ORTIZ MUÑOZ	20/10/2023	Beneficiario
MVAL_08084	AMELIA DE JESÚS SOTO LLANEZ	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08028	LUIS EDUARDO AMAYA PULIDO	20/10/2023	Beneficiario
MVAL_08119	CLARA INÉS VARGAS AGUILAR	20/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08076	SANDRA JEANNETTE GUERRERO DAZA	21/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08099	ANA MILENCY MOSQUERA MOSQUERA	21/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08088	YOLANDA LÓPEZ GUACANEME	21/10/2023	Autorizado Filadelfo Acero
MVAL_08081	CLARA RITA LÓPEZ SANTAMARIA	21/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08029	DIOSELINA SÁNCHEZ ROMERO	21/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08161	JOSÉ ARNOBI HERRERA LÓPEZ	23/10/2023	Beneficiario
MVAL_08196	MARÍA XIMENA RODRÍGUEZ FAJARDO	24/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08184	MARÍA DEL CARMEN FAJARDO	24/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08052	JACKELINE OMES MORALES	24/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08051	ERNESTINA FONTECHA SANTAMARIA	24/10/2023	Autorizado John Pérez
MVAL_08031	JOSÉ FREDY RODRÍGUEZ	24/10/2023	Beneficiario
MVAL_08113	MARÍA ISMAELINA SALAZAR HERNÁNDEZ	24/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08224	MARÍA YOLANDA MATTA MONROY	25/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08226	HILDA ALCIRA CASTIBLANCO HERNÁNDEZ	25/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08227	EDISON FERNANDO ROJAS MEDINA	25/10/2023	Beneficiario
MVAL_08014	ELOÍSA MORA DE CASTILLO	25/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08212	MARÍA NANCY DIAZ HERRERA	25/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08206	ERNESTO MEDINA CLAROS	26/10/2023	Beneficiario

MVAL_08046	ALCIRA SOTO LLANES	26/10/2023	Beneficiaria
MVAL_08151	REGULO LÓPEZ DIAZ	26/10/2023	Beneficiario
MVAL_08160	DORA BAQUERO ESCOBAR	26/10/2023	Beneficiaria
MVAL_04201	JUAN CARLOS PULIDO ARIAS	27/10/2023	Beneficiario
MVAL_04202	JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ ANTONIO	27/10/2023	Beneficiario
MVAL_04196	VÍCTOR MANUEL BELTRÁN GUZMÁN	31/10/2023	Beneficiario
MVAL_04503	ERIBERTO CUADROS CUADROS	31/10/2023	Autorizado Abedulio Solano
MVAL_04326	RUTH STELLA RAMÍREZ RIVERA	31/10/2023	Beneficiaria
MVAL_04327	MARÍA ROSA HERNÁNDEZ BOHÓRQUEZ	31/10/2023	Beneficiaria
MVAL_07983	NELSON ANDRÉS HERNÁNDEZ CÁRDENAS	31/10/2023	Beneficiario
MVAL_08126	MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ MORENO	31/10/2023	Beneficiario
MVAL_04304	VIRGELINA ROJAS DE HERNÁNDEZ	31/10/2023	Beneficiario
MVAL_04504	ANA ELIZABETH MARANTA VARGAS	31/10/2023	Beneficiario
MVAL_04505	FLOR EMILCE ÁVILA QUIROGA	31/10/2023	Beneficiario
MVAL_04207	MANUEL HERNÁN RIVERA RIAÑO	31/10/2023	Autorizada Martha Rivera
MVAL_04209	WILSON ALFONSO DIAZ LEMUS	31/10/2023	Beneficiario
MVAL_04376	ANA CLOTILDE MORENO BERNAL	1/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04252	MAXIMILIANO RAMOS MARTÍNEZ	1/11/2023	Beneficiario
MVAL_04257	ROSA ELENA BORDA MORENO	1/11/2023	Autorizado Juan Mora
MVAL_04310	ARMELIDA TRUJILLO ANDRADE	1/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04296	LUIS ALONSO GRACIANO CASTAÑO	2/11/2023	Beneficiario
MVAL_04430	FERNANDO LEGUIZAMÓN ROJAS	2/11/2023	Autorizada María Neva
MVAL_04496	ENRIQUE JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	2/11/2023	Autorizado Osvaldo Jiménez
MVAL_04420	MARÍA ESTELLA AGUDELO CASAS	2/11/2023	Autorizada Yenny Serna
MVAL_04382	JOSÉ DAVID VÁSQUEZ SÁNCHEZ	2/11/2023	Beneficiario
MVAL_04494	MARÍA FRANCY YATE GIRÓN	2/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04269	MARÍA MELBA GARCÍA	2/11/2023	Autorizada Yuri Rincón
MVAL_04270	JAVIER ARMANDO QUIMBAY URREGO	2/11/2023	Autorizada Clara Martínez Cárdenas
MVAL_04273	LUZ PERLA DUCUARA	2/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04204	BLANCA CECILIA DIAZ PEÑA	2/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04213	RAÚL ANTONIO PINEDA SUAREZ	2/11/2023	Beneficiario
MVAL_04275	PILAR ALVARADO SIERRA	2/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04379	JOSÉ MARCEL TOVAR LAGUNA	2/11/2023	Beneficiario
MVAL_04366	ELVIRA SOTO DIAZ	2/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04419	FABIOLA CAMPOS	2/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04385	ANA LUCIA RAMOS LINARES	2/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04189	ANA BRICEIDA AMADO TRASLAVIÑA	2/11/2023	Beneficiaria

MVAL_04199	SONIA JUDITH CASTRO	2/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04278	HÉCTOR RUBIO MARTÍNEZ	2/11/2023	Beneficiario
MVAL_04498	ANA MERCEDES VILLAMIL	2/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04297	EMILIO GUTIÉRREZ	2/11/2023	Autorizada Alba Cerón
MVAL_04335	ANA LUCIA CASTRO DE COLMENARES	2/11/2023	Beneficiaria
MVAL_07543	JORGE MAURICIO SALCEDO	16/11/2023	*Beneficiario*
MVAL_04488	MARÍA PRISCILA TORRES DE MARTÍNEZ	17/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04513	ANA ISABELINA SORIA RODRÍGUEZ	17/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04515	AVEDULIO SOLANO LOZANO	17/11/2023	Beneficiario
MVAL_04552	ALCIRA ISABEL MARTÍNEZ URREGO	17/11/2023	Autorizada Jennifer Ávila
MVAL_04674	EFRAÍN CONTRERAS COLMENARES	17/11/2023	Beneficiario
MVAL_04571	GENOVEVA MACHADO	17/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04600	EMILIA PATIÑO	17/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04691	YOLA DEL CARMEN GUERRERO MARTÍNEZ	17/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04210	OTILIA RIVERA JARCIA	17/11/2023	Autorizado Marco Cerna
MVAL_04727	RUBY LILIANA PARRA	20/11/2023	Autorizada Blanca Parra
MVAL_04697	JHON FAIVER DUQUE PRECIADO	21/11/2023	Autorizada Lida Rubiano
MVAL_04699	MELBA NORA RAMOS MONTOYA	21/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04502	ZONIA PATRICIA VARGAS HERNÁNDEZ	21/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04598	ANGELA MARÍA PATIÑO DE ROJAS	21/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04603	MARÍA HELENA GÓMEZ PÉREZ	21/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04658	FREDY ALBERTO GUZMÁN ARÉVALO	21/11/2023	Beneficiario
MVAL_04554	JOHN ALEXANDER ARÉVALO VARGAS	21/11/2023	Beneficiario
MVAL_04613	JORGE RIAÑO	21/11/2023	Beneficiario
MVAL_04455	OLGA CECILIA CARANTÓN	21/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04792	HILDA CECILIA FORERO ARIAS	21/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04356	MARIO EMILIO DAZA HERNÁNDEZ	21/11/2023	Beneficiario
MVAL_04802	ELVIRA VALERO DE FONSECA	21/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04599	OLIVIA ANACONA BENAVIDES	22/11/2023	Autorizado Bairon Castiblanco
MVAL_04604	ADIELA MARÍA QUIROZ SÁNCHEZ	22/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04632	ANA SILVIA PARADA GÓMEZ	22/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04469	ANA CELIA GAMBOA SALAMANCA	22/11/2023	Beneficiaria
MVAL_04634	ANA LUCIA GONZÁLEZ TORRES	23/11/2023	Autorizado José Moncada
MVAL_04586	GILBER ANTONIO MORA ORTIZ	23/11/2023	Beneficiario
MVAL_04713	HENRY ALFONSO AGUILAR	2/12/2023	Beneficiario
MVAL_04716	ANGIE MILENA CHINGATE	2/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04510	CECILIA MONJE RODRÍGUEZ	4/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04575	LUIS EDUARDO MARTIN LEÓN	4/12/2023	*Beneficiario*

MVAL_04578	ALEJANDRO ROJAS GAONA	5/12/2023	*Beneficiario*
MVAL_04597	SANTOS VARGAS	5/12/2023	Autorizada Franceneth Vargas
MVAL_04512	MARGARITA ACUÑA RIVERA	5/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04240	DOLLY MYRIAM BARBOSA NOVOA	5/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04244	ANA FRANCELINA PEÑA SUAREZ	5/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04391	SERGIO ELADIO OSPINA GÓMEZ	5/12/2023	Beneficiario
MVAL_04675	MARÍA TERESA GUIO PINZÓN	6/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04742	VÍCTOR MANUEL CHINGATE	6/12/2023	*Beneficiario*
MVAL_04442	MARÍA TERESA TORRES	6/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04741	JOSÉ RAFAEL MARTIN GORDILLO	6/12/2023	Beneficiario
MVAL_04773	MYRIAM INÉS JIMÉNEZ SALINAS	6/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04306	MARYLU RINCÓN VALENZUELA	6/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04838	MYRIAM ARÉVALO HERRERA	6/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04859	CARMEN GONZÁLEZ ANDRADE	6/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04785	JOSÉ RAMIRO TOVAR PRIETO	6/12/2023	Beneficiario
MVAL_04856	YESID SOLANO LUCAS	6/12/2023	Autorizada Angela Guzmán
MVAL_04247	JESÚS ALFONSO BELTRÁN BARRERA	6/12/2023	Beneficiario
MVAL_04408	NOHORA ALBA ACOSTA FERNÁNDEZ	6/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04848	MARLENY GONZÁLEZ MORA	6/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04459	FLORA CHAPARRO DE ORTIZ	6/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04620	MARÍA DEL CARMEN MORENO CASTILLO	6/12/2023	Autorizada Sandra Quicazaque
MVAL_04569	JESÚS MARÍA MONTAÑO VALENCIA	7/12/2023	*Beneficiario*
MVAL_04747	ROSA HERMINDA ALONSO CRUZ	7/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04437	LUZ EDIT INFANTE OSORIO	7/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04673	GRACIELA CUELLAR GRASS	7/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04245	BRIGITTE ANDREA ÁLVAREZ RIVERA	7/12/2023	Autorizada Leidy González
MVAL_04473	PABLO RAMÍREZ	7/12/2023	Beneficiario
MVAL_04475	EDUARDO GRANADOS	7/12/2023	Autorizada Ana Isabel Aza
MVAL_04774	LUZ MARINA MONTAÑEZ AVENDAÑO	8/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04588	NORA MIDIA COSME VIAFARA	11/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04655	ROSA BERTA COBOS	11/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04630	ROSALBINA HERRERA BAUTISTA	11/12/2023	Autorizado Luis Franco
MVAL_04746	JULIA VERÓNICA VEGA VEGA	11/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04807	MARÍA DEL PILAR SALGADO GONZÁLEZ	11/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04799	ROSA MARÍA LÓPEZ DE LÓPEZ	11/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04543	ANA ROSA VENEGAS MARTÍNEZ	13/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04538	JOSÉ WILLIAM MÉNDEZ MORENO	13/12/2023	Autorizada Alba Dorey
MVAL_04487	ARGELIA GÓMEZ CARVAJAL	16/12/2023	Beneficiaria

MVAL_08109	CARLOS ARTURO ARIZALA FAGUA	19/12/2023	Beneficiario
MVAL_04566	CARMEN INÉS CAMARGO NAVARRO	20/12/2023	Autorizada Johana Esmeralda Serna
MVAL_08124	SAMUEL VIGUES	20/12/2023	Beneficiario
MVAL_04421	ANSELMO GARZÓN ECHEVERRI	22/12/2023	Beneficiario
MVAL_04191	MARÍA MARINA SÁNCHEZ DE ALGUTRIA	27/12/2023	Beneficiaria
MVAL_04534	JUAN ARTURO LUQUE ROBERTO	27/12/2023	Beneficiario
MVAL_04404	DORIS ACOSTA MARTÍNEZ	27/12/2023	Beneficiaria
MVAL_03902	SILVIO ROJAS BARRERA	3/01/2024	Beneficiaria
MVAL_04320	LUCIRIS CHARRY MARTÍNEZ	9/01/2024	Autorizada Hercilia Charry
MVAL_03894	NELSON CASTRO MELO	17/01/2024	*Beneficiario*
MVAL_08440	VÍCTOR HELY ESPITIA SÁNCHEZ	5/02/2024	Beneficiario
MVAL_08270	SARA ISABEL CLAVIJO DE ARAQUE	5/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08567	RUPERTO QUEVEDO MORENO	5/02/2024	Beneficiario
MVAL_08505	ROSA AURORA MÉNDEZ	5/02/2024	*Autorizado José Velásquez*
MVAL_08406	OSCAR CASTRO GARZÓN	5/02/2024	Beneficiario
MVAL_08405	MARÍA OLIVA IBÁÑEZ	5/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08562	MARÍA NERY RODRÍGUEZ DE COLO	5/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08402	MARÍA ESTELA CASTRO TORRES	5/02/2024	*Beneficiaria*
MVAL_08424	JUAN DAVID MARTIN PIEDRAHITA	5/02/2024	Beneficiario
MVAL_08264	ESMERALDA RÍOS VIDUEÑEZ	5/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08265	CARLOS CELINO ROJAS PINZÓN	5/02/2024	Beneficiario
MVAL_08446	AURA ROSA MARTÍNEZ ARANGO	5/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08436	ANA MERCEDES PINZÓN DE MARTÍNEZ	5/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08507	ALFONSO BAUTISTA SANTAMARIA	5/02/2024	Beneficiario
MVAL_08542	ROSA ELENA ÁNGEL PINILLA	6/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08535	MARÍA ALCIRA VILLAMIL PINILLA	6/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08538	MAGDA BEATRIZ AMEZQUITA CASTILLO	6/02/2024	*Autorizada Tania Cifuentes*
MVAL_08570	EZEQUIEL RODRÍGUEZ AYA	6/02/2024	Beneficiario
MVAL_08571	CELMIRA JIMÉNEZ BLANCO	6/02/2024	*Beneficiaria*
MVAL_08511	CARLOS ALIRIO DAZA SERRANO	6/02/2024	*Autorizada Melba Rachen*
MVAL_08543	BLANCA MARTTA ABREU	6/02/2024	*Autorizada Paula Ramírez*
MVAL_08585	MARTHA ISABEL ROJAS HERNÁNDEZ	7/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08590	MARÍA OLINDA ESTUPIÑÁN AGUDELO	7/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08644	MARÍA HERMINIA CORTES SANTANA	7/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08587	MAGNOLIA ARROYAVE BONILLA	7/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08262	JOHN JAROL HERRERA BOBATIVA	7/02/2024	Beneficiario
MVAL_08547	DORA ALBA MARTIN CONTRERAS	7/02/2024	Beneficiaria

MVAL_08422	BLANCA MARLENE ROMERO BERNAL	7/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08398	URIEL BELLO SÁNCHEZ	8/02/2024	Beneficiario
MVAL_08400	MARTHA LUCIA ROMERO	8/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08425	MARÍA ISABEL MORENO LOZANO	8/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08510	MARÍA INEZ ROMERO DE CAMPOS	8/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08442	HERNÁN ARAQUE PRADA	8/02/2024	Beneficiario
MVAL_08598	ALVEIRO TAPIERO FLÓREZ	8/02/2024	*Autorizada Nohemi Flórez*
MVAL_08411	MARÍA GRACIELA DIAZ VERA	9/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08515	MARÍA BERTA GORDILLO	9/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08508	FABIO REY GUTIÉRREZ	9/02/2024	Beneficiario
MVAL_08276	EVANGELISTA GONZÁLEZ CUTIVA	9/02/2024	*Autorizado Yeferson González*
MVAL_08474	BETULIA CÓRDOBA GARCÍA	9/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08461	RUBIELA MARTÍNEZ VERA	12/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08499	MARÍA DORALBA SABOGAL DE CHILATRA	12/02/2024	*Autorizado Wilder Chilatra*
MVAL_08486	LUZ MARINA BEJARANO BELTRÁN	12/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08449	JOSÉ EDWIN AGUIRRE MORENO	12/02/2024	Beneficiario
MVAL_08389	OMAIRA LINEY PASTRANA VILLALBA	13/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08415	LUIS ARNULFO PACHÓN ALONSO	13/02/2024	Beneficiario
MVAL_08758	JORGE ELIECER SALAZAR HERNÁNDEZ	13/02/2024	*Autorizado María Ramírez*
MVAL_08487	FAVIO HENRIQUE CORDERO ARAQUE	13/02/2024	Beneficiario
MVAL_08263	ELENA DIAZ OYOLA	13/02/2024	*Autorizada Ana Díaz*
MVAL_08291	EDITH HERNÁNDEZ PINTO	13/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08717	EDILSA ADELA CHAPARRO CASTILLO	13/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08513	DINA MARÍA MARROQUÍN	13/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08439	CLARA INÉS CARO ALARCÓN	13/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08650	SARA ROSA VALENCIA BETANCUR	14/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08472	ROSA ALBINA CASTELLANOS MARTÍNEZ	14/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08477	MARÍA ARACELIA VILLAMARIN CRUZ	14/02/2024	Beneficiaria
MVAL_06649	MARÍA AMPARO CAJICÁ DE GARCÍA	14/02/2024	Beneficiaria
MVAL_06636	LUZ MIRYAM VILLAMIL DE VALENCIA	14/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08469	LUZ MARY CIFUENTES CASTAÑO	14/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08678	LUIS ÁNGEL RAMÍREZ BARRAGÁN	14/02/2024	Beneficiario
MVAL_08725	SERGIO RAMÍREZ	15/02/2024	Beneficiario
MVAL_06600	EVELIO MAYORGA FONSECA	15/02/2024	Beneficiario
MVAL_08722	ELIZABETH PATIÑO USSA	15/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08462	EDELMIRA TOBAR GUTIÉRREZ	15/02/2024	*Autorizada Lisbeth Castillo*
MVAL_06286	CLARA INÉS SEGURA TORRES	15/02/2024	Beneficiaria
MVAL_06932	BLANCA CECILIA PINEDA SIERRA	15/02/2024	Beneficiaria

MVAL_08467	ARMANDO VARGAS RINCÓN	15/02/2024	Beneficiario
MVAL_06929	ADEODATO ZAMBRANO	15/02/2024	Beneficiario
MVAL_08760	SENEN MARTÍNEZ CASTAÑEDA	16/02/2024	Beneficiario
MVAL_08629	SANDRA MARITZA RUIZ PARRA	16/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08698	NATIVIDAD DE JESÚS DIAZ DIAZ	16/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08604	MARLENY FERNÁNDEZ PARRA	16/02/2024	Beneficiaria
MVAL_05279	MARÍA CECILIA CAMARGO LINARES	16/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08620	LORENA OLIVEROS AROCA	16/02/2024	*Autorizado Pedro Elías Rey*
MVAL_08617	JULIO ALBERTO VALBUENA GUTIÉRREZ	16/02/2024	Beneficiario
MVAL_08624	DANICELA GIRALDO NOVOA	16/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08653	MARÍA CECILIA ARAQUE BONILLA	16/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08652	MARÍA LUCILA TEZ CHINDOY	19/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08466	JULIO CESAR VELANDIA LÓPEZ	19/02/2024	Beneficiario
MVAL_08480	ENRIQUE MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ	19/02/2024	Beneficiario
MVAL_08715	YESENIA SILDANIA FRANCISCONI	20/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08723	SEGUNDO MELQUISEDEC PÉREZ MEDINA	20/02/2024	Beneficiario
MVAL_08381	NIRSA ELVIRA RODRÍGUEZ TARAZONA	20/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08416	IBETH ROA GARZÓN	20/02/2024	*Autorizado Camilo Andrés Roa*
MVAL_08393	HUGO ALEJANDRO PARRA SANTOS	20/02/2024	Beneficiario
MVAL_08390	NOHEMI NEIRA SABOYA	21/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08713	CARLOS ANÍBAL SALAZAR RUBIO	21/02/2024	Beneficiario
MVAL_08749	ADRIANA LUCIA CRUZ PEÑA	23/02/2024	*Autorizado Nelson Velásquez*
MVAL_08593	MARÍA YOLANDA TOVAR RAYO	26/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08447	MARÍA ELENA ALARCÓN	26/02/2024	Beneficiaria
MVAL_05263	MAGNOLIA MOLINA CARDONA	26/02/2024	Beneficiaria
MVAL_05185	GINA PAOLA LOZANO CORREAL	26/02/2024	Beneficiaria
MVAL_05195	CECILIA CHACÓN	26/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08414	BARBARA ARENAS VELA	26/02/2024	Beneficiaria
MVAL_05222	ANA JULIA ESPITIA	26/02/2024	Beneficiaria
MVAL_05334	YOLANDA MONROY CASALLAS	27/02/2024	Beneficiaria
MVAL_05281	MARÍA INÉS ROJAS CUERVO	27/02/2024	Beneficiaria
MVAL_05330	MARÍA ELSA GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ	27/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08635	MARÍA ELENA BOHÓRQUEZ CABALLERO	27/02/2024	Beneficiaria
MVAL_03888	LUIS LABREAN GÓMEZ FRAILE	27/02/2024	Beneficiario
MVAL_08431	LUIS GABRIEL LÓPEZ GIRALDO	27/02/2024	Beneficiario
MVAL_08495	LUIS FELIPE RODRÍGUEZ CESPEDES	27/02/2024	Beneficiario
MVAL_04984	JOSÉ DANIEL SUAREZ	27/02/2024	Beneficiario
MVAL_03880	JHON ROGER VARGAS VARGAS	27/02/2024	Beneficiario

MVAL_05224	JEISSON OSWALDO ESCOBAR SARMIENTO	27/02/2024	Autorizada Martha Sarmiento
MVAL_05352	JAVIER BUSTOS	27/02/2024	Beneficiario
MVAL_05193	HELIODORO SOSA FANDIÑO	27/02/2024	Beneficiario
MVAL_06599	FLOR ELBA CORTES VELANDIA	27/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08476	FABIOLA PINILLOS GARCÍA	27/02/2024	Beneficiaria
MVAL_06731	ESTEBAN VALBUENA GARCÍA	27/02/2024	Beneficiario
MVAL_05255	CARLOS ALFREDO CANCELADO SÁNCHEZ	27/02/2024	Autorizada Clementina Cancelado
MVAL_08514	ANA SILVIA MARTÍNEZ BEJARANO	27/02/2024	Beneficiaria
MVAL_05351	NELSI PÉREZ GUZMÁN	29/02/2024	Beneficiaria
MVAL_07154	NANCY GIRALDO RAMÍREZ	29/02/2024	Beneficiaria
MVAL_08230	JEISSON ALONSO ARDILA CHASOY	29/02/2024	Autorizada Victoria Chasoy
MVAL_08413	ANABEYBA MÉNDEZ LOZANO	29/02/2024	Beneficiaria
MVAL_03890	MARIBEL SANDOVAL LOZANO	1/03/2024	Beneficiaria
MV_00456	BENJAMÍN TOLOZA	5/03/2024	Beneficiario
MVAL_08478	ELEUTERIO SESQUILE PUERTA	6/03/2024	Beneficiario

10.1.2.1.4 ELABORACIÓN DE HISTORIA DE VIDA

Durante la ejecución del contrato 917 de 2023 el equipo social de contratista de obra con el acompañamiento del equipo social de interventoría, realizó la relatoría y postulación de catorce (14) beneficiarios.

Beneficiarios postulados por contratista de obra para Historias de Vida

Tabla 17 Historias de Vida postuladas

MV	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREVISTA	AUTORIZACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES	RELATORÍA
MVAL_07472	María Dolores Hinestroza Cuesta	10/08/2023	SI	SI
MVAL_07792	Catalina López Rodríguez	25/08/2023	SI	SI
MVAL_07935	Cecilia Apache De León	24/08/2023	SI	SI

MVAL_07709	Luz Stella González Rodríguez	31/07/2023	SI	SI
MVAL_07900	Hermes Mendoza Cubides	31/07/2023	SI	SI
MVAL_06832	Clara Villarraga Martínez	24/08/2023	SI	SI
MVAL_073654	Eimmy Yesenia Medina Ramírez	29/08/2023	SI	SI
MVAL_04488	MARIA PRISCILA TORRES	27/11//2023	SI	SI
MVAL_04469	ANA CELIA GAMBOA	27/11//2023	SI	SI
MVAL_04505	FLOR EMILCE AVILA QUIROGA	27/11//2023	SI	SI
MVAL_04494	MARIA FRANCY YATE	27/11//2023	SI	SI
MVAL_04326	RUTH RAMÍREZ RIVERA	27/11//2023	SI	SI
MVAL_04356	MARIO EMILIO DAZA	27/11//2023	SI	SI
MVAL_04382	JOSE DAVID VÁSQUEZ SÄNCHES	27/11//2023	SI	SI

Estas postulaciones se realizaron con el propósito de reconstruir y reflexionar a partir de la memoria y tener experiencias y vivencias propias de la comunidad, a las cuales se les realizó una entrevista semiestructurada la cual fue el insumo para la elaboración de la relatoría, las personas beneficiarias firmaron el formato de autorización de medios audiovisuales.

A la interventoría Interel 2023 se le hizo entrega de los formatos de relatoría y autorización de medios audiovisuales.

La SDHT realizó la escogencia de tres (3) historias de vida como lo estipula el anexo técnico.

Beneficiarios escogidos por SDHT para Historia de vida

Tabla 18 Historias de Vida seleccionadas

MV	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	ESTADO MV	FECHA DE ENTREVISTA	AUTORIZACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES	RELATORÍA	FECHA REGISTRO FÍLMICO
MVAL_07472	María Dolores Hinestroza Cuesta	Entregado	10/08/2023	SI	SI	8/09/2023
MVAL_04382	José David Vásquez Sánchez	Validado	27/11/2023	SI	SI	
MVAL_04488	María Priscila Torres	Entregado	27/11/2023	SI	SI	

En relación a las historias de vida seleccionadas por la SDHT, el área de comunicaciones solo realizó el registro fílmico del antes del MVAL_07472 María Dolores Hinestroza Cuesta.

El registro fílmico del antes, durante y después de cada una de las viviendas de los beneficiarios seleccionados para historias de vida, era una función y responsabilidad de la SDHT, la cual no realizaron durante la ejecución de las actividades de obras.

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe las tres historias de vida seleccionadas por la SDHT, que corresponde al anexo número siete (7) denominado Historia de Vida.

10.1.2.2 FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS

En el PGS en la fase de ejecución de obras el objetivo fue Protocolizar el proceso de obras generando un espacio con el hogar beneficiario para dar inicio al proceso constructivo en las viviendas Validar la información entregada por la Secretaría Distrital

del Hábitat -SDHT y verificar el estado actual de cada una de las viviendas (componente social y técnico).

Las metas que se propusieron realizar durante la fase de validación fueron las siguientes:

- Apertura de obra
- Visita de seguimiento social
- Atención de petición, quejas, reclamos y sugerencias
- Atención de Postventas

10.1.2.2.1 APERTURA DE OBRA

El equipo técnico y social de contratista de obra con el acompañamiento del equipo técnico y social de interventoría durante la ejecución del contrato 917 de 2023 realizó un total de trescientas noventa y cinco (395) aperturas.
Para ello el equipo social de contratista de obra concretó vía telefónica con las familias beneficiarias la visita de apertura, en esta se sensibilizó a las familias beneficiarias las recomendaciones generales del proceso de ejecución de obra las cuales están contenidas en el acta técnico social de inicio de obras y se dio apertura de la bitácora de obra donde se consignó las observaciones o recomendaciones al hogar.
En este espacio se socializó los horarios de atención en el Punto de atención a la comunidad, correo electrónico y número telefónico de contacto de contratista de obra e interventoría. Así mismo se socializó las intervenciones de obra a ejecutarse en la vivienda y firma de documentación (Presupuesto inicial, Carta de buen trato y acta técnico social de inicio de obras).

10.1.2.2.2 VISITAS DE SEGUIMIENTO SOCIAL

El equipo social de contratista de obra con acompañamiento del equipo social de interventoría realizó visitas de seguimiento social a cada uno de los mejoramientos de viviendas que se encontraban con ejecución de obras, esto se realizó con el objetivo de brindar atención oportuna a cada uno de los beneficiarios ante sus dudas, inquietudes,

peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias que se presenten durante la ejecución.

Estas visitas de seguimiento se consignaban en cada una de las bitácoras de obra.

De igual manera durante la ejecución del contrato 917 de 2023 se llevaron a cabo seguimientos relevantes en compañía de la SDHT, interventoría y contratista de obra.

A continuación, se enlistan los seguimientos relevantes que se llevaron a cabo en la ejecución del contrato de obra 917 de 2023.

Tabla 19 Seguimientos Relevantes

MV	DIRECCIÓN	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
MVAL_07874	KR 6 ESTE 81 C 53 SUR	LUIS EDISON SUAREZ GONZALEZ	01/08/2023	Sin elementos estructurales para instalación de cubierta y pisos en tierra en áreas de cocina y sala. Se requiere de revalidación por parte de los profesionales técnicos para definir áreas a priorizar.
MVAL_07933	CL 81C SUR 3A 09 ESTE	PEDRO OSWALDO MORA DIAZ	01/08/2023	Sin elementos estructurales para instalación de cubierta.
MVAL_07581	KR 10 BIS ESTE 81C 27 SUR	JOHN JAIRO GARCIA PUENTES	01/08/2023 09/08/2023	Sin elementos estructurales para instalación de cubierta. Se realizó visita con el especialista estructural de la SDHT con el fin de determinar las actividades a ejecutarse.
MVAL_07708	KR 6D ESTE 81C 35 SUR	BELLA RUTH OSORIO	01/08/2023 09/08/2023	Sin elementos estructurales para instalación de cubierta y baño. Se realizó visita con el especialista estructural de la SDHT con el fin de determinar las actividades a ejecutarse.
MVAL_07718	KR 6D ESTE 81 C- 27 SUR	MARINA MORENO ROJAS	01/08/2023	Se acuerda realizar el desmote del cielo raso y conservar los muros de madera. Se priorizarán las demás áreas según el alcance del presupuesto.

MVAL_07708	KR 6D ESTE 81C 35 SUR	BELLA RUTH OSORIO	13/09/2023	Visita con profesional estructural de la SDHT, donde se prioriza las áreas de baño, lavadero y cubierta. Realizar refuerzo en suelo de las áreas de baño y lavadero.
MVAL_07472	CL 87ª BIS SUR 9-32 ESTE	MARIA DOLORES HINESTROZA CUESTA	23/10/2023	Avance en la ejecución de las obras realizadas en el MV de Historia de vida.
MVAL_07339	CL 87ª BIS SUR 10-42 ESTE	ANA STELLA GARZÓN CUCARIANO	23/10/2023	Cierre de PQRS
MVAL_07731	KR 6 ESTE 81C 15 SUR	YUBICEY CARDENAS GARZÓN	16/11/2023	Auditoria internas SDHT
MVAL_07035	CL 88ª SUR 8-70 ESTE	PEDRO HUMBERTO QUINTANA SANCHEZ	16/11/2023	Auditoria internas SDHT
MVAL_07042	CAL 88ª SUR 8-32 ESTE	JOSE MANUEL RAMIREZ BUITRAGO	16/11/2023	Auditoria internas SDHT
MVAL_06941	CL 88ª SUR 9-45 ESTE	FABIO ANTONIO LOPEZ SALAZAR	16/11/2023	Auditoria internas SDHT
MVAL_07774	KR 7 ESTE 81ª-03 SUR	ANA ELIN JEREZ	16/11/2023	Auditoria internas SDHT
MVAL_07708	KR 6D ESTE 81C 35 SUR	BELLA RUTH OSORIO FLORIDO	22/11/2023	Visita de seguimiento a obras ejecutadas en el MV.
MVAL_04604	CL 97B SUR 7D 22 ESTE	ADIELA MARIA QUIROZ SANCHEZ	22/11/2023	Visita de acompañamiento para definir actividades de obra a ejecutar en el MV.
MVAL_04792	KR 6C ESTE 91-46 SUR	HILDA CECILIA FORERO ARIAS	22/11/2023	Visita de acompañamiento para definir actividades de obra a ejecutar en el MV.
MVAL_07411	CL 87B BIS SUR 10-22 ESTE	MARCO TULIO GONZALEZ	21/12/2023	Visita de postventa con SDHT.
MVAL_04189	KR 6F ESTE 97D 04 SUR	ANA BRICEIDA AMADO	19/01/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_04569	KR 7C ESTE 97B 26 SUR	JESUS MARIA MONTAÑO VALENCIA	19/01/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_04552	KR 7B ESTE 97B 26 SUR	ALCIRA ISABEL MARTINEZ URREGO	19/01/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_04620	CL 91 SUR 7D 21 ESTE	MARIA DEL CARMEN MORENO CASTILLO	19/01/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_04838	KR 6ª ESTE 91-70 SUR	MYRIAM AREVALO HERRERA	19/01/2024	Visita de seguimiento con SDHT.

MVAL_04382	KR 6B ESTE 97B-40 SUR	JOSE DADID VASQUEZ SANCHEZ	19/01/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_04404	CL 97D SUR 6C-20 ESTE	DORIS ACOSTA MARTINEZ	19/01/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_04320	KR 6 ESTE 97D 22 SUR	LUCIRIS CHARRY MARTINEZ	19/01/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08585	CL 84ª SUR 2-38 ESTE	MARTHA ISABEL ROJAS HERNANDEZ	8/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT- Concepto técnico.
MVAL_08542	CL 84ª SUR 1-65 ESTE	ROSA ELENA ANGEL PINILLA	8/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT- Concepto técnico.
MVAL_08535	CL 84ª SUR 1-23 ESTE	MARIA ALCIRA VILLAMIL PINILLA	9/02/2024	Visita de seguimiento por parte de contratista de obra e interventoría. Concepto técnico social.
MVAL_08424	CL 83 SUR 1B-13 ESTE	JUAN DAVID MARTIN PIEDRAHITA	19/02/2024	Visita de seguimiento por parte de contratista de obra e interventoría con el objetivo de aclarar dudas al beneficiario.
MVAL_08505	CL 84C SUR 2-32 ESTE	ROSA AURORA MENDEZ	21/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08486	KR 4 ESTE 83ª 23 SUR	LUZ MARINA BEJARANO BELTRAN	21/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08499	DG 83B SUR 3B-15 ESTE	MARIA DORALBA SABOGAL	21/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08535	CL 84ª SUR 1-23 ESTE	MARIA ALCIRA VILLAMIL PINILLA	21/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08542	CL 84ª SUR 1-65 ESTE	ROSA ELENA ANGEL PINILLA	21/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08543	CL 84ª SUR 1-71 ESTE	BLANCA MARTTA ABREU	21/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08400	CL 82 SUR 1ª-17 ESTE	MARTHA LUCIA ROMERO	21/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08587	CL 84ª SUR 2-08 ESTE	MAGNOLIA ARROYAVE MOLINA	21/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08436	TV 2ª ESTE 83-27 SUR	ANA MERCEDES PINZON	21/02/2024	Visita de seguimiento con SDHT.

MVAL_08590	CL 84ª SUR 1-60 ESTE	MARIA OLINDA ESTUPIÑAN AGUDELO	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08398	CL 83 SUR 1ª 05 ESTE	URIEL BELLO SANCHEZ	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08270	TV 2 ESTE 83-35 SUR	SARA ISABEL CLAVIJO DE ARAQUE	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08276	CL 83 SUR 1B-23 ESTE	EVANGELISTA GONZALEZ CUTIVA	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08508	CL 84B SUR 2-17 ESTE	FABIO REY GUTIERREZ	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08510	CL 84B SUR 2-39 ESTE	MARIA INEZ ROMERO DE CAMPOS	12/03/2024	Visita de seguimiento con SDHT.
MVAL_08538	CL 84A SUR 1 41 ESTE	MAGDA BEATRIZ AMEZQUITA CASTILLO	2/04/2024	Visita de verificación de instalación de cubiertas
MVAL_08562	CL 84C SUR 2 53 ESTE	MARIA NERY RODRIGUEZ DE COLO	2/04/2024	Visita de verificación de instalación de cubiertas.
MVAL_08088	CL 79 SUR 2 83 ESTE	YOLANDA LOPEZ GUACANEME	2/04/2024	Visita de verificación de instalación de cubiertas
MVAL_08148	CL 78A SUR 3 61 ESTE	JESUS ANTONIO BUSTACARA FUENTES	2/04/2024	Visita de verificación de instalación de cubiertas
MVAL_08150	CL 78A SUR 3 67 ESTE	ROSA CELIA LOBATON HERNANDEZ	2/04/2024	Visita de verificación de instalación de cubiertas
MVAL_07718	KR 6D ESTE 81 C- 27 SUR	MARINA MORENO ROJAS	2/04/2024	Visita de verificación de instalación de cubiertas
MVAL_07832	KR 6 ESTE 81 C 72 SUR	LUZ MYRIAM ESCOBAR	2/04/2024	Visita de verificación de instalación de cubiertas
MVAL_07834	KR 6 ESTE 81 C 60 SUR	ROSALBA HERNANDEZ	2/04/2024	Visita de verificación de instalación de cubiertas
MVAL_07810	KR 6 BIS ESTE 81C 46 SUR	LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR	2/04/2024	Visita de verificación de instalación de cubiertas
MVAL_08567	CL 84C SUR 2 23 ESTE	RUPERTO QUEVEDO MORENO	17/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_07817	CL 81 C SUR 6-45 ESTE	IRMA LUCIA ROZO ROZO	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_08587	CL 84A SUR 2 08 ESTE	MAGNOLIA ARROYAVE BONILLA	17/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.

MVAL_08570	CL 84C SUR 1 71 ESTE	EZEQUIEL RODRIGUEZ AYA	17/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_08265	TV 2 ESTE 83 65 SUR	CARLOS CELINO ROJAS PINZON	17/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_04513	KR 7A ESTE 97B 50 SUR	ANA ISABELINA SORIA RODRIGUEZ	17/05/2024	Visita de seguimiento a obras ejecutadas en el MV.
MVAL_08151	CL 78A SUR 3 71 ESTE	REGULO LOPEZ DIAZ	16/05/2024	Visita de acompañamiento para definir actividades de obra a ejecutar en el MV.
MVAL_08124	CL 79 SUR 3 68 ESTE	SAMUEL VIRGUES	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_08133	CL 79 SUR 3 18 ESTE	JESUS DAVID ARIAS BETANCOURT	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_08143	CL 78A SUR 3 29 ESTE	DORALBA MURCIA CHAPARRO	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_08161	CL 79A SUR 3 64 ESTE	JOSE ARNOBI HERRERA LOPEZ	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_08219	CL 79A SUR 3 53 ESTE	MARIA MARLENY HERRERA LOPEZ	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_08206	KR 3 ESTE 79A 12 SUR	ERNESTO MEDINA CLAROS	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_07786	KR 7 ESTE 81A 20 SUR	VERONICA CASTAÑEDA VILLAMIL	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_07954	KR 3A ESTE 81C 41 SUR	ANGIE JULLIET CASTELLANOS SANCHEZ	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_07708	KR 6D ESTE 81C 35 SUR	BELLA RUTH OSORIO FLORIDO	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_07866	CL 81 C SUR 5 13 ESTE	JOSE DE JESUS LOPEZ ROMERO	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_07874	KR 6 ESTE 81 C 53 SUR	LUIS EDILSON SUAREZ GONZALEZ	16/05/2024	Visita de inspección técnica para definir intervención en cubierta.
MVAL_08389	KR 7 ESTE 90A 03 SUR	OMAIRA PASTRANA VILLALBA	5/06/2024	Visita de seguimiento con acompañamiento de SDHT e interventoría.
MVAL_08477	KR 7A ESTE 90A 26 SUR	MARIA ARACELIA VILLAMARIN CRUZ	5/06/2024	Visita de seguimiento con acompañamiento de SDHT e interventoría.
MVAL_05279	CL 84B SUR 0 66 ESTE	MARIA ELENA BOHORQUEZ CABALLERO	5/06/2024	Visita de seguimiento con acompañamiento de SDHT e interventoría.
MVAL_07935	CL 81C SUR 3ª 21 ESTE	CECILIA APACHE DE LEÓN	5/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar las condiciones en que fue entregada la vivienda y posible inspección para auditoría interna.

MVAL_07900	KR 4ª ESTE 81C 34 SUR	HERMES MENDOZA CUBIDES	5/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar las condiciones en que fue entregada la vivienda y posible inspección para auditoría interna.
MVAL_07779	CL 81C SUR 7 26 ESTE	MARCO ANTONIO ALIPIO PATIÑO	5/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar las condiciones en que fue entregada la vivienda y posible inspección para auditoría interna.
MVAL_08722	CL 83 SUR 0 25 ESTE	ELIZABETH PATIÑO USSA	5/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar las condiciones en que fue entregada la vivienda y posible inspección para auditoría interna.
MVAL_08477	KR 7A ESTE 90A 26 SUR	MARIA ARACELIA VILLAMARIN CRUZ	12/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar el avance y posible inspección para auditoría interna.
MVAL_08381	TV 1ª ESTE 83 21 SUR	NIRSA ELVIRA RODRIGUEZ TARAZONA	5/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar el avance y posible inspección para auditoría interna.
MVAL_08644	CL 84B SUR 0 30 ESTE	MARIA HERMINIA CORTES SANTANA	5/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar el avance y posible inspección para auditoría interna
MVAL_08495	KR 3 BIS ESTES 82 49 SUR	LUIS FELIPE RODRIGUEZ CESPEDES	12/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar el avance y posible inspección para auditoría interna
MVAL_08511	CL 84B SUR 2 65 ESTE	CARLOS ALIRIO DAZA SERRANO	12/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar las condiciones en que fue entregada la vivienda y posible inspección para auditoría interna.
MVAL_03890	KR 6A ESTE 97F 32 SUR	MARIBEL SANDOVAL LOZANO	12/06/2024 13/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar el avance y posible inspección para auditoría interna. Vivienda visita para auditoría interna de SDHT.
MVAL_03888	KR 6A ESTE 97F 27 SUR	LUIS LABREAN GOMEZ FRAILE	12/06/2024 13/06/2024	Visita con la SDHT e interventoría para evaluar el avance y posible inspección para auditoría interna. Vivienda visita para auditoría interna de SDHT.
MVAL_05185	KR 7C ESTE 90A 58 SUR	GINA PAOLA LOZANO CORREAL	19/06/2024	Visita de seguimiento con acompañamiento de SDHT e interventoría.
MVAL_05281	KR 7 ESTE 90A 03 SUR	MARIA INES ROJAS CUERVO	19/06/2024	Visita de seguimiento con acompañamiento de SDHT e interventoría.

MVAL_05224	KR 7A ESTE 90A 26 SUR	JEISSON OSWALDO ESCOBAR SARMIENTO	19/06/2024	Visita de seguimiento con acompañamiento de SDHT e interventoría.
MVAL_08725	CL 83 SUR 0 43 ESTE	SERGIO RAMIREZ	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08629	CL 83 SUR 0 43 ESTE	SANDRA MARITZA RUIZ PARRA	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08442	TV 2ª ESTE 83 62 SUR	HERNAN ARAQUE PRADA	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08390	TV 1A ESTE 83 64 SUR	NOHEMI NEIRA SABOYA	17/07/2024 19/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08381	TV 1 A ESTE 83 21 SUR	NIRSA ELVIRA RODRIGUEZ TARAZONA	17/07/2024 19/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_07154	CRA 6ª ESTE 97F 32 SUR	JHON ROGER VARGAS VARGAS	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_05281	KR 7 ESTE 90A 03 SUR	MARIA INES ROJAS CUERVO	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08389	TV 1ª EDTE 83 70 SUR	OMAIRA LINEY PASTRANA VILLALBA	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08447	TV 2A ESTE 83 62 SUR	MARIA ELENA ALARCON	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08469	CL 84B SUR 0 30 ESTE	LUZ MARY CIFUENTES CASTAÑO	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08393	KR 3B ESTE 82 17 SUR	HUGO ALEJANDRO PARRA SANTOS	17/07/2024 19/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_06599	CL 88B SUR 7B 17 ESTE	FLOR ELBA CORTES VELANDIA	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_03888	KR 6ª ESTE 97F 27 SUR	LUIS LABREAN GOMEZ FRAILE	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08635	CL 84B SUR 0 66 ESTE	MARIA ELENA BOHORQUEZ CABALLERO	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_05185	KR 7C ESTE 90ª 58 SUR	GINA PAOLA LOZANO CORREA	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08478	KR 3B ESTE 82 08 SUR	ELEUTERIO SESQUILE PUERTA	17/07/2024 19/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_05195	CL 90A SUR 7C 19 ESTE	CECILIA CHACON	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_08466	KR 3 BIS ESTE 82 04 SUR	JULIO CESAR VELANDIA LOPEZ	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.

MVAL_08713	CL 83 BIS SUR 0 64 ESTE	CARLOS ANIBAL SALAZAR RUBIO	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_05281	KR 7 ESTE 90A 03 SUR	MARIA INES ROJAS CUERVO	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.
MVAL_03890	KR 6ª ESTE 97F 32	MARIBEL SANDOVAL LOZANO	17/07/2024	Visita con SDHT e interventoría para evento de entregas protocolarias.

10.1.2.2.3 ENTREGA DE LA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

El equipo técnico social de contratista de obra con el acompañamiento del equipo técnico y social de interventoría durante la ejecución del contrato 917 de 2023 realizó un total de trescientas noventa y cinco (395) entregas a satisfacción a los beneficiarios.
En esta actividad se hizo la protocolización de la entrega del mejoramiento para el disfrute del hogar.
El equipo social socializó con cada una de las familias las recomendaciones del manual de uso, conservación y mantenimiento de las obras de mejoramiento de vivienda; el manual de saneamiento y buenos hábitos de higiene y salud en el hogar; así mismo explicó a cada una de las familias beneficiarias acerca de la separación de residuos sólidos desde la vivienda y el uso del Kit ecológico que está conformado por tres canecas de color verde, blanco y negra.
También se socializó en cada una de las entregas el tiempo de garantía del mejoramiento de vivienda y los canales de atención de la Secretaría Distrital de Hábitat _ SDHT por si requieren hacer efectivas las garantías en sus mejoramientos.

Durante esta visita de entrega de las obras de mejoramiento se realizó la firma de la documentación (Acta de entrega física y recibo a satisfacción (presupuesto final de obra); Acta de mayores y menores (donde aplique); recibido del manual de uso, conservación y mantenimiento de las obras de mejoramiento de vivienda y manual de saneamiento y buenos hábitos de higiene y salud en el hogar; firma de nota de entrega del mejoramiento de vivienda la cual se consignó en Bitácora de obra.)

Una vez se hizo la entrega del mejoramiento de vivienda y este se recibió a satisfacción por la persona beneficiaria o la persona autorizada se procedió a retirar la bitácora de la vivienda y se informó a cada una de las personas que reciben el mejoramiento de vivienda que los documentos que se firmaron durante el proceso de la ejecución del Programa de

Vivienda en la modalidad de habitabilidad reposaran en la SDHT y si en algún momento requieren copia de los mismos los pueden solicitar ante la entidad.

Tabla 20 Entregas de Mejoramiento de Vivienda

MV	NOMBRE BENEFICIARIO (A) - SEGÚN RESOLUCION DE ASIGNACION DEL SUBSIDIO - BASE DE DATOS ENTREGADA	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
MVAL_07709	LUZ STELLA GONZALEZ RODRIGUEZ	8/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07826	ROSA MARIA AGUILERA DIAZ	11/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07742	MAYURI BENITEZ FIRIGUA	13/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07697	MARIA SILVIA ALVAREZ	13/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07786	VERONICA CASTAÑEDA VILLAMIL	15/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07699	MARIA DE LAS MERCEDES VILLARRAGA	15/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07779	MARCO ANTONIO ALIPIO PATIÑO	15/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07792	CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ	15/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07720	TILCIA ADARME DE SANCHEZ	18/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07915	EDUBINA MIRANDA GOMEZ	18/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07725	BLANCA MARINA DIAZ DE SASTOQUE	19/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07619	ANA ELVIA MARTINEZ MORALES	19/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07774	ANA ELIN JEREZ	19/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07824	ADOLFO CARO PIRATEQUE	19/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07716	STERNS FRANCI PORTELA HERRERA	20/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07711	NAYDILIA MONCADA LEON	20/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07911	MYRIAM PILAR CARVAJAL ALVARADO	20/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07935	CECILIA APACHE DE LEON	20/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07884	LUIS EDUARDO QUINTERO BOJACA	26/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07719	JOSE GABRIEL DUITAMA GARCIA	27/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07937	DORA INES VEGA CHACON	27/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07731	YUBICEY CARDENAS GARZON	28/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07692	MARIA DEL CARMEN OCAMPO MELGAREJO	28/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07609	CONCEPCION RODRIGUEZ MARTIN	28/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07954	ANGIE JULLIET CASTELLANOS SANCHEZ	28/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07908	FREDY RICARDO BONILLA SUAZA	29/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07921	ANA LUCIA ROA RODRIGUEZ	29/09/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07837	FLOR MARINA COBOS SORIANO	4/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07644	BLANCA AMERICA QUINTERO CORREDOR	4/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07834	ROSALBA HERNANDEZ	6/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07575	ROCIO RIVERA HERRERA	6/10/2023	Recibida a satisfacción

MVAL_07777	OSCAR ALEXANDER MONROY BALAGUERA	6/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07832	LUZ MYRIAM ESCOBAR	6/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07410	LUIS ANTONIO TRIANA TORRES	6/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07810	LUIS ALBERTO MARIÑO CORREDOR	6/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07641	JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07603	JOSE ALIRIO CAICEDO MORENO	6/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07639	GLORIA STELLA SANCHEZ PARRA	6/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07876	FABIAN ANDRES SALAMANCA SILVA	6/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06941	FABIO ANTONIO LOPEZ SALAZAR	9/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07411	MARCO TULIO GONZALEZ	10/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07675	LIDA OFELIA URREGO UBATE	10/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07466	MARIA FABIOLA CASTAÑEDA HIDALGO	11/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07791	LUIS ANTONIO BUITRAGO ZAMBRANO	11/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07900	HERMES MENDOZA CUBIDES	11/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07693	BERLY AZUCENA PASTRAN ANTONIO	11/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07690	ANA VICTORIA MENDOZA TIBATA	11/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07652	LUIS ALVARO RODRIGUEZ GIRALDO	12/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07657	HERNANDO ADARME PAEZ	12/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07476	PEDRO ALONSO RIVERA CASTAÑEDA	13/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07478	MARTHA FUERTE	13/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07645	JORGE LOZANO GARZON	13/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07658	DINACELI CARDONA VALENCIA	13/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07557	ANDRES ANTONIO RIVAS MOLINA	13/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07588	SANDRA CONSUELO ACUÑA ESPITIA	17/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07855	MARTHA LUCERO GIRALDO ROJAS	17/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07866	JOSE DE JESUS LOPEZ ROMERO	17/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07770	LUIS DOMINGO PEREZ ROMERO	18/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07510	SANDRA MILENA RIVERA CASTILLO	19/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07035	PEDRO HUMBERTO QUINTANA SANCHEZ	19/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07650	MARILUZ MARTINEZ RODRIGUEZ	19/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07636	ERICSON LAVERDE HERNANDEZ	19/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07592	JOHN ALEXANDER REYES JIMENEZ	21/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07377	YEIMY YAGUARA TAPIA	24/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06337	MARIA BENILDA HERNANDEZ BAEZ	24/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07042	JOSE MANUEL RAMIREZ BUITRAGO	24/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07364	EIMMY YESSENIA MEDINA RAMIREZ	24/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07463	BLANCA LEONOR VILLAMARIN JIMENEZ	24/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06998	AMADEO CIFUENTES ORJUELA	24/10/2023	Recibida a satisfacción

MVAL_06700	MARIA ESTELA MOJICA DE QUINTERO.	27/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06683	GLADYS GONZALEZ SABOGAL	27/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06874	RAFAEL HUMBERTO PRIETO ORJUELA	31/10/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06750	YENY ANDREA MARTINEZ GARCIA	1/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07472	MARIA DOLORES HINESTROZA CUESTA	1/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06837	JINETH PAOLA MELO DONOSO	1/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07509	HORACIO HERNANDEZ MARTINEZ	2/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06824	OLGA LUCIA RODRIGUEZ	3/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07341	DIOSELINA OCHOA DE BARON	3/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07708	BELLA RUTH OSORIO FLORIDO	3/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07433	ANA PATRICIA LANZA OURIZA	3/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07444	ANA DOLORES NOVOA VARGAS	3/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07586	MARILUZ BENITEZ FIRIGUA	7/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06749	DIEGO RENE DIAZ RIVERA	7/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07434	WILLINTON ASCENCIO MONTIEL	8/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07718	MARINA MORENO ROJAS	8/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07874	LUIS EDILSON SUAREZ GONZALEZ	8/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07600	JAIRO IVAN GARCIA REYES	8/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08031	JOSE FREDY RODRIGUEZ	8/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06833	YUDY ESPERANZA ALFONSO BARRETO	9/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07516	DANIEL RICARDO VARGAS	9/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06832	CLARA CARLOTA VILLARRAGA MARTINEZ	9/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07339	ANA STELLA GARZON CUCARIANO	9/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06724	ALBA NURY TORRES MORALES	9/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08151	REGULO LOPEZ DIAZ	9/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07336	GABRIEL GARZON	10/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08104	JOSE PABLO ROMERO MENGUAN	10/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08084	AMELIA DE JESUS SOTO LLANEZ	10/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08081	CLARA RITA LOPEZ SANTAMARIA	10/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07581	JOHN JAIRO GARCIA PUENTES	11/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08120	MARIA LUZ DARY HERRERA GIRALDO	11/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08133	JESUS DAVID ARIAS BETANCOURT	11/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07436	EDMY YANNET MUNERA VERGARA	14/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06613	DIEGO ANDRES MORA NIEVES	14/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08150	ROSA CELIA LOBATON HERNANDEZ	14/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08140	CLAUDIA YANETH CHAPARRO BERNAL	14/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07973	BENILDA PATIÑO USSA	14/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08076	SANDRA JEANNETTE GUERRERO DAZA	14/11/2023	Recibida a satisfacción

MVAL_08184	MARIA DEL CARMEN FAJARDO	14/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07852	MARIA EUGENIA BETANCUR JIMENEZ	16/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07817	IRMA LUCIA ROZO ROZO	16/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08065	SANDRA MILENA CAMARGO VELASCO	22/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08088	YOLANDA LOPEZ GUACANEME	22/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08046	ALCIRA SOTO LLANES	22/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07445	SERVANDO BUSTOS GRANADOS	23/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07332	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA	23/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08143	DORALBA MURCIA CHAPARRO	23/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07933	PEDRO OSWALDO MORA DIAZ	24/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06838	EUSTACIO ALVAREZ	24/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08137	GLADYS OFELIA SOLORZANO LOPEZ	24/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08142	LUZ MARY BAQUERO ESCOBAR	24/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07999	DOLORES LONDOÑO AGUILAR	24/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08037	PEDRO JULIO ORTIZ MUÑOZ	24/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08119	CLARA INES VARGAS AGUILAR	24/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08099	ANA MILENCY MOSQUERA MOSQUERA	24/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08206	ERNESTO MEDINA CLAROS	24/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08148	JESUS ANTONIO BUSTACARA FUENTES	27/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08196	MARIA XIMENA RODRIGUEZ FAJARDO	27/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07712	RAFAEL TOVAR BAUTISTA	28/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06648	ELIZABETH RIVERA ROJAS	28/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08113	MARIA ISMAELINA SALAZAR HERNANDEZ	28/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06646	ROSALBA ZAMBRANO HERNANDEZ	29/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06816	MARIELA RIOS BARBOSA	29/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06249	MARIA HERCILIA FLOREZ ROMERO	29/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08144	LEONOR CHAPARRO CARRILLO	29/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08101	MARIBEL GARCIA HERNANDEZ	29/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08052	JACKELINE OMES MORALES	29/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08051	ERNESTINA FONTECHA SANTAMARIA	29/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08226	HILDA ALCIRA CASTIBLANCO HERNANDEZ	29/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08170	MARIA ZENAIDA GOMEZ MIRANDA	30/11/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07660	MARLENI RAGA HURTADO	4/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07983	NELSON ANDRES HERNANDEZ CARDENAS	4/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_06169	ALBA MERY GARCIA HERNANDEZ	5/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08000	MARIA ANUNCIACION SANCHEZ BELLO	5/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08029	DIOSELINA SANCHEZ ROMERO	5/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04204	BLANCA CECILIA DIAZ PEÑA	5/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04488	MARIA PRISCILA TORRES DE MARTINEZ	6/12/2023	Recibida a satisfacción

MVAL_08028	LUIS EDUARDO AMAYA PULIDO	7/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08161	JOSE ARNOBI HERRERA LOPEZ	7/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08160	DORA BAQUERO ESCOBAR	7/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04430	FERNANDO LEGUIZAMON ROJAS	7/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04603	MARIA HELENA GOMEZ PEREZ	7/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04270	JAVIER ARMANDO QUIMBAY URREGO	8/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04275	PILAR ALVARADO SIERRA	8/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08174	ANA ADELAIDA GAMBOA CUERVO	11/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08008	GLORIA ROCIO RINCON PEÑUELA	11/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08023	GINA PAOLA APONTE GARCIA	11/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08167	CARLOS HERNANDO LOBATON HERNANDEZ	11/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08224	MARIA YOLANDA MATTA MONROY	11/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04503	ERIBERTO CUADROS CUADROS	11/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08227	EDISON FERNANDO ROJAS MEDINA	12/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08165	MARIA ADELA GONZALEZ FUNEME	13/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08219	MARIA MARLENY HERRERA LOPEZ	13/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04207	MANUEL HERNAN RIVERA RIAÑO	13/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04326	RUTH STELLA RAMIREZ RIVERA	13/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04327	MARIA ROSA HERNANDEZ BOHORQUEZ	13/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08019	MYRIAM YESENIA GONZALEZ RUIZ	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08014	ELOISA MORA DE CASTILLO	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08126	MYRIAM STELLA GUTIERREZ MORENO	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_08212	MARIA NANCY DIAZ HERRERA	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04504	ANA ELIZABETH MARANTA VARGAS	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04505	FLOR EMILCE AVILA QUIROGA	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04257	ROSA ELENA BORDA MORENO	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04273	LUZ PERLA DUCUARA	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04600	EMILIA PATIÑO	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04209	WILSON ALFONSO DIAZ LEMUS	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04210	OTILIA RIVERA GARCIA	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04310	ARMELIDA TRUJILLO ANDRADE	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04379	JOSE MARCEL TOVAR LAGUNA	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04366	ELVIRA SOTO DIAZ	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04419	FABIOLA CAMPOS	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04385	ANA LUCIA RAMOS LINARES	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04296	LUIS ALONSO GRACIANO CASTAÑO	14/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04674	EFRAIN CONTRERAS COLMENARES	15/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04252	MAXIMILIANO RAMOS MARTINEZ	15/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04269	MARIA MELBA GARCIA	15/12/2023	Recibida a satisfacción

MVAL_04213	RAUL ANTONIO PINEDA SUAREZ	15/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04356	MARIO EMILIO DAZA HERNANDEZ	15/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04189	ANA BRICEIDA AMADO TRASLAVIÑA	15/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04278	HECTOR RUBIO MARTINEZ	15/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04335	ANA LUCIA CASTRO DE COLMENARES	15/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04297	EMILIO GUTIERREZ	20/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_07543	JORGE MAURICIO SALCEDO	22/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04658	FREDY ALBERTO GUZMAN AREVALO	22/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04613	JORGE RIAÑO	22/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04455	OLGA CECILIA CARANTON	22/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04201	JUAN CARLOS PULIDO ARIAS	27/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04510	CECILIA MONJE RODRIGUEZ	28/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04512	MARGARITA ACUÑA RIVERA	28/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04691	YOLA DEL CARMEN GUERRERO MARTINEZ	28/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04437	LUZ EDIT INFANTE OSORIO	28/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04792	HILDA CECILIA FORERO ARIAS	28/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04802	ELVIRA VALERO DE FONSECA	29/12/2023	Recibida a satisfacción
MVAL_04599	OLIVIA ANACONA BENAVIDES	5/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04632	ANA SILVIA PARADA GOMEZ	5/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04697	JHON FAIVER DUQUE PRECIADO	6/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04597	SANTOS VARGAS	9/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04673	GRACIELA CUELLAR GRASS	9/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04469	ANA CELIA GAMBOA SALAMANCA	9/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04699	MELBA NORA RAMOS MONTOYA	10/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04575	LUIS EDUARDO MARTIN LEON	10/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04716	ANGIE MILENA CHINGATE	10/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04538	JOSE WILLIAM MENDEZ MORENO	10/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04202	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ ANTONIO	10/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04391	SERGIO ELADIO OSPINA GOMEZ	10/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04498	ANA MERCEDES VILLAMIL	10/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08109	CARLOS ARTURO ARIZALA FAGUA	10/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04586	GILBER ANTONIO MORA ORTIZ	11/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04604	ADIELA MARIA QUIROZ SANCHEZ	12/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04306	MARYLU RINCON VALENZUELA	12/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04473	PABLO RAMIREZ	12/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04376	ANA CLOTILDE MORENO BERNAL	15/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04578	ALEJANDRO ROJAS GAONA	15/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04588	NORA MIDIA COSME VIAFARA	15/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04742	VICTOR MANUEL CHINGATE	15/01/2024	Recibida a satisfacción

MVAL_04741	JOSE RAFAEL MARTIN GORDILLO	15/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04244	ANA FRANCELINA PEÑA SUAREZ	15/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08124	SAMUEL VIGUES	15/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04543	ANA ROSA VENEGAS MARTINEZ	16/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04554	JOHN ALEXANDER AREVALO VARGAS	16/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04859	CARMEN GONZALEZ ANDRADE	16/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04475	EDUARDO GRANADOS	16/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04598	ANGELA MARIA PATIÑO DE ROJAS	17/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04571	GENOVEVA MACHADO	17/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04240	DOLLY MYRIAM BARBOSA NOVOA	17/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04675	MARIA TERESA GUIO PINZON	18/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04630	ROSALBINA HERRERA BAUTISTA	18/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04421	ANSELMO GARZON ECHEVERRI	18/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04713	HENRY ALFONSO AGUILAR	18/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04515	AVEDULIO SOLANO LOZANO	19/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04534	JUAN ARTURO LUQUE ROBERTO	19/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04747	ROSA HERMINDA ALONSO CRUZ	19/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04199	SONIA JUDITH CASTRO	19/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04502	ZONIA PATRICIA VARGAS HERNANDEZ	20/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04552	ALCIRA ISABEL MARTINEZ URREGO	22/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04773	MYRIAM INES JIMENEZ SALINAS	22/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04799	ROSA MARIA LOPEZ DE LOPEZ	22/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04496	ENRIQUE JIMENEZ RODRIGUEZ	23/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04513	ANA ISABELINA SORIA RODRIGUEZ	23/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04838	MYRIAM AREVALO HERRERA	23/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04247	JESUS ALFONSO BELTRAN BARRERA	23/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_03902	SILVIO ROJAS BARRERA	23/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04569	JESUS MARIA MONTAÑO VALENCIA	24/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04566	CARMEN INES CAMARGO NAVARRO	24/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04746	JULIA VERONICA VEGA VEGA	24/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04807	MARIA DEL PILAR SALGADO GONZALEZ	24/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04245	BRIGITTE ANDREA ALVAREZ RIVERA	24/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04304	VIRGELINA ROJAS DE HERNANDEZ	24/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04196	VICTOR MANUEL BELTRAN GUZMAN	24/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04655	ROSA BERTA COBOS	25/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04320	LUCIRIS CHARRY MARTINEZ	25/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04442	MARIA TERESA TORRES	26/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04634	ANA LUCIA GONZALEZ TORRES	26/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04404	DORIS ACOSTA MARTINEZ	26/01/2024	Recibida a satisfacción

MVAL_04420	MARIA ESTELLA AGUDELO CASAS	26/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04774	LUZ MARINA MONTAÑEZ AVENDAÑO	26/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04785	JOSE RAMIRO TOVAR PRIETO	26/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04459	FLORA CHAPARRO DE ORTIZ	29/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_03894	NELSON CASTRO MELO	29/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04727	RUBY LILIANA PARRA	31/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04856	YESID SOLANO LUCAS	31/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04487	ARGELIA GOMEZ CARVAJAL	31/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04620	MARIA DEL CARMEN MORENO CASTILLO	31/01/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04382	JOSE DAVID VASQUEZ SANCHEZ	2/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04494	MARIA FRANCY YATE GIRON	2/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04408	NOHORA ALBA ACOSTA FERNANDEZ	2/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04848	MARLENY GONZALEZ MORA	2/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08440	VICTOR HELY ESPITIA SANCHEZ	17/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08571	CELMIRA JIMENEZ BLANCO	17/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08264	ESMERALDA RIOS VIDUEÑEZ	18/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08507	ALFONSO BAUTISTA SANTAMARIA	18/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08570	EZEQUIEL RODRIGUEZ AYA	22/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08562	MARIA NERY RODRIGUEZ DE COLO	23/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08422	BLANCA MARLENE ROMERO BERNAL	23/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08436	ANA MERCEDES PINZON DE MARTINEZ	23/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08406	OSCAR CASTRO GARZON	26/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08424	JUAN DAVID MARTIN PIEDRAHITA	26/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08446	AURA ROSA MARTINEZ ARANGO	26/02/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08538	MAGDA BEATRIZ AMEZQUITA CASTILLO	5/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08717	EDILSA ADELA CHAPARRO CASTILLO	5/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08513	DINA MARIA MARROQUIN	5/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08678	LUIS ANGEL RAMIREZ BARRAGAN	6/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08262	JOHN JAROL HERRERA BOBATIVA	6/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08567	RUPERTO QUEVEDO MORENO	7/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08400	MARTHA LUCIA ROMERO	7/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08535	MARIA ALCIRA VILLAMIL PINILLA	7/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08587	MAGNOLIA ARROYAVE BONILLA	7/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08265	CARLOS CELINO ROJAS PINZON	7/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08511	CARLOS ALIRIO DAZA SERRANO	11/03/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08505	ROSA AURORA MENDEZ	16/04/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08405	MARIA OLIVA IBAÑEZ	16/04/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08590	MARIA OLINDA ESTUPIÑAN AGUDELO	16/04/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08402	MARIA ESTELA CASTRO TORRES	16/04/2024	Recibida a satisfacción

MVAL_08449	JOSE EDWIN AGUIRRE MORENO	16/04/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08442	HERNAN ARAQUE PRADA	16/04/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08722	ELIZABETH PATIÑO USSA	16/04/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08291	EDITH HERNANDEZ PINTO	16/04/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08543	BLANCA MARTTA ABREU	16/04/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08585	MARTHA ISABEL ROJAS HERNANDEZ	10/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08515	MARIA BERTA GORDILLO	15/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08499	MARIA DORALBA SABOGAL DE CHILATRA	20/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08415	LUIS ARNULFO PACHON ALONSO	20/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08510	MARIA INEZ ROMERO DE CAMPOS	22/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08508	FABIO REY GUTIERREZ	22/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08398	URIEL BELLO SANCHEZ	23/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08270	SARA ISABEL CLAVIJO DE ARAQUE	23/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08715	YESENIA SILDANIA FRANCISCONI	24/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08276	EVANGELISTA GONZALEZ CUTIVA	24/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08758	JORGE ELIECER SALAZAR HERNANDEZ	27/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08542	ROSA ELENA ANGEL PINILLA	28/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08411	MARIA GRACIELA DIAZ VERA	28/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08486	LUZ MARINA BEJARANO BELTRAN	29/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08263	ELENA DIAZ OYOLA	29/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08547	DORA ALBA MARTIN CONTRERAS	29/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08598	ALVEIRO TAPIERO FLOREZ	29/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08461	RUBIELA MARTINEZ VERA	30/05/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05334	YOLANDA MONROY CASALLAS	7/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08723	SEGUNDO MELQUISEDEC PEREZ MEDINA	7/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08629	SANDRA MARITZA RUIZ PARRA	7/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05351	NELSI PEREZ GUZMAN	7/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08698	NATIVIDAD DE JESUS DIAZ DIAZ	7/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08725	SERGIO RAMIREZ	11/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08760	SENEN MARTINEZ CASTAÑEDA	13/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08650	SARA ROSA VALENCIA BETANCUR	13/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08389	OMAIRA LINEY PASTRANA VILLALBA	17/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08425	MARIA ISABEL MORENO LOZANO	18/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08644	MARIA HERMINIA CORTES SANTANA	18/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08635	MARIA ELENA BOHORQUEZ CABALLERO	18/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08381	NIRSA ELVIRA RODRIGUEZ TARAZONA	19/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_03890	MARIBEL SANDOVAL LOZANO	19/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08495	LUIS FELIPE RODRIGUEZ CESPEDES	19/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04191	MARIA MARINA SANCHEZ DE ALGUTRIA	21/06/2024	Recibida a satisfacción

MVAL_08652	MARIA LUCILA TEZ CHINDOY	24/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08620	LORENA OLIVEROS AROCA	24/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08390	NOHEMI NEIRA SABOYA	26/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08447	MARIA ELENA ALARCON	26/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_03888	LUIS LABREAN GOMEZ FRAILE	26/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05185	GINA PAOLA LOZANO CORREAL	28/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05195	CECILIA CHACON	28/06/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05279	MARIA CECILIA CAMARGO LINARES	2/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08487	FAVIO HENRRIQUE CORDERO ARAQUE	3/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_04984	JOSE DANIEL SUAREZ	4/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05281	MARIA INES ROJAS CUERVO	8/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_06649	MARIA AMPARO CAJICA DE GARCIA	10/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_06636	LUZ MIRYAM VILLAMIL DE VALENCIA	10/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08469	LUZ MARY CIFUENTES CASTAÑO	10/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08476	FABIOLA PINILLOS GARCIA	10/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08480	ENRIQUE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	10/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08617	JULIO ALBERTO VALBUENA GUTIERREZ	11/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_03880	JHON ROGER VARGAS VARGAS	11/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08230	JEISSON ALONSO ARDILA CHASOY	11/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_06600	EVELIO MAYORGA FONSECA	11/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08478	ELEUTERIO SESQUILE PUERTA	11/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08713	CARLOS ANIBAL SALAZAR RUBIO	11/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_06932	BLANCA CECILIA PINEDA SIERRA	11/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08416	IBETH ROA GARZON	12/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_06731	ESTEBAN VALBUENA GARCIA	12/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08474	BETULIA CORDOBA GARCIA	12/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08477	MARIA ARACELIA VILLAMARIN CRUZ	13/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08604	MARLENY FERNANDEZ PARRA	16/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05352	JAVIER BUSTOS	17/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08462	EDELMIRA TOBAR GUITIERREZ	17/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08624	DANICELA GIRALDO NOVOA	17/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05193	HELIODORO SOSA FANDIÑO	18/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08439	CLARA INES CARO ALARCON	18/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05255	CARLOS ALFREDO CANCELADO SANCHEZ	18/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08514	ANA SILVIA MARTINEZ BEJARANO	18/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05330	MARIA ELSA GONZALEZ BOHORQUEZ	22/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_06286	CLARA INES SEGURA TORRES	22/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_06929	ADEODATO ZAMBRANO	22/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08393	HUGO ALEJANDRO PARRA SANTOS	24/07/2024	Recibida a satisfacción

MVAL_06599	FLOR ELBA CORTES VELANDIA	24/07/2024	Recibida a satisfacción
MV_00456	BENJAMIN TOLOSA OSORIO	24/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08749	ADRIANA LUCIA CRUZ PEÑA	24/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08653	MARIA CECILIA ARAQUE BONILLA	25/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08414	BARBARA ARENAS VELA	25/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05263	MAGNOLIA MOLINA CARDONA	27/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08431	LUIS GABRIEL LOPEZ GIRALDO	27/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08472	ROSA ALBINA CASTELLANOS MARTINEZ	29/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_07154	NANCY GIRALDO RAMIREZ	29/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08593	MARIA YOLANDA TOVAR RAYO	29/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05222	ANA JULIA ESPETIA	29/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_05224	JEISSON OSWALDO ESCOBAR SARMIENTO	30/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08467	ARMANDO VARGAS RINCON	30/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08413	ANABEYBA MENDEZ LOZANO	30/07/2024	Recibida a satisfacción
MVAL_08466	JULIO CESAR VELANDIA LOPEZ	31/07/2024	Recibida a satisfacción

10.1.2.3 RENUNCIAS

Durante la ejecución del contrato 917 de 2023 se recepcionaron un total de dieciséis (16) renuncias, de las cuales tres (3) de ellas se presentó desistimiento por parte de los beneficiarios.

El equipo social de contratista de obra con el acompañamiento del equipo social de interventoría procede hacer el abordaje como se estipula en el Plan de gestión social y se firma el formato de Renuncia.

El contratista de obra realizó la entrega a interventoría de los formatos de renuncias.

Tabla 21 Renuncias

MV	NOMBRE BENEFICIARIO (A) - SEGÚN RESOLUCION DE ASIGNACION DEL SUBSIDIO - BASE DE DATOS ENTREGADA	MOTIVO DE RENUNCIA
MVAL_07671	JOSE DEL CARMEN YUMAYUSA MARTINEZ	Motivos personales
MVAL_07796	GABRIEL ANGEL TALERO SANCHEZ	Venta del predio
MVAL_08186	YOHANA RIVERA ROJAS	Motivos personales
MVAL_04448	TEMILDA MORENO ESPITIA	Asuntos personales

MVAL_07601	ARGEMIRO FORERO MUÑOZ	Fallecimiento del beneficiario
MVAL_04683	MAURICIO MATEUS PEÑA	Motivos personales
MVAL_04467	OLINTO SÁNCHEZ HERNANDEZ	Disponibilidad de tiempo
MVAL_04784	MARIA NOHEMY QUINTERO GALLEGO	Problemas de Salud
MVAL_04846	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ MOLINA	Motivos personales
MVAL_04816	PEDRO TULIO FONSECA AMEZQUITA	Venta del predio
MVAL_04191	MARIA MARINA SÁNCHEZ DE ALGUTRIA	Motivos personales
MVAL_03903	GERARDO MONTERO	Motivos personales
MVAL_06927	MARIA EUGENIA VALBUENA	Motivos personales
MVAL_06927	ARGELIA GOMEZ CARVAJAL	Desistimiento
MVAL_06927	ANSELMO GARZON ECHEVERRI	Desistimiento
MVAL_04984	JOSE DANIEL SUAREZ	Desistimiento

En relación a la renuncia del MVAL_04191 MARIA MARINA SÁNCHEZ DE ALGUTRIA, se radico ante interventoría y ellos a su vez a SDHT, esta se llevó a cabo durante la primera fase de ejecución del contrato de obra. La señora beneficiaria presentó desistimiento ante SDHT y en la adición del contrato de obra fue asignado este MV el cual se ejecutó por contratista de obra en la fase de adición.

Así mismo el MVAL_04984 JOSE DANIEL SUAREZ presento renuncia y desistimiento al Programa de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad directamente en la SDHT. Ante el desistimiento del beneficiario el contratista de obra ejecuta el mejoramiento de vivienda.

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe los formatos de las trece (13) renuncias, que corresponde al anexo número ocho (8) denominado Renuncias

10.1.3 **ANALISIS DE MATRIZ DE ATENCIÓN PQRS, Posventas y atención a comunicación en el PAC**

Durante la ejecución del contrato de obra 917 de 2023 se presentaron en total 29 PQRS-Posventas, las cuales fueron atendidas por el equipo social de contratista de obra con acompañamiento del equipo social de interventoría.

Estas se generaron en las siguientes circunstancias de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y postventas, entendidas así:

Petición: es la solicitud o demanda frente alguna necesidad en general de la obra.

Queja: es la reclamación o protesta que se hace a causa de un desacuerdo o inconformidad de la obra.

Reclamo: es la acción de protestar cuando no se atendió las peticiones o quejas realizadas.

Sugerencias: es la acción de pedir que se tenga en cuenta algún aspecto dentro del proceso de ejecución de obra.

Postventa: es la actividad que debe garantizar el contratista de obra y que atienda las posibles reparaciones identificadas por la interventoría teniendo en cuenta que una vez entregadas las obras de mejoramiento de vivienda pueda requerir por producto de fallas o errores en la ejecución de las obras. Estas postventas durante la fase de ejecución del contrato y cierre de las obras en la vivienda pueden darse dentro del término de la vigencia del contrato; y se asumen como garantías de postventa.

A continuación, se realiza un análisis de la Matriz de atención PQRS- Postventas que se recepcionaron durante la ejecución del contrato 917 de 2023.

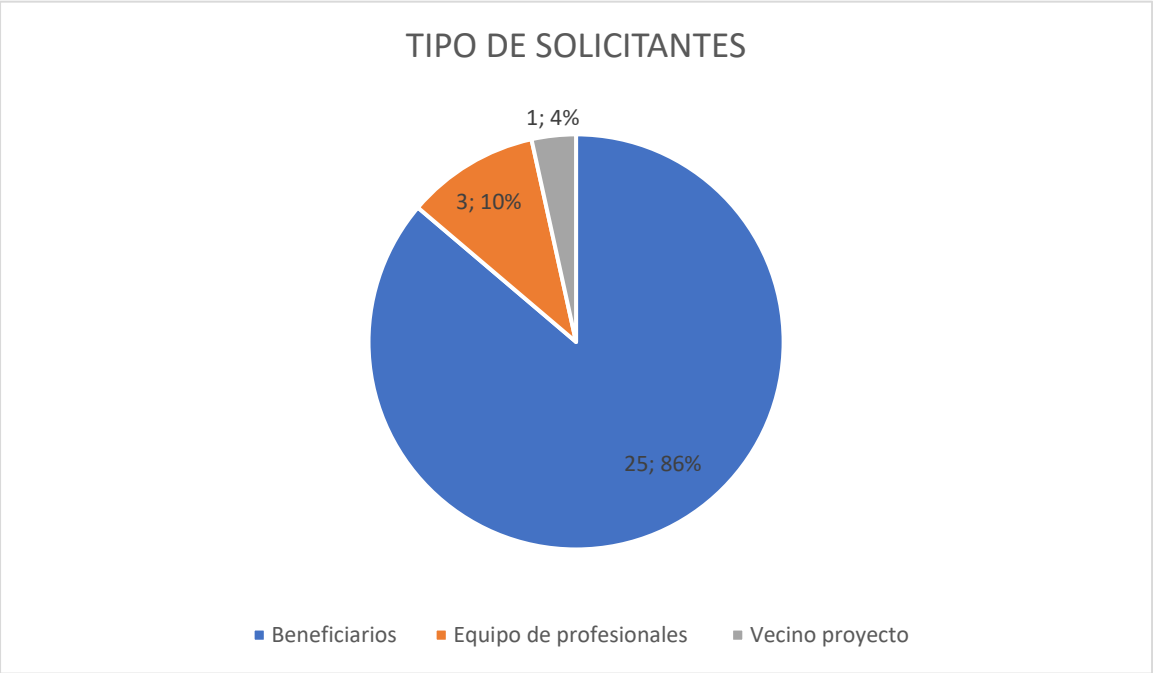


Ilustración 45 Tipo de solicitantes

De estas 29 PQRS- Postventas, 25 correspondiente al 86% fueron interpuestas por beneficiarios, 3 correspondiente al 10% por equipo de profesionales de contratista de obra y 1 correspondiente al 4% por un vecino de un mejoramiento de vivienda.

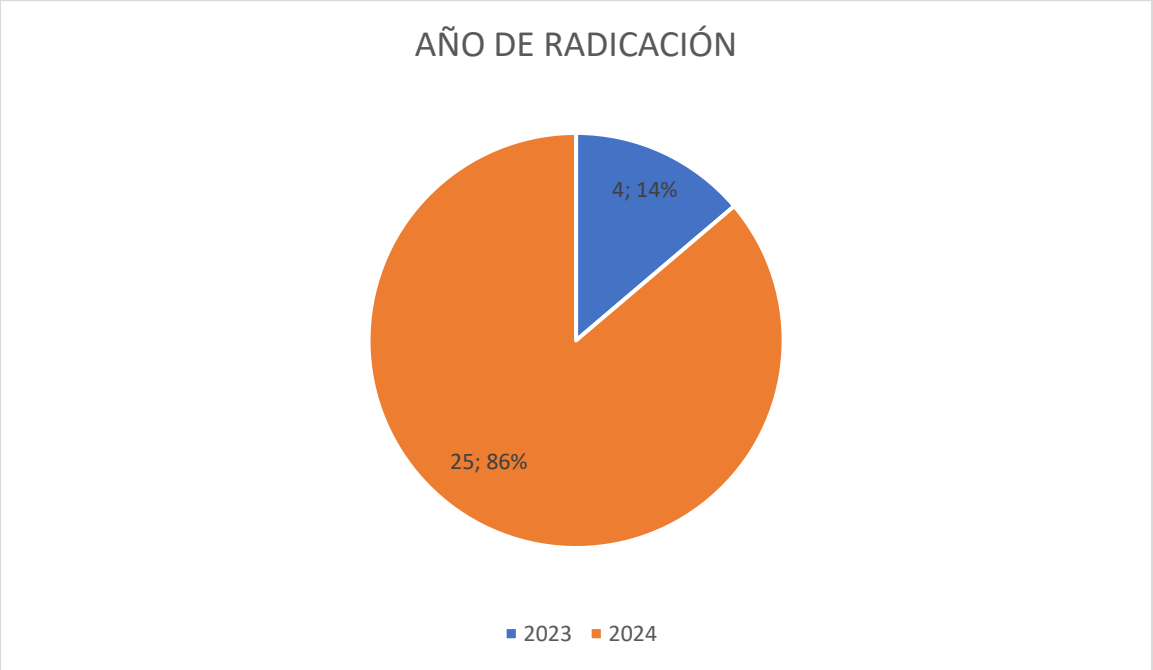


Ilustración 46 Año de radicación

De estas 29 PQRS – Postventas 4 fueron interpuestas en el año 2023 y 25 en el año 2024.

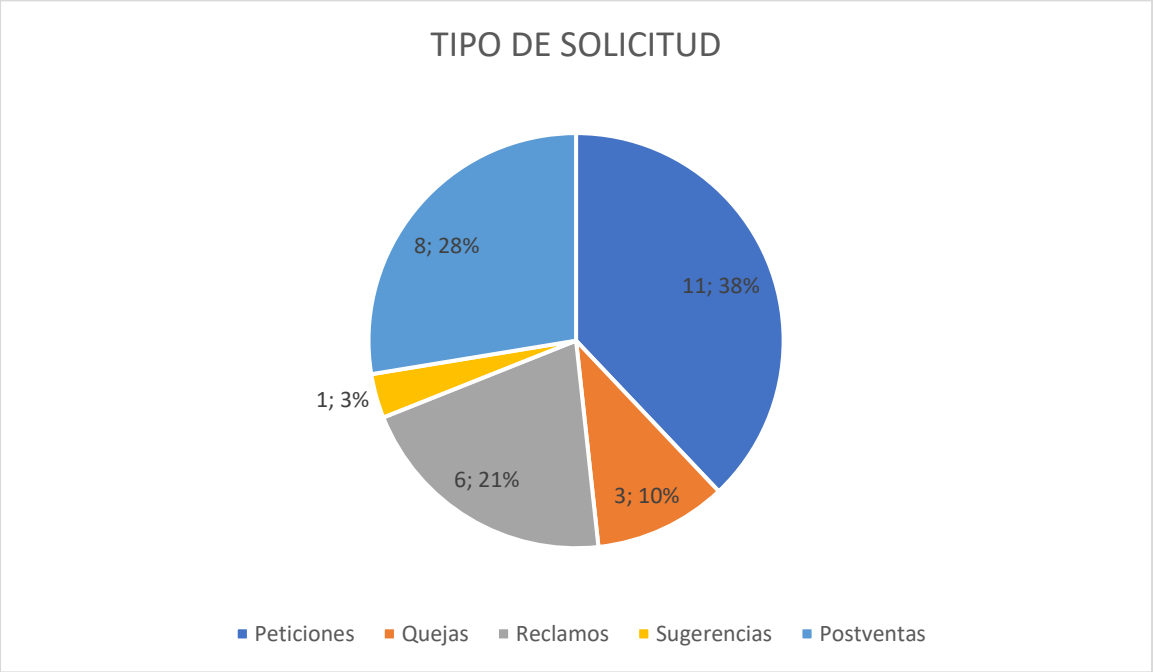


Ilustración 47 Tipo de solicitud

De estas 29 PQRS – Postventas, 11 correspondiente a 38% fueron peticiones; 8 correspondiente a 28% fueron postventas; 6 correspondiente al 21% fueron reclamos, 3 correspondiente al 10% fueron quejas y una (1) correspondiente al 3% fue una sugerencia.

En relación a las once (11) peticiones interpuestas de estas nueve (9) son solicitudes referentes al inicio o reactivación de las obras de mejoramiento en sus viviendas. Las otras dos (2) una fue solicitud de resocialización de presupuesto y actividades de obra en un mejoramiento de vivienda en ejecución y la otra petición fue arreglo de una teja de casa vecina a la cual le cayó objeto durante la ejecución, esta teja fue reemplazada por contratista de obra. A todas se le dio tramite desde los componentes técnicos y sociales de contratista de obra e interventoría.

En relación a las ocho (8) postventas que se atendieron, de ellas tres fueron ocasionadas por el vendaval que se presentó el 31 de marzo de 2023 y afectaron las cubiertas de los beneficiarios, de esta una tuvo una (1) afectación media y dos (2) afectaciones bajas las cuales fueron atendidas por el contratista de obra y verificadas por la interventoría y se procedió a realizar el cierre de estas garantías de postventas. En relación a las otras cinco (5) postventas atendidas una (1) de ellas se presentó por filtración en el área del baño y las otras cuatro (4) por filtraciones en la cubierta. Todas estas fueron atendidas

por contratista de obra y verificadas las subsanaciones por parte de la interventoría procediendo hacer el cierre de las mismas. Para ello se elaboró informe del cierre de la postventa y se hizo entrega de los mismos a interventoría y ellos radicaron a SDHT.

En relación a los seis (6) reclamos interpuestos, tres (3) fueron por una parte del equipo de profesionales del contratista de obra donde reclamaban el pago de honorarios los cuales fueron pagados una vez el contratista de obra superó las dificultades generadas por un embargo en sus cuentas. Dos (2) reclamos fueron por la continuidad de las obras de mejoramiento de vivienda en dos viviendas que por las dificultades del contratista y la suspensión de las obras estaban paralizadas estas se reactivaron una vez se reinició el contrato de obra y fueron entregadas a satisfacción a los beneficiarios y la otra reclamación fue en relación a las actividades de obra ejecutadas en la vivienda y el presupuesto, ante esta reclamación se explica al beneficiario los presupuesto inicial y final que se ejecutaron en su vivienda, así mismo se hicieron las subsanaciones de obra y se hizo entrega del mejoramiento de vivienda y recibo a satisfacción por parte del beneficiario.

En relación a las tres (3) quejas interpuestas, dos (2) de ellas fueron por la parálisis de las obras durante la suspensión del contrato, las cuales fueron atendidas una vez se reinició el contrato de obra, estos MV fueron entregados y recibos a satisfacción por parte de los beneficiarios y la otra queja fue interpuesta por una beneficiaria debido a inconformidades en la ejecución de su vivienda, esta fueron atendidas de forma oportuna conociendo las inconformidades de la beneficiaria y llegando acuerdos se solucionó y se terminaron de ejecutar las actividades de obra, haciendo entrega del mejoramiento de vivienda y recibo a satisfacción por parte de la beneficiaria. Y una sugerencia por parte del beneficiario en relación a la socialización de actas de mayores y menores y presupuesto final.

Y en relación al Punto de atención a la comunidad – PAC durante la ejecución del contrato de obra 917 de 2023 se tuvieron dos Puntos de atención a la comunidad – PAC, el objetivo del PAC fue suministrar adecuadamente información, dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas o sugerencias de la comunidad que se acerque al PAC. En estos lugares se fijó una valla informativa con la información del contrato de obra e interventoría (horario de atención, objeto del contrato, numero de contrato de obra e interventoría, correo electrónico de contratista de obra e interventoría y de la SDHT, número de contacto de contratista de obra e interventoría). Se hace énfasis que las personas que se acercaban al PAC eran con el objetivo de conocer la manera de acceder al subsidio de mejoramiento de vivienda o son beneficiarios del programa de Plan Terraza, a las personas que se acercaban se les brindaba la información que solicitaban.

En relación a los beneficiarios del Programa de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad las dudas e inquietudes se resolvían en las visitas de seguimiento que se hacían a sus viviendas.

10.1.4 ANALISIS Y RESULTADO DE LA VALIDACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIAL DE LAS FAMILIAS VARIACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN Y DE LA VALIDACIÓN

La SDHT hizo entrega a contratista de obra de cada uno de los expedientes foliados de cada uno de los beneficiarios como lo estipulaba el anexo técnico para la prestación del servicio y/o entrega del bien.

Entre los documentos que integran los expedientes se encontraba el formato de Caracterización social del núcleo familiar donde estipulan el número de integrantes del núcleo familiar al cual le fue asignado el subsidio de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad.

En la fase de estructuración realizada por la SDHT según la información consignada en las fichas de visita social de clasificación de hogar caracterización social para mejoramiento de vivienda - habitabilidad el total de personas que conformaban los trescientos noventa y cinco (395) hogares beneficiarios fue de novecientas tres (903) personas frente a la fase de validación realizada por el contratista de obra y consignada en los formatos de caracterización social el total de personas que conformaban los hogares beneficiarios fue de un millón ochenta y tres (1083) personas.

En los trescientos noventa y cinco hogares caracterizados durante la fase de estructuración (SDHT) y la fase de validación (contratista de obra) se encontró un aumento de un total de ciento ochenta (180) personas.

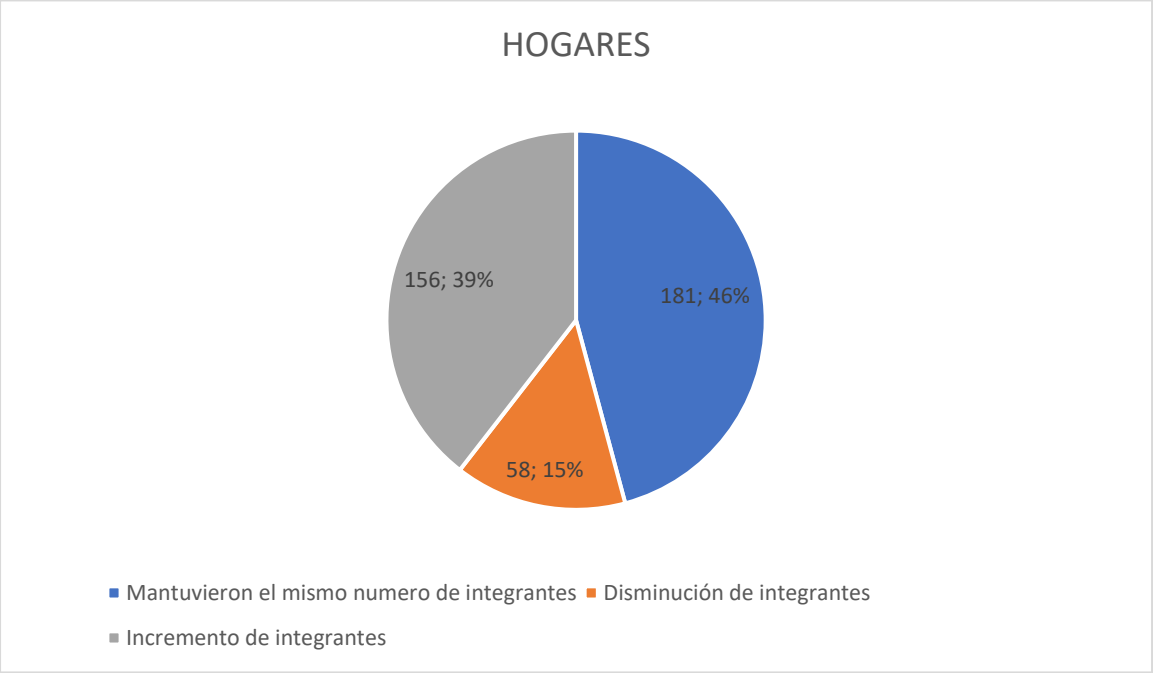


Ilustración 48 Hogares

De los 395 hogares beneficiarios caracterizados en la fase de estructuración 181 hogares beneficiarios correspondiente al 46% mantuvieron el mismo número de integrantes en sus núcleos familiares; 156 hogares beneficiarios correspondiente al 39% tuvieron un incremento en el número de integrantes y los otros 58 hogares beneficiarios correspondiente al15% disminuyo el número de integrantes de los núcleos familiares.

10.1.5 LECCIONES APRENDIDAS

Las lecciones aprendidas durante la ejecución del Programa de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad ofrecen una valiosa perspectiva acerca de cada una de las actividades que funcionaron bien y aportaron positivamente en la ejecución del proyecto y aquellas actividades que requieren de un ajuste para que la ejecución fluya de forma adecuada.

Como es de conocimiento el Programa de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad se ejecuta a través de tres fases, las cuales son fase de validación, fase de ejecución de las obras y fase de cierre de proyecto.

Si bien es cierto el contratista de obra inicia el proceso de ejecución en la fase de validación, antes de ello se surtió el proceso de estructuración por parte de la SDHT.

Según lo manifestado por los beneficiarios durante la visita de estructuración les manifiestan que con la asignación y ejecución del subsidio le harán todas las actividades de obras que requiera la vivienda, esto ha generó en las familias beneficiarias una amplia expectativa en relación a las actividades de obra que se ejecutarían en sus viviendas, por ello se considera que durante estas visitas de estructuración se le debe de informar a los potenciales beneficiarios que el subsidio de vivienda asignado se ejecuta en relación a las necesidades habitacionales de la vivienda y a un presupuesto que es agotable. Esto con el objetivo de que las familias tengan conocimiento que los recursos se ejecutan según el orden de prioridades y el monto máximo del presupuesto.

En relación a las sesiones de inicio se requiere que se haga énfasis a que los precios de las actividades de obra parten de un proceso licitatorio donde los oferentes proponen unos valores tomando como referencia los precios establecidos por la SDHT.

Con el objetivo de aclarar dudas desde la primera visita que se realice a las familias beneficiarias, se debería implementar la entrega de un folleto con los puntos más relevantes de la reunión de inicio, este folleto debe ser explicado a las familias por el o la profesional social.

Así mismo se requiere que cada uno de los mejoramientos de viviendas cuenten con las resoluciones de asignación de los subsidios antes de ser entregados a los contratistas de obra, con el objetivo de disminuir los reprocesos en cuanto a las renuncias y desistimiento de las mismos.

De igual forma es importante para una adecuada ejecución contar con la participación de las familias beneficiarias e involucrar a la comunidad desde el inicio del proyecto, esto es crucial en para contar con las organizaciones de base de cada uno de los territorios priorizados.

En la fase de validación es indispensable realizar una evaluación de las necesidades de cada una de las viviendas, con el objetivo de ejecutar unas actividades de obra de acorde a las necesidades habitacionales de la vivienda, así mismo es importante involucrar a la familia para el cuidado y conservación de las obras realizadas.

Implementar un componente educativo de temas de habitabilidad el cual se puede desarrollar durante las visitas de seguimiento por parte del profesional social, esto con el objetivo de brindar herramientas a las familias beneficiarias para que logren la sostenibilidad de los mejoramientos de vivienda

Es importante continuar con la estrategia de una comunicación clara y asertiva con las familias beneficiarias para generar confianza con cada uno de los actores del programa de mejoramiento de vivienda. Y seguir con los canales de comunicación asegurando que la información llegue a cada uno de los beneficiarios de manera clara y oportuna.

Del componente técnico al formato de memorias finales se le debería implementar un formato de registro fotográfico por cada una de las actividades de obra que se ejecutan en el mejoramiento de vivienda, esto dado que en ocasiones se puede pasar por el alto el registro en el durante de cada una de las actividades.

.

11 REGISTROS AUDIOVISUALES

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR hace entrega de los registros audiovisuales (antes, durante y después) de los trescientos noventa y cinco (395) mejoramientos de viviendas que se ejecutaron en el marco del contrato de obra 917 de 2023, estos se harán entrega por medio magnético, así mismo se pueden consultar en el siguiente driver https://drive.google.com/drive/folders/1i62fskLiMznk_PGE77Pu_Icf-H3kb86V?usp=drive_link

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe los registros audiovisuales, que corresponde al anexo número nueve (9) denominado Registros fotográficos.

12 PAZ Y SALVOS DE TRABAJADORES Y PROVEEDORES

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR durante la ejecución del contrato de obra 917 de 2023 realizó la vinculación de personal operativo y personal administrativo para la realización de cada una de las actividades.

.

Tabla 22 Paz y Salvos

PERSONAL RETIRADO-CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS EGR			
MES/AÑO	**PERSONAL OPERATIVO**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**TOTAL**
Agosto 2023	2	0	2
Septiembre 2023	37	0	37
Octubre 2023	25	2	27
Noviembre 2023	36	1	37
Diciembre 2023	22	1	23
Enero 2024	80	2	82
Febrero 2024	10	0	10
Marzo 2024	0	0	0
Abril 2024	105	12	117
Mayo 2024	0	0	0
junio 2024	4	0	4
Julio 2024	63	13	76
TOTAL	**384**	**31**	**415**

En la tabla anterior se relacionó la cantidad de personal operativo y administrativo retirado mes a mes, desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la terminación del mismo. En total se firmaron cuatrocientos quince (415) paz y salvos, los cuales son soporte de que los colaboradores recibieron los pagos por parte del consorcio derivados del tiempo de la relación laboral.

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe paz y salvos del personal, que corresponde al anexo número diez (10) denominado Paz y salvo Personal.

13 ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

En relación al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Consorcio Buenas Viviendas este fue una herramienta de gestión que permitió (a partir de la identificación de los aspectos ambientales) prevenir aquellos impactos que deterioran sustancial e importantemente al componente ambiental y social de la zona a intervenir (en las fases de validación, ejecución y cierre), a partir del diseño de estrategias que permitieron mitigar y compensar los impactos detectados. La metodología general de la identificación de los aspectos inicia desde la recopilación de información primaria y secundaria de las características del área de influencia del proyecto (ambiente, población, medio biótico y abiótico), posterior se realizó una evaluación cuantitativa y objetiva del deterioro socio ambiental que se pudiera llegar a causar por las intervenciones y con ello se implementó medidas de manejo. El PMA tuvo como propósito recopilar un conjunto de actividades que confluyen en la prevención de los impactos ambientales generados por el desarrollo del objeto contractual en el área de influencia.

Y en relación al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) el cual se estructuró teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, emanada por el Ministerio del Trabajo.

El Consorcio Buenas Viviendas EGR, asumió su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyeron a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en sus actividades, brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro, para lo cual se ejecutó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) tendiente a preservar, mantener, mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y actividades disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo.

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe los planes ambientales -PMA y el Plan SST, que corresponde al anexo número once (11) denominado Planes PMA – PSST.

14 INFORME AMBIENTAL Y SST

El Consorcio Buenas Viviendas – EGR anexa a este informe los informes finales de la ejecución de los componentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

El informe de cierre del componente ambiental busca proporcionar una evaluación completa de las actividades, logros y lecciones aprendidas durante el desarrollo del objeto contractual y sirve como herramienta crucial de rendición de cuentas, desde el componente ambiental, tanto al equipo interventor como a la supervisión técnica del contratante, teniendo presente que este tipo de instrumentos permite identificar y documentar la ruta trazada en el periodo de tiempo contemplado para el desarrollo del proyecto, y con ello recopila lecciones aprendidas que permitirán la mejora en futuros proyectos en el marco del mejoramiento de vivienda en territorios priorizados de mejoramiento, adicional evalúa los beneficios alcanzados e incluso permite establecer recomendaciones prácticas.

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe el informe ambiental con sus anexos, que corresponde al anexo número doce (12) denominado Informe Ambiental

En el plan de seguridad y salud que se llevaron a cabo en el periodo establecido en el contrato No 917 del 2023, se da a conocer las metodologías que se implementaron dentro del marco normativo vigente para brindar a los colaboradores condiciones óptimas de trabajo, reducir o minimizar la ocurrencia de los accidentes laborales, la aparición de las enfermedades laborales y la eliminación de los factores que ponen en peligro la salud y la seguridad durante la ejecución de las actividades en el área de trabajo.

Fue muy importante las acciones que tomo el consorcio para la prevención y protección de la salud de los trabajadores creando conciencia de la importancia del autocuidado frente a posibles riesgos encontrados en el desarrollo de sus labores, entregando los elementos de protección personal, realizando el acompañamiento en el desarrollo de las actividades, inducciones, notificando riesgos, cumpliendo con el cronograma de capacitaciones, inspeccionando herramientas y áreas de trabajo y de esta manera terminar el contrato con índices de accidentalidad bajo

Con el objetivo de que se verifique la información anteriormente enunciada se anexa a este informe el informe SS con sus anexos, que corresponde al anexo número trece (13) denominado Informe SST.

15 LISTADO DE ANEXOS

- Carpeta 1 Expedientes
- Carpeta 2 Actas de Entregas a Satisfacción
- Carpeta 3 Matriz Base Técnica
- Carpeta 4 Pólizas
- Carpeta 5 Planillas de pago de seguridad social
- Carpeta 6 Bitácora de PAC
- Carpeta 7 Historias de Vida
- Carpeta 8 Renuncias
- Carpeta 9 Registros Fotográficos
- Carpeta 10 Paz y Salvos
- Carpeta 11 Planes PMA - PSST
- Carpeta 12 Informe Ambiental
- Carpeta 13 Informe SST



JOSE LUIS CERON CERON

DIRECTOR DE OBRA
C. C 112183369

CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS – EGR 	**INFORME MENSUAL CONSORCIO BUENAS VIVIENDAS**	Código	CBV - 1
		Fecha	06/07/23
		N° Actividad	006
