Barranquilla, 30 de Noviembre de 2024

Doctor
RAFAEL LAFONT DE SALAS.
Supervisor
Barranquilla.

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES N° 1

Cordial Saludo.

Con la presente hago entrega del Informe de actividades N° 1 correspondiente al periodo al 30 de Noviembre 2024, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios.
N°.CD-12-2024-6335 "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

Atentamente



MARIELA SENIOR DE CORTES.
C.C. N° 32.621.574 de B7quilla.

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe	NOVIEMBRE 30 de 2024	Numero de contralto:	**CD-12-2024-6335**
Datos del Contratista :	**MARIELA ESTER SENIOR DE CORTES** **C.C N.º 32.621.574 B/QUILLA**		
Periodo del informe:	Informe comprendido Entre el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.	Informe número:	01
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato:	SON: (SEIS MILLONES, NOVECIENTOS MIL PESOS, M/L). ($ 6.900. 000.oo)		
Supervisor:	**RAFAEL LAFONT DE SALAS** C.C.: 8.662.605		
Cargo:	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

Para este periodo se trabajó en la programación de los proyectos de la Infraestructura pública del sector salud en el distrito de Barranquilla. Cuyo único contrato N° edu-227-2016
Objeto: "DISEÑO, CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCION EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

- Para este mes se trabajó en la Supervisión de Obras de Salud de nuevos hospitales para el Distrito de Barranquilla.
- La Obras en ejecución son:

Camino Nuevo Barranquilla: En este Periodo se continuó realizando la revisión de los diseños arquitecto y demás sistemas del proyecto en ejecución, evaluándolos frente a la nueva norma de habilitación resolución 3100/19. Y las actividades ejecutadas en obras civiles fueron:

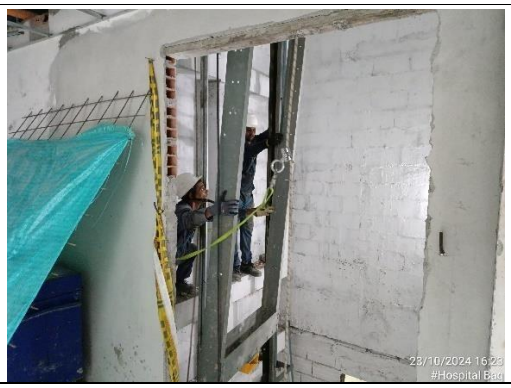
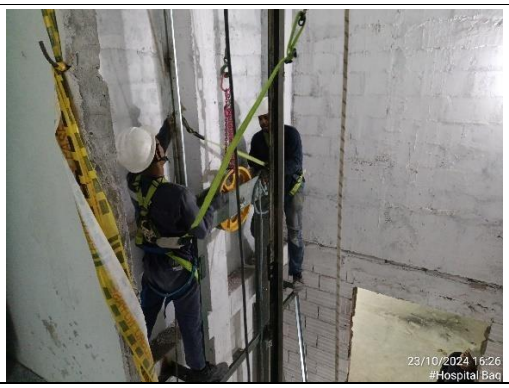
- Ensamble de ascensores camilleros
- Transformadoras ya en obra de 500, 400, y 300 Kva.
- Celdas para transformadores en obra.
- Instalación de tableros de aislamiento en quirófanos.
- Fundida de placa para sendero de urbanismo.
- Instalación de piso vinilo.
- Instalación de barandas en escaleras
- Instalación de columnas consolas UCI
- Instalación de consolas habitaciones.
- Fundida de placas de urbanismo.
- Corte de placa de concreto.
- Instalación de detectores de humo.
- Construcción de bordillos.
- Levante en bloque abujardado.
- Levante en bloque de arcilla.
- Instalación de mini Split en habitaciones bipersonales.
- Instalación de tubería IMC
- Instalación de luminarias de UCI.
- Sello de tubería de Chiller.
- Armado de mesones de granito.
- Instalación de tablero de aislamiento.

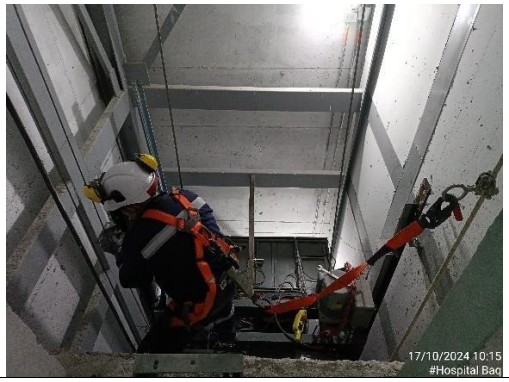
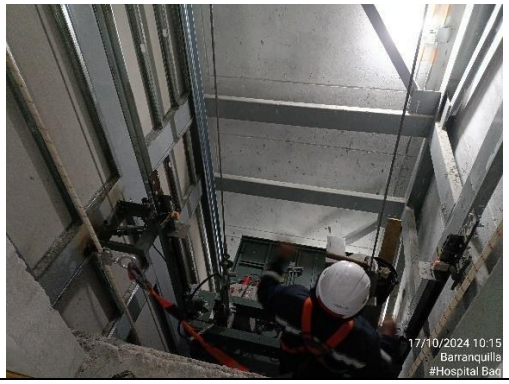
Paso San Camilo: En este periodo se realizaron las siguientes actividades.


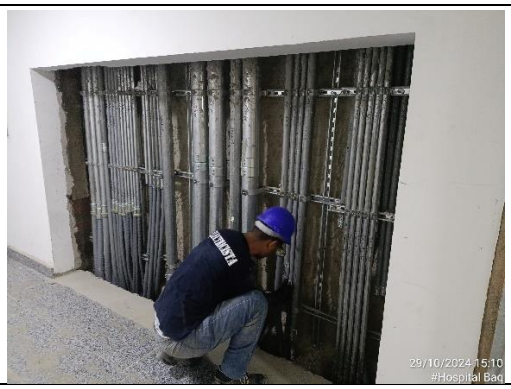
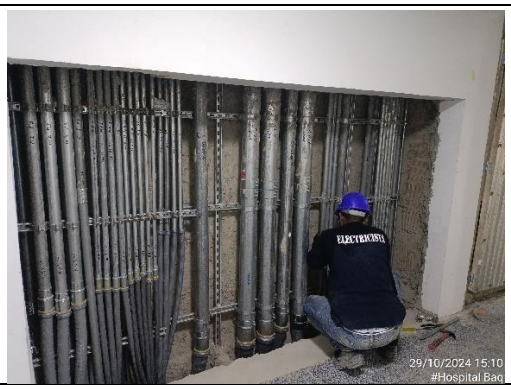
- Instalación de tubería hidrosanitaria.
- Levantes de muros en bloque N°4
- Fundida de columnetas y dinteles para mampostería confinada
- Fundida de viga de cimentación para escalera en concreto 4.000 psi
- Instalación de tubería eléctrica
- Aplicación de pañete en mortero 1:4
- Aplicación de pañete impermeabilizado
- Aplicación de pañete impermeabilizado en fachada
- Fundida de escalera en concreto 4000 psi
- Instalación de tubería EMT ¼
- Filos allanados en mortero 1:4
- Fundida de plantilla sobre cubierta para desagüe.
- Armado e instalación de ducteria P3
- Regatas sobre muros.
- Instalación de cajas de paso metálicas.
- Instalación de enchape cerámico sobre muros.
- Figurado de acero de refuerzo para mampostería
- Figurado de aceros de refuerzo para tanque de agua potable.

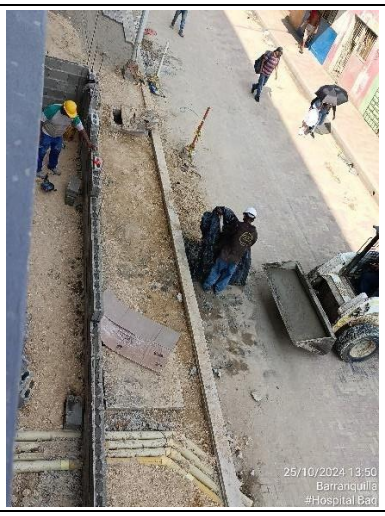
Anexo las actividades en fotografías

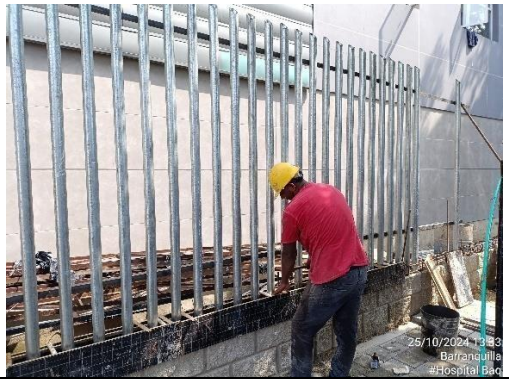
CAMINO NUEVO BARRANQUILLA

Actividades realizadas en el presente mes.	
	
Ensamble de ascensores públicos.	Ensamble de ascensores públicos.
	
Ensamble de ascensores públicos.	Ensamble de ascensores públicos.
	
Ensamble de ascensores de camilleros.	Ensamble de ascensores de camilleros.

	
Ensamble de ascensores públicos.	Ensamble de ascensores públicos.
	
Ensamble de ascensores públicos.	Ensamble de ascensores públicos.
	
Transformadores en obra de 500 kva, 400kva, 300 kva.	Transformadores en obra de 500 kva, 400kva, 300 kva.

	
Celdas de transformadores en obra.	Celdas de transformadores en obra.
	
Instalación tubería EMT de acometida.	Instalación tubería EMT de acometida.
	
Instalación de tableros de aislamiento enquirófanos piso 2.	Instalación de tableros de aislamiento enquirófanos piso 2.

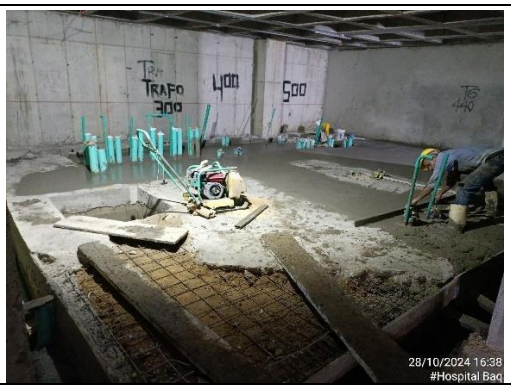
	
Obras civiles de urbanismo, construcción de rampa.	Obras civiles de urbanismo, construcción de rampa.
	
Obras civiles de urbanismo, construcción de rampa.	Obras civiles de urbanismo, construcción de rampa.
	
Obras civiles de urbanismo, construcción de rampa.	Obras civiles de urbanismo, construcción de rampa.

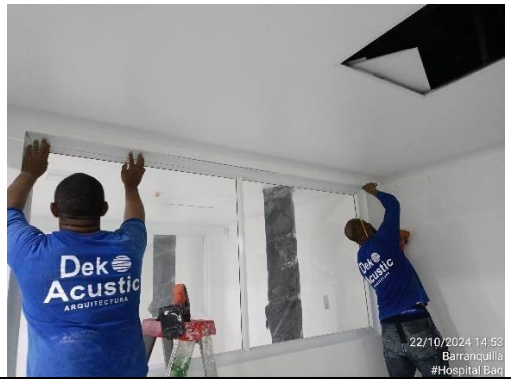
	
Obras civiles de urbanismo, cimentación de entrada urgencia.	Obras civiles de urbanismo, cimentación de entrada urgencia.
	
Cerramiento perimetral viga corona.	Cerramiento perimetral viga corona.
	
Cerramiento perimetral.	Cerramiento perimetral.

	
Instalación de malla 15x15 para urbanismo.	Fundida de placa para sendero de urbanismo.
	
Instalación de loseta para sendero de urbanismo.	Instalación de loseta para sendero deurbanismo.
	
Instalación de piso granito Hammer.	Instalación de piso granito Hammer.

	
Instalación de piso granito Hammer.	Mesón en granito Hammer.
	
Mesón en granito Hammer.	Certificación de puntos de red.
	
Instalación de estructura de cielo raso en área de rampa.	Instalación de estructura de cielo raso en áreade rampa.

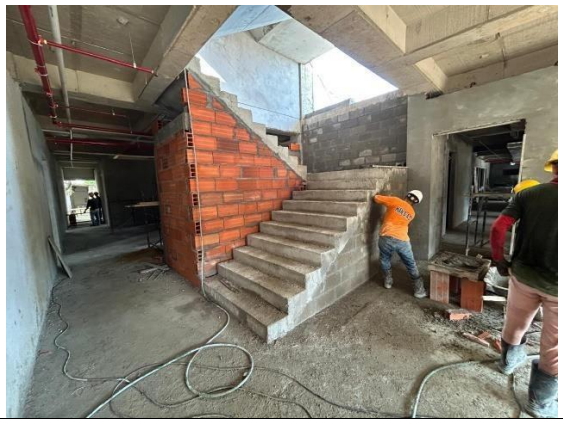
	
Instalación de lámina RH de cielo raso en área de rampa.	Instalación de lámina RH de cielo raso en área de rampa.
	
Instalación de hunter Douglas liso.	Instalación de hunter Douglas liso.
	
Instalación de hunter Douglas liso.	Obras civiles de adecuación en subestación.

	
Obras civiles de adecuación en subestación.	Obras civiles de adecuación en subestación.
	
Obras civiles de adecuación en subestación.	Instalación de barras en U baños.
	
Instalación de grifería de baños.	Instalación de regaderas en baños.

	
Montaje de rack segundo piso.	Montaje de rack segundo piso.
	
Instalación de mediacaña en área de UCI.	Instalación de mediacaña en área de UCI.
	
Instalación de mediacaña en área de UCI.	Instalación de mediacaña en área de UCI.

	
Instalación de barandas en escaleras.	Instalación de barandas en escaleras.
	
Instalación de barandas en escaleras.	Instalación de barandas en escaleras.
	
Instalación de tomacorrientes.	Instalación de luminarias.

SAN CAMILO

Actividades realizadas en el presente mes	
	
Aplicación de pañete impermeabilizado.	Levante en bloque vibro-prensado.
	
Levante de muro en bloque No.4	Suministro e instalación de enchape cerámicosobre muro.
	
Aplicación de pañetes en mortero 1:4 ML.	Armado de aceros de refuerzo para vigas de cimentación (Muro perimetral de cerramiento).

	
Excavación de terreno para cimentación (Muro perimetral de cerramiento).	Aplicación de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado.
	
Aplicación de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado ML.	Aplicación de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado
	
Fundida de viga dintel en concreto armado (Segundo piso).	Instalación de tubería de RCI 4” (Primerpiso).



Levante en bloque vibro-presado (Muro perimetral de cerramiento).



Instalación de tubería EMT de 1/2".



Instalación de aceros de refuerzo para viga de cimentación (Muro perimetral de cerramiento).



Fundida de viga de cimentación para muro perimetral de cerramiento.

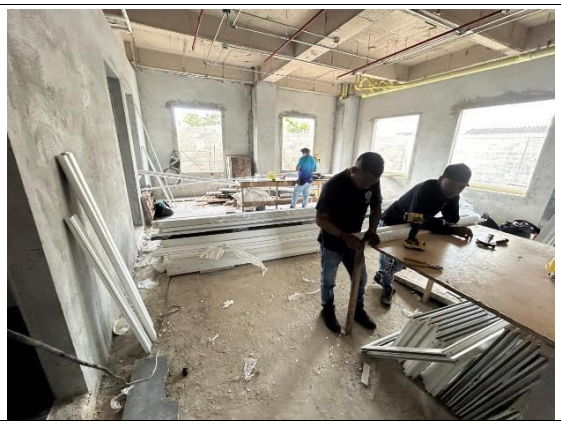
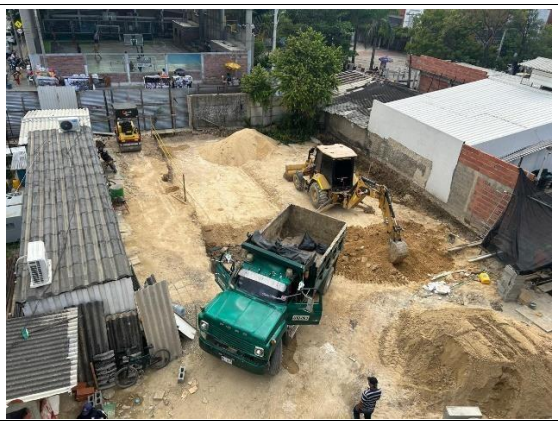


Instalación de piso cerámico.



Instalación de tubería RCI de 2”.

	
Levante de muro de refuerzo para contenciónde terreno (Tanque de agua potable).	Excavación de terreno para tanque de agua potable.
	
Excavación para tanque de agua potable	Excavación y levante de muro de refuerzo para contención de terreno (tanque de aguapotable).
	
Excavación y levante de muro de refuerzo y armado de aceros para tanque de agua potable.	Instalación de tubería de sanitaria PVC 4”.

	
Relleno con materia pétreo paraestabilización del terreno.	Excavación de terreno para tanque de aguapotable.
	
Fundida de placa de contrapiso 10 cm.	Instalación de aceros de refuerzo para viga decimentación de muro perimetral de cerramiento.
	
Fabricación y armado de puertas y ventanasen carpintería metálica.	Excavación y tratamiento y nivelación de terreno en área de parqueadero.
