ACTA No.	017
FECHA	26-09-2024
CIUDAD	Bogotá
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2595 de 2023
OBJETO:	REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS ORIENTADOS A DAR CUMPLIMIENTO A LOS DERECHOS TERRITORIALES, ATENCIÓN INTEGRAL A LAS POBLACIONES Y COMUNIDADES, PROCESOS DE FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
TEMA A TRATAR:	Seguimiento Contrato 2595 de 2023 FINDETER

PARTES QUE INTERVIENEN EN LA REUNION

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Nombre: Fernando Diaz Ariza. C.C. No. 91.013.639 Cargo: Apoyo a la supervisión Convenio.	Nombre: Sandra Ximena Herrera Monge C.C. No. 1.018.410.685 Cargo: Gestora Contrato Findeter
Nombre: Sebastián de Jesús Osorio Negrete C.C. No. 15.648.381 Cargo: Contratista Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías	Nombre: María Fernanda Cifuentes. C.C No. 1.018.443.330. Cargo: Abogado Findeter
Nombre: Melissa Lilibeth Quispe Riascos C.C. No. 1.086.897.142 Cargo: Contratista Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías	Nombre: Mayer Numpaque Pérez. C.C No. 1.000.950.021 Cargo: Profesional Findeter

DESARROLLO DE LA REUNION

La reunión da inicio a las 10 am.

Se solicita que en esta mesa técnica haga presencia la Dirección de Negocios Fiduciarios de Findeter, por lo siguiente:

1. Haciendo una verificación del extracto bancario del mes de agosto de 2024 se encontró lo siguiente:

Se realizó una dispersión relacionada así:

DIA	TRANSACCION	IDENT	DEBITO
09	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A480390	$ 52.325.743.789

Se genera el siguiente interrogante; ¿A que corresponde dicho pago?, del cual se debitó de la cuenta de ahorros 256-14785-1 del Banco de Occidente, denominada FIDUAGRARIA PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MINISTERIO DEL INTERIOR.

¿Se comienza revisando con el equipo de Findeter si se constituyó una subcuenta en la cuenta fiduciaria?, teniendo en cuenta los estudios previos que dice lo siguiente:

En la Mesa de seguimiento se lee textualmente lo siguiente; Cito (5.1. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA FIDUCIA.

FINDETER pondrá a su disposición un esquema fiduciario para la Administración de Recursos, contratados por EL CONTRATISTA con una sociedad fiduciaria pública de reconocida experiencia y trayectoria en el sistema financiero colombiano. Todo lo anterior con arreglo a lo dispuesto por el artículo 335 de la Constitución política de Colombia, el Decreto - Ley 663 de 1993 el cual dispone el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como lo regulado en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.

El fiduciario, como vocero y administrador del patrimonio autónomo, celebrará y ejecutará diligentemente todos los actos jurídicos necesarios para lograr la finalidad del fideicomiso, comprometiendo al patrimonio autónomo dentro de los términos señalados en el acto constitutivo

de la fiducia. Para este efecto, el fiduciario deberá expresar que actúa en calidad de vocero y administrador del respectivo patrimonio autónomo.

En desarrollo de la obligación legal indelegable establecida en el numeral 4 del artículo 1234 del Código de Comercio, el Fiduciario llevará además la personería del patrimonio autónomo en todas las actuaciones procesales de carácter administrativo o jurisdiccional que deban realizarse para proteger y defender los bienes que lo conforman contra actos de terceros, del beneficiario o del constituyente, o para ejercer los derechos y acciones que le correspondan en desarrollo del contrato de fiducia.

Nota: Los recursos serán transferidos a una cuenta exclusiva para el presente contrato y no asignados a una subcuenta de la fiduciaria.)

Donde Carlos Romero Gordo
Profesional - DPNF
Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios

Hace una precisión de la siguiente manera:

De acuerdo con lo relacionado e informado anteriormente, el movimiento bancario de la Cuenta de Ahorros (Banco de occidente) 256-14785-1 del 09 de Agosto de 2024 por $52.3 millones no corresponde a un pago, hace referencia a un traslado interno del Patrimonio Autónomo Findeter Min Interior Derechos Territoriales, donde se constituyó el Fondo de Inversión Colectiva FIC en Fiduagraria S.A., de acuerdo con lo instruido por el Comité Financiero No. 1 del 08 de Agosto de 2024; en dicho Comité, se decidió asignar el 80% de los recursos al Fondo de Inversión Colectiva y el 20% restante mantenerlo en la cuenta de ahorros. Se precisa que este traslado al igual que los demás que tengan la misma naturaleza, no son pagos o gastos del Patrimonio Autónomo sino traslados de recursos dinerarios internos, resaltando que los recursos se mantienen constituidos en la Cuenta de Ahorros y en el FIC cuyo titular es el Patrimonio Autónomo Findeter Min Interior Derechos Territoriales, salvaguardando los dineros transferidos por el MINISTERIO DEL INTERIOR para cumplir con el objeto del CI_2595_2023_MININTERIOR, es decir, que la sumatoria de los saldos de la Cuenta de Ahorros y el FIC constituyen el 100% del saldo de los recursos del Patrimonio Autónomo.

De igual manera se precisa que lo establecido en la nota 5.1. de los estudios previos del contrato interadministrativo No. 2595 de 2023, hace referencia a que los recursos que transfirió el Ministerio del Interior para desarrollar el Objeto del CI_2595_2023_MININTERIOR, se deben manejar en una cuenta exclusiva, esto es, un Patrimonio Autónomo independiente que administra los recursos fideicomitidos en una sola cuenta contable que es el Patrimonio Autónomo; es decir, que la Cuenta Exclusiva hace referencia a el Estado Financiero (Contabilidad) que se maneja de manera independiente del Estado Financiero de FIDUAGRARIA S.A. y de los demás Patrimonios Autónomos que administra dicha Fiduciaria; de igual manera, los rendimientos que se generan diarios tanto en la Cuenta de Ahorros como los del FIC, son reintegrados mensualmente a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, de acuerdo con las instrucciones realizadas por el MINISTERIO DEL INTERIOR, para este Contrato Interadministrativo. El manejo de los recursos con base en el modelo de Cuenta de Ahorros y FIC se ha venido utilizando en muchos Contratos Interadministrativos que contienen dineros del Estado.

Es importante resaltar que la Fiduciaria entrega mensualmente Estados Financieros, Extractos de la Cuenta de Ahorro, del Fondo de Inversión Colectiva FIC, soportes de los hechos económicos realizados, cuyo titular es única y exclusivamente el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIN INTERIOR DERECHOS TERRITORIALES, que al momento de su creación, la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA le asignó un código, que garantiza el manejo de los recursos de forma independiente de los que tiene dicha Fiduciaria.

Se precisa que lo relacionado anteriormente se encuentra en concordancia con concepto remitido en respuesta a requerimiento realizado por el MINISTERIO DEL INTERIOR.

Una Vez termina la intervención el Profesional de Findeter Carlos Gordo, se continua con el seguimiento donde.

FINDETER envió la solicitud de Prorroga mediante oficio de los convenios derivados los cuales son:

Oficio

2202450510364

Findeter No.Rad: 2202450510364
Tipo: Radicado de Salida 30/09/2024 05:47 p.m. Folios: 1
Asunto: Solicitud prórroga del Contrato Interadministrativo No. 2595 de 2023
Radicador: ANGELICA BENAVIDES ALBA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2024

Doctor

HÉCTOR GABRIEL RONDÓN OLAVE
Viceministro para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos
Supervisor CI No. 2595 de 2023
Ministerio del Interior
Cra. 8 No. 12b – 31
Ciudad
gabriel.rondon@mininterior.gov.co

Asunto: Solicitud prórroga del Contrato Interadministrativo No. 2595 de 2023

Respetado doctor Héctor,

En ejercicio de los deberes de vigilar y velar por el cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 2595 de 2023, suscrito entre LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER-, en calidad de supervisor, expongo y solicito, lo siguiente:

Se proceda por parte de la entidad que usted representa con el trámite para ampliar el plazo de ejecución del contrato en mención hasta el 15 de junio del 2025.

Lo anterior, teniendo en cuenta los tiempos de entrega y trámites propios que se vienen surtiendo al interior de las comunidades para la presentación de las iniciativas priorizadas por el Ministerio del Interior, que deben cumplir los requisitos técnicos y jurídicos establecidos por Findeter para adelantar el trámite contractual y posterior ejecución. Lo cual conlleva a que, la fecha proyectada de terminación de los derivados se encuentra prevista entre el 29 de diciembre de 2024 y el 15 de junio de 2025 (anexo 1), superando la fecha de terminación actual del interadministrativo, que se encuentra prevista para el 16 de diciembre de 2024.

Adicionalmente, se relaciona el estado financiero del Contrato Interadministrativo aludido, con corte a 31 de agosto de 2024, de la siguiente manera:

CDP	VIGENCIA FISCAL	FUENTE	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR APROPIADO	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER	VR. EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
187023	2023	NACION	25.917.398.324	21.614.570.765	4.302.418.541	17.375.512.101	4.239.607.664	80%
187223	2023	NACION	22.000.000.004	14.169.642.468	7.830.357.542	8.575.130.006	5.594.511.462	61%
1223	2023	NACION	7.067.521.459	6.190.000.000	877.521.459	3.578.500.000	2.611.500.000	58%
186923	2023	NACION	35.000.000.004	33.183.200.000	1.816.800.000	7.049.765.348	26.133.434.652	21%
102224	2024	NACION	24.600.000.004	8.135.736.976	16.464.263.024	-	8.135.736.976	0%
102824	2024	NACION	5.000.000.004	-	5.000.000.000	-	-	
224	2024	NACION	799.994.327	249.994.327	550.000.000	-	249.994.327	0%
TOTAL			120.384.914.112	83.543.551.548	36.841.360.566	36.578.708.445	46.964.845.101	44%

Gobierno de Colombia

Dirección General:
Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.
PBX: (601) 623 0311 / 623 0388
Línea gratuita nacional: 01-8000-116622

@findeter @findetercol findeter @findetercol Findeter

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Para la verificación pertinente, se anexa:

1. Relación de proyectos con fecha de terminación que superan el plazo.
2. Documento de identidad y antecedentes representante legal Findeter.
3. Certificado de Cámara de Comercio Findeter.
4. Certificado de aportes a seguridad social y parafiscales.
5. Informe técnico contrato interadministrativo.

Sin otro particular, solicitamos comedidamente el envío de las comunicaciones sobre este asunto a través de la siguiente cuenta de correo electrónico: jemercado@findeter.gov.co; sxherrera@findeter.gov.co

Cordialmente,

JORGE EMILIO MERCADO GONZÁLEZ
Gerente de Medio Ambiente

Elaboró: Ximena Herrera Monge – Profesional Vicepresidencia Técnica – Gestora del Contrato
María Fernanda Cifuentes Gómez - Profesional de la Jefatura de Contratación Derivada

C.C. Germán Carlosama López- Director de Asuntos Indígenas Rom y Minorías- Ministerio del Interior-german.carlosama@mininterior.gov.co



La relación de los 48 derivados que FINDETER expresa al Ministerio del Interior y a la supervisión, donde los tiempos de su ejecución que superan el plazo hasta el mes de Junio de 2025, se relacionan a continuación:

N° PROYECTO	ASOCIACIÓN	DEPARTAMENTO	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	OBJETO DEL PROYECTO	FECHA TERMINACION	DIFERENCIA	VALOR PROYECTO
3	ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SOBRE LA CRISIS CLIMÁTICA DEL CORREGIMIENTO DE EL VALLE, BAHÍA SOLANO - CHOCÓ	CHOCO	BAHIA SOLANO	FORTALECIMIENTO	Fortalecimiento de la gobernanza y el relacionamiento de las comunidades indígenas emberas del Alto Río Valle y Boroboro.	1/06/2025	5 MESES Y 1 DÍAS	$ 340.000.000

19	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU IPOULIA DE URRAICHI	LA GUAJIRA	WAYUU IPOULIA	CONSTRUCCIÓN NUEVA	Fortalecimiento de la transmisión oral, prácticas ancestrales y el sistema normativo wayuu en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira	15/06/2025	5 MESES Y 15 DÍAS	$ 4.000.000.000
42	RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DE CALARCÁ, QUINDÍO	QUINDÍO	DACHI AGORE DRU	MEJORAMIENTO	Mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes, permitiéndoles el acceso constante a electricidad a través del aprovechamiento de la energía solar. Acceso a servicios públicos de calidad, para nuestras familias y niños. Vivienda digna para las 17 familias del resguardo.	29/12/2024	11 MESES Y 29 DÍAS	$ 1.840.000.000
63	SHAQUIÑAN	NARIÑO	YARAMAL SHAQUI	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Construccion De Cubierta Y Cancha En Grama Sintetica Del Polideportivo De La Casa Mayor Del Resguardo Indigena De Yaramal, Gran Pueblo De Los Pastos - Nariño.	26/01/2025	0 MESES Y 26 DÍAS	$ 885.400.000
64	SHAQUIÑAN	NARIÑO	REFUGIO SHAQUI	MEJORAMIENTO	Fortalecimiento del resguardo indígena refugio del sol del Pueblo Quillasingas, a través del mejoramiento de la casa del pensamiento en el corregimiento del Encano del Municipio de Pasto".	15/03/2025	2 MESES Y 15 DÍAS	$ 608.400.000

65	SHAQUIÑAN	NARIÑO	GUACHUCAL SHAQ	CONSTRUCCIÓN NUEVA	Fortalecimiento de la Escuela de Derecho Propio Laureano Inampues, a través de la construcción de un salón múltiple en el resguardo indígena de Guachucal del Departamento de Nariño	12/02/2025	1 MESES Y 12 DÍAS	$ 600.000.000
66	SHAQUIÑAN	NARIÑO	CUMBAL SHAQUI	PLACA HUELLA	Fortalecimiento de la infraestructura vial en el Resguardo Indígena del Gran Cumbal, vereda Miraflores, municipio de Cumbal, departamento de Nariño".	9/03/2025	2 MESES Y 9 DÍAS	$ 1.243.600.000
67	SHAQUIÑAN	NARIÑO	MUESES SHAQUI	PLACA HUELLA	Fortalecimiento de la estructura institucional, organizativa y de gobierno propio mediante la construcción de la placa huella en el Resguardo Indígena de Mueses municipio Potosí.	29/01/2025	0 MESES Y 29 DÍAS	$ 885.400.000
68	SHAQUIÑAN	NARIÑO	MUELLAMUES SHAQ	PLACA HUELLA	Fortalecimiento de la infraestructura vial en beneficio de la comunidad del Resguardo Indígena de Muellamues con placa huella, tramo vial San Diego de Muellamues a Colimba, sector Simancas a Cascajal, municipio de Guachucal departamento de Nariño	9/01/2025	0 MESES Y 9 DÍAS	$ 986.700.000
69	CABILDOS ACIZI	NARIÑO	PASTAS ACIZI	PLACA HUELLA	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en la entrada principal de la Vereda Guespud del resguardo indígena de Pastas, Pueblo de Los Pastos	13/02/2025	1 MESES Y 13 DÍAS	$ 999.994.359

					en municipio de Aldana, departamento de Nariño			
70	CABILDOS ACIZI	NARIÑO	GUACHUCAL ACIZI	PLACA HUELLA	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en el sector San Francisco - Ipialpud Bajo del resguardo indígena de Guachucal, Pueblo de Los Pastos en el municipio de Guachucal, departamento de Nariño	11/03/2025	2 MESES Y 11 DÍAS	$ 870.400.000
71	CABILDOS ACIZI	NARIÑO	CARLOSAMA ACIZI	PLACA HUELLA	Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en el sector Chavisnan del resguardo indígena de Carlosama, Pueblo de Los Pastos en municipio de Cuaspud, departamento de Nariño”	2/03/2025	2 MESES Y 2 DÍAS	$ 986.699.995
75	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	SANDE AICO	MEJORAMIENTO	Adecuación De La Casa Del Pensamiento Del Cabildo De El Sande En El Departamento De Nariño.	19/03/2025	2 MESES Y 19 DÍAS	$ 885.000.000
76	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	MALES AICO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Construcción Cubierta En La Cancha Sintética Del Resguardo Indígena De Males	20/02/2025	1 MESES Y 20 DÍAS	$ 838.909.024
77	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	IPIALES AICO	CUBIERTA	Construcción De Cubierta del Polideportivo de la Casa Mayor del Resguardo Indígena de Ipiales, Gran Pueblo de Los Pastos - Nariño	27/02/2025	2 meses 11 dias	$ 1.243.600.000
78	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	MUJERES AICO	CUBIERTA	Construcción De Cubierta de la casa de las mujeres indígenas Pastos	20/01/2025	0 MESES Y 20 DÍAS	$ 1.000.000.000

79	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	MONTAÑA AICO	MEJORAMIENTO	Mejoramiento de la casa de pensamiento del Cabildo Indígena Montaña de Fuego, del Pueblo Quillasinga - Nariño	01-20-2025	1 mes y 4 dias	$ 608.400.000
81	ASOPASTOS	NARIÑO	CUMBAL ASOPASTO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Construcción Y Adecuación De Escenario Deportivo En La Vereda Nazate Municipio De Cumbal Departamento De Nariño	28/01/2025	0 MESES Y 28 DÍAS	$ 885.400.000
82	ASOPASTOS	NARIÑO	PANAN ASOPASTOS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Mejoramiento De Escenarios Deportivos De Las Veredas Panan Centro Y La Poma En El Resguardo Indigena De Panan - Municipio De Cumbal - Nariño	28/01/2025	0 MESES Y 28 DÍAS	$ 986.699.398
84	ASOPASTOS	NARIÑO	S. JUAN ASOPAST	PLACA HUELLA	Fortalecimiento de la infraestructura vial en el Resguardo Indígena de San Juan, vereda Laguna de Baca, Municipio de Ipiales	12/02/2025	1 MESES Y 12 DÍAS	$ 1.085.400.000
85	ASOPASTOS	NARIÑO	PUEBLO ASOPASTO	PLACA HUELLA	Construcción de placa huella en el Resguardo Indígena de Colimba, sector Quetambud del Gran Pueblo de los Pastos - Departamento de Nariño	6/01/2025	0 MESES Y 6 DÍAS	$ 685.400.000
86	ASOPASTOS	NARIÑO	MALLAMA ASOPAST	PLACA HUELLA	Construcción placa huella en el Resguardo Gran Mallama del Municipio de Mallama - Departamento de Nariño	27/02/2025	1 MESES Y 27 DÍAS	$ 870.400.000
87	INTY QUILLA	NARIÑO	TESCUAL INTIQUI	OBRA NUEVA	Construcion De Casa De La Cultura Municipio De Puerres - Resguardo Indígena Del Gran Tescual	12/03/2025	2 MESES Y 12 DÍAS	$ 608.655.366

88	INTY QUILLA	NARIÑO	FUNES INTIQUI	MEJORAMIENTO	Adecuación De La Casa Del Pensamiento Del Cabildo De Funes En El Departamento De Nariño	25/02/2025	1 MESES Y 25 DÍAS	$ 608.400.000
89	INTY QUILLA	NARIÑO	VÍAS INTIQUILLA	PLACA HUELLA	Fortalecimiento De La Infraestructura Vial Mediante La Construcion De Placa Huella En El Municipio De Tuquerres - Nariño Resguardo Indígena De Yascual	14/01/2025	0 MESES Y 14 DÍAS	$ 785.698.289
90	INTY QUILLA	NARIÑO	GENOY INTIQUILL	PLACA HUELLA	Construcción Placa Huella Cabildo Indígena De Genoy Municipio De Pasto, Nariño	8/01/2025	0 MESES Y 8 DÍAS	$ 442.704.138
91	INTY QUILLA	NARIÑO	YASCUAL INTI	FORTALECIMIENTO	Fortalecimiento Institucional Del Resguardo De Yascual En Aras Del Equilibrio Territorial	5/01/2025	0 MESES Y 5 DÍAS	$ 100.400.000
92	INTY QUILLA	NARIÑO	GUACHAVES INTI	PRODUCTIVO	Mejoramiento de la producción agropecuaria a usos y costumbre como base para la recuperación de la autonomía y soberanía alimentaria de las familias indígenas del resguardo de guachaves, pueblo de los pastos	5/01/2025	0 MESES Y 5 DÍAS	$ 986.700.000
93	INTY QUILLA	NARIÑO	CUYICOLA INTI	PRODUCTIVO	Mejoramiento de la producción cuyícola de acuerdo a usos y costumbres, para el fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria de las familias indígenas del Resguardo de Tuquerres, Pueblo de los Pastos – Departamento de Nariño	5/01/2025	0 MESES Y 5 DÍAS	$ 1.000.000.000

99	ASOPASTOS	NARIÑO	ASOPASTOS	FORTALECIMIENTO	Fortalecer espacios de integración cultural, desde las diferentes ramas deportivas con el fin de generar espacios de aprovechamiento del tiempo libre en los pueblos Pastos y Quillasingas del departamento de Nariño.	24/01/2025	0 MESES Y 24 DÍAS	$ 980.000.000
100	ACIZI	NARIÑO	BECAS ACIZI	FORTALECIMIENTO	Otorgar a 550 estudiantes, becas de educación técnica laboral, que, contribuyan en la evolución social, económica y cultural de sus comunidades étnicas, en los departamentos de Nariño y Guajira.	4/01/2025	0 MESES Y 4 DÍAS	$ 2.400.000.000
101	AAMIC - ASOC. ACUICOLA DE MUJERES INDÍGENAS	Cauca y Nariño	AAMIC - ASOC. ACUICOLA DE MUJERES INDÍGENAS	FORTALECIMIENTO	Incrementar niveles de aprovechamiento comercial y productivo de la actividad piscícola, de los pueblos Misak y Pastos.	7/01/2025	0 MESES Y 7 DÍAS	$ 650.000.000
103	NASA POTRERITOS	HUILA	NASA POTRERITOS	FORTALECIMIENTO	Apoyar y fortalecer el ejercicio de gobierno propio, defensa y control territorial de las Autoridades Tradicionales y los Cuidanderos del Territorio.	3/02/2025	1 MESES Y 3 DÍAS	$ 700.000.000
106	ADER	LITORAL PACÍFICO NARIÑENSE	ADER	FORTALECIMIENTO	Fortalecer la implementacion de chagra, de la comunidad AWA, en el marco de la seguridad alimentaria.	10/02/2025	1 MESES Y 10 DÍAS	$ 2.219.000.000
107	ADER	MESA DE LOS PASTOS	ADER	FORTALECIMIENTO	“Convenio Solidario Para Fortalecer Las Tradiciones Cósmicas De Los Pueblos Pasto Y	5/01/2025	0 MESES Y 5 DÍAS	$ 1.000.000

					Quillasinga Para Preservar Usos Y Costumbres"			
109	ACIZI	NARIÑO	MODELO DE SALUD ACIZI	FORTALECIMIENTO	Convenio Solidario para fortalecer el modelo de salud propio e intelectual en el marco de la guía metodológica para la construcción y contenidos del SISPI en los resguardo indígenas de Guachaves, Ipiales, Sande y Funes.	27/12/2024	11 MESES Y 27 DÍAS	$ 500.000.000
110	RESGUARDO INDÍGENA EL SANDE	NARIÑO	APOYO SANDE COMPROMISO GUARDIAS	FORTALECIMIENTO	Fortalecer la soberana y seguridad alimentaria de las familias indgenas del resguardo indgena el sande, mediante mejoramiento de la produccin de huevo criollo.	10/02/2025	1 MESES Y 10 DÍAS	$ 700.000.000
114	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJA ANALUU	Putumayo, Atlántico, Choco, Valle del Cauca, Vaupés, Cordoba y la Guajira.	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJA ANALUU	FORTALECIMIENTO	Fortalecer los pueblos indígenas en capacidades asociativas y operativas por medio del cargue de censo, depuración, inscripción de asociaciones y actualización para su autogobierno y organización territorial.	11/01/2025	0 MESES Y 11 DÍAS	$ 1.000.000.000
115	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE VALLE DEL CAUCA - REGION PACIFICO ACITA RP	VALLE DEL CAUCA	DOTACION DE IMPLEMTOS DE APROPIACION DE LOS INDIGENAS.	FORTALECIMIENTO	Fortalecer la apropiacion y accionar de la justicia propia en los pueblos indigenas del Valle del Cauca para la resolucion de conflictos y la soberania territorial.	15/01/2025	0 MESES Y 15 DÍAS	$ 1.500.000.000

116	CAMAWARI	LITORAL PACÍFICO NARIÑENSE	CAMAWARI	FORTALECIMIENTO	Fortalecer el Ejercicio de Gobierno Propio de la Organización CAMAWARI a Través de la Revisión y Actualización de sus Estatutos y la Adquisición de Equipamiento Institucional.	10/02/2025	1 MESES Y 10 DÍAS	$ 399.550.000
117	RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA	CALDAS Y RISARARLDA	RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA	FORTALECIMIENTO	Compilar y ajustar el Plan de Vida, de la comunidad Indígena emberá Chamí, del Resguardo Escopetera Pirza.	13/01/2025	0 MESES Y 13 DÍAS	$ 1.500.000.000
119	CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA	Cauca, Huila, Putumayo, Valle del Cauca, Quindío, Bogotá D.C.	CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA	FORTALECIMIENTO	Desarrollar la primera fase de sensibilización y fundamentación del proceso de actualización del Plan de Vida del Pueblo Yanakuna.	11/01/2025	0 MESES Y 11 DÍAS	$ 500.000.000
121	RESGUARDO NASA DE Plç KWE ÏKH	HUILA	RESGUARDO NASA DE Plç KWE ÏKH	FORTALECIMIENTO	Apoyar y fortalecer el ejercicio de gobierno propio, defensa y control territorial de las Autoridades Tradicionales y los Cuidanderos del Territorio - Guardia Indígena	3/02/2025	1 MESES Y 3 DÍAS	$ 500.000.000
125	ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE LA GUAJIRA YANAMA	Guajira	ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE LA GUAJIRA YANAMA	FORTALECIMIENTO	Formular el capitulo de diagnostico para el plan de salvaguarda del pueblo Wayuu para los municipios de Uribia y Manaure en el departamento de la Guajira".	12/02/2025	1 MESES Y 12 DÍAS	$ 1.000.000.000

126	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO	Cesar	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO	FORTALECIMIENTO	Fortalecer los escenarios de formación en educación propia y gobernabilidad del pueblo kankuamo mediante la realización de espacios de diálogo intergeneracional y comunitario en los asentamientos kankuamos de los municipios de Valledupar, La paz y Pueblo bello, en el departamento de la Cesar	8/03/2025	2 MESES Y 8 DÍAS	$ 500.000.000
127	AICO PACHAMAMA	Sucre, Córdoba, Risaralda, Quindío, Cauca y Nariño	AICO PACHAMAMA	FORTALECIMIENTO	Fortalecer A La Institucionalidad Indigena A Traves De La Formulacion Y Construccion Del Plan De Vida Para Las Comunidades Indigenas: Zenu Del Oasis, Zenu De Pueblo Nuevo Betancí, Embera Chamí Kurmado, Yanacona De Armenia, Pastos De Armenia, Misak Piscitau De Piendamo Y Awa De Oniac	13/01/2025	0 MESES Y 13 DÍAS	$ 2.000.000.000
128	DEJANDO HUELLA	META Y GUAVIARE	DEJANDO HUELLA	FORTALECIMIENTO	Mejorar La Justicia Propia De Los Resguardos Indígenas La Victoria, Turpial, Doquera, Jiw Caño La Sal, Jiw Luna Roja Y Nukak, Mediante, Capacitación Y Dotación De La Guardia Indígena Como Mecanismo De Defensa De Los Derechos Humanos, El Territorio, La	13/01/2025	0 MESES Y 13 DÍAS	$ 1.000.000.000

					Autonomía Y La Cultura Propia.			
129	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS EMBERA CHAMI “DACHI NABE IUJA	RISARALDA	FORTALECIMIENTO A LA GUARDIA INDÍGENA	FORTALECIMIENTO	Fortalecimiento A La Institucionalidad Indígena A Través De La Formulación Y Construcción Del Plan De Vida Y El Fortalecimiento A La Guardia Indígena Del Resguardo Karabi Drua Del Pueblo Embera Chami	30/01/2025	0 MESES Y 30 DÍAS	$ 350.000.000
Total Proyectos	48 proyectos						$46.267.910.569	

- Respecto a los informes radicados por FINDETER, se han aprobado por parte de la supervisión hasta el informe 4 con sus respectivos Anexos.
  El informe 5 está en revisión por ajuste en unos anexos.
  Los informes 6, 7, 8 están radicados, pero no se cuenta con los respectivos soportes para poder ser revisados por la supervisión.
  El informe 9 y el informe 10 están pendientes por radicar los cuales deben de ser radicados el 30 de Septiembre de 2024.


- FINDETER hace presentación del estado actual de los 129 convenios. (se anexa presentación)

Comité de Seguimiento Programa MININTERIOR
Contrato Interadministrativo No. 2595 de 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

TABLA #1. RESUMEN GENERAL DE PROYECTOS

ESTADO	PROYECTOS
EN EJECUCIÓN	54
TERMINADO	22
PENDIENTES POR SUSCRIBIR ACTA DE INICIO	14
PENDIENTES POR SUSCRIBIR CONVENIO SOLIDARIO	11
FIRMA DE MINUTA	19
LIQUIDADO	1
EN LIQUIDACIÓN	8
TOTAL GENERAL PROYECTOS	**129**

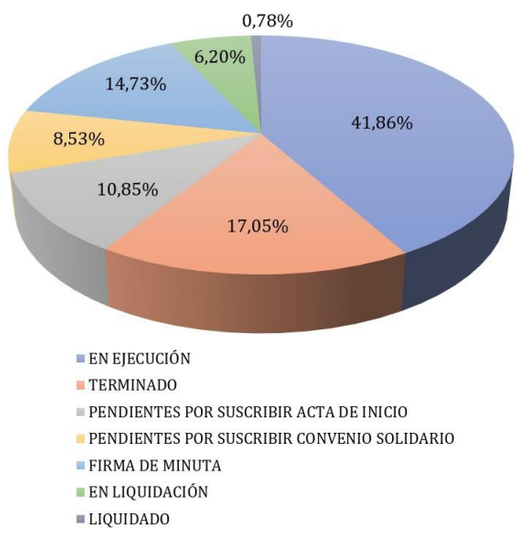

GRÁFICA #1. BALANCE PORCENTUAL DE PROYECTOS

No se cumplió con la meta de proyectada del pago para 52 proyectos y equivalente al valor proyectado por$ 14.769.864.555, el motivo por el cual no se logró la meta establecida, es porqué la radicación de las cuentas sobre paso el tiempo, que se les asigna a las comunidades para poder radicar.

Estas metas no complementadas, se pasan para el mes de octubre por lo que se habían radicado extemporáneamente. Dicho esto, quedaron efectivamente cancelados en el mes de Septiembre son los siguientes 25 Proyectos por un valor de $6.383.450.828

N° PROYECTO	ASOCIACIÓN	DEPARTAMENTO	PROYECTO	No.CONVENIO SOLIDARIO	TIPO DE PROYECTO	% PROYECCION No. de Desembolso	% PROYECCION PAGO	PAGO PROYECTADO
4	REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL PUEBLO ZENÚ	CÓRDOBA	PLAN REGIÓN PG	007-2024	FORTALECIMIENTO	3	20,00%	$ 95.000.000
6	Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca CXHAB WALA KIWE - ACIN	CAUCA	PROD. ACIN	052-2024	FORTALECIMIENTO	1	40,00%	$ 76.000.000
20	CONCEJO ETNOLÓGICO DE LA COMUNIDAD EBANO TACANAL	URABA Y ANTIOQUÍA	PLAN ÉBANO	012-2024	FORTALECIMIENTO	3	20,00%	$ 100.000.000
27	FUNDACION WAUYE>EAKUAIPA>A	LA GUAJIRA	PLAN WAUYEE	032-2024	FORTALECIMIENTO	2	40,00%	$ 228.000.000
29	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL VALLE DEL CAUCA	PLAN ACIVA RP	PLAN CANTAGALLO	051-2024	FORTALECIMIENTO	2	40,00%	$ 147.008.584
36	Central Cooperativa Indígena del Cauca – CENCOIC	CAUCA, NARIÑO, HUILA, PUTUMAYO, TOLIMA, Y VALLE DEL CAUCA	FORT. CENCOIC	058-2024	FORTALECIMIENTO	2	40,00%	$ 388.000.000
39	Resguardo Indígena LLANO BUCO (BUKJUKUE)	HUILA	GOB. LLANO BUCO	023-2024	FORTALECIMIENTO	3	20,00%	$ 60.000.000

41	FUNDACIÓN ABORIGEN ONIC	Cundinamarca	FORT. ONIC	045-2024	FORTALECIMIENTO	3	20,00%	$ 120.000.000
43	RES.NAMUY PIRO	NARIÑO, CAUCA, PUTUMAYO, GUAJIRA, MAGDALENA, VICHADA, META Y CALDAS	Departamento de Nariño, pueblos Pasto, Quillasinga; departamento de Cauca, pueblos Misak Misak y Nasas; departamento del Putumayo, pueblos Inga Kamtsa; departamento de la Guajira, pueblo Wayuu; departamento de Mgadalena, pueblo Arhuaco, Kogui; Departamento de Vichada, Pueblo Sikuani, Departamento de Meta, Pueblo achawua; departamento de Caldas, pueblo Embera Chami.	004-2024	FORTALECIMIENTO	3	20,00%	30.000.000,00
60	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AMURIAJIRAWA DE ARRAIPA	VICHADA, ANTIOQUIA, CÓRDOBA, CHOCÓ, CALDAS Y LA GUAJIRA	SALVAG. ARRAIPA	030-2024	FORTALECIMIENTO	3	25,00%	$ 475.000.000
63	SHAQUIÑAN	NARIÑO	YARAMAL SHAQUI	070-2024	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1	35,00%	$ 309.890.000
71	CABILDOS ACIZI	NARIÑO	CARLOSAMA ACIZI	080-2024	PLACA HUELLA	1	35,00%	$ 345.344.998
79	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	MONTAÑA AICO	068-2024	MEJORAMIENTO	1	35,00%	$ 212.940.000
79	CABILDOS ACIZI	NARIÑO	PASTAS ACIZI	079-2024	MEJORAMIENTO	1	35,00%	$ 349.998.026

80	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	ILES AICO	060-2024	PRODUCTIVO	1	35,00%	$ 761.421.842
83	ASOPASTOS	NARIÑO	COLIMB ASOPASTO	061-2024	FORTALECIMIENTO	1	40,00%	$ 80.000.000
84	ASOPASTOS	NARIÑO	S. JUAN ASOPASTOS	053-2024	PLACA HUELLA	1	35,00%	$ 379.890.000
85	ASOPASTOS	NARIÑO	PUEBLO ASOPASTO	082-2024	PLACA HUELLA	1	35,00%	$ 239.890.000
86	ASOPASTOS	NARIÑO	MALLAMA ASOPAST	069- PAF-MININTERIOR-CS-748-2024	PLACA HUELLA	1	35,00%	$ 304.640.000
87	INTY QUILLA	NARIÑO	TESCUAL INTIQUI	088-2024	OBRA NUEVA	1	35,00%	$ 213.029.378
94	RESGUARDO LAGUNA PEJENDINO	NARIÑO	PROD. PEJENDINO	057-2024	FORTALECIMIENTO	2	40,00%	$ 354.160.000
97	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TRAPECIO AMAZÓNICO	AMAZONAS	FORT. ACITAM	089-PAF-MININTERIOR-CS-769-2024	FORTALECIMIENTO	2	35,00%	$ 350.000.000
98	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS	ANTIOQUIA	LOS ALMENDROS	084-2024	FORTALECIMIENTO	1	40,00%	$ 200.000.000
117	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA - PIRZA	CALDAS Y RISARARLDA	RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA PIRZA	087-2024	FORTALECIMIENTO	1	35,00%	$ 525.000.000
118	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS POR COLOMBIA	BOGOTÁ D.C	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS POR COLOMBIA	100-PAF-MININTERIOR-CS-783-2024	FORTALECIMIENTO	1	40,00%	$ 68.238.000
TOTAL CUENTAS DE COBRO MININTERIOR						25		$ 6.383.450.828

La proyección para el mes de Octubre es de 68 proyectos equivalente a $19.454.941.511,16, se reportan a continuación

N° PROYECTO	ASOCIACIÓN	DEPARTAMENTO	PROYECTO	No.CONVENIO SOLIDARIO	TIPO DE PROYECTO	% PROYECCION PAGO2	PAGO PROYECTADO
1	Asociación de Cabildos Mayores Embera Katíos del Alto Sinú	CÓRDOBA	EMBERA KATÍOS	034-2024	FORTALECIMIENTO	20%	$ 40.000.000,00
5	Asociación de Cabildos indígenas Emberá, Waunan, Katio, Chamí y Tule del Departamento del Choco-OREWA	CHOCÓ	ASOREWA	047-2024	FORTALECIMIENTO	20%	$ 38.000.000,00
7	ORIVAC, ORGANIZACIÓN REGIONAL INDIGENA DEL VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	PLAN ORIVAC	002-2024	FORTALECIMIENTO	20%	$ 20.000.000,00
9	ARIT	HUILA, CAQUETÁ, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, PUTUMAYO, META, TOLIMA y BOGOTÁ D.C.	GOBIERNO AISO	018-2024	FORTALECIMIENTO	25%	$ 137.500.000,00
11	Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Shipia Wayuu	LA GUAJIRA	GOBIERNO SHIPIA	036-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 98.000.000,00
13	Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI) OPIAC	CUNDINAMARCA	CDDHH INDÍGEN	033-2024	FORTALECIMIENTO	25%	$ 362.500.000,00
14	RESGUARDO INDÍGENA AWA DE MAGUI	NARIÑO	AWA DE MAGUI	048-2024	FORTALECIMIENTO	25%	$ 142.500.000,00
17	Asociación Indígena Nacional Tierra Viva	ANTIOQUÍA, PUTUMAYO, LA GUAJIRA, NARIÑO	TIERRA VIVA	001 -2024	FORTALECIMIENTO	25%	$ 375.000.000,00
20	CONCEJO ETNOLÓGICO DE LA COMUNIDAD EBANO TACANAL	URABA Y ANTIOQUÍA	PLAN ÉBANO	016-2024	FORTALECIMIENTO	20%	$ 100.000.000,00
22	RESGUARDO INDIGENA TOTORO	CAUCA	PLAN TOTORÓ	029-2024	FORTALECIMIENTO	20%	$ 100.000.000,00
23	RESGUARDO INDIGENA ESCOPETERA Y PIRZA,	CALDAS	PLAN ESCOPETERA	037-2024	FORTALECIMIENTO	20%	$ 94.000.000,00

26	ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA – RESGUARDO KOGUI – MALAYO – ARHUACO	CESAR, LA GUAJIRA Y MAGDALENA	WIWA KOGUI	017-2024	FORTALECIMIENTO	20%	$ 94.000.000,00
33	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE CALDAS - ACICAL	CALDAS	FORT. ACICAL	027-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 332.500.000,00
34	Resguardo Indígena de Huila Páez Cauca	CAUCA	HUILA PAEZ	040-2024	FORTALECIMIENTO	40%	$ 188.000.000,00
36	Central Cooperativa Indígena del Cauca – CENCOIC	CAUCA, NARIÑO, HUILA, PUTUMAYO, TOLIMA, Y VALLE DEL CAUCA	FORT. CENCOIC	058-2024	FORTALECIMIENTO	25%	242.500.000
37	Resguardo Indígena Yanakuna Rumiyako del Municipio de Pitalito Huila	HUILA	RESG. RUMIYAKO	022-2024	FORTALECIMIENTO	25%	$ 305.000.000,00
41	FUNDACIÓN ABORIGEN ONIC	CUNDINAMARCA	FORT. ONIC	049-2024	FORTALECIMIENTO	20%	$ 60.000.000,00
42	RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DE CALARCÁ, QUINDÍO	QUINDÍO	DACHI AGORE DRU	050-2024	MEJORAMIENTO	40%	$ 736.000.000,00
46	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AMURIAJIRRAWA DE ARRAIPA	Territorio Nacional	PROCESOS ARRAIP	024-2024	FORTALECIMIENTO	25%	$ 758.654.809,25
51	FUNDACIÓN NARIÑO 2000	PUTUMAYO, NARIÑO, CAUCA, RISARALDA, BOGOTÁ, LA GUAJIRA	FORT. F.NARIÑO	028-2024	FORTALECIMIENTO	25%	$ 442.500.000,00
54	CORPORACIÓN PARA LA RESULTORÍA ESTRATÉGICA MANTIS	GUAVIARE	FORTALECIMIENTO DE LOS USOS Y COSTUMBRES DEL PUEBLO NUKAK A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Y DESARROLLO DE PLANES ADMINISTRATIVOS ORGANIZACIONALES.	045-2024	FORTALECIMIENTO	25%	$ 287.500.000,00

56	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU ANATAS WAKUAIPA	LA GUAJIRA	PLAN ANATAS	026-2024	FORTALECIMIENTO	40%	$ 320.000.000,00
57	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU	HUILA	FORT. CRIHU	020-2024	FORTALECIMIENTO	25%	$ 160.000.000,00
63	SHAQUIÑAN	NARIÑO	YARAMAL SHAQUI	070-2024	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	35%	$ 309.890.000,00
66	SHAQUIÑAN	NARIÑO	CUMBAL SHAQUI	071- PAF-MININTERIOR-CS-751-2024	PLACA HUELLA	35%	$ 435.260.000,00
67	SHAQUIÑAN	NARIÑO	MUESES SHAQUI	072- PAF-MININTERIOR-CS-752-2024	PLACA HUELLA	35%	$ 309.890.000,00
68	SHAQUIÑAN	NARIÑO	MUELLAMUES SHAQ	073- PAF-MININTERIOR-CS-753-2024	PLACA HUELLA	35%	$ 345.345.000,00
69	CABILDOS ACIZI	NARIÑO	PASTAS ACIZI	079-2024	PLACA HUELLA	35%	$ 349.998.025,65
70	CABILDOS ACIZI	NARIÑO	GUACHUCAL ACIZI	091-PAF-MININTERIOR-CS-782-2024	PLACA HUELLA	35%	$ 304.640.000,00
71	CABILDOS ACIZI	NARIÑO	CARLOSAMA ACIZI	080- PAF-MININTERIOR-CS-760-2024	PLACA HUELLA	35%	$ 345.344.998,25
73	CABILDOS ACIZI	NARIÑO	ALDEA ACIZI	074- PAF-MININTERIOR-CS-754-2024	OBRA NUEVA	40%	$ 243.360.000,00
74	CABILDOS ACIZI	NARIÑO	TUQUERRES ACIZI	075 - PAF-MININTERIOR-CS-755-2024	MEJORAMIENTO	40%	$ 97.440.000,00
75	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	SANDE AICO	090-PAF-MININTERIOR-CS-774-2024	MEJORAMIENTO	35%	$ 309.750.000,00
76	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	MALES AICO	067-2024	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	35%	$ 293.618.158,40
77	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	IPIALES AICO	065-2024	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	35%	$ 435.260.000,00
78	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	MUJERES AICO	066-2024	CUBIERTA	35%	$ 350.000.000,00
79	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	MONTAÑA AICO	068-2024	MEJORAMIENTO	35%	$ 212.940.000,00
80	AICO POR LA PACHAMAMA	NARIÑO	ILES AICO	060-2024	PRODUCTIVO	40%	$ 870.196.390,40
81	ASOPASTOS	NARIÑO	CUMBAL ASOPASTO	076-2024	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	35%	$ 309.890.000,00

82	ASOPASTOS	NARIÑO	PANAN ASOPASTOS	077-2024	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	35%	$ 345.344.789,26
83	ASOPASTOS	NARIÑO	COLIMB ASOPASTO	061-2024	FORTALECIMIENTO	40%	$ 80.000.000,00
84	ASOPASTOS	NARIÑO	S. JUAN ASOPAST	081-2024	PLACA HUELLA	35%	$ 379.890.000,00
85	ASOPASTOS	NARIÑO	PUEBLO ASOPASTO	082- PAF-MININTERIOR-CS-762-2024	PLACA HUELLA	35%	$ 239.890.000,00
86	ASOPASTOS	NARIÑO	MALLAMA ASOPAST	069- PAF-MININTERIOR-CS-748-2024	PLACA HUELLA	35%	$ 304.640.000,00
87	INTY QUILLA	NARIÑO	TESCUAL INTIQUI	088-2024	OBRA NUEVA	40%	243.462.146
88	INTY QUILLA	NARIÑO	FUNES INTIQUI	(en blanco)	MEJORAMIENTO	35%	$ 212.940.000,00
89	INTY QUILLA	NARIÑO	VÍAS INTIQUILLA	083-2024	PLACA HUELLA	40%	$ 314.279.316
90	INTY QUILLA	NARIÑO	GENOY INTIQUILL	078-2024	PLACA HUELLA	40%	$ 177.081.655,20
91	INTY QUILLA	NARIÑO	YASCUAL INTI	055-2024	FORTALECIMIENTO	40%	$ 40.160.000,00
92	INTY QUILLA	NARIÑO	GUACHAVES INTI	062-2024	PRODUCTIVO	40%	$ 394.680.000,00
93	INTY QUILLA	NARIÑO	CUYICOLA INTI	063-2024	PRODUCTIVO	40%	$ 400.000.000,00
95	COMUNIDAD OBONUCO DEL PUEBLO QUILLACINGA	NARIÑO	CUYICOLA OBONUC	064-2024	PRODUCTIVO	40%	$ 663.800.000,00
96	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL EMPRENDIMIENTO REGIONAL - ADER NARIÑO	NARIÑO	FORTALECIM ADER	042-2024	FORTALECIMIENTO	25%	$ 270.558.222,75
99	ASOPASTOS	NARIÑO	ASOPASTOS	085-PAF-MININTERIOR-CS-771-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 343.000.000,00
102	RESGUARDO INDIGENA DE LAME	CAUCA	RESGUARDO INDIGENA DE LAME	099-PAF-MININTERIOR-CS-775-2024	FORTALECIMIENTO	40%	$ 120.000.000,00
103	NASA POTRERITOS	HUILA	NASA POTRERITOS	098-PAF-MININTERIOR-CS-776-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 245.000.000,00
104	CABILDO MAYOR UKAWE'SX THA' ALTO NÁPOLES	VALLE DEL CAUCA	CABILDO MAYOR UKAWE'SX THA' ALTO NÁPOLES	097-PAF-MININTERIOR-CS-777-2024	FORTALECIMIENTO	40%	$ 100.000.000,00
105	CABILDO MAYOR DXI'J PHADENA	VALLE DEL CAUCA	CABILDO MAYOR DXI'J PHADENA	095-PAF-MININTERIOR-CS-778-2024	FORTALECIMIENTO	40%	$ 100.000.000,00
107	ADER - MESA PASTOS	NARIÑO	ADER - MESA PASTOS	104- PAF-MININTERIOR-CS-792-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 350.000.000,00
112	ASOCIACIÓN INDIGENA WAYUU IPOULIA DE URRAICHI	LA GUAJIRA	ASOCIACIÓN INDIGENA WAYUU IPOULIA DE URRAICHI	103- PAF-MININTERIOR-CS-786-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 455.000.000,00

114	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJA ANALUU	Putumayo, Atlántico, Choco, Valle del Cauca, Vaupés, Cordoba y la Guajira.	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJA ANALUU	102- PAF-MININTERIOR-CS-785-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 350.000.000,00
115	ACIVA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS VALLE DEL CAUCA - REGIÓN PACÍFICO	Valle del cauca y Chocó	ACIVA - ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS VALLE DEL CAUCA - REGIÓN PACÍFICO	108- PAF-MININTERIOR-CS-788-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 525.000.000,00
118	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS POR COLOMBIA	BOGOTÁ D.C	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS POR COLOMBIA	100-PAF-MININTERIOR-CS-783-2024	FORTALECIMIENTO	40%	$ 68.238.000,00
119	CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA	Cauca, Huila, Putumayo, Valle del Cauca, Quindío, Bogotá D.C.	CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA	094-PAF-MININTERIOR-CS-780-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 175.000.000,00
121	RESGUARDO NASA DE Plç KWE ÏKH	HUILA	RESGUARDO NASA DE Plç KWE ÏKH	093-PAF-MININTERIOR-CS-781-2024	FORTALECIMIENTO	40%	$ 200.000.000,00
124	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJAA WAUYA	Guajira	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJAA WAUYA	109-PAF-MININTERIOR-CS-793-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 525.000.000,00
126	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO	Cesar	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO	111-PAF-MININTERIOR-CS-796-2024	FORTALECIMIENTO	35%	$ 175.000.000,00
127	AICO PACHAMAMA	Sucre, Córdoba, Risaralda, Quindío, Cauca y Nariño	AICO PACHAMAMA	(en blanco)	FORTALECIMIENTO	35%	$ 700.000.000,00
Total	68					$ 19.454.941.511,16	

Los proyectos con los que inicio el convenio 2595 de 2023, que a la fecha de esta mesa técnica no han iniciado son los siguientes.

COMPROMISOS

RESPONSABLES	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Ministerio del Interior y FINDETER	1. FINDETER enviará el informe Financiero del mes de agosto. 2. FINDETER estará enviando el Oficio referente a las liquidaciones 3. FINDETER enviara los respectivos anexos para la revisión de los informes 6, 7 y 8. 4. FINDETER estará radicando los informes 9 y 10 con sus respectivos soportes.	7 octubre 2024

	5. El MINISTERIO estará terminando de revisar el informe 5 con sus respectivos anexos.	

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Fernando Diaz Ariza
Firma
Apoyo a la Supervisión Convenio

Sandra Ximena Herrera Monge
Firma
FINDETER

Sebastián de Jesús Osorio Negrete
Firma
Contratista Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías

Mayer Numpaque Pérez.
Firma
FINDETER

Melissa Lilibeth Quispe Riascos.
Firma
Contratista Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías

Camilo José Álvarez.
Firma
FINDETER

Leonardo Fabián Hernandez Jaramillo.
Firma
Contratista Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías

María Fernanda Cifuentes G.
Firma
FINDETER

Hernán de Jesús Insignares.
Firma
Contratista, Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías

Carlos Alberto Gordo
Firma
FINDETER

Juan Sebastián Ordoñez.
Firma
Contratista, Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías

Ismael León
Firma
FINDETER

Erika Linares Penagos.

Firma
Contratista, Viceministerio para el dialogo Social,
y derechos Humanos

.

Merardo Rivera.
Firma
Contratista, Viceministerio para el dialogo Social,
y derechos Humanos

Registro Fotográfico



Lista de Asistencia

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema: Seguimiento Convenio 2595 de 2023 Findeter

Responsable u organizador: Fernando Diaz | Dependencia: Viceministerio Dialogo

Ciudad: Bogota | Lugar y/o enlace: Bancal piso 6 | ☒Presencial ☐Virtual | Fecha: Dia 26 Mes 9 Año 2024 | Hora inicial 10 am Hora final

Tipo ☐ Comité ☐ Junta ☒ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN) **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)** Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDIHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Carlos Alberto Romero Cadena	1144204484	53							FINDETER	PROFESIONAL	carromero@findeter.gov.co	3005607789	
2	Mercado Rivera	4241646								VDS	CONTRATISTA	mercado.rivera.		
3	Erika Linares P	52230371								VDS	Contratista	elinares35@hotmail.com	3165275 ++	
4	Ismael Leon R	80492859								Findeter	abogado	ileon@Findeter.gov	3006955	
5	Maria Fernanda Cifuentes	1018443330	33					X		Findeter	abogada	mfcifuentes@findeter.gov.co	3013580707	
6	Leonardo Hernandez	80084877	43					X		Dairm	Contratista	Leonardo.Hernandez@minint.gov.co	3212661427	
7	Juan Sebastián Ordoñez O.	1031779259						X		DAIRM	Contratista	juan.ordonez@mininterior.gov.co	3145492231	
8	Ximena Herrera Muñoz	1018410685	37							Findeter	Gestora	sxherrera@findeter.gov.co	3202662682	
9	Mayer Numpaque P.	1000950021								Findeter	Supervisor	mynumpaque@findeter.gov.co	3023504778	
10	Mercado Rivera	4241646								VDS	contratista	mercado.rivera	3153591031	
11	Fernando Diaz	91036394								VDS	contratista	fernando.diaz@dnp.gov.co	3115588524	
12	Camilo José Álvarez Valencia	1023118026								Findeter	Contratista	CJAlvarez@findeter.gov.co	3134391159	
13	Sebastian Ospina N	1564938								DDHH	ti	sebastian.ospina@mininterior.gov.co	3012744.6	

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.
