	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	MACROPROCESO: APOYO	
	DEPENDENCIA:	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL / FORMATO: Acta	
	FECHA: 04-01/24 / **CÓDIGO: GC** / **VERSIÓN: 00**	Páginas 1

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION				FECHA:	6	de	DICIEMBRE	de	2024	
PERIODO:	DEL	21	de	NOVIEMBRE	de	2024	AL	6	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ					
N° Contrato	MSE-SAMC-003-2024	Fecha de suscripción contrato	07 DE OCTUBRE DE 2024		Fecha de Terminación según contrato	07 DE DICIEMBRE DE 2024
N° CDP	244	Fecha CDP	30 DE AGOSTO DE 2024	N° RP	819	Fecha RP	07 DE OCTUBRE DE 2024
N° CDP	318	Fecha CDP	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	N° RP	905	Fecha RP	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nombre del Supervisor:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA			Identificación:		C.C No.1.049.650.352 de Tunja

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	ISMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS R/L JASMITH DANIELA SIERRA RODRÍGUEZ	Identificación:	NIT No. 901.718.955-1
Teléfono:	3223871674	Dirección:	CALLE 3 No.3-75

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	8	10	2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	7	12	2024
ADICIONES EN PLAZO			N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	6	12	2024

Andrea Carolina Ruiz Medina

INGENIERIA CIVIL


ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
Interventor y/o Supervisor

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	MACROPROCESO: APOYO			
	DEPENDENCIA:			
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	FORMATO: Acta de Liquidación		
	FECHA: 04-01/24	CÓDIGO: GC	VERSIÓN: 00	Páginas 2

INFORME DE SUPERVISIÓN


AVANCE DE EJECUCIÓN


% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%




ÍTEM	DESCRIPCIÓN-- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. CONDICIONES MÍNIMAS DE DESEMPEÑO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ALCANTARILLADO (INCLUYE	ML	558,10
2	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	579,89
3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	13,31
4	RELLENO ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	39,07
5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	502,61
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)..	M3-KM	1.250,15
7	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	2,64
8	DESMONTE ADOQUÍN PREFABRICADO	M2	0,00
9	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	605,81

REGISTRO FOTOGRAFICO

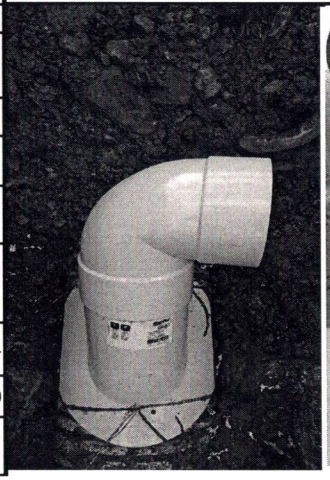

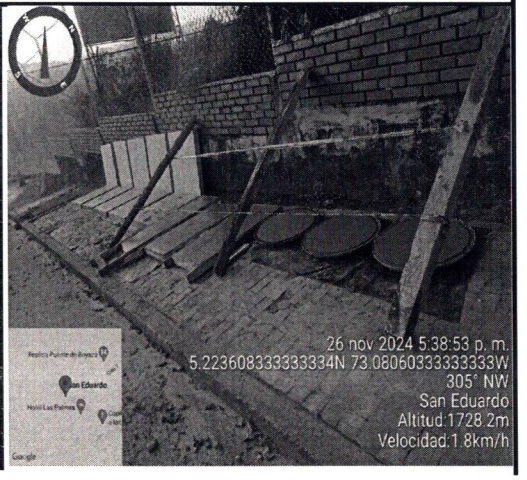

10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	348,00
11	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1,2 M	ML	4,00
12	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M, 2.5"	ML	-
13	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA	UND	5,57
14	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UND	125,80
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	ML	204,10
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	6,00
17	SUMINISTRO E INSTALACIO DE KIT SILLA YEE D.E 160MM	UND	22,00
18	SUMINISTRO E INSTALACIO DE KIT SILLA YEE D.E 200MM	UND	1,00
19	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80X 80 CM	UND	26,00
20	RELLENO DE GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	39,07
21	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE MATERIAL DE GRESS	ML	74,00
22	POZO DE INSPECCION DIAMETRO INTERIOR 1.0 M	UND	3,00
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SANITARIO	UND	7,00
24	TUBERIA DE 6" PVC SANITAIA, INCLUYE INSTALACION	ML	4,45
25	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA EN SECOO	M3	12,60
26	CERRAMINETO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50	UND	25,00

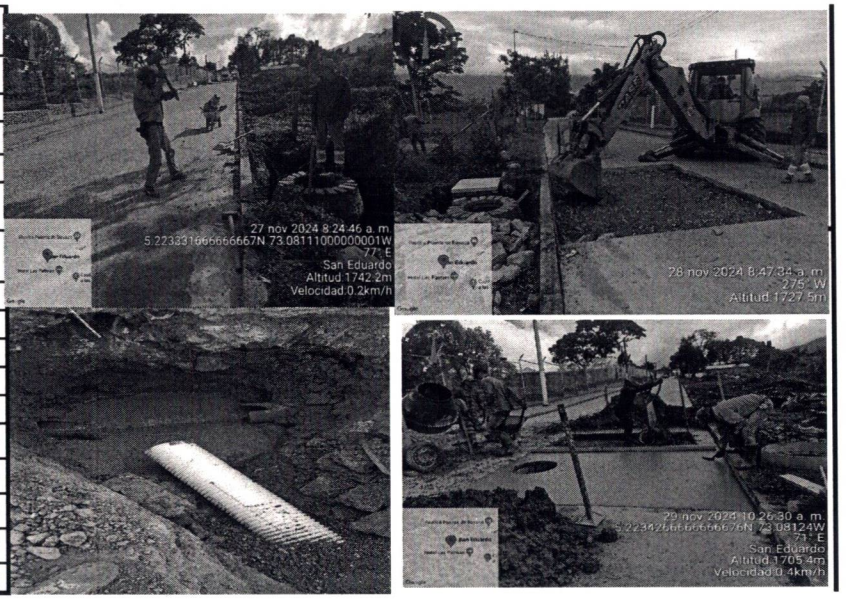

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	MACROPROCESO: APOYO			
	DEPENDENCIA:			
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	FORMATO: Acta de Liquidación		
	FECHA: 04-01/24	**CÓDIGO: GC**	**VERSIÓN: 00**	Páginas 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

SEGUIMIENTO FINACIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 235.453.358,00
Valor Adición	$ 18.507.179,00
Valor Total del contrato:	$ 253.960.537,00
Valor Pagado	$ 222.632.114,00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 31.325.879,00**
Valor Ejecutado	$ 253.957.993,00
Saldo:	$ 2.544,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 253.957.993,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud												$ 0
Pensión												$ 0
Aportes ARL												$ 0
CCF												$ 0
Valor pagado por periodo												**$ 0**

OBSERVACIONES

ADJUNTA PLANILLA NO.31760177 EN LA CUAL SE RELACIONA TRES (03) TRABAJADORES CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE , DE IGUAL MANERA ADJUNTA PLANILLA No. 31759953 EN LA CUAL SE RELACIONA CINCO (05) PROFESIONALES CORRESPONDE A EL MES DE NOVIEMBRE

FIRMA: Andrea Carolina Ruiz Medina

INGENIERIA CIVIL

Supervisor

VoBo

NOMBRE:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA

Documentos y folios Anexos	CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES Y PLANOS RECORD

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	MSE-SAMC-003-2024	**DE FECHA:**	07 DE OCTUBRE DE2024	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL			08 DE OCTUBRE DE 2024	2
CONTRATISTA:	ISMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS **R/L** JASMITH DANIELA SIERRA RODRÍGUEZ			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	PLAZO:	DOS (02) MESES		06 DE DICIEMBRE DE 2024
V. INICIAL	**$ 235,453,358.00**	**% EJECUTADO**	100.00%		**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	**18,507,179.00**	**% TIEMPO**	100.00%	07 DE DICIEMBRE DE 2024	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL	**$ 253,960,537.00**				

CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCLUSIÓN DE NUEVOS		PAGOS REALIZADOS ACTA PARCIAL No. 1		ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDAD FINAL EJECUTADA	
No.	**COD - GOBER**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**INCREMENTO POR DISTANCIA**	**V/TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
SECCIÓN 1- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO															
1.1	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ALCANTARILLADO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	M	500	$ 1,062.32	-	$ 531,160.00	558.10	$ 592,881.00	558.10	$ 592,881.00	0.00	$ 0.00	558.10	$ 592,881.00
SECCIÓN 2- RED DE ALCANTARILLADO															
2.1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	310.00	$ 25,449.98	-	$ 7,889,494.00	579.89	$ 14,758,189.00	579.89	$ 14,758,189.00	0.00	$ 0.00	579.89	$ 14,758,189.00
2.2	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	62.00	$ 51,943.58	-	$ 3,220,502.00	13.31	$ 691,369.00	5.12	$ 265,951.00	8.19	$ 425,418.00	13.31	$ 691,369.00
2.3	2.01.07	RELLENO ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	24.00	$ 169,516.10	0.14	$ 4,637,960.00	39.07	$ 7,550,213.00	39.067	$ 7,549,633.00	0.00	$ 0.00	39.067	$ 7,549,633.00
2.4	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	300.00	$ 26,055.23	0.14	$ 8,910,889.00	502.61	$ 14,929,006.00	502.61	$ 14,929,006.00	0.00	$ 0.00	502.61	$ 14,929,006.00
2.5	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)..	M3-KM	1,687.20	$ 2,312.50	-	$ 3,901,650.00	1,250.15	$ 2,890,972.00	1,250.19	$ 2,891,064.00	-0.04	-$ 93.00	1250.15	$ 2,890,971.00
2.6	3.13.15	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	0.9240	$ 411,262.48	-	$ 380,007.00	2.64	$ 1,085,733.00	-	$ 0.00	2.64	$ 1,085,733.00	2.64	$ 1,085,733.00
2.7	1.01.47	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	2.40	$ 4,742.57	-	$ 11,382.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.8	3.12.01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	372.00	$ 5,013.50	-	$ 1,865,022.00	605.81	$ 3,037,228.00	597.61	$ 2,996,118.00	8.20	$ 41,111.00	605.81	$ 3,037,229.00
SECCIÓN 3- REDES Y OTROS															
3.1	2.05.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	500.00	$ 202,745.55	0.14	$ 115,564,964.00	348.00	$ 80,433,215.00	348.00	$ 80,433,215.00	0.00	$ 0.00	348.00	$ 80,433,215.00
3.2	2.05.05	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	ML	9.00	$ 2,451,553.56	0.14	$ 25,152,940.00	4.00	$ 11,179,084.00	-	$ 0.00	4.00	$ 11,179,084.00	4.00	$ 11,179,084.00
3.3	2.05.07	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M, 2.5 < H < 3.5	M	1.00	$ 5,108,376.39	0.14	$ 5,823,549.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.4	2.07.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	UND	2.62	$ 961,647.52	0.14	$ 2,872,753.00	5.57	$ 6,106,269.00	0.64	$ 701,618.00	4.93	$ 5,404,651.00	5.57	$ 6,106,269.00
3.5	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	UND	44.56	$ 7,002.12	0.14	$ 355,696.00	125.80	$ 1,004,188.00	71.30	$ 569,146.00	54.50	$ 435,042.00	125.80	$ 1,004,188.00
ITEMS NO PREVISTOS															
NP1	2.05.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	ML	-	$ 62,608.90	0.14	$ 0.00	204.10	$ 14,567,463.00	204.10	$ 14,567,463.00	0.00	$ 0.00	204.10	$ 14,567,463.00
NP2	2.05.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	-	$ 85,764.02	0.14	$ 0.00	6.00	$ 586,626.00	6.00	$ 586,626.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 586,626.00
NP3	ESTUDIO DE MERCADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE D.E. INY ALCANT 315 MM X 160 MM, INCLUYE SELLADO CON SIKAFLEX Y AMARRE CON ALAMBRE GALVANIZADO	UND	-	$ 222,000.00	0.14	$ 0.00	22.00	$ 5,567,760.00	22.00	$ 5,567,760.00	0.00	$ 0.00	22.00	$ 5,567,760.00

CONDICIONES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCLUSIÓN DE NUEVOS		PAGOS REALIZADOS ACTA PARCIAL No. 1		ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDAD FINAL EJECUTADA	
No.	COD - GOBER	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	INCREMENTO POR DISTANCIA	V/TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP4	ESTUDIO DE MERCADO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE D.E. INY ALCANT 315 MM X 200 MM, INCLUYE SELLADO CON SIKAFLEX Y AMARRE CON ALAMBRE GALVANIZADO	UND	-	$ 286,600.00	0.14	$ 0.00	1.00	$ 326,724.00	1.00	$ 326,724.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 326,724.00
NP5	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	-	$ 480,785.87	0.14	$ 0.00	26.00	$ 14,250,493.00	26.00	$ 14,250,493.00	0.00	$ 0.00	26.00	$ 14,250,493.00
NP6	2.01.10	RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	-	$ 138,070.10	0.14	$ 0.00	39.07	$ 6,149,615.00	39.07	$ 6,149,615.00	0.00	$ 0.00	39.07	$ 6,149,615.00
NP7	2.06.20	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10"	ML	-	$ 9,841.03	0.14	$ 0.00	74.00	$ 830,189.00	74.00	$ 830,189.00	0.00	$ 0.00	74.00	$ 830,189.00
NP8	2.05.03	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.0m H <1.0m	UND	-	$ 1,519,181.66	0.14	$ 0.00	3.00	$ 5,195,601.00	-	$ 0.00	3.00	$ 5,195,601.00	3.00	$ 5,195,601.00
NP9	2.05.34	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"	UND	-	$ 106,902.06	0.14	$ 0.00	7.00	$ 853,078.00	7.00	$ 853,078.00	0.00	$ 0.00	7.00	$ 853,078.00
NP10	1.06.41	TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	-	$ 77,259.14	0.14	$ 0.00	4.46563	$ 393,313.00	0.70	$ 61,653.00	3.75	$ 330,283.00	4.45	$ 391,936.00
NP11	3.02.04	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	-	$ 79,066.56	-	$ 0.00	12.60	$ 996,239.00	12.60	$ 996,239.00	0.00	$ 0.00	12.60	$ 996,239.00
NP12	3.13.09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	-	$ 48,379.34	0.14	$ 0.00	25.00	$ 1,378,811.00	25.0000	$ 1,378,811.00	0.00	$ 0.00	25.00	$ 1,378,811.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 181,117,968.00		$ 195,354,259.00		$ 171,255,472.00		$ 24,096,830.00		$ 195,352,302.00
A. I. U. 30.00% (A.-24.00%, I.-2.00%, U.-4.00%)	$ 54,335,390.00		$ 58,606,278.00		$ 51,376,642.00		$ 7,229,049.00		$ 58,605,691.00
SUBTOTAL	$ 235,453,358.00		$ 253,960,537.00		$ 222,632,114.00		$ 31,325,879.00		$ 253,957,993.00
AJUSTE/DIFERENCIA	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
TOTAL	$ 235,453,358.00		$ 253,960,537.00		$ 222,632,114.00		$ 31,325,879.00		$ 253,957,993.00

VALOR PRESENTE ACTA	SALDO SIN EJECUTAR	$ 2,544.00
SON: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	$ 31,325,879.00	

Andrea Carolina Ruiz Medina
INGENIERÍA CIVIL

ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SUPERVISORA

ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
R/L JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECRETARIA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE	

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
	MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-18
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	**VERSIÓN:** 002
		FECHA: 10/09/2024

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	06 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO	MSE-SAMC-003-2024 **FECHA** 07 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACÁ
VALOR INICIAL CONTRATADO	$235,453,358.00
CONTRATISTA:	ISMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS R/L JASMITH DANIELA SIERRA RODRÍGUEZ
NIT/CC	NIT: 901718955-1 / C.C 1.496534.26 DE TUNJA
SUPERVISORA:	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
FECHA ACTA DE INICIO	08 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	DOS (02) MESES
ADICION N° 01	$ 18,507,179.00
PRORROGA N° 01	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 253,960,537.00
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	07 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	06 DE DICIEMBRE DE 2024

En la oficina de secretaria de planeacion y obras publicas del Municipio se reunieron **ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA** como **SUPERVISORA** delegada y la señora **JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ** como **CONTRATISTA DE ISMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS**, con el fin de suscribir la presente acta final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	07 DE OCTUBRE DE 2024	**235,453,358.00**
Adicional 01	19 DE NOVIEMBRE DE 2024	**18,507,179.00**
Acta Parcial No.1	21 DE NOVIEMBRE DE 2024	**222,632,114.00**
Acta Final	06 DE DICIEMBRE DE 2024	**31,325,879.00**
Total ejecutado		**253,957,993.00**
Saldo no ejecutado		**2,544.00**
Menos ajuste al valor inicial		**0.00**
Valor total presente acta		**31,325,879.00**

Andrea Carolina Ruiz Medina

ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SECRETARIA DE PLANEACION Y O.P
SUPERVISORA

JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA	SECREATARÍA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	
