Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) (SEDE)	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: HUILA — Municipio: SAN AGUSTIN

Corregimiento: — Cabecera/ Inspeccion/ Barrio:

Nombre del establecimiento: PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA EL PURUTAL

Nivel de complejidad:

Ubicación (Dirección): VEREDA PURUTAL — Teléfono (Fax):

IPS de referencia: E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO	
ADECUACIÓN	X	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

"ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA PURUTAL DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA"

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	SI	NO
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?	X	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***	X	

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

EL PREDIO CUENTA CON LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 235 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DONDE SE ACREDITA LA SANA POSECION DEL PREDIO Y DEL INMUEBLE UBICADO EN LA VEREDA PURUTAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos		Hundimiento	
Inundación Total		Otro	
Inundación Parcial		Cual?	
No presenta afectaciones naturales	X		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido		Seco	
Templado	X	Húmedo	
Frío		Salino	

Temperatura promedio: 17 °C

1.4.A ACCESO — Via Vehicular: X — Camino peatonal: — Fluvial: — Maritimo: — Aereo:

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA — Baja: X — Media: — Alta:

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado		Publico	X
Posesión	X	Arrendamiento	
Invasión / lote público			
Invasión / lote privado			
Usufructo - Comodato			

Tiene escritura? SI: — NO: X

CEDULA CATASTRAL No.:

MATRICULA INMOBILIARIA No.:

1.6 AREAS

Area total lote	423,44	M2
Area ocupada lote	74,11	M2
Area construida	74,11	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	X	Regular	X
Inclinado		Irregular	
Accidentado		Limites indefinidos	

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso	X	

Número de edificios: 1

Numero de pisos: 1 — Sotano:

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	CONCRETO		X		Iluminación ext.	NO			
Vias internas	CONCRETO		X		Zonas de parqueo	NO			
Sardineles	NO				Zonas verdes	SI		X	
Cerramiento	NO								

1.10 OBSERVACIONES

EL PREDIO CUENTA CON LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 235 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DONDE SE ACREDITA LA SANA POSECION DEL PREDIO Y DEL INMUEBLE UBICADO EN LA VEREDA PURUTAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

Fecha diligencia: Año 24 — Mes 09 — Día 25

Responsable del levantamiento: **Arq. WILSON UNI COLLAZOS**

MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA 1 DE 1

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
PRECONSULTA SALA DE ESPERA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	R	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	12,23 M2		30,57 M2				1 UND		2,13 M2		12,23 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
CONSULTORIO 1	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	R	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	13,8 M2		29,6 M2				1 UND		2,1 M2		5.2 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
CONSULTORIO PROMOCION Y	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	R	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	12,18 M2		35,3 M2				1 UND		2,1 M2		12,18 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
ESTERILIZACION Y LAVADO	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	R	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	7,76 M2		27,9 M2				1 UND		1,85 M2		7,76 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
BAÑO	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	BALDOSA	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	R	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-	3,66 M2		21,72 M2				1 UND		,87 M2		3,66 M2	

Profesional Responsable: **ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279**

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: X	Conexión red pública:	SI NO X
Instalación propia:	Eliminacion propia: X	CAPACIDAD M3
Otro:	Otro:	Elevado
Cual?	Cual? POZO SEPTICO	Subterraneo:
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI NO X	SI NO X	SI NO
TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO

OBSERVACIONES

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI X	BUENA	SI NO X
NO	REGULAR	CAPACIDAD Kva
Otro sistema de suministro:	MALA X	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
Cual?	TIPO DE AFECTACION	Estado:

OBSERVACIONES

NO CUENTA CON ILUMINACION EXTERIOR

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual

OBSERVACIONES

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE

MUROS

CERCA

RIO

COLUMNAS

VENTANA

DUCHAS


PUERTA

INODORO


LAVAMANOS

AREA CONSTRUIDA 74,11 M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION

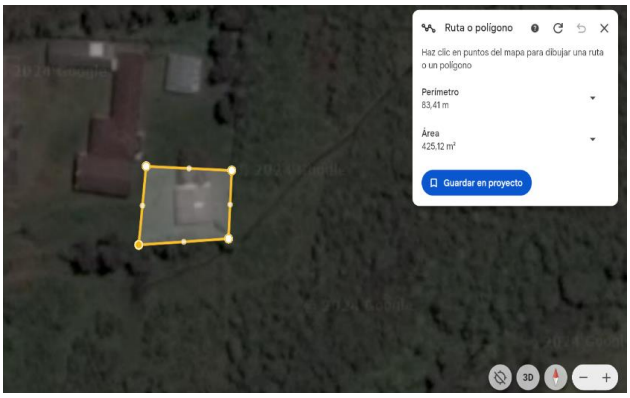

ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO

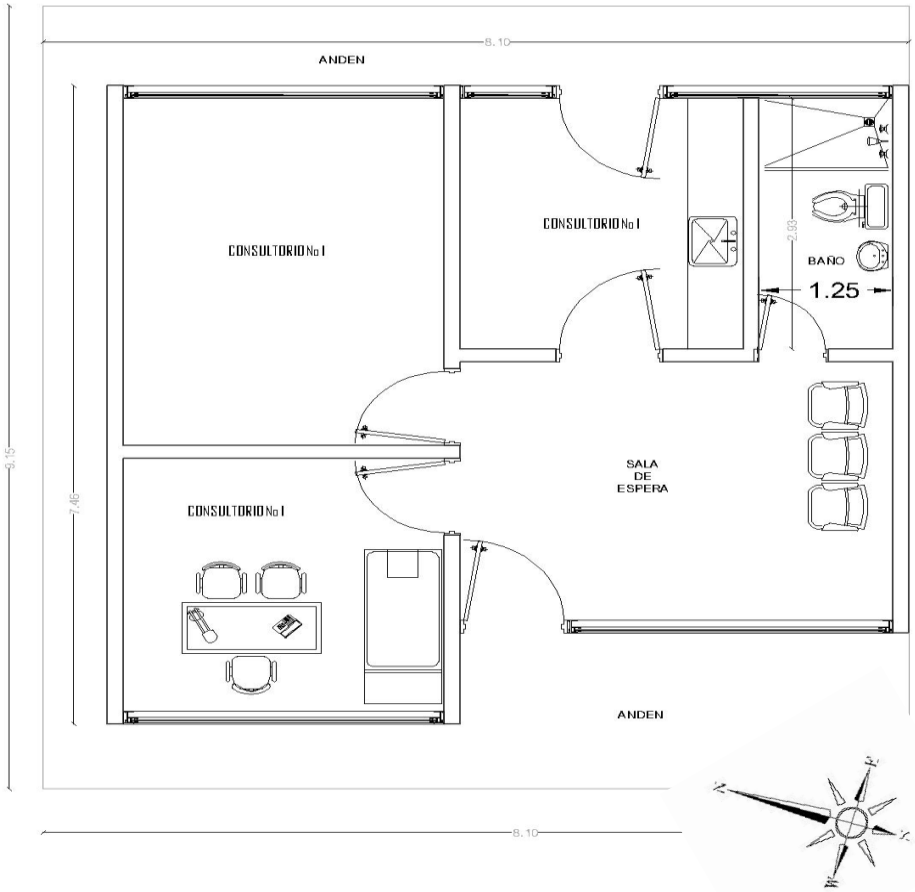

Fecha diligencia: Año 24 Mes 09 Día 16

Responsable del levantamiento: ARQ.WILSON UNI COLLAZOS
A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**SERVICIOS AMBULATORIOS**		
1,1	Consultorio Medicina general	1	
1,2	Consultorio Promocion y Prevencion	1	
1,3	Consultorio Enfermería (crecimiento y desarrollo)	1	
1,5	Sala de Telemedicina		
1,6	Vacunación		
1,7	consultorio de Odontólogia y Salud Oral		
1,8	Rayos X Odontológico		
2	**SERVICIO DE URGENCIAS**		
2,1	Consultorio de Urgencias		
2,2	Consultorio de triage		
2,3	Consultorio de triage(1 camilla)		
2,4	Sala Reanimación y/o Procedimientos		
2,5	Sala de curaciones y/o ferulización		
2,6	Sala ERA		
2,7	Sala EDA		
2,8	Sala de observación		
2,8,1	No. Camillas Observación Adultos		
2,8,2	No. Camillas Observación pediátricas		
2,11	Lavado de pacientes		
3	**SERVICIOS DE APOYO**		
3,1	Laboratorio clinico		
3,2	Cubículos toma de muestra		
3,3	Toma muestra ginecológica		
3,4	Servicio de Imagenología		
4	**SERVICIO DE HOSPITALIZACION**		
4,1	Camas pediátricas		
4,2	camas obstetricas		
4,3	habitaciones unipersonales		
4,4	Servicio de Atención partos		
5	**OTROS SERVICIOS**		
	LAVADO Y ESTERILIZACION	1	

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 9 Día 1 6

Responsable del levantamiento: ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: FACHADAS









Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279
	2 4	0 9	1 6		

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 41 DEPTO · 668 MUNICIPIO · 0437 INSTITUCION · SEDE	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS | **AMBIENTE: PUERTAS Y VENTANAS**











Fecha diligencia: Año 24 · Mes 09 · Día 16

Responsable del levantamiento: ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
MP A 19132007-12169279


Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS


AMBIENTE: INSTALACIONES ELECTRICAS E INFRAESTRUCTURA



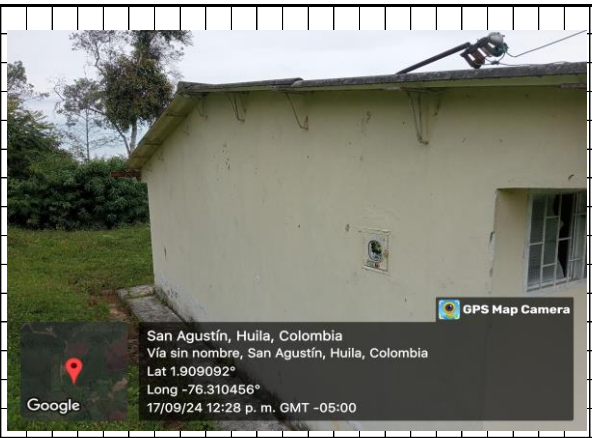





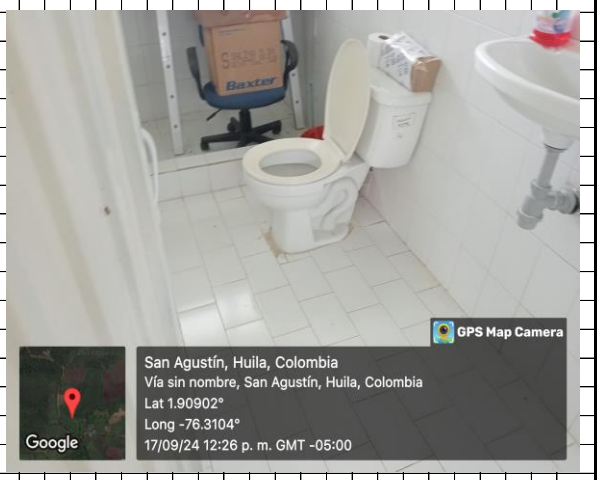

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 9 Día 1 6

Responsable del levantamiento: ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: PISOS Y CUBIERTAS













Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279
	24	09	16		

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: ESTUCO Y PINTURA













Fecha diligencia:	Año 2 4	Mes 0 9	Día 1 6	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279
