INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA PROYECTO

ACUERDO DE APROBACIÓN N°	
FECHA DEL ACUERDO:	
NOMBRE PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN JUAN DE BETULIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
SECTOR:	MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN JUAN DE BETULIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
FASE:	EJECUCIÓN
VALOR:	$ 1.413.249.117,00.
TIPO DE RECURSO:	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
VALOR APROBADO POR EL OCAD:	$1.657.061.525,00

1.2. VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD

FUENTES APROBADAS	TIPO DE RECURSO	VIGENCIA PRESUPUESTAL SGR	VALOR APROBADO
SGR	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	2023-2024	$1.657.061.525,00

1.3. VALOR CONTRATADO

NÚMERO DE CONTRATO O RESOLUCIÓN	OBJETO DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN	VALOR DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN
CM-013-2023	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN JUAN DE BETULIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**	$ 104.168.036,00

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	7	FECHA	12/12/2024	PERIODO	28 de abril- 4 de diciembre		
CONTRATO N°	LP-025-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

LP-025-2023	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN JUAN DE BETULIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	$ 1.413.249.117,00
VALOR TOTAL CONTRATADO		**$ 1.517.417.153.**

1.4. TRÁMITES SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD:

TIPO DE AJUSTE	ACUERDO / RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIONES

2. INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO NÚMERO:	**CM-025-2023**
OBJETO CONTRATO:	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN JUAN DE BETULIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."**
CONTRATISTA:	MANA CONSTRUCCIONES
VALOR DEL CONTRATO:	$ 104.168.036,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 104.168.036,00
% DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
CESIÓN A CONTRATISTA:	JAVIER JOSÉ DOMINGUEZ VERGARA
CORREO ELECTRÓNICO:	

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

2.1. TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE ABRIL 2024
PRÓRROGA:	3 MESES
SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO INICIAL	7 MESES
PLAZO ACTUALIZADO	10 MESES
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28 OCTUBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	28 FEBRERO 2025

3. CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	**N/A**
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

4. AVANCE DEL PROYECTO

4.1. AVANCE GENERAL:

PROYECTO								
	PROGRAMADO				EJECUTADO			
PERIODO	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
29 abril 2024 -28 mayo 2024	9.13%	$148,093,029.27	9.13%	$ 271,426,954.91	13.35%	$ 202,704,651.74	13.35%	$ 202,704,651.74
29 mayo 2024 – 28 junio 2024	13.93%	$225,894,861.27	23.06%	$ 497,321,816.18	26.40%	$ 400,714,112.05	39.75%	$ 603,418,763.79
29 junio 2024 – 28 Julio	14.34%	$232,637,881.27	37.40%	$ 729,959,697.45	3.55%	$ 53,899,631.40	43.31%	$ 657,318,395.19


NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**			**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**							
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**			
		OTROS(Especifique)							

29 julio 2024 – 28 agosto 2024	13.65%	$221,340,568.91	51.04%	$	951,300,266.36	6.26%	$	95,075,739.99	49.57%	$	752,394,135.18
29 agosto 2024 – 28 septiembre 2024	13.23%	$214,597,548.91	64.27%	$	1,165,897,815.27	5.24%	$	79,488,753.08	54.81%	$	831,882,888.26
29 septiembre 2024 – 28 octubre 2024	13.65%	$221,340,568.91	77.92%	$	1,387,238,384.18	3.12%	$	47,298,585.38	57.92%	$	879,181,473.64
29 octubre 2024 – 28 noviembre 2024	13.23%	$214,540,931.91	91.15%	$	1,601,779,316.09	1.09%	$	16,567,488.10	59.01%	$	895,748,961.73
30 noviembre 2024 – 28 diciembre 2024	8.76%	$142,017,174.91	99.90%		$1,743,796,490.99	10.24%		$155,450,228.01	69.25%		$1,051,199,189.75

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	7	FECHA	12/12/2024		PERIODO	28 de abril- 4 de diciembre	
CONTRATO N°	LP-025-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

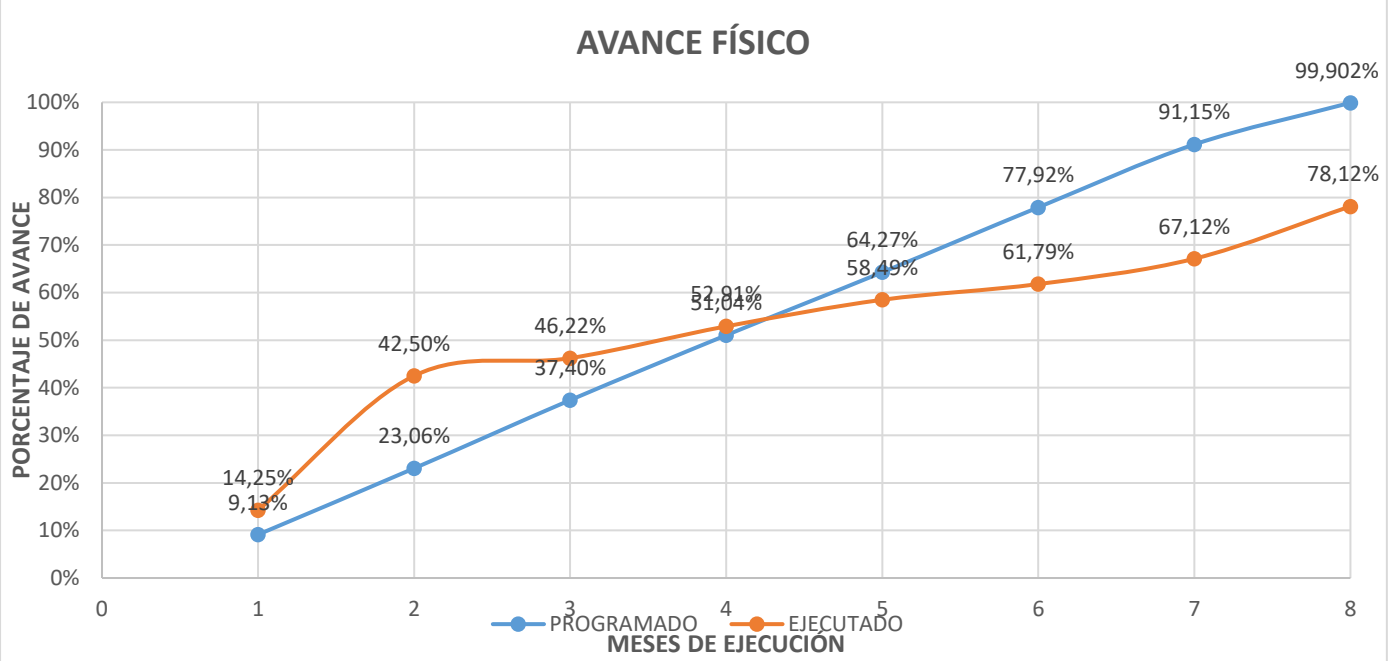

El porcentaje físico ejecutado acumulado hasta la fecha del 4 de diciembre de 2024 es del 69.25% y el avance físico programado hasta el 28 de diciembre de 2024 es del 99.90%

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

4.2. CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA N° LP-025-2023	
OBJETO:	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN JUAN DE BETULIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DE CONTRATO:	$ 1.413.249.117,00
VALOR DE ADICIÓN:	$ 104.628.113,00.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.517.877.230,00
% DEL ANTICIPO:	0.00%
VALOR DEL ANTICIPO:	$0.00
CONTRATISTA MEDIANTE CESIÓN:	MANÁ CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901.548.710-2 R/L MARIA JULIA FAYAD PADILLA
CORREO ELECTRÓNICO:	
FECHA DE ACTA DE INICIO:	29 DE ABRIL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28 AGOSTO 2024
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA:	TRES (3) MESES
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE ACTA DE FINALIZACIÓN:	28 DICIEMBRE 2024
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	91.21%
AVANCE FÍSICO EJECUTADO:	67.73%
AVANCE FINANCIERO:	39.66%
OBSERVACIONES: Para la fecha de 30 de noviembre del 2024 el avance es realmente corto, algunos factores meteorológicos han influido. Toda vez que se muestra un retraso del 26,12%, se muestra un acumulado de obra de 60.93% se solicita mediante oficio incrementar las cuadrillas con el fin de reponer el atraso habido, y así nivelar con la programación nueva suministrada con la aprobación de la prórroga.	

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co


INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

AVANCE FISICO

OBRA								
			PROGRAMADO		EJECUTADO			
PERIODO	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
29 abril 2024 -28 mayo 2024	8.45%	$128,209,042.00	8.45%	$128,209,042.00	12.936%	$ 196,355,561.34	12.94%	$ 196,355,561.34
29 mayo 2024 – 28 junio 2024	13.57%	$206,010,874.00	22.02%	$334,219,916.00	26.95%	$ 409,022,585.91	39.88%	$ 605,378,147.25
29 junio 2024 – 28 Julio	14.02%	$212,753,894.00	36.04%	$546,973,810.00	2.41%	$ 36,532,133.32	42.29%	$ 641,910,280.57
29 julio 2024 – 28 agosto 2024	14.02%	$212,753,894.00	50.05%	$759,727,704.00	6.12%	$ 92,892,173.75	48.41%	$ 684,152,116.66
29 agosto 2024 – 28 septiembre 2024	13.57%	$206,010,874.00	63.62%	$965,738,578.00	5.02%	$ 76,151,223.96	53.43%	$ 755,054,194.83
29 septiembre 2024 – 28 octubre 2024	14.02%	$212,753,894.00	77.64%	$1,178,492,472.00	2.74%	$ 41,577,897.86	56.17%	$ 793,766,105.30
29 octubre 2024 – 28 noviembre 2024	13.57%	$205,954,257.00	91.21%	$1,384,446,729.00	0.56%	$ 8,571,662.61	56.73%	$ 861,103,238.74
30 noviembre 2024 – 28 diciembre 2024	8.79%	$133,430,500.00	100.00%	$1,517,877,229.00	11.00%	$ 166,958,789.26	67.73%	$ 1,028,062,028.00

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

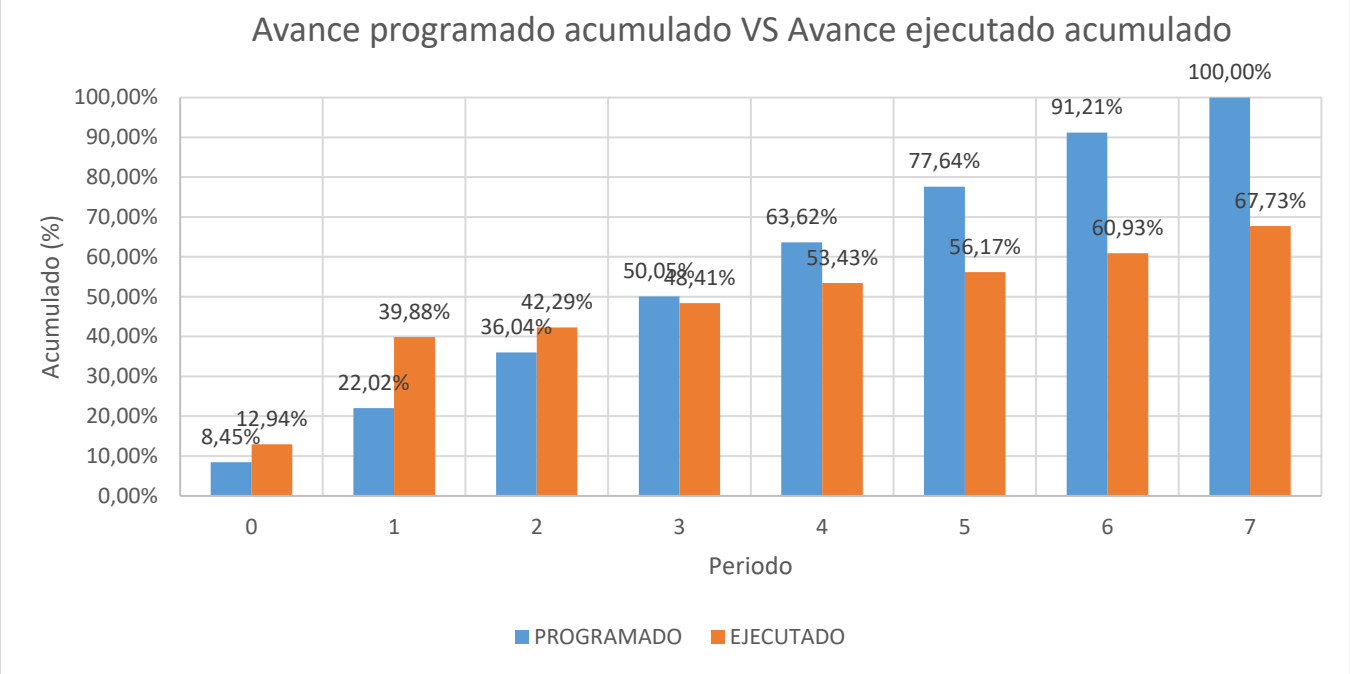

El porcentaje físico ejecutado acumulado hasta la fecha del 4 de diciembre de 2024 es del 67.73% y el avance físico programado hasta el 28 de diciembre de 2024 es del 100%

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

5. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AVANCE FISICO

OBRA								
	PROGRAMADO				EJECUTADO			
PERIODO	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	%	$	%	$	%	$	%	$
29 abril 2024 -28 mayo 2024	8.45%	$128,209,042.00	8.45%	$128,209,042.00	12.936%	$182,820,664.41	12.94%	$182,820,664.41
29 mayo 2024 – 28 junio 2024	13.57%	$206,010,874.00	22.02%	$334,219,916.00	26.95%	$380,828,433.91	39.88%	$563,649,098.32
29 junio 2024 – 28 Julio	14.02%	$212,753,894.00	36.04%	$546,973,810.00	2.41%	$34,013,953.26	42.29%	$597,663,051.58
29 julio 2024 – 28 agosto 2024	14.02%	$212,753,894.00	50.05%	$759,727,704.00	6.12%	$86,489,065.08	48.41%	$684,152,116.66
29 agosto 2024 – 28 septiembre 2024	13.57%	$206,010,874.00	63.62%	$965,738,578.00	5.02%	$70,902,078.17	53.43%	$755,054,194.83
29 septiembre 2024 – 28 octubre 2024	14.02%	$212,753,894.00	77.64%	$1,178,492,472.00	2.74%	$38,711,910.47	56.17%	$793,766,105.30
29 octubre 2024 – 28 noviembre 2024	13.57%	$205,954,257.00	91.21%	$1,384,446,729.00	0.56%	$7,980,813.19	56.73%	$861,103,239
30 noviembre 2024 – 28 diciembre 2024	8.79%	$133,430,500.00	100.00%	$1,517,877,229.00	11.00%	$ 155,450,228.01	67.73%	$1,028,062,028.00

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	7	FECHA	12/12/2024	PERIODO	28 de abril- 4 de diciembre		
CONTRATO N°	LP-025-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

5.1 AVANCE INTERVENTORÍA

5.1.1 CONTROL DE COSTOS

AVANCE ACUMULADO PROPUESTA ECONOMICA VIGENTE

CATEGORIA	CARGO	N° PERSONAS	% DEDICACION	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	VALOR TOTAL
PERFIL PROFESIONAL						
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	10%	7	$ 3,500,000.00	$ 4,550,000.00
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	43%	7	$ 2,500,000.00	$ 23,573,600.42
	PROFESIONAL SISO	2	40%	7	$ 2,400,000.00	$ 7,680,000.00
PERFIL TECNICO						
PERFIL AUXILIAR						
SUBTOTAL PERSONAL						$ 35,803,600.42
FACTOR MULTIPLICADOR						1.9
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 68,026,840.80

COSTOS DIRECTOS					
TIPO	CANTIDAD	%	MESES	VALOR	VALOR TOTAL
Oficina-Campamento (Incluye servicios públicos)	1	100%	7	$ 960.000.00	$ 6,720,000.00
Alquiler de Equipos de computo	2	100%	7	$ 220.000.00	$ 3,080,000.00
Edición de informes. papelería. reproducción de documentos. incluye fotografías	1	100%	7	$ 100.000.00	$ 700,000.00
Comunicaciones (teléfono. fax. e-mail. etc)	1	100%	7	$ 66.233.00	$ 463,631.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 10,963,631.00
TOTAL. COSTOS					$ 78,990,471.80
IVA (19 %)					$ 15,008,189.64
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$93,998,661.4

Avance físico acumulado programado para el mes de noviembre es de 8.24% y avance físico ejecutado acumulado hasta el 28 de noviembre 2024 es de 90.2%

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co


INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

5.1.2 AVANCE FISICO

PERIODOS	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
29 abril 2024 -28 mayo 2024	19.09%	$19.883.897.27	19.09%	$19.883.897.27	19.09%	$19.883.897.27	19.09%	$19.883.897.27
29 mayo 2024 – 28 junio 2024	19.09%	$19.883.897.27	38.18%	$39.767.794.54	19.09%	$19.883.897.27	38.18%	$39.767.794.54
29 junio 2024 – 28 Julio	19.09%	$19.883.897.27	57.27%	$59.651.691.81	19.09%	$19.883.897.27	57.27%	$59.651.691.81
29 julio 2024 – 28 agosto 2024	8.24%	$ 8.586,674.91	65.2%	$68.238.366,72	8.24%	$ 8.586,674.91	65.2%	$68.238.366,72
29 agosto 2024 – 28 septiembre 2024	8.24%	$ 8.586,674.91	73.75%	$76.825.041,63	8.24%	$ 8.586,674.91	73.75%	$76.825.041,63
29 septiembre 2024 – 28 octubre 2024	8.24%	$ 8.586,674.91	82.00%	$85.411.716,534	8.24%	$ 8.586,674.91	82.00%	$85.411.716,534
29 octubre 2024 – 28 noviembre 2024	8.24%	$ 8.586,674.91	90.2%	$93,998,661.44	8.24%	$ 8.586,674.91	90.2%	$93,998,661.44

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**		**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**	
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

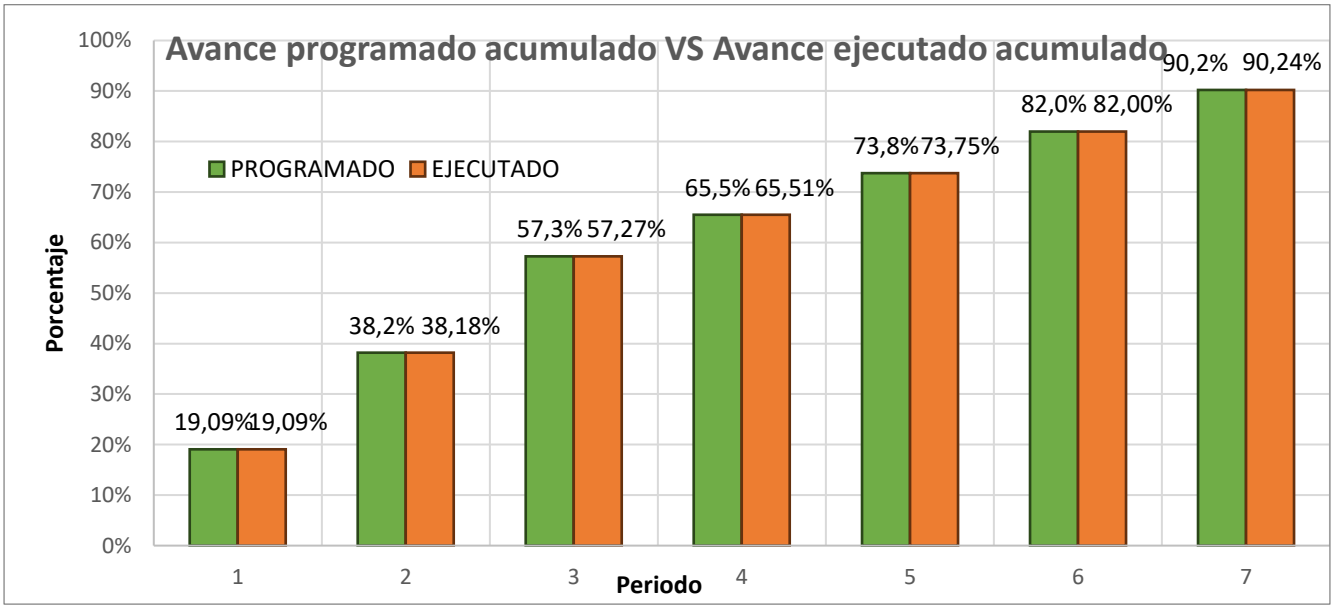

Avance físico acumulado programado para el mes de noviembre es de 8.24% y avance físico ejecutado acumulado hasta el 28 de noviembre 2024 es de 90.2%

5.1.3 CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista presentó planilla de pago **N°: 30299920** correspondiente al 1 junio 2024 al 30 junio 2024.
El contratista presentó planilla de pago **N°:** 31227987 correspondiente al 1 agosto 2024 al 30 agosto 2024
El contratista presentó planilla de pago **N°: 31327905** correspondiente al 1 septiembre 2024 al 30 septiembre 2024
El contratista presentó planilla de pago **N°: 8633748362** correspondiente al 1 octubre 2024 al 31octubre 2024

Anexo: CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

INFORME No.	7	FECHA	12/12/2024		PERIODO	28 de abril- 4 de diciembre	
CONTRATO N°	LP-025-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

5.2 INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

5.2.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS. SUSPENSIONES. AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
PRORROGA N°1	02 MESES	FACTOR CLIMATICO	N° 0570
PRORROGA N°2	01 MES	FACTOR CLIMATICO	800.11-03/SI N° 3026

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
ADICION DE OBRA LP-025-2023	**$104.628.113,00**	**Cantidades mayores de obra**	**800.11-03/SI - 2789**

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

5.2.2 GARANTÍAS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado para el contrato de obra>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	53-44-101030736
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	
ANEXO N°	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	8/02/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/04/2024	28/05/2025	$ 10.416.804
Pago de salarios. prestaciones sociales. legales e Indemnizaciones laborales.	29/04/2024	28/11/2027	$ 10.416.804
Calidad del servicio	29/04/2024	30/04/2029	$ 10.416.804

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	7	FECHA	12/12/2024		PERIODO	28 de abril- 4 de diciembre	
CONTRATO N°	LP-025-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

6. INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

6.1 PAGOS REALIZADOS CONTRATO DE OBRA:

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
1		30/08/24	22.13%	$ 312,732,183.00			$ 312,732,183.00
2		30/08/24	17.53%	$ 247,697,928.00			$ 247,697,928.00
TOTALES			39.66%	$560,430,111.00			$ 560,430,111.00

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 29/04/2024 AL 12/12/2024

6.2 PAGOS REALIZADOS INTERVENTORIA

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
1	1	28/08/24	19.08%	$ 19,883,987.27			$ 19,883,987.27
2	2	28/08/24	19.08%	$ 19,883,987.27			$ 19,883,987.27
3	3	28/08/24	19.08%	$ 19,883,987.27			$ 19,883,987.27
TOTALES			57.3%	$ 59,651,961.81			$ 59,651,961.81

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 29/04/2024 AL 12/12/2024

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

7. GESTIÓN SOCIAL APOYO A LA SUPERVISION

7.1 ACTVIDADES REALIZADAS

	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA	PARTICIPANTES	CANTIDAD ASISTENTES	EVIDENCIA	RESPONSABLE SOCIAL SID
						ACTA	

7.2 PETICIONES DE LA COMUNIDAD

TIPO DE PETICIÓN	CANAL DE RECEPCIÓN PETICIONES	No. RECIBIDAS		No. ABIERTAS		No. CERRADAS		OBSERVACIONES
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Denuncia								
Petición								
Queja								
Reclamo								
Solicitud información								
Sugerencia								
TOTAL								

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	7	FECHA	12/12/2024		PERIODO	28 de abril- 4 de diciembre	
CONTRATO N°	LP-025-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA. identificación de personal y costos directos ejecutados por la interventoría.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	INTERVENTORÍA PROFESIONAL, AUXILIAR, TECNICA…	EJECUTADO	%90.24







NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

SUCRE_YPADILLA-02460662155132-724932-001255489-A

INFORME No.	7	FECHA	12/12/2024		PERIODO	28 de abril- 4 de diciembre	
CONTRATO N°	LP-025-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					



NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**		**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**	
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					







9. COMENTARIOS. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría del proyecto representado por JAVIER JOSÉ DOMÍNGUEZ VERGARA y reportado a la Secretaría de Infraestructura. las obras ejecutadas del contrato LP-025-2023 en el acta parcial de obra No. 3. se ejecutaron cumpliendo con las especificaciones y parámetros de calidad establecidos.

Las pólizas de los contratos de obra LP-025-2023. y de interventoría CM-013-2023 se encuentran vigentes y actualizadas a la fecha.

El acta parcial de obras No. 3 presentada por el contratista fue aprobada por la interventoría en términos de calidad y cantidad de las obras ejecutadas y establece un avance del **67,73%** Además. el Interventor certifica

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

que revisó. verificó y constató el pago de los parafiscales de Ley por parte del contratista. con base en los soportes presentados.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	VALOR ($)	%
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 1.413.249.117.00	
ANTICIPO	$ 0.00	
ADICIÓN DEL CONTRATO	$ 104.628.113,00	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ **1.517.877.230,00**	100.00%
EJECUCIÓN		
VALOR ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 1	$ 312.732.001.00	22.13%
VALOR ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 2	$ 247.697.928.00	17.53%
VALOR ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 3 (POR COBRAR)	$467.631.916,00	30,81%
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 1.028.062.028,00**	**67.73%**
SALDO POR EJECUTAR	**$489.815.202,00**	**32.27%**

Una vez revisada el acta parcial de obras No. 3. de acuerdo con las obras evidenciadas en las visitas a las obras. se da concepto favorable dejando claro que las cantidades y valores consignados en dicha acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.

El contratista de interventoría presentó las actas parciales de interventoría No. 4. 5. 6 con sus anexos reglamentarios presentando un avance del 90.2%. El Interventor cumplió con la entrega de los informes mensuales 4. 5. 6 y adjuntó las planillas de seguridad social del personal que labora de los meses facturados. las cuales van desde el 29 de julio de 2024 al 29 octubre de 2024

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	VALOR ($)	%
VALOR DEL CONTRATO	**$ 104.168.036.000**	100.00%
ANTICIPO	$ 0.00	0.00%
EJECUCIÓN		

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

VALOR ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1	$ 19.883.987.27	19.09%
VALOR ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2	$ 19.883.987.27	19.09%
VALOR ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 3	$ 19.883.987.27	19.09%
VALOR ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 4 (POR COBRAR)	$ 8.586,674.91	8.24%
VALOR ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 5 (POR COBRAR)	$ 8.586,674.91	8.24%
VALOR ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 6 (POR COBRAR)	$ 8.586,674.91	8.24%
SALDO POR EJECUTAR	**$18.756.320,00**	**16.48%**

Una vez revisados los informes de interventoría 4,5,6 y revisadas las planillas de seguridad social del personal de interventoría. se da concepto favorable a las actas parciales de interventoría No. 4,5,6.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen a los 13 días del mes de diciembre de 2024.


RAFAEL HERRERA PANZZA
Profesional Especializado
Ing. de Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**		**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**	
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

10. ANEXOS


Anexo: CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

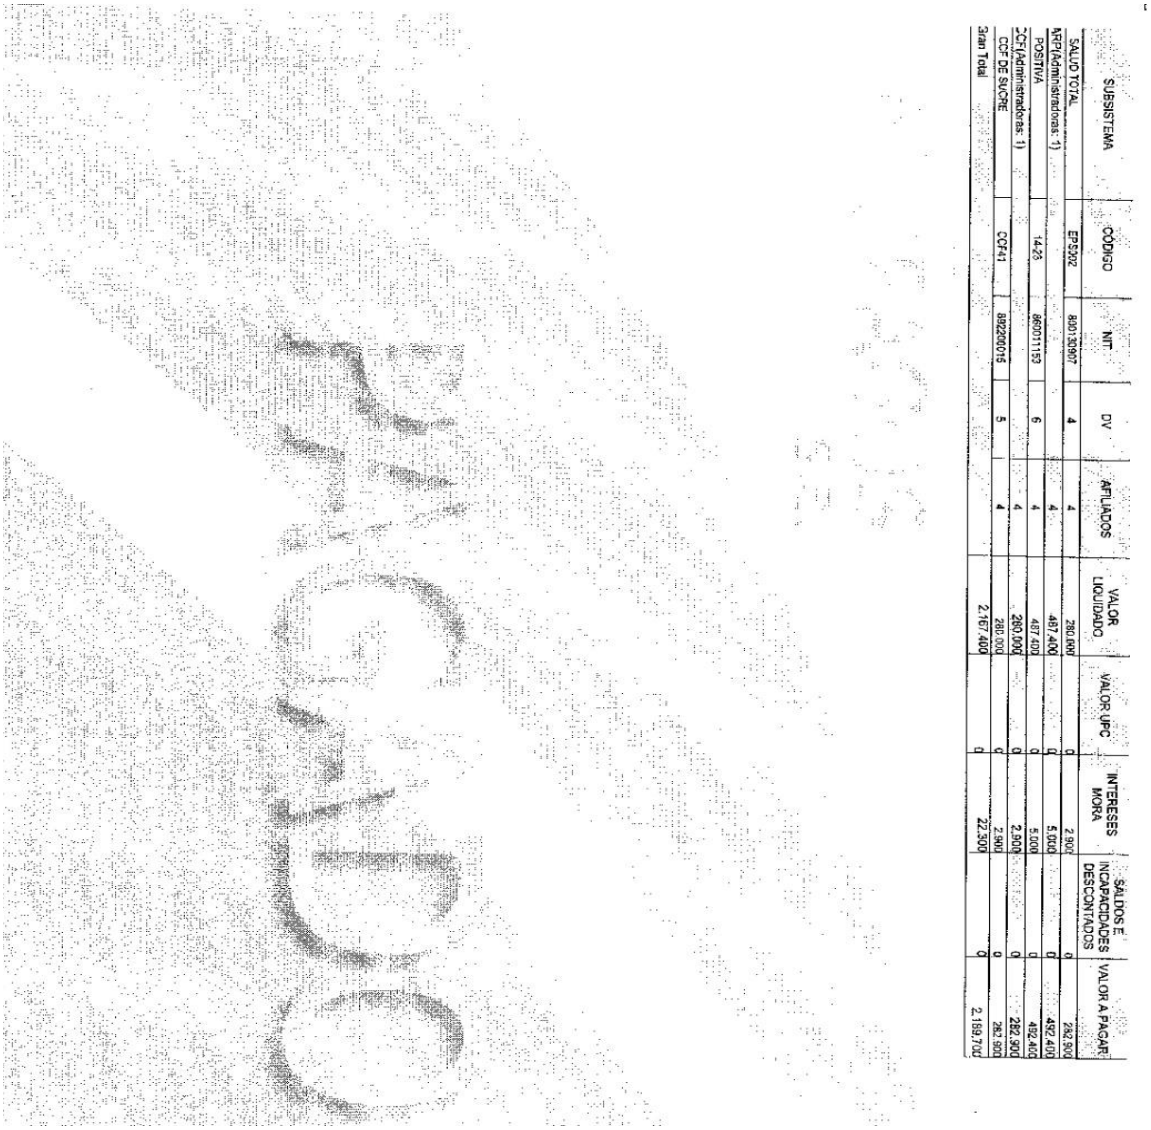

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS302	830130907	4	4	280.900	0	2.900	0	282.900
RPI(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	487.400	0	5.000	0	492.400
				4	487.400	0	5.000	0	492.400
ECI(Administradoras: 1)				4	280.900	0	2.900	0	282.900
CCF DE SUCRE	CCF41	892280015	5	4	280.900	0	2.900	0	282.900
Gran Total				4	2.167.400	0	22.500	0	2.189.700


NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

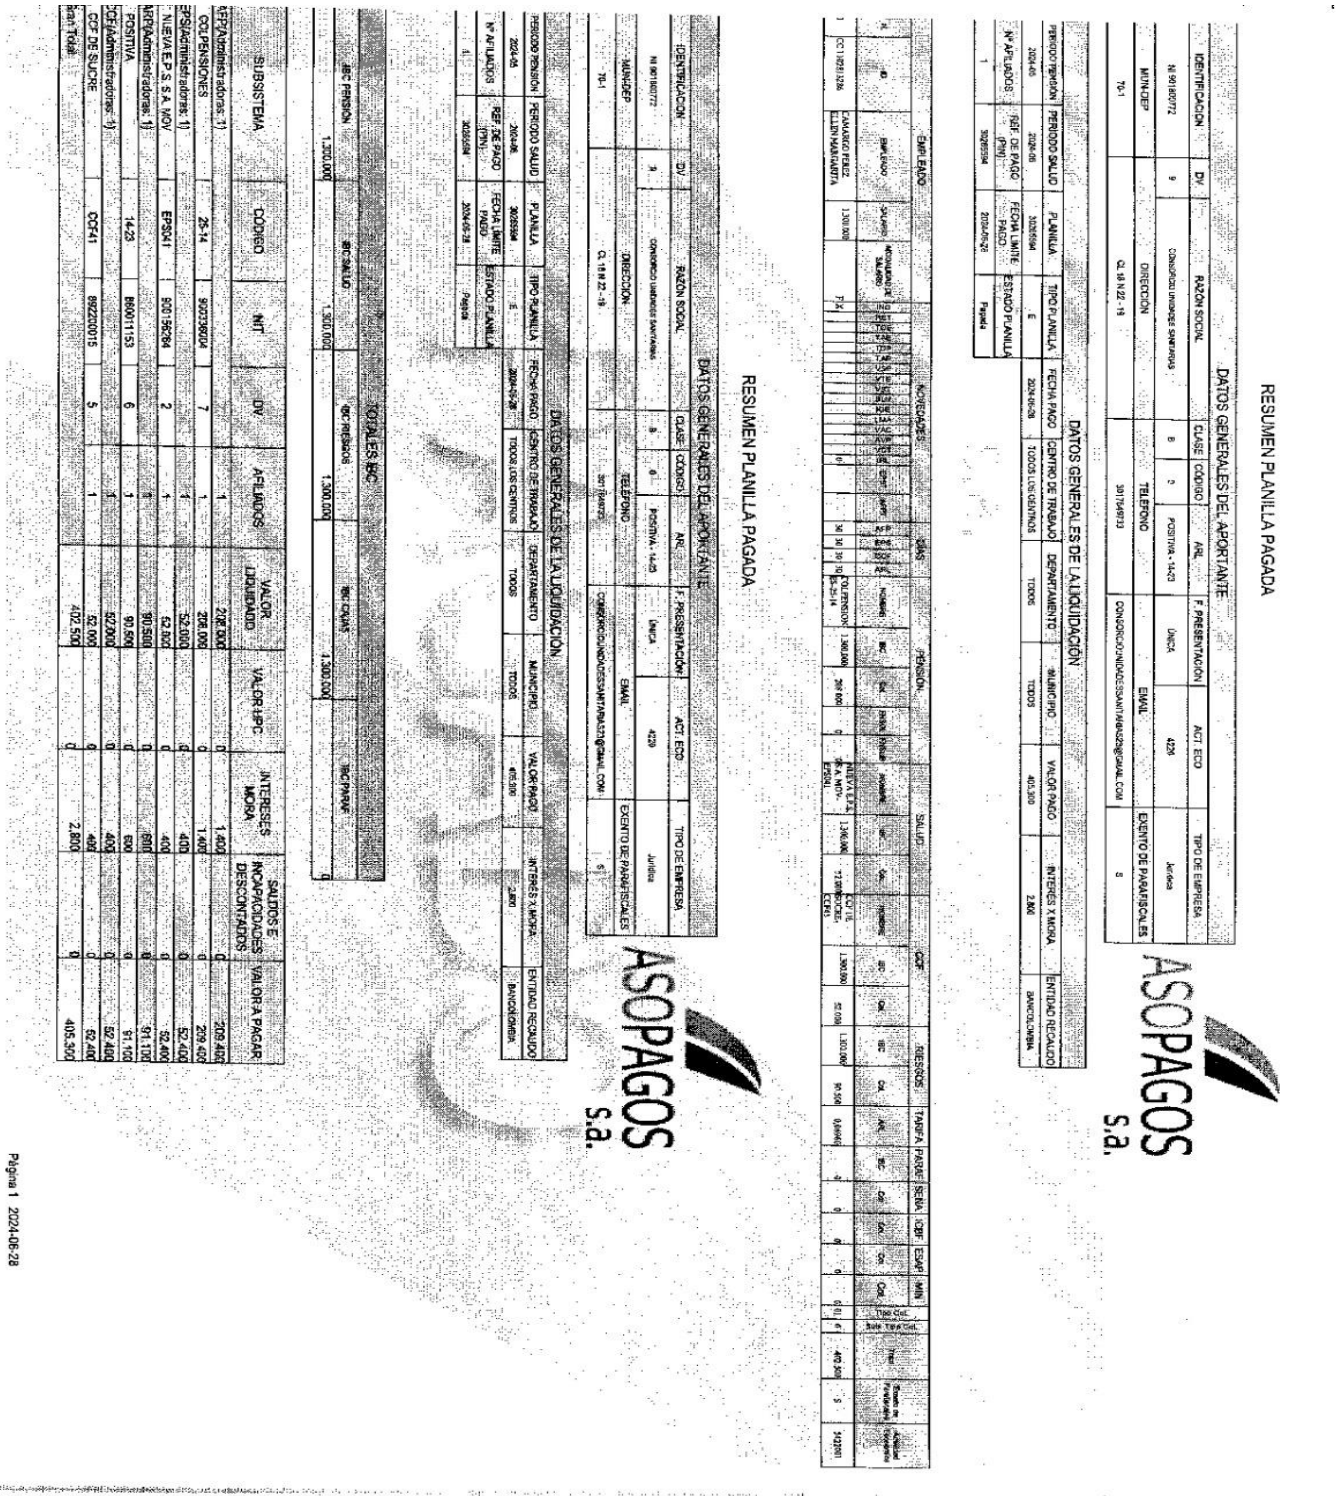

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME DE APOYO A LA SUPERVISION**	**CODIGO:** FSI-800-004 **VERSION** 01 **FECHA:** 01/01/2024

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

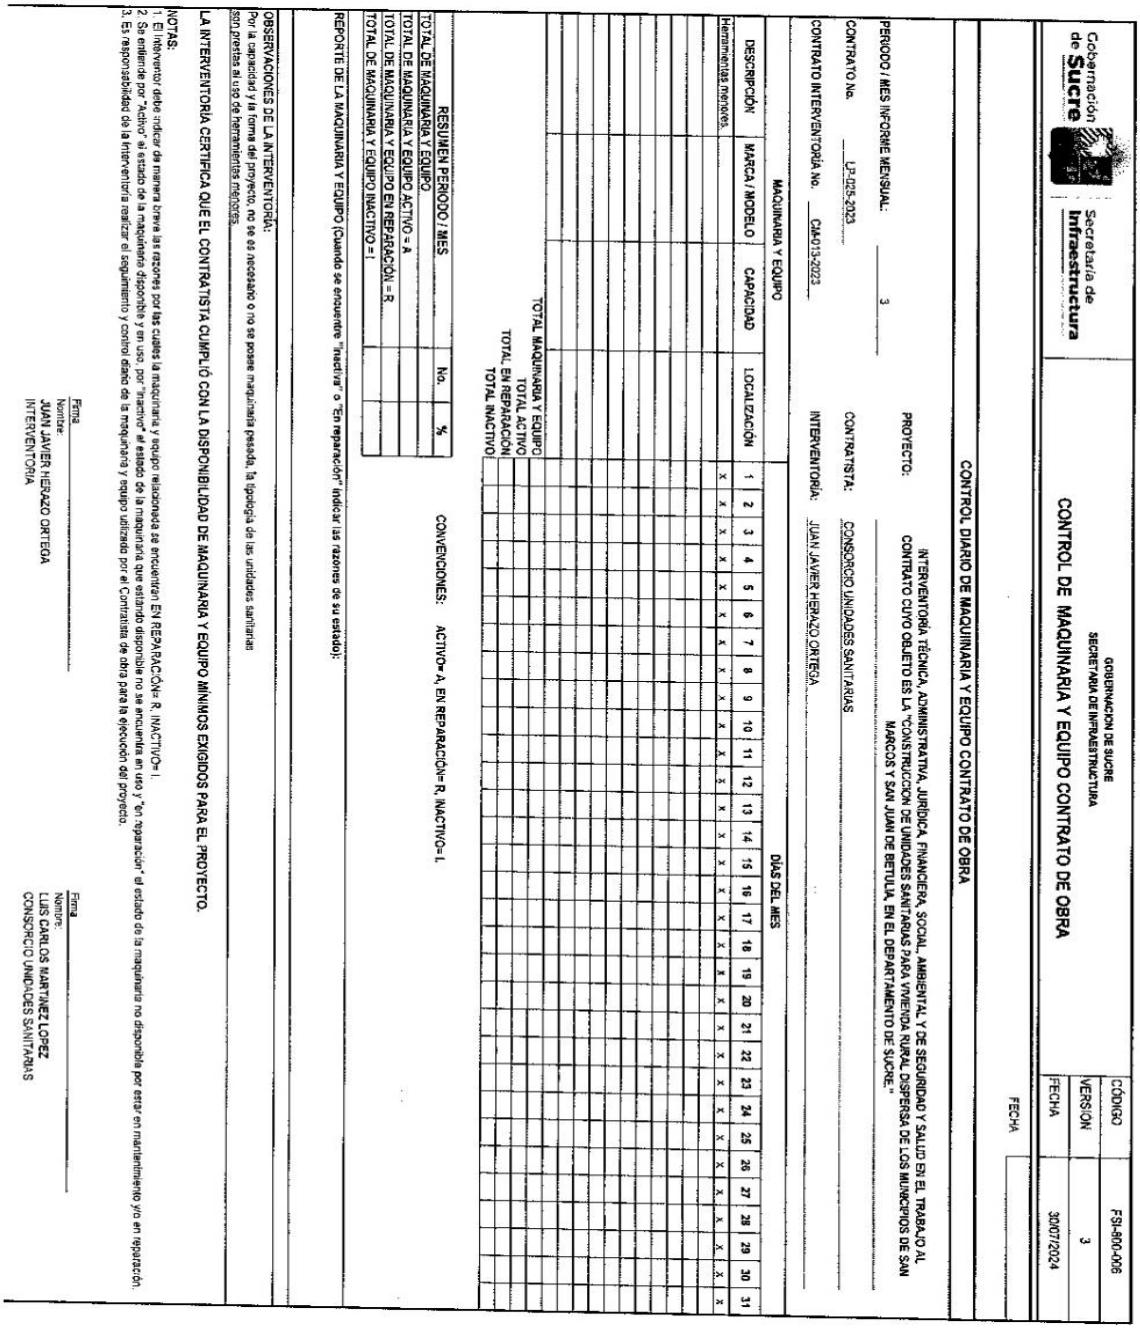

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

GOBERNACION DE SUCRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

CÓDIGO	FSI-800-006
VERSION	3
FECHA	30/07/2024

FECHA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN JUAN DE BETULIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 3

CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS

CONTRATO No. LP-025-2023

INTERVENTORÍA: JUAN JAVIER HERAZO ORTEGA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. CM013-2023

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Herramientas menores.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													
			TOTAL ACTIVO																													
			TOTAL EN REPARACIÓN																													
			TOTAL INACTIVO																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN =R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
Por la capacidad y la forma del proyecto, no se es necesario o no se posee maquinaria pesada, la tipología de las unidades sanitarias son prestas al uso de herramientas menores.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionado se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" al estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" al estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "En reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.


Firma
Nombre:
JUAN JAVIER HERAZO ORTEGA
INTERVENTORÍA

Firma
Nombre:
LUIS CARLOS MARTINEZ LOPEZ
CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

SUCRE_YPADILLA-02460662155132-724932-001255489-A

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

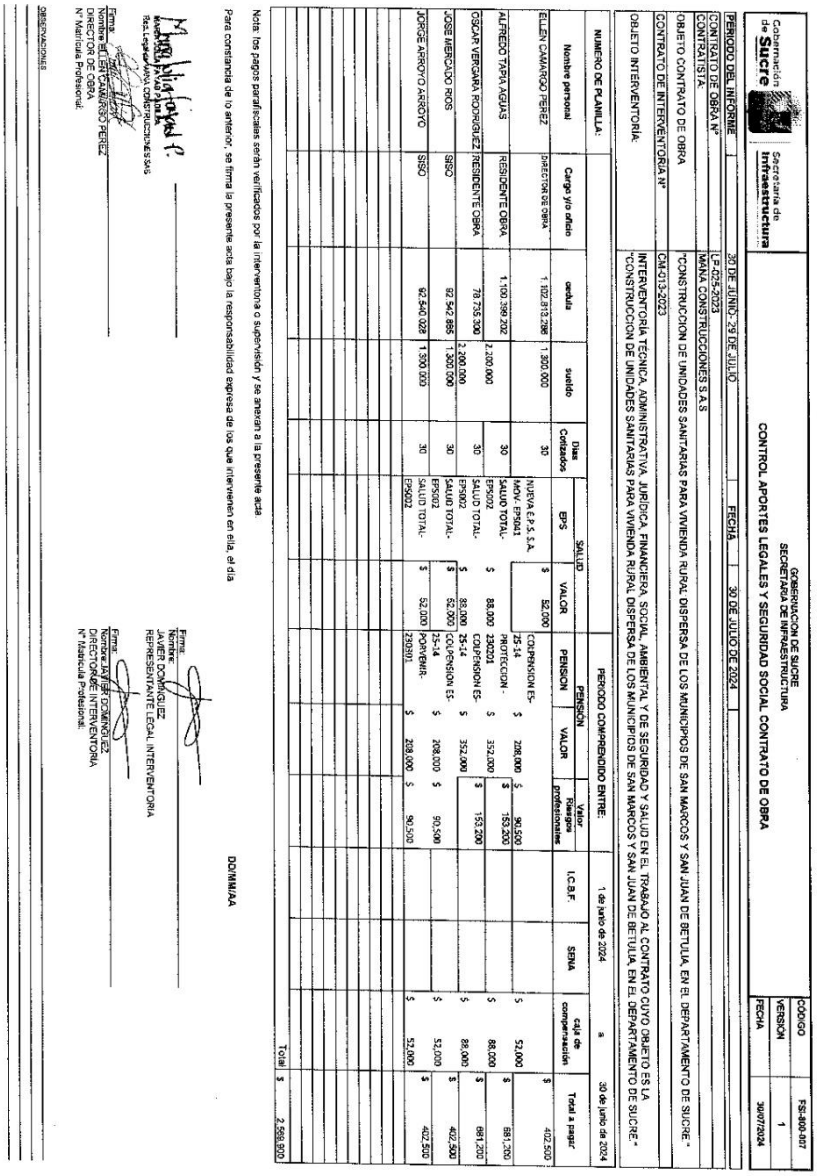

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

GOBERNACION DE SUCRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO: FSI-800-007 | VERSION: 1 | FECHA: 30/07/2024

PERIODO DEL INFORME: 30 DE JUNIO- 29 DE JULIO | FECHA: 30 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA N°: LP-025-2023
CONTRATISTA: MANA CONSTRUCCIONES S.A.S
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN JUAN DE BETULIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE "
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: CM-013-2023
OBJETO INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN JUAN DE BETULIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

NUMERO DE PLANILLA: | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de junio de 2024 a 30 de junio de 2024

Nombre personal	Cargo y/o oficio	ucuba	suelto	Dias Cotizados	SALUD EPS	SALUD VALOR	PENSION	PENSION VALOR	Valor riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensacion	Total a pagar
ELLEN CAMARGO PEREZ	DIRECTOR DE OBRA	1.102.813.298	1.800.000	30	NUEVA E.P.S. S.A.	$ 52.000	COMPENSION ES-	$ 208.000	$ 90.500		$	$ 52.000	$ 402.500
ALFREDO TAPIA AGUAS	RESIDENTE OBRA	1.100.398.202	2.200.000	30	MOV. EPS041 SALUD TOTAL-		25-14 PROTECCION -		$ 153.200				
OSCAR VERGARA RODRIGUEZ	RESIDENTE OBRA	78.758.300	2.200.000	30	EPS002 SALUD TOTAL-	$ 88.000	230201 COMPENSION ES-	$ 352.000			$	$ 88.000	$ 681.200
JOSE MERCADO RIOS	SISO	92.542.885	1.300.000	30	EPS002 SALUD TOTAL-	$ 88.000 $ 52.000	25-14 COMPENSION ES-	$ 352.000	$ 153.200		$	$ 88.000	$ 681.200
JORGE ARROYO ARROYO	SISO	92.540.028	1.300.000	30	EPS002 SALUD TOTAL-	$ 52.000	25-14 PORVENIR-	$ 208.000	$ 90.500		$	$ 52.000	$ 402.500
					EPS002		230301	$ 208.000	$ 90.500		$	$ 52.000	$ 402.500
												Total	$ 2.569.900

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexaran a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día

DD/MM/AA

Firma
Nombre: MARIA CONSTRUCCIONES SAS
Rep. Legal
Nombre del CLIENTE CAMARGO PEREZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional:


Firma
Nombre
JAVIER DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
Nombre JAVIER DOMINGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional:

OBSERVACIONES

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
SUCRE_YPADILLA-02460662155132-724932-001255489-A
www.sucre.gov.co

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

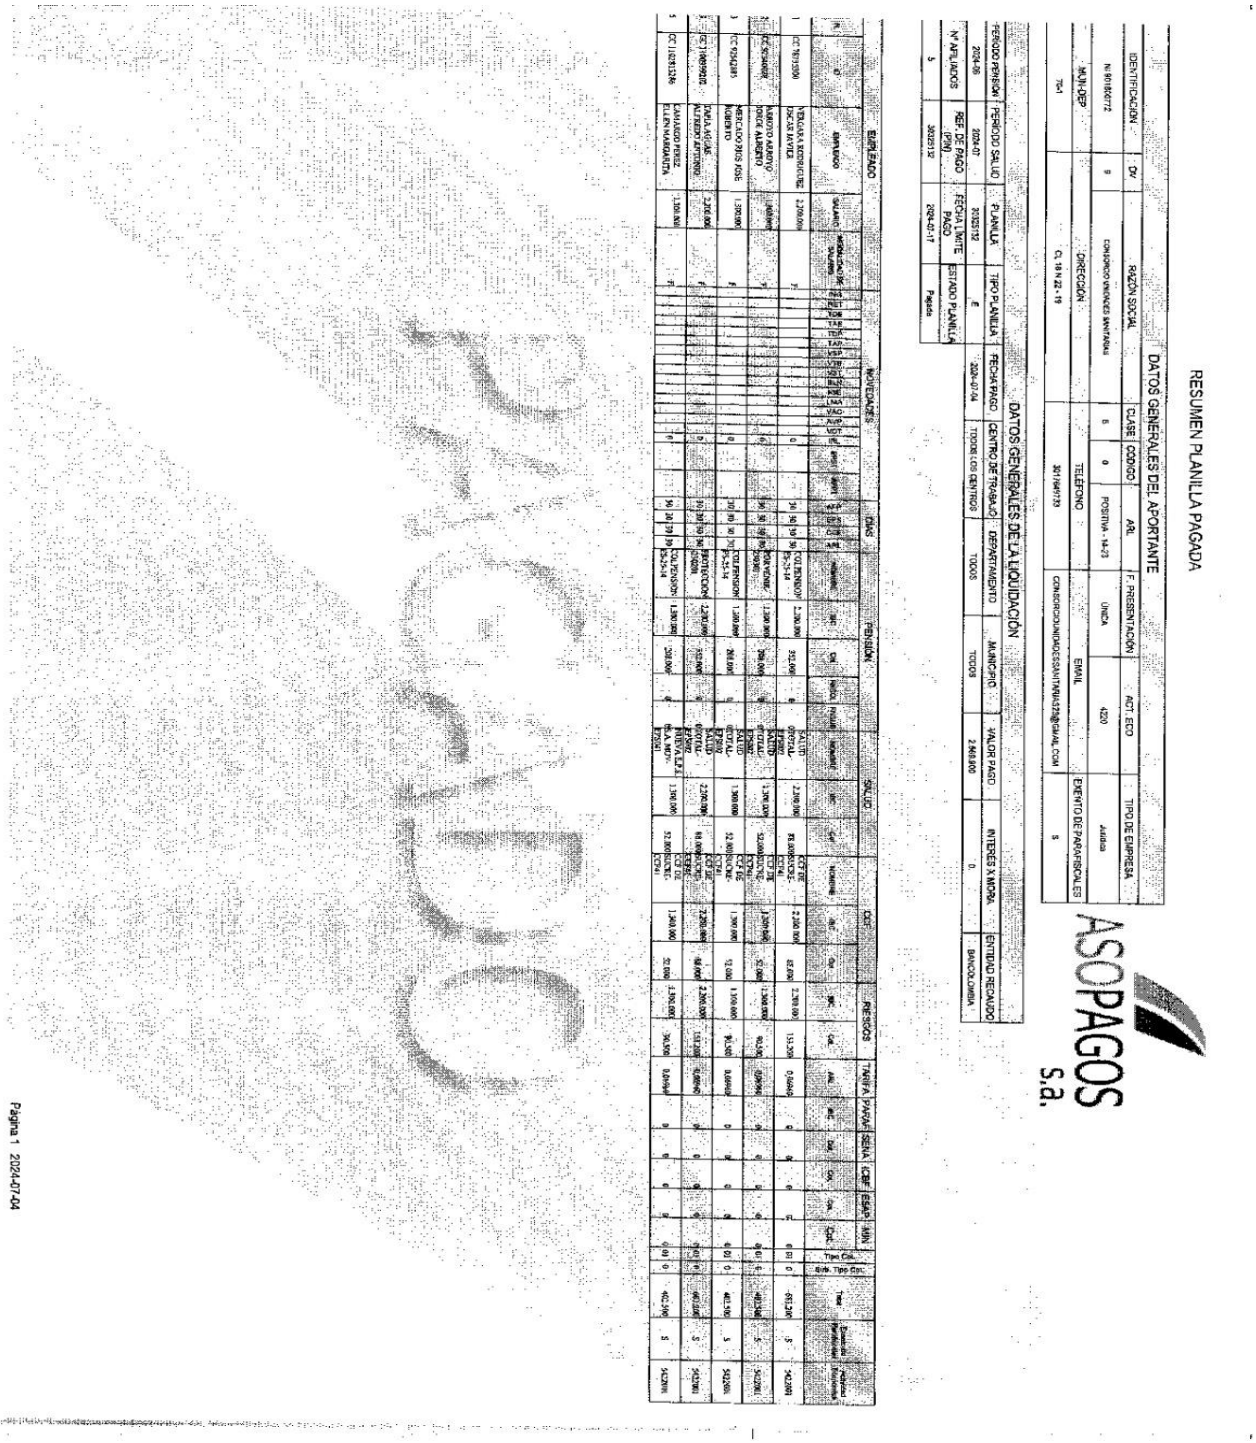

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901806172	9	CONSORCIO UNIONES SANITARIAS	5	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4220	JURIDICA

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CL 19 N 22-19	3014491739	CONSORCIOUNIONESSANITARIAS2@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-07	32332132	2024-07-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.449.600	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5	32332132	2024-07-17	Pagada

N	TD	NUMERO	EMPLEADO	NOVEDADES	DIAS	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	PARAFISCALES	SENA	ICBF	ESAP	MEN
1	CC	78103590	VERGARA ESTRUCTURE JOSE ALFREDO		30	COLPENSIONES 2.280.000	COLPENSIONES 2.280.000	CCF DE BARRANQUILLA 2.280.000	2.280.000	0,522%	0	0	0	0	0
2	CC	9134489	MORENO ARROYO JORGE ALBERTO		30	PORVENIR 1.300.000	PORVENIR 1.300.000	CCF DE BARRANQUILLA 1.300.000	1.300.000	0,522%	0	0	0	0	0
3	CC	9342285	MERCADO RIOS JOSE ROBERTO		30	COLPENSIONES 1.300.000	COLPENSIONES 1.300.000	CCF DE BARRANQUILLA 1.300.000	1.300.000	0,522%	0	0	0	0	0
4	CC	1080908210	PAEZ MEJIA ALFREDO ANTONIO		30	PROTECCION 2.280.000	PROTECCION 2.280.000	CCF DE BARRANQUILLA 2.280.000	2.280.000	0,522%	0	0	0	0	0
5	CC	1102831328	ESTRADA PEREZ ELKIN ALEXANDRA		30	COLPENSIONES 1.300.000	COLPENSIONES 1.300.000	CCF DE BARRANQUILLA 1.300.000	1.300.000	0,522%	0	0	0	0	0

Página 1 2024-07-04

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV.	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
NI 901860772	5	CONSORCIO UNIDOS SANTAFE	R	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	CONSORCIOUNIDOSSANTAFE@GMAIL.COM	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CL 18 N 22- 18	3017545733			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	98529342	E	2024-07-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.569.900	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PILA)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5	30727172	2024-07-17	Pagada


TOTALES IBC

IBC PENSION	IBC SALUD	IBC PRESTOS	IBC CAJAS	IBC PARAF.
6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3):				5	1.328.000	0	0	0	1.328.000
PROTECCION	23020	800227739	0	1	352.000	0	0	0	352.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	788.000	0	0	0	788.000
PORVENIR	23030	800224808	8	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 2):				5	332.000	0	0	0	332.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	280.000	0	0	0	280.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1):				5	577.900	0	0	0	577.900
POSITIVA	14-23	860011153	5	5	577.900	0	0	0	577.900
CCF(Administradoras: 1):				5	332.000	0	0	0	332.000
CCF DE SUCRE	CCF41	892200115	4	5	332.000	0	0	0	332.000
Gran Total				5	2.569.900	0	0	0	2.569.900

Página 2 2024-07-04


INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**		**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**	
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

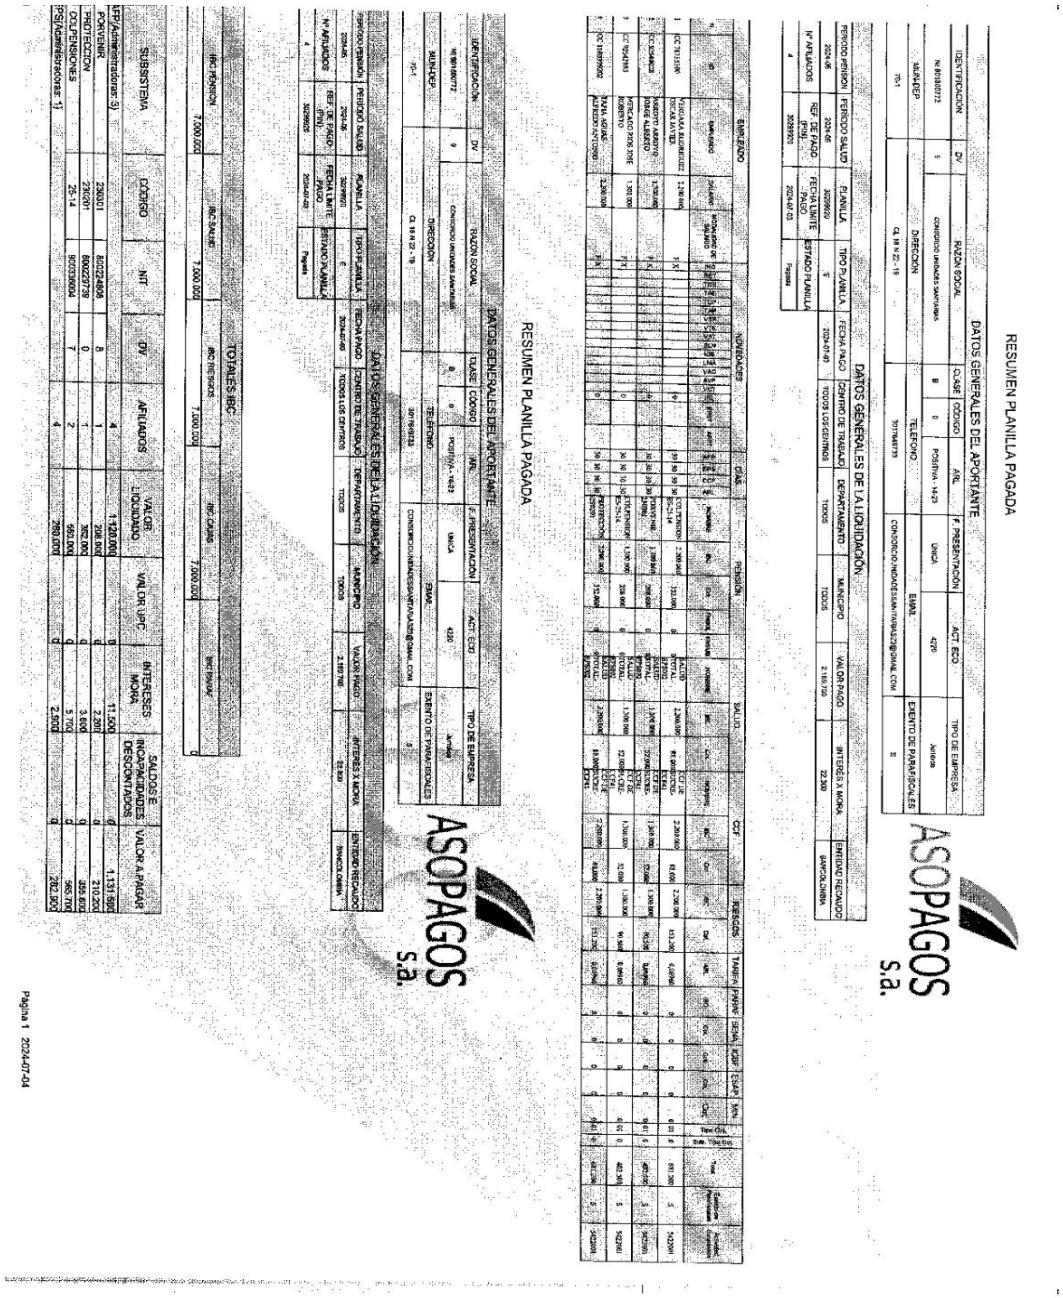

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

SUCRE_YPADILLA-02460662155132-724932-001255489-A

INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

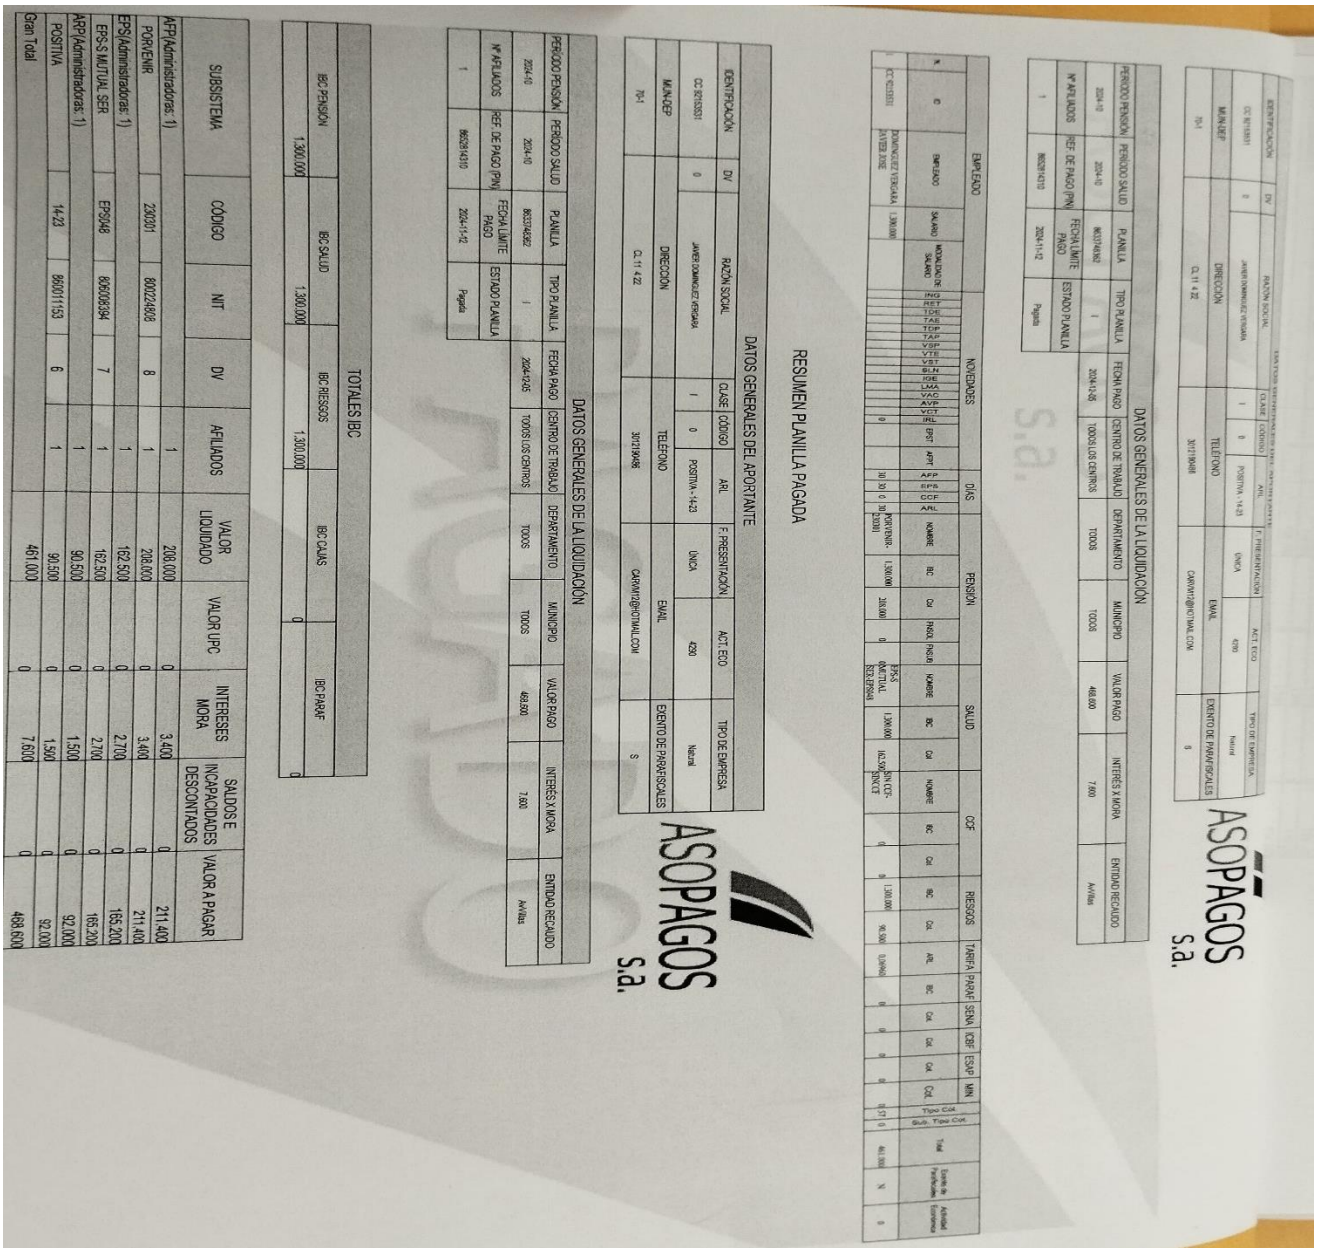

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL
CC 92153531	0	JAVIER DOMINGUEZ VERGARA
MUN-SEP		DIRECCIÓN
70-1		CL 11 4 22

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	86337649362	1	2024-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	468.600	7.600	AVIÑAS

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	86539143170	2024-11-12	Pagada

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	86337649362	1	2024-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	468.600	7.600	AVIÑAS

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	86539143170	2024-11-12	Pagada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 92153531	0	JAVIER DOMINGUEZ VERGARA	1	0	POSITIVA - 1-23	ÚNICA	4220	Natural
MUN-SEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1		CL 11 4 22		3012194496		CARVIR12@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	86337649362	1	2024-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	468.600	7.600	AVIÑAS

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	86539143170	2024-11-12	Pagada

TOTALES IBC


IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	3.403	0	211.403
PORVENIR	230301	800224808	8	1	208.000	0	3.403	0	211.403
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	2.700	0	165.200
EPS-S MUTUAL SER	EPS548	806008394	7	1	162.500	0	2.700	0	165.200
ARP(Administradoras: 1)				1	90.500	0	1.500	0	92.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	90.500	0	1.500	0	92.000
Gran Total					461.000	0	7.600	0	468.600

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

SUCRE_YPADILLA-02460662155132-724932-001255489-A


INFORME No.	**7**	**FECHA**	**12/12/2024**	**PERIODO**	**28 de abril- 4 de diciembre**		
CONTRATO N°	**LP-025-2023**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**	**X**	**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)					

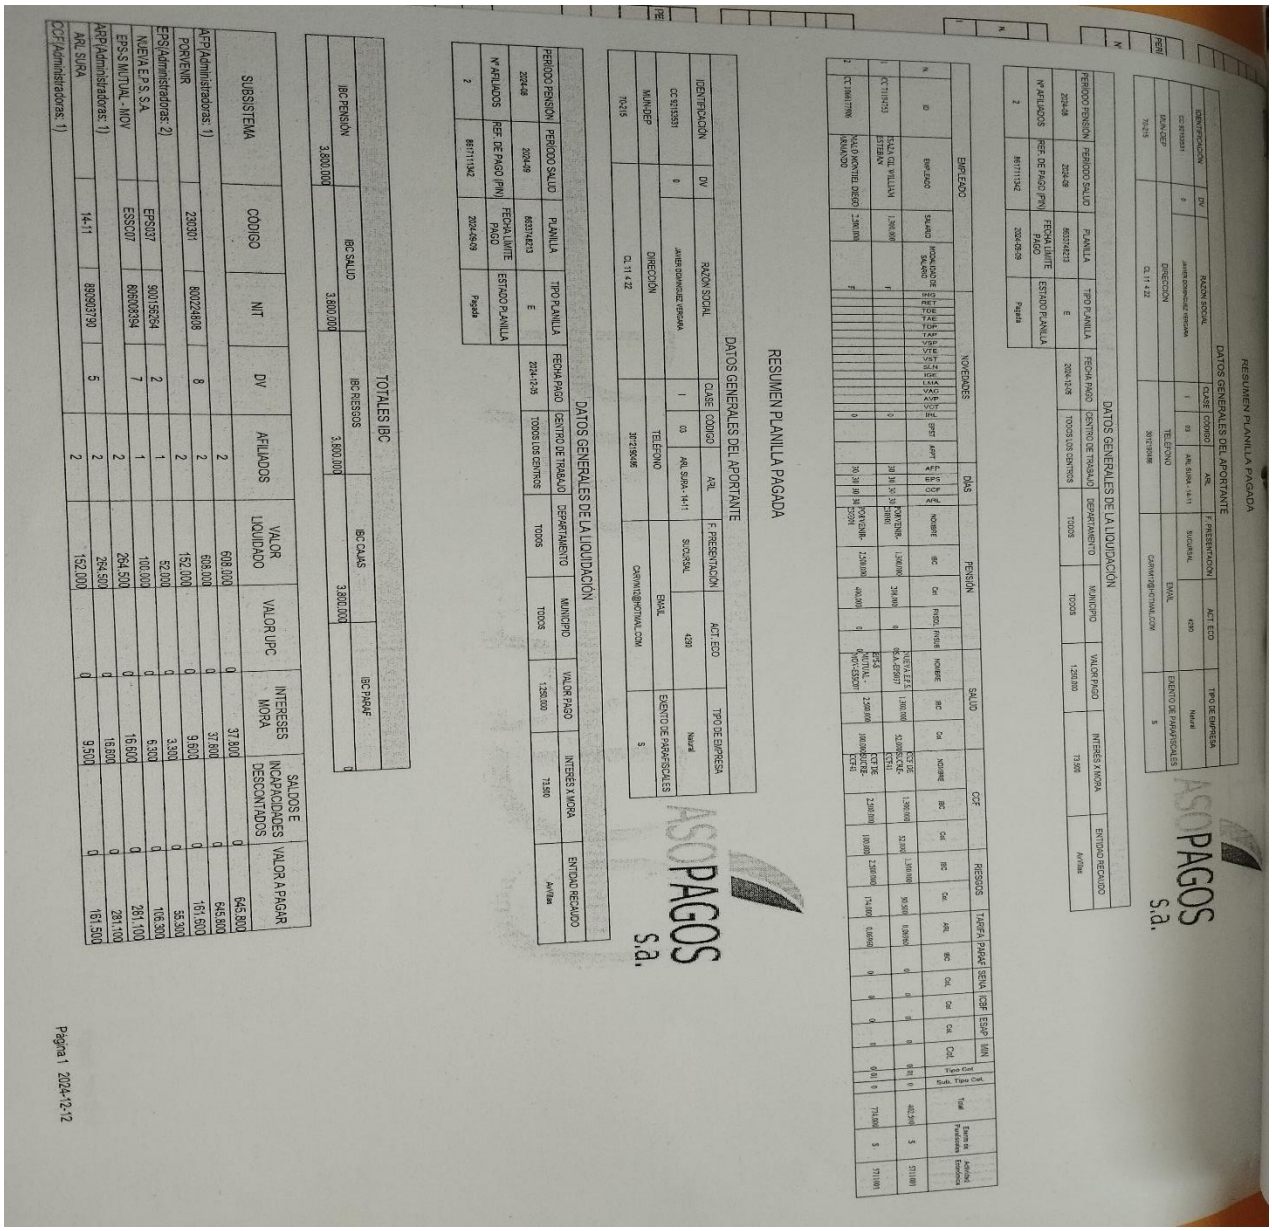

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

SUCRE_YPADILLA-02460662155132-724932-001255489-A

INFORME No.	7	FECHA	12/12/2024		PERIODO	28 de abril- 4 de diciembre	
CONTRATO N°	LP-025-2023	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR	X	CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)					

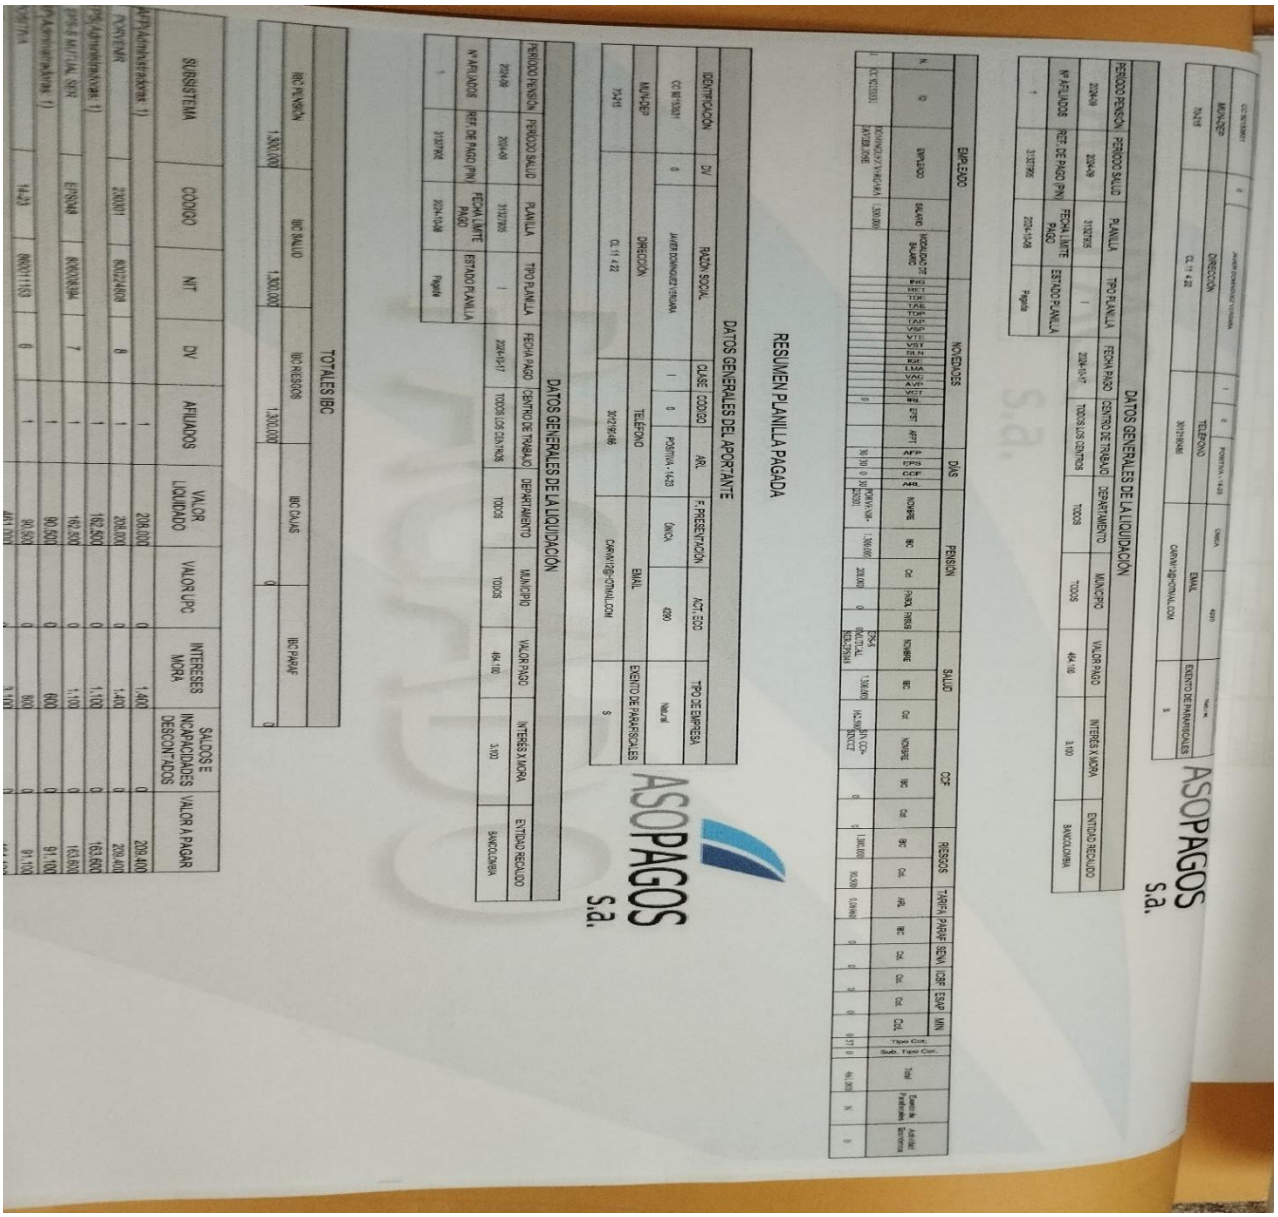

NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co
