CONTRATO DE OBRA N° 2023-045 DEL 11 DE JULIO DEL 2023

"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA"

ENTIDAD CONTRATANTE: ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA

NIT: 826002202-7

CONTRATISTA: CEROM DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 820.003.010–2

INFORME N°13

AGOSTO 1 – AGOSTO 31 DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
3.1 AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. 5
Su aspecto físico está compuesto de tierras quebradas y altiplanos. Se ubica en lo más agreste del ramal oriental de la Cordillera de los Andes. Debido a ello su paisaje es riquísimo en diversidad de vistas, y su clima varía desde el más frío, en los páramos, hasta el cálido en las riberas del río Chicamocha. 5
5
3.2 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 6
4. GENERALIDADES DEL PROYECTO 6
4.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6
4.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 9
5. CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS 10
5.1 GENERALIDADES PÓLIZAS Y GARANTÍAS 10
6. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL 12
6.1 ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS GESTIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL 12
5.2 ACCIDENTES DE TRABAJO 12
5.3 ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS GESTIÓN SEGURIDAD SOCIAL 12
5.3.1 Afiliaciones al sistema de seguridad social 12
5.3.2 Afiliaciones a la Administradora de Riesgos Profesionales 12
7. GENERACIÓN DE EMPLEO 14
8. MAQUINARIA Y EQUIPO 16
9. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 17
9.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 17
9.2 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DEL PROYECTO 17
9.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRAS 17
10. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 18
10.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 18

10.1.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) 18
10.1.2 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. 19
10.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO 20
10.2.1 PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI 20
10.3 ACERO DE REFUERZO Y MALLAS 21
10.3.1 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 21
10.4 ESTRUCTURA METALICA 22
10.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA): 22
10.5 CUBIERTA 23
10.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm 23
10.6 MAMPOSTERIA 24
10.6.1 MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS 24
10.6.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 25
10.7 PISOS 26
10.7.1 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 : 26
10.8 ESTUCO Y PINTURA 27
10.8.1 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS: 27
10.8.2 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES: 28
10.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 29
10.9.1 RED HIDRAULICA: 29

1. INTRODUCCIÓN

Por medio de este informe de obra, se demostrará los avances de un periodo comprendido desde el 1 de AGOSTO al 31 de AGOSTO del 2024, desarrolladas para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”

Inicialmente se delimita el proyecto dando la ubicación exacta, zonificando el área de intervención; se hace una descripción de las actividades ejecutadas en esa periodicidad, identificando el alcance de la obra y evaluando si existe retraso según cronograma para tomar medidas pertinentes.

Para poder determinar dichos factores de importancia en el desarrollo de la obra, es necesario desenvolver una serie de temáticas como lo es el área de influencia indirecta y directa, mencionar generalidades del proyecto de esta manera tener un acercamiento al mismo y evaluar el alcance que tiene, posterior a esto se mencionan las actividades realizadas y se establece el avance evaluando si se está dando cumplimiento con los tiempos establecidos.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Dar a conocer los avances de la obra en ejecución y demostrar el cumplimiento de actividades que reúne para el desarrollo óptimo de la nueva ESE centro de salud del municipio de La Uvita– Boyacá.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las especificaciones técnicas en la construcción del centro de salud.
- Garantizar la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de actividades del proyecto.
- Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice en el desarrollo del mismo.
- Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general se seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normativa vigente.

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1 AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA.

La Uvita es un municipio colombiano, ubicado en el norte del departamento de Boyacá. Limita al norte con el municipio de San Mateo, al sur con el municipio de Chita, al Oriente con el municipio de Chita, al Occidente con el municipio de Boavita. Tiene bajo su jurisdicción el centro poblado: Cusagüi.

Su aspecto físico está compuesto de tierras quebradas y altiplanos. Se ubica en lo más agreste del ramal oriental de la Cordillera de los Andes. Debido a ello su paisaje es riquísimo en diversidad de vistas, y su clima varía desde el más frío, en los páramos, hasta el cálido en las riberas del río Chicamocha.

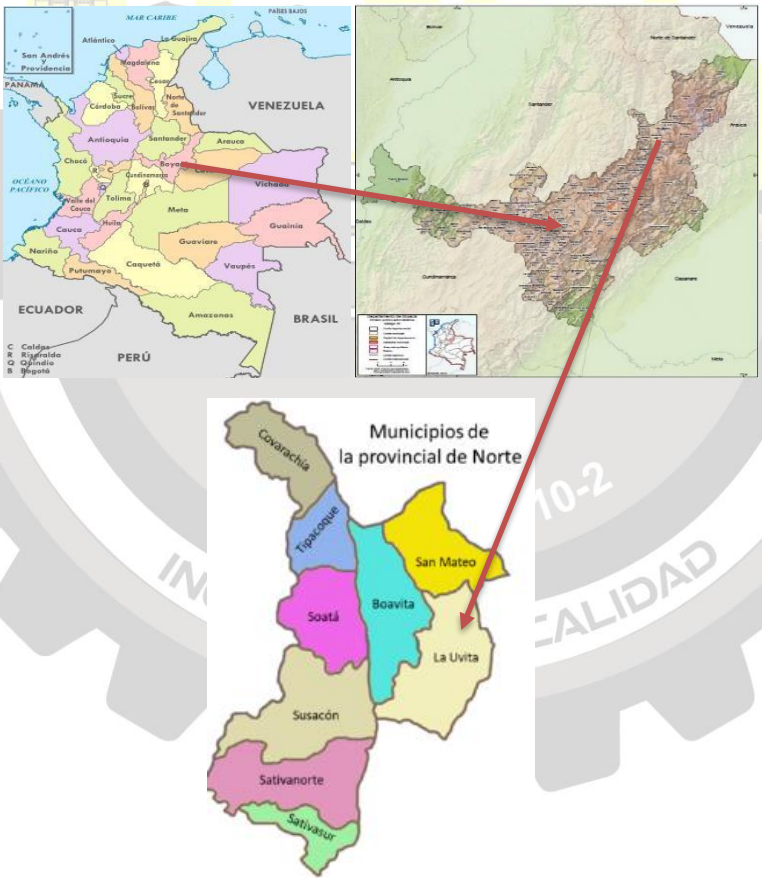


FIGURA 1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPIO

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/lauvita

3.2 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA



FIGURA 2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA PREDIO UBICACIÓN DEL PROYECTO
Fuente: Google Earth

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

4.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

En este informe se presenta la descripción detallada de la metodología utilizada para el desarrollo de actividades en la ejecución del proyecto para la **CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ.**

TABLA 01. ESTADO DEL CONTRATO 2023-045

CONTRATO N°	*2023-045*
FECHA DE CONTRATO	*11 DE JULIO DE 2023*
CONTRATANTE	*ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA*
NIT	*826002202-7*
REPRESENTANTE LEGAL	*ANDREA CATALINA PINZON BOTIA, C.C 1.020.779.397 expedida en Bogotá*
CONTRATISTA	*CEROM DE COLOMBIA S.A.S*
NIT	*820.003.010-2*
REPRESENTANTE LEGAL	*JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO CC: 74.363.121 expedida en Sutatenza (Boyacá)*
INTERVENTORIA	*UNION TEMPORAL INTER UVITA*
NIT	*901.738.692-2*
REPRESENTANTE LEGAL	*ANDRES DAVID MENDIVELSO ALVAREZ*
OBJETO	*"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA"*
VALOR INICIAL	*TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($3.662.845.429,00) M/CTE*
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	*CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE ENERO DE 2023*
ACTA DE INICIO:	*16 DE AGOSTO DE 2023*
ACTA DE SUSPENSION 1:	*30 DE DICIEMBRE DE 2023*

ACTA DE REINICIO 1:	*10 DE ENERO DE 2024*
PRORROGA 1:	*TRES (3) MESES*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*27 DE ABRIL DE 2024*
PRORROGA 2:	*DOS (2) MESES*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*27 DE JUNIO DE 2024*
PRORROGA 3:	*CUARENTA Y CINCO (45) DIAS*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*11 DE AGOSTO DE 2024*
PRORROGA 4:	*TRES (3) MESES*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*13 DE NOVIEMBRE DE 2024*

4.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Para dar cumplimento al objeto contractual del proyecto se requiere realizar la construcción del nuevo centro de salud del municipio de La Uvita, la construcción busca garantizar a la población del municipio una mejor calidad de vida para las familias y un mejor servicio en temas de salud. De esta manera se construyen unas instalaciones que se adapten a las necesidades de la comunidad, mediante el desarrollo de tecnologías alternativas sostenibles, que simultáneamente suplan las condiciones requeridas por las entidades encargadas y por la población del municipio de La Uvita.

Para dar cumplimento al objeto contractual del proyecto se requiere de la construcción del nuevo centro de salud de La Uvita, esta construcción comprende la ejecución de las siguientes actividades:

- **OBRAS PRELIMINARES:** Comprende las actividades de localización y replanteo, descapote, cerramiento perimetral, instalación de campamento, así como demolición de pisos y andenes.

- **MOVIMIENTO DE TIERRAS:** Incluye excavaciones manuales y mecánicas en material común, nivelación y conformación del terreno, además de implementar un mejoramiento del suelo en material de afirmado.

- **CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES:** Se realizará la construcción de 4 bloques de edificaciones con sus respectivas instalaciones hidrosanitarias, red contra incendios, instalaciones eléctricas y de voz y datos que servirán tanto para el área operativa como para la administración.

- **EXTERIORES Y ZONAS VERDES:** Se realizará una instalación de piso en grama, plantación de árboles paisajísticos y el suministro e instalación de bancas para exteriores.

- **VIAS Y PARQUEADEROS:** Se construirán vías de acceso y salida para vehículos al igual que parqueaderos tanto para vehículos como bicicletas.

- **SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALES:** Se realizará el suministro de equipos específicos para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

5. CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS

SEGUIMIENTO Y VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS

5.1 GENERALIDADES PÓLIZAS Y GARANTÍAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No de Póliza: 20154
Anexo.

TABLA 02. CONTROL DE POLIZAS

CONTROL DE PÓLIZAS				
GARANTÍAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		FECHA INICIO	**FECHA VENCIMIENTO**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	16-08-23	29-06-25	$232.000.000,00

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No de Póliza: 68859
Anexo.

CONTROL DE PÓLIZAS				
GARANTÍAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		FECHA INICIO	**FECHA VENCIMIENTO**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	16-08-23	14-03-25	$732.569.086,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	16-08-23	14-03-25	$732.569.086,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	16-08-23	14-11-27	$549.426.814,35

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	08-05-24	13-11-29	$732.569.086,00
CALIDAD DEL SERVICIO	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	16-08-23	14-03-25	$366.284.543,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	16-08-23	14-03-25	$732.569.086,00

6. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL

En el presente reporte se informa el seguimiento a la gestión de Seguridad Industrial y Social realizado durante el período, en la ejecución del contrato de Obra 2023-045.

6.1 ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS GESTIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente se les hace entrega de elementos de protección personal a los trabajadores. La dirección del contrato realiza inspección periódica al uso de estos elementos realizando el proceso administrativo respectivo al personal que no use dichos elementos.

5.2 ACCIDENTES DE TRABAJO

No reportó ningún accidente de trabajo durante el periodo de ejecución del contrato.

5.3 ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS GESTIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente se realizaron las siguientes actividades:

5.3.1 Afiliaciones al sistema de seguridad social: Se realizaron las respectivas afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y de Salud en el Trabajo del personal de obra y administrativo de acuerdo con la decisión personal del trabajador referente a Entidades Prestadoras de Servicios de Salud.

5.3.2 Afiliaciones a la Administradora de Riesgos Profesionales:

Se realizaron las respectivas afiliaciones a la ARL SURA del personal de obra y administrativo de acuerdo con el nivel de riesgo.

A continuación, se relaciona personal que trabaja en obra; en el periodo relacionado en el presente informe, se anexa certificados de afiliaciones.

TABLA 03. RELACIÓN DEL PERSONAL

No	Cedula	Apellidos y Nombre	Cargo	Fecha de ingreso	EPS	PENSION	ARL
1	5440859	CARLOS ARTURO BERRIO CACERES	Oficial de obra	5/02/2024	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA
2	1002698905	DAVID LEONARDO BOTIA MURILLO	Auxiliar de obra	15/10/2023	SANITAS	COLPENSIONES	SURA
3	4239368	JOSE MIGUEL BOTIA MORALES	Auxiliar de obra	2/11/2023	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA
4	1100476	JOSE BERNARDO CONTRERAS	Maestro de obra	16/08/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
5	1090399182	HERNAN CONTRERAS RODRIGUEZ	Oficial de obra	9/01/2024	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA
6	4240055	LUIS EBERTO GALVIS NIÑO	Auxiliar de obra	3/10/2023	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA
7	11443434	HILDEBRANDO JAIME LIMAS	Auxiliar de obra	16/08/2023	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA
8	1056994947	JOSE LIBARDO LIMAS QUINCHARA	Auxiliar de obra	30/04/2024	SANITAS	PORVENIR	SURA
9	4060131	CARLOS ALBERTO MESA	Auxiliar de obra	17/04/2024	CAJACOPI	COLFONDOS	SURA
10	1057690579	WILSON FERNANDO MONTAÑEZ BERMUDEZ	Director de obra	16/08/2023	SANITAS	PROTECCION	SURA
11	1049647963	JEYSON JOSE ROMERO QUINTERO	Residente de obra A	24/08/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
12	1100502	RAFAEL SIPAMOCHA NOPE	Oficial de obra	25/09/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
13	1055186223	MANUEL ANTONIO SOCONGOCHA RODRIGUEZ	Oficial de obra	6/09/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
14	1006636660	YOLMAN TUMAY GIRON	Electricista	3/04/2024	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA
15	4249073	SANTIAGO ACUÑA SUESCA	Oficial de obra	10/05/24	CAJACOPI	PORVENIR	SURA
16	1010030728	BRAYAN ESTIVEN MEDINA VERANO	Auxiliar de obra	02/06/24	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
17	1056994069	YULIAN ALEJANDRO CACERES BERRIO	Auxiliar de obra	01/06/24	SANITAS	PORVENIR	SURA
18	1002698742	OSCAR JAVIER BLANCO DUARTE	Auxiliar de obra	24/06/24	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
19	1049413692	YIMY JAVIER DIAZ CARRILLO	Auxiliar de obra	22/07/24	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
20	1056994798	DAIRO ALONSO RISCANEVO VELANDIA	Auxiliar de obra	29/07/24	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
21	1118774601	GEINER ELI TUMAY GIRON	Electricista	23/07/24	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA

7. GENERACIÓN DE EMPLEO

Por parte de la empresa CEROM DE COLOMBIA S.A.S, toma la responsabilidad de realizar verificación del personal que se encuentra vinculado en la ejecución de la obra, para esto se apoya en el formato de generación de empleo en el que se especifica cuantos trabajadores se encuentran laborando y qué tipo de mano de obra desempeñan. Después de diligenciar el formato se evidencia que en el periodo informado se contó con un total de 21 empleados, los cuales corresponden a director, residente, maestro general de obra, 5 oficiales de obra, 2 electricistas y 10 auxiliares de obra.

TABLA 04. FORMATO DE GENRACIÓN DE EMPLEO

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA												
REPORTE MENSUAL DE GENERACION DE EMPLEO												
CONTRATO DE OBRA 2023-045												
PERIODO: 1 DE AGOSTO- 31 DE AGOSTO DE 2024				**OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACÁ**								
CONTRATISTA:	**CEROM DE COLOMBIA S.A.S R/L JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO**			**SUPERVISIÓN: ANDREA CATALINA PINZON BOTIA R/L ESE CENTRO DE SALUD LA UVITA**								
FECHA DE REGISTRO: 31 AGOSTO DE 2024												
CONTRATISTA												
MUNICIPIO	**MANO DE OBRA CALIFICADA**			**MANO DE OBRA NO CALIFICADA**								**TOTAL, EMPLEOS**
	SUB CONTRATISTAS	**MANO DE OBRA EXTERNA**	**SUB TOTAL**	**LOCAL**	**EXTERNA**	**SUBTOTAL**	**MADRES CABEZA DE FAMILIA**	**DESPLAZADOS**	**DESMOVILIZADOS**	**SUBTOTAL**		
LA UVITA	**2**	**0**	**2**	**12**	**7**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**		**21**

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

Para la ejecución de todas las actividades relacionadas en el CONTRATO DE OBRA 2023-045, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA – BOYACÁ", se requirió del equipo y maquinaria relacionada a continuación:

TABLA 05. RELACIÓN DE EQUIPO

MAQUINARIO Y O EQUIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
VOLQUETAS	MACK CV713	1
MEZCLADORA	FERMAC 1B	1
PLACA VIBRATORIA	FERMAC	1
VIBRADOR ELÉCTRICO	DINGO 2300W	1
CORTADORA	TRUPER 14" 2200W	1
TALADRO	BOSH GSB 13	1
HERRAMIENTA MENOR	VARIOS	-

9. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

9.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

Las actividades contratadas para el cumplimento del objeto contractual del contrato de obra 2023-045, se relacionan en la tabla siguiente.

PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXOS)

9.2 AVANCE FINANCIERO Y FISICO DEL PROYECTO

CANTIDADES EJECUTADAS (ANEXOS)

INFORME FINANCIERO FIDUCIARIA (ANEXOS)

9.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Durante el periodo del 1 de AGOSTO al 31 de AGOSTO del 2024 se realizó un avance de obra correspondiente al 70.38%, como se indica en la tabla siguiente:

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	83.33%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	70.38%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	72.57%

10. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo de ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades:

10.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

10.1.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) Se realizaron excavaciones para cimentaciones, tuberías y cárcamos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Fuente: Elaboración Propia

10.1.2 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM. Se realizó mejoramiento de piso para áreas exteriores.

REGISTRO FOTOGRÁFICO MEJORAMIENTO DE PISO	
	
	
Fuente: Elaboración Propia	

10.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO

10.2.1 PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 2500 PSI Se realizó mezcla de concreto de 2500 psi según el diseño de mezcla para placa base del cuarto eléctrico y andenes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
Fuente: Elaboración Propia	

10.3 ACERO DE REFUERZO Y MALLAS

10.3.1 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa: Se realizó la instalación de malla electro soldada para andenes perimetrales .

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Fuente: Elaboración Propia

10.4 ESTRUCTURA METALICA

10.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CUBIERTA): Se realizó la instalación de estructura metálica para los bloques 01, 02.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

Fuente: Elaboración Propia

10.5 CUBIERTA

10.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm Se realizó la instalación de policarbonato para las cubiertas de los bloques 01, 02.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
Fuente: Elaboración Propia	

10.6 MAMPOSTERIA

10.6.1 MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 MTS Se realizó la instalación de bloque #5 para muros del cuarto eléctrico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
Fuente: Elaboración Propia	

10.6.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 Se realizó la instalación de pañete para muros de los bloques 03 y 04.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
Fuente: Elaboración Propia	

10.7 PISOS

10.7.1 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 : Se realizó la instalación de alistado de piso para áreas del bloque 01.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
Fuente: Elaboración Propia	

10.8 ESTUCO Y PINTURA

10.8.1 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS: Se realizó la instalación de estuco y pintura para muros internos de los bloques 01 y 02.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
Fuente: Elaboración Propia	

10.8.2 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES: Se realizó la instalación de pintura en vinilo para fachadas de los bloques 01, 02 y 03.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
Fuente: Elaboración Propia	

10.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

10.9.1 RED HIDRAULICA: Se realizó la instalación de tubería y accesorios de red hidráulica exterior.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
Fuente: Elaboración Propia	

ANEXOS

PLANILLAS AFILIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

POLIZAS GENERADAS HASTA LA FECHA

BITACORA DE OBRA

PRESUPUESTO DE OBRA

SABANA Y MEMORIAS DE CANTIDADES

INFORME FINANCIERO FIDUCIARIA

CERTIFICADO DE ESCOMBRERA

CARACTERIZACION DE MATERIALES GRANULARES

CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERO

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS
