AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de #

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	28 de julio de 2024
Semana No.	3	**Del :**	22 de julio de 2024	**al**	28 de julio de 2024

Plazo total	485	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	19	días	**Tiempo restante**	466 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	3,92%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**	0,000%	0,00%
Valor programado ($)			**Valor ejecutado ($)**	$0	$0
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0,00

OBSERVACIONES

En virtud de lo estabecido en el desarrollo del contrato, se llevo a cabo rl comite tecnico semanal el 26 de julio de 2024.

El consorcio Aerosafka duramte esta semana solicita una prorroga de diez (10) dias para la terminación de la etapa 1 correspondiente a la apropiación, esto teniendo en cuenta que la visita de reconocimiento se llevó a cabo hasta le 18 de julio de 2024 y el acta de inicio se firmo el 9 de julio de 2024.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEREO SAFKA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRA1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 - Lote 1	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	N/A
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Durante la semana del presente informe se continua con la ejecución de la Etapa 1 del proyecto que consiste en la revisión y elaboración de los documentos correspondientes para la firma del acta de apropiacion.

Oficios recibidos del Contratista:

* Mediate comunicacación del contratista No. 003-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 25 de julio de 2024 se presentan los siguientes documentos, los cuales se encuentra en revisión por parte de la interventoria.

1. HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.
2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES.
3. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
4. CONTRATO DE APERTURA FIDUCIARIA.

* Mediante el OFICIO No. 004-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 26 de julio de 2024, se radica por parte del contratista el informe tecnico de la visita de reconocimiento realizada el 19 de julio, en la cual participo personal del contratista, la interventoría y la entidad.

Oficios remitidos por la Interventoría:

* Comunicación CALM01-001-2024-SOLICITUD ENTREGA INFORMACION PRELIMINAR CONTRATO DE OBRA del 22 de julio de 2024.
* CALMO1-002-2024_SOLICITUD ENTREGA INFORME SEMANAL- del 24 de julio de 2024.
* El 25 de julio de 2024, la interventoría remite via correo electrónico el Informe Semanal de interventoría N° 1 periodo: 9 de julio a 12 de julio de 2024
* El 25 de julio de 2024 la interventoria remite via correo electrónico el Informe Semanal Interventoría No. 2_ Aeropuerto Valledupar
* El 25 de julio de 2024 mediante comunicación CALM01-003-2024 radica a la Aerocivil Remisión Pólizas Actualizadas Acta de Inicio Contrato de Interventoría No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
* El 25 de julio de 2024, la interventoría mediante comunicación CALMO1-004-2024_SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS VISITA DE RECONOCIMIENTO, solicita el cumplimiento de lso compormisos.

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

No aplica para el presente informe

AREA AMBIENTAL

No aplica para el presente informe

AREA SST

La profesional SST se encuentra en la revisión de las hojas de vida preentadas por el contratista las cuales corresponden a:


Residente de Obra: Ing. Jhonny Turizo
Coordinador de Obra: Arq. Mario Londoño
Profesional SST: Karina Paola Mina


PLAN DE CALIDAD


No aplica para el presente informe

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	3
Personal del Contratista	6
Total Personal en Obra	9

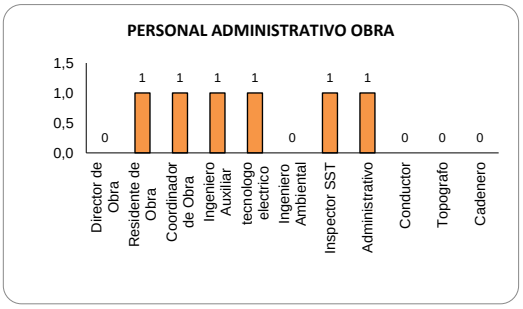





AVANCE FINANCIERO DE OBRA
En el momento no se encuentra aun avance financiero de obra.
AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA
No aplica para el periodo
REGISTRO FOTOGRÁFICO
No aplica para el presente informe.

OBSERVACIONES	Representante Legal
	
	ING ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ
