AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 05/AGO/2024	Página: 1 de #

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	4 de agosto de 2024
Semana No.	4	**Del :**	29 de julio de 2024	**al**	4 de agosto de 2024

Plazo total	485	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	26	días	**Tiempo restante**	459 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	5,36%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**	0,000%	0,00%
Valor programado ($)			**Valor ejecutado ($)**	$0	$0
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0,00

OBSERVACIONES

Se realizaron los tramites pertinenetes para el ingreso del personal de topografia y laboratorio de suelso y se esta avanzando en esas labores.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEREO SAFKA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRA1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 - Lote 1	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	N/A
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

* Mediante OFICIO No. 006-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 29 de julio de 2024, el contratista radicó ante la interventoria para revisión el Plan de Calidad V0

* OFICIO No. 007-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 30 de julio de 2024, dirigida al gerente del aeropuerto se solicita por parte del contratista el ingreso de personal para adelantar las isguientes actividades:

1. Estudio de suelos o geotecnia.
2. Levantamiento y localizaciones de coordenadas por medio del sistema RTK (topografía).

* Mediante la comunicaión OFICIO No. 010-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 30 de julio de 2024, el consorcio AEROSAFKA hace la solicitud fromal de prorroga de la etapa 1 del proyecto por un termino diez (10) dias, solicitud que fue planteada en el comite de obra del 26 de julio, aprobada en dicha mesa de trabajo por la interventoria y la entidada contratante.

* Mediante comunicación OFICIO No. 008-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 el contratista radica ante la interventoria el cronograma de ejecución del proyecto.

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

No aplica para el periodo

AREA AMBIENTAL

No aplica para este periodo

AREA SST


La interventoria se encuentra revisando las hojas de vida presentadas por el contratista y en la organización de las hojas de vida de la interventoría para presentar a la entidad.


PLAN DE CALIDAD

Mediante comunicación OFICIO No. 006-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 del 29 de julio de 2024, el contratista radicó el Plan de calidad el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoria.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA





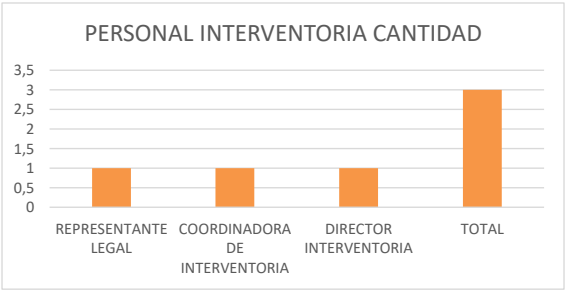

Personal de Interventoría	2
Personal del Contratista	7
Total Personal en Obra	9

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

No aplica para este periodo

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

No aplica para este periodo

REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA CIVIL

GEORREFERENCIACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y APIQUES PARA ESTUDIO DE SUELOS












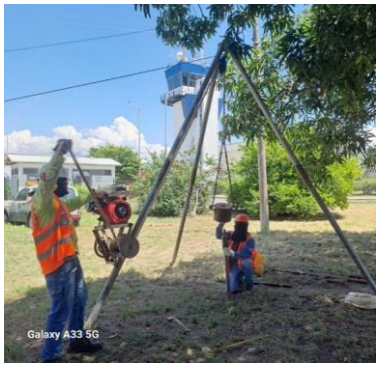



PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO

No aplica para este periodo

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Como se puede evidenciar en el registro fotografico se estan adelantando actividades como levantamiento topografico y estudio de suelos.	ING ALEJANDRO FABIO RUIZ GARCES
