AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha:	Página: 1 de #

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	9 de septiembre de 2024
Semana No.	9	**Del :**	2 de septiembre de 2024	**al**	8 de septiembre de 2024
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	61 días			**Tiempo restante**	426 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	12,53%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**	0,000%	0,00%
Valor programado ($)			**Valor ejecutado ($)**	$0	$0
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0,00%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 0,00

OBSERVACIONES

No hay observaciones para el periodo del informe.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEREO SAFKA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRA1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 - Lote 1	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	N/A
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

•RE: El día 5 de septiembre del 2024 vía correo electrónico se da respuesta a las presentas generadas del anexo técnico, en referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR.
•RE: El día 5 de septiembre del 2024 vía correo electrónico se da respuesta a las inquietudes técnicas del tablero general, en referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR.
•Oficio CALMO1-039-2024, Documentación Requerida para tramite de actas parciales de obra, 02/09/24.
•Oficio CALMO1-040-2024, Respuesta al oficio No 016 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Radicación Hojas de Vida - V1, 05/09/24.
•Oficio CALMO1-041-2024 Solicitud de entrega de cotizaciones de componentes del Sistema de Luces PAPI, 05/09/24.
•Solicitud de firma por parte de interventoria para vinculación en Fiducia, 05/09/2024.
•Acta de comité No 5, del 23 de agosto de 2024, 05/09/24.
•FASE 1: Revisión de componentes de la apropiación, 06/09/24.

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

No aplica para el periodo

AREA AMBIENTAL

Mediante OFICIO No. 43-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 el contratista radica el plan de manejo ambiental en referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR.

AREA SST

• El dia 02/09/24,el contratista envia a Aeronáutica Civil, una comunicacion en donde el contratista informa y envía documentos del personal que serán responsables de iniciar las actividades de demolición en la subestación actual. Se relaciona el nombre del personal que ingresara a realizar las actividades:

• LUIS MIGUEL GIRALDO MARTÍNEZ.
• LORENZO MIGUEL RAMOS GUERRERO.
• BRYAN ANDRÉS ESPELETA OCHOA.


PLAN DE CALIDAD


No se realiza seguimiento al lan de calidad toda vez que no se han iniciado las labores de la estapa 2.


CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
•RE: El día 5 de septiembre del 2024 vía correo electrónico se da respuesta a las presentas generadas del anexo técnico, en referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR. •RE: El día 5 de septiembre del 2024 vía correo electrónico se da respuesta a las inquietudes técnicas del tablero general, en referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR. •Oficio CALMO1-039-2024, Documentación Requerida para tramite de actas parciales de obra, 02/09/24. •Oficio CALMO1-040-2024, Respuesta al oficio No 016 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Radicación Hojas de Vida - V1, 05/09/24. •Oficio CALMO1-041-2024 Solicitud de entrega de cotizaciones de componentes del Sistema de Luces PAPI, 05/09/24. •Solicitud de firma por parte de interventoria para vinculación en Fiducia, 05/09/2024. •Acta de comité No 5, del 23 de agosto de 2024, 05/09/24. •FASE 1: Revisión de componentes de la apropiación, 06/09/24.	•OFICIO No. 041-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, por medio del cual remito una serie de preguntas generadas del Anexo Técnico, en referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR. •OFICIO No. 042-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 por medio del cual se remite las inquietudes técnicas del tablero general, en referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR. •OFICIO No. 43-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 por medio del cual se radica el plan de manejo ambiental en referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR. •OFICIO No. 44 -AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, por medio del cual se notifica el inicio formal de las actividades relacionadas con el proyecto de construcción civil, en conformidad con las normativas y procedimientos establecidos.; en referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ DE VALLEDUPAR. •OFICIO No 45 AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, por medio del cual se radica el INFORME MENSUAL DE OBRA No1 V3, AJUSTADO A OFICIO CALMO1-038-2024 •OFICIO No. 046-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, Por medio del cual se hace una aclaración respecto al oficio No 44 NOTIFICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, •OFICIO No. 047-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024; por medio del cual se da respuesta al oficio CALM01-037-2024, en referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR. •OFICIO No. 048-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, por medio del cual se radica el PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL, ajustado al modelo de Aerocivil. •OFICIO No. 049-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024, por medio del cual se radica LA PROGRAMACION DE OBRA, En referencia al contrato 23001191 H4 de 2023 en el AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ DE VALLEDUPAR.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

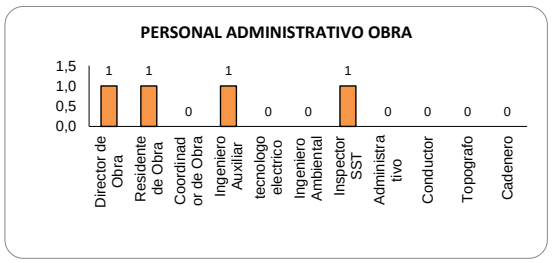





Personal de Interventoría	3
Personal del Contratista	4
Total Personal en Obra	7

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

No aplica para el periodo

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

No aplica para el periodo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTALES

PISTA AEREA LUCES PAPI Y CABLEADO

NO SE HAN INICIADO LAS LABORES DE ESTE ITEM.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	
	ING ALEJANDRO FABIO RUIZ GARCES
