OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME DE SUPERVISION

NESHER MATEO REINA ALVARADO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

MUNICIPIO DE TAURAMENA

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

TAURAMENA 2024 - 2027

FECHA: (17/12/2024)

OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME DE SUPERVISION **FECHA: (17/12/2024)**

CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTAH AMAYA AGUIRRE - JEFE DE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION
CONTRATO	631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3. PROGRAMACION DE INTERVENTORIA

4. CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES

6. INFORME FOTOGRAFICO

a. Informe técnico
b. Actas de visita
c. Soportes de pago seguridad social
d. Informe seguimiento plan ambiental
e. Informe seguimiento SST

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE
FECHA PRESENTE INFORME	17/12/2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula **SEPTIMA (7)** del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
Revisión de la documentación pertinente correspondiente al contrato **No 631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"** necesaria para el inicio del proyecto.	La correcta iniciación del proyecto teniendo en cuenta el estado ideal de todos los aspectos técnicos, ambientales, financieros y contables del mismo.
Visitas realizadas a los predios en los cuales se realizará la ejecución del proyecto objetivo del contrato **No 631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"** para tener un seguimiento real del estado del mismo.	Lograr un reporte real y actualizado del avance del proyecto para la plataforma de seguimiento **GESPROY**.
Revisión y recepción de los informes de avance presupuestal por parte de la empresa interventora del contrato **No 631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"** que fueron entregados mensualmente.	El correcto cargue de información presupuestal a la plataforma de seguimiento **GESPROY**.
Entrega de informes mensuales por parte de la supervisión al contrato **No 631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE"** correspondientes al avance presupuestal del mismo.	El correcto cargue de información presupuestal a la plataforma de seguimiento **GESPROY**.

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**N.A.**	**N.A.**	**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL:**	**89,00%**

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE
FECHA PRESENTE INFORME	17/12/2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula **SEPTIMA (7)** del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
Viviendas de interés prioritario construidas en sitio propio urbana y rural	No.	28	89,00%

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACION ATENDIDA	
			UNIDAD DE	CANTIDAD
Déficit de vivienda cuantitativo	%	89%	HAB	25

3. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

¿Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

A la fecha del presente informe no se ha materizalizado ninguno de los riesgos establecidos en el estudio previo del proceso, anexo 3, Matriz de riesgos.

Como constancia de la ejecución, el Contratista hace entrega de: Informe 1 (Parcial) con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los originales de dichos informes con sus respectivos soportes, reposan en el expediente del contrato en la oficina Asesora Jurídica del Municipio.

4. ANEXOS

1. Registro fotográfico

MARTHA AMAYA AGUIRRE
JEFE DE DESPACHO OFICINA
ASESORA DE PLANEACION

NESHER MATEO REINA ALVARADO
PROFESIONAL DE APOYO A LA
SUPERVISION

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	**INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE		
CONTRATO No	631	**FECHA DE CONTRATO**	29 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR	$ 250.559.575,00	**VALOR ANTICIPO**	$ 125.279.787,50
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.	**NIT O C.C.**	844002476-3
R/L	EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN	**C.C.**	74180496
PLAZO CONTRACTUAL	8 MESES	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA**	CMMT-OAP-002-2023 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO (DIAS)	240	**PUBLICACION OFICIAL**	02 DE DICIEMBRE DE 2023
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	1151 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION**	1668 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE DESIGNACION DE SUPERVISION	11 DE ABRIL DE 2024	**INTERVENTOR**	N/A
ACTA DE INICIO	12 DE ABRIL DE 2024	**FECHA DE TERMINACION**	08 DE FEBRERO DE 2025

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**FECHA DE APROBACION**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**DESCRIPCION AMPAROS**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
605-47994000105185	DE CUMPLIMIENTO	19-mar-2024	29-dic-2023	31-ene-2025	$ 25.055.958,00
	BUEN MANEJO ANTICIPO	19-mar-2024	29-dic-2023	31-ene-2025	$ 125.279.787,50
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19-mar-2024	29-dic-2023	31-ene-2025	$ 12.527.979,00
605-74994000023387	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	19-mar-2024	29-dic-2023	31-ago-2024	$ 260.000.000,00

CONTROL ADMINISTRATIVO

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS			VALORES DE ACTAS	
ACTA DE INICIO	12 DE ABRIL DE 2024		**VALOR DEL ANTICIPO**	$ 125.279.787,50
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL	13 DE DICIEMBRE DE 2024		**VALOR ACTA PARCIAL**	$ 112.751.809,00
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ACTA FINAL DE EJECUCION	-		**VALOR ACTA DE RECIBO FINAL**	$ 12.527.978,50
ACTA DE LIQUIDACION	-		**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$ 225.503.617,00

CONDICIONES FINAL DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 250.559.575,00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	10 MESES
VALOR EJECUTADO	$ 225.503.617,00

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE - JEFE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1 *Actividades preeliminares predios urbanos y rurales*

Se realizó visita en conjunto con la empresa ejecutora, la empresa interventora y el profesional de apoyo a la supervisión por parte de la alcaldía para el reconocimiento y puesta en marcha de las obras de construcción en cada uno de los predios.

2 *Seguimiento a la construcción de viviendas en predios urbanos*

Se realizaron una serie de visitas por parte de la empresa interventora y el profesional de apoyo a la supervisión por parte de la alcaldía a cada uno de los predios urbanos para tener información verás y real del estado de cada uno de ellos y reportar cualquier anomalidad que se pudiera presentar.

3 *Seguimiento a la construcción de viviendas en predios rurales*

Se realizaron una serie de visitas por parte de la empresa interventora y el profesional de apoyo a la supervisión por parte de la alcaldía a cada uno de los predios rurales para tener información verás y real del estado de cada uno de ellos y reportar cualquier anomalidad que se pudiera presentar, teniendo en cuenta la diferencia de diseños y requerimientos entre estas y las vivendas urbanas.

4 *Recepción de las viviendas urbanas e inicio de procesos de escrituración*

Una vez terminadas cada una de las viviendas urbanas, se procedió a realizar la respectiva acta a cada uno de los beneficiarios para proceder con el trámite legal de escrituración de cada subsidio para poder luego hacer la entrega de cada vivienda, indicando el compromiso de realizar proceso de protocolización de mejora.

5 *Recepción de las viviendas rurales*

Una vez terminada cada vivienda rural, se procedió con la capacitación a cada beneficairio sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales que fue instalado en cada vivienda y así poder realizar la entrega de la misma. De igual forma se indicó el adecuado uso y cuidado que requiere la construcción por parte del beneficiario.

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
INTERVENTOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE - JEFE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
ABRIL	1	Revision de Documentos				
	2			Acta de Inicio		
	3		Entrega de documentos técnicos			
	4					
MAYO	1				Seguimiento de actividades	
	2				Seguimiento de actividades	
	3				Seguimiento de actividades	
	4				Seguimiento de actividades	
JUNIO	1				Seguimiento de actividades	
	2			Actas de visita a predios	Seguimiento de actividades	
	3				Seguimiento de actividades	
	4				Seguimiento de actividades	
JULIO	1				Seguimiento de actividades	
	2				Seguimiento de actividades	
	3				Seguimiento de actividades	
	4				Seguimiento de actividades	
AGOSTO	1				Seguimiento de actividades	
	2				Seguimiento de actividades	
	3				Seguimiento de actividades	
	4				Seguimiento de actividades	

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
INTERVENTOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE - JEFE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA						
SEPTIEMBRE	**1**				Seguimiento de actividades	
	2				Seguimiento de actividades	Entrega de informes técnicos y financieros correspondientes a los meses abril, mayo y junio
	3				Seguimiento de actividades	
	4				Seguimiento de actividades	
OCTUBRE	**1**				Seguimiento de actividades	
	2				Seguimiento de actividades	
	3				Seguimiento de actividades	
	4				Seguimiento de actividades	
NOVIEMBRE	**1**				Seguimiento de actividades	
	2				Seguimiento de actividades	Entrega de informes técnicos y financieros correspondientes a los meses julio, agosto y septiembre
	3				Seguimiento de actividades	Entrega de informe técnico y financiero correspondiente al mes de octubre
	4				Seguimiento de actividades	
DICIEMBRE	**1**				Seguimiento de actividades	
	2			Entrega de acta de cobro parcial No 1	Seguimiento de actividades	

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE - JEFE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION

INFORME FOTOGRAFICO

ESTADO INCIAL Y FINAL	ESTADO INCIAL Y FINAL
	
Propietario: Wendy Sarmiento Ubicación: Calle 20 # 14a - 26 Tipo de predio: Urbano	Propietario: Wendy Sarmiento Ubicación: Calle 20 # 14a - 26 Tipo de predio: Urbano
	
Propietario: Luis Carlos Plazas Ubicación: Calle 20 # 10 - 24 Tipo de predio: Urbano	Propietario: Luis Carlos Plazas Ubicación: Calle 20 # 10 - 24 Tipo de predio: Urbano
	
Propietario: Ana Lucia Satoba Ubicación: Calle 21 # 13 - 05 Tipo de predio: Urbano	Propietario: Ana Lucia Satoba Ubicación: Calle 21 # 13 - 05 Tipo de predio: Urbano

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACION DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE - JEFE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION

INFORME FOTOGRAFICO

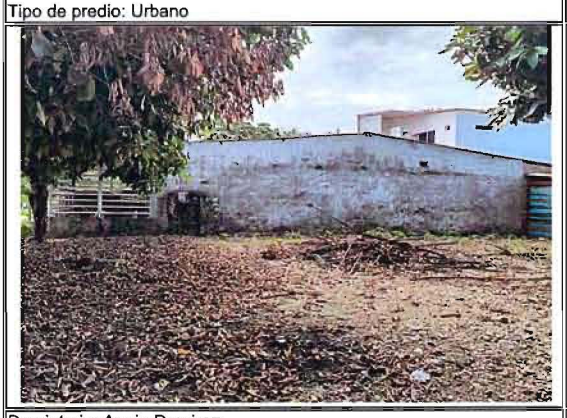
ESTADO INCIAL Y FINAL	ESTADO INCIAL Y FINAL
	
Propietario: Viviana Pino Ubicación: Calle 7 # 6a - 48 Tipo de predio: Urbano	Propietario: Viviana Pino Ubicación: Calle 7 # 6a - 48 Tipo de predio: Urbano
	
Propietario: Mariluz Salinas Ubicación: Carrera 9 # 7a - 16 Tipo de predio: Urbano	Propietario: Mariluz Salinas Ubicación: Carrera 9 # 7a - 16 Tipo de predio: Urbano
	
Propietario: Jhoon Cubides Ubicación: Calle 5 # 5b - 20 Tipo de predio: Urbano	Propietario: Jhoon Cubides Ubicación: Calle 5 # 5b - 20 Tipo de predio: Urbano

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE - JEFE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION

INFORME FOTOGRAFICO

ESTADO INCIAL Y FINAL	ESTADO INCIAL Y FINAL
	
Propietario: Rony Daza Ubicación: Calle 8e # 6 - 03 Tipo de predio: Urbano	Propietario: Rony Daza Ubicación: Calle 8e # 6 - 03 Tipo de predio: Urbano
	
Propietario: Angie Ramirez Ubicación: Calle 15 # 1a - 55 Tipo de predio: Urbano	Propietario: Angie Ramirez Ubicación: Calle 15 # 1a - 55 Tipo de predio: Urbano
	

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE - JEFE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION

INFORME FOTOGRAFICO

ESTADO INCIAL Y FINAL	ESTADO INCIAL Y FINAL
Propietario: Arley Monroy Ubicación: Diagonal 8 # 3 - 58 Tipo de predio: Urbano	Propietario: Arley Monroy Ubicación: Diagonal 8 # 3 - 58 Tipo de predio: Urbano
	
Propietario: Viviana Yepes Ubicación: Calle 11 # 21 - 16 Tipo de predio: Urbano	Propietario: Viviana Yepes Ubicación: Calle 11 # 21 - 16 Tipo de predio: Urbano
	
Propietario: Daniela Lozano Ubicación:Vereda Cabañas Tipo de predio: Rural	Propietario: Daniela Lozano Ubicación:Vereda Cabañas Tipo de predio: Rural
	
Propietario: Oscar Zorro Ubicación: Vereda Cabañas Tipo de predio: Rural	Propietario: Oscar Zorro Ubicación: Vereda Cabañas Tipo de predio: Rural

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE - JEFE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION

INFORME FOTOGRAFICO

ESTADO INCIAL	ESTADO FINAL
	
Propietario: Catherine Duarte Ubicación: Vereda Cabañas Tipo de predio: Rural	Propietario: Catherine Duarte Ubicación: Vereda Cabañas Tipo de predio: Rural
	
Propietario: Tatiana Criollo Ubicación: Vereda Aguablanca Tipo de predio: Rural	Propietario: Tatiana Criollo Ubicación: Vereda Aguablanca Tipo de predio: Rural
	
Propietario: Robinson Gomez Ubicación: Vereda Aguablanca Tipo de predio: Rural	Propietario: Robinson Gomez Ubicación: Vereda Aguablanca T:po de predio: Rural

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACION DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE - JEFE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION

INFORME FOTOGRAFICO

ESTADO INCIAL	ESTADO FINAL
	
Propietario: Alexis Reuter Ubicación: Vereda Aceite Alto Tipo de predio: Rural	Propietario: Alexis Reuter Ubicación: Vereda Aceite Alto Tipo de predio: Rural
	
Propietario: Sandy Zorro Ubicación: Vereda Visinaca Tipo de predio: Rural	Propietario: Sandy Zorro Ubicación: Vereda Visinaca Tipo de predio: Rural
	
Propietario: Solmar Soler Ubicación: Vereda Chitamena Alto Tipo de predio: Rural	Propietario: Solmar Soler Ubicación: Vereda Chitamena Alto Tipo de predio: Rural

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO AREA URANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	INGENARE S.A.S.
SUPERVISOR	MARTHA AMAYA AGUIRRE - JEFE DESPACHO OFICINA ASESORA DE PLANEACION

INFORME FOTOGRAFICO

ESTADO INCIAL	ESTADO FINAL
	
Propietario: Claris Moreno Ubicación: Vereda Yaguaros Tipo de predio: Rural	Propietario: Claris Moreno Ubicación: Vereda Yaguaros Tipo de predio: Rural
	
Propietario: Florisbel Tarache Ubicación: Vereda Yaguaros Tipo de predio: Rural	Propietario: Florisbel Tarache Ubicación: Vereda Yaguaros Tipo de predio: Rural
