AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE OBRA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	28 de octubre de 2024
Semana No.	15	**Del :**	21 de octubre de 2024	**al**	26 de octubre de 2024

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	102	días	**Tiempo restante**	354 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	22.37%			
Nombre del Supervisor :	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO INTERNACIONAL ALMIRANTE PADILLA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	3.00%	16.00%	**(%) Ejecutado**	1.00%	10.00%
Valor programado ($)	$73,163,622.59	$125,622,573.76	**Valor ejecutado ($)**	$29,108,273.86	$55,228,828.15
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-6.00%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 70,393,745.61

OBSERVACIONES

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023-LOTE 2	**Contrato No:**	23001308H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2,471,685,007.00	**Valor Inicial:**	$ 855,375,978
Valor Anticipo:	$ 535,395,000	**Valor Anticipo:**	SIN
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17-jul-24	**Fecha de iniciación:**	17-jul-24
Fecha de vencimiento:	16-oct-25	**Fecha de vencimiento:**	16-oct-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 2,471,685,007.00	**Valor total actual del contrato**	$ 855,375,978

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN CAMPO

Durante la semana se realizó:
* Se realiza el informe semanal correspondiente.
* Se asiste al comité de seguimiento No 12.
*Se ingresa a al lado aire del aeropuerto con oficiales y ayudantes de obra .
*Se realiza entrega del Cronograma semanal de actividades correspondiente a la semana del 28 al 03 de octubre de 2024.
*Se realiza entrega del informe semanl No 14.
*Se elabora bitácora de obra.

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

LUNES 21 de octubre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Excavaciones para nivelacion e implantacion de la Subestacion electrica.
MARTES 22 de octubre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Excavaciones para cimentacion de la Subestacion electrica.
MIERCOLES 23 de octubre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Cerramiento y señalizacion del area de intervencion. Excavaciones para instalacion de red de agua potable.
JUEVES 24 de octubre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Excavaciones para instalacion de red de agua potable.
VIERNES 25 de octubre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Capacitacion personal previo inicio de obra, por parte del profesional Sst. Ingreso de materiales para la cimentacion de la Subestacion electrica.
SABADO 26 de octubre 2024	TURNO DIURNO 7:00am-5:00pm	Trasiego de materiales al campamento de obra.

ACTIVIDADES DE SEGRUIDAD Y SALUD EN EL TRABJO

Durante esta semana, se llevaron a cabo diversas actividades orientadas a fortalecer la seguridad y salud en el trabajo con un enfoque integral que incluyó las siguientes actividades realizadas: Inspecciones de Seguridad, Acompañamiento de Actividades, Charlas y Capacitaciones, señalizaciones generales, gestion de ingresos. La semana de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo fue altamente productiva, logrando sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a sus tareas diarias y brindándoles herramientas para prevenir accidentes.
Las charlas y capacitaciones fueron complementadas con actividades prácticas y supervisión constante, lo que permitió reforzar la cultura de seguridad en la empresa. Se destacaron los esfuerzos para mantener un ambiente de trabajo seguro, mejorar la comunicación sobre riesgos y fortalecer el compromiso de todos con las normas de seguridad
Lunes 21/10/2024: Se realizó una charla enfocada en los riesgos asociados a las excavaciones manuales, en la que se abordaron temas como:
Técnicas adecuadas para realizar excavaciones seguras.
Identificación de peligros como caídas, derrumbes y contacto con cables o tuberías subterráneas.
Uso de herramientas adecuadas y protección personal, como cascos, guantes y botas antideslizantes.
Martes 22/10/2024: Este día se realizó una charla sobre la importancia de la salud mental en el entorno laboral. Los temas cubiertos incluyeron: Identificación de signos de estrés y agotamiento en los trabajadores.
La importancia de mantener un equilibrio emocional para evitar accidentes laborales relacionados con la fatiga mental.
Recursos disponibles para apoyo psicológico dentro de la empresa.
Recepción de Elementos de Seguridad en el PSO
Se verificó el ingreso de los elementos de seguridad relacionados en el documento del plan de seguridad operacional PSO.
miercoles 23/10/2024: Charla condiciones Climáticas, los temas abordados incluyeron: Precauciones a tomar en climas extremos (calor, frío, lluvias), equipos de protección adecuados según las condiciones meteorológicas.
Se realizó la señalización de las áreas de trabajo para garantizar que todos los colaboradores pudieran identificar claramente los riesgos en su entorno, tales como zonas de excavación, áreas de tránsito de vehículos y lugares con condiciones peligrosas (húmedos, resbaladizos, etc.).
Jueves 24/10/2024: El día estuvo dedicado a la ejecución de excavaciones manuales, siguiendo los lineamientos de seguridad previamente discutidos en la charla del lunes. Se implementaron medidas de seguridad adicionales durante la actividad práctica, como la utilización de barreras de protección para prevenir caídas o deslizamientos de tierra.
Charla: Residuos Peligrosos
Se dictó una charla sobre la correcta gestión de residuos peligrosos en el lugar de trabajo, Se enfatizó que el cumplimiento de los procedimientos de seguridad, se realiza trasiego de material. **Viernes 25/10/2024:**
Charla SST no hay atajos para la seguridad se continua con el trasiego de Material (Cemento y Varilla) con medidas de seguridad
Se realizó el trasiego de materiales pesados (cemento y varilla), con medidas estrictas de seguridad. Durante esta actividad, se supervisó el uso adecuado de equipos como carretillas, EPP guantes de seguridad, botas y cascos para evitar accidentes relacionados con cargas pesadas y caídas de material.
sabado 26/10/204: El último día de la semana estuvo dedicado a la reflexión sobre los actos inseguros, aquellos comportamientos que ponen en riesgo la seguridad laboral, se realizan actividades de supervision e inspecciones de las actividades de obra.
Control de ruido
Se suministra EPP para proteccion auditiva y se socializa dia a dia la programacion de vuelos.
Manejo de olores
Debido a que nos encontramos en etapa de revision de diseños y tramites administrativos no se han realizado actividades para este componente.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

lunes 21/10/ 2024: Ingreso del personal al área de trabajo, seguidamente se realiza señalización según planos aprobados por interventoría e inician excavaciones, con herramientas manuales (picos, palas), por parte de la cuadrilla encargada de realizar la actividad, el material terreo extraído, es acopiado al lado de la excavación para la reutilización del mismo, el material sobrante se utilizara para rellenos en áreas no propias del proyecto, orden y aseo del área antes de culminar la jornada laboral.
Martes 22/10/2024: Ingreso del personal al área de trabajo, charla de sensibilización (residuos aprovechables) Continua la actividad de excavación con herramientas manuales (picos, palas) por parte de la cuadrilla encargada de realizar la actividad, orden y aseo del área antes de culminar la jornada laboral
Miércoles 23/10/2024: Continua las excavaciones en las áreas designadas y aprobadas por interventoría, con herramientas manuales (picos, palas) por parte de la cuadrilla encargada de realizar la actividad, recolección y empaque de los residuos orgánicos, teniendo en cuenta la utilización de los elementos de protección personal. Estos residuos posteriormente se le darán disposición final a través de un receptor, orden y aseo del área.
Jueves 24/10/2024: Ingreso del personal al área de trabajo, charla de sensibilización (residuos biológicos) continua la actividad de excavación, según los trasados aprobados por interventoría, el material terreo retirado se reutilizará en el proyecto o áreas de relleno pertenecientes al aeropuerto almirante padilla, orden y aseo del área antes de terminación de la jornada laboral.
Vienes 25/10/2024: Ingreso del personal al área de trabajo, continuando con la actividad de excavaciones y acopio del material terreo para su reutilización, orden y aseo del del área antes de terminación de la jornada laboral.
Sábado 26/11/2024: la cuadrilla encargada de realizar las excavaciones continua con la actividad, según los trasados aprobados por interventoría, acopiando el material terreo para su reutilización, orden y aseo del del área antes de terminación de la jornada laboral

ACTIVIDADES TECNICAS.

Se realiza comité de avance de obra N° 12.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
N/A		N/A
Para el periodo no se reportan novedades relacionada con el ingreso y/o salida de vehiculos.	Para este periodo ingresa a obra apisonador, pulidora, rotomartillo, sierra circular.	Para este periodo se ingresa herramnientas menores (pico, palas, carretillas, mona, machetes, carretilla, cinta metrica)

Ficha: PMA_03_ Programa: GESTIÓN DE RESIDUOS - SUBPROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS

Generación de residuos: Durante el periodo se generaron y entregaron a gestor 0,0 Kg de residuos con las siguientes características	Gestión de CONSTRUCARIBE 2024
NO APLICA PARA ESTE PERIODO	NO APLICA PARA ESTE PERIODO

FICHA: PMA_04_ Programa: MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO Y VERTIMIENTOS - SUBPROGRAMA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS FUENTES NATURALES Y VERTIMIENTOS

Vertimientos
- No se realizaron actividades relacionadas con el lavado de vehículos, maquinaria y equipos dentro de los frentes trabajo, ni en cuerpos de agua, caños o drenajes naturales aledaños.
- No se realizaron vertimientos de aguas negras y residuos líquidos o sólidos a los canales de aguas lluvias

FICHA: PMA_05_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA -SUBPROGRAMA DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL, DESCAPOTE Y DISPOSICIÓN DE SUELOS

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

FICHA: PMA_06_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA MANEJO DE MATERIALES Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN

INGRESO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Para el periodo no se reporta ingreso o relación de materiales de construcción:

SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN
Para el periodo no se reporta material sobrante.

FICHA: PMA_07_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA SEÑALIZACIÓN

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

Ficha: PMA_09_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA MANEJO DE SUELOS

NO APLICA PARA ESTE PERIODO


Ficha: PMA_10_ Programa: IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS MENORES Y DE INFRAESTRUCTURA - SUBPROGRAMA MANEJO AMBIENTAL PARA CAMPAMENTOS, TALLERES Y/O BODEGAS


NO APLICA PARA ESTE PERIODO


Ficha: PMA-05-B - PMA_12_ Programa: MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE - Subprograma: MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
NO APLICA PARA ESTE PERIODO
PMA-PGS-04 Programa: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - SUBPROGRAMA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL VINCULADO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO
NO APLICA PARA ESTE PERIODO

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	4
Personal del Contratista	11
Total Personal en Obra	15







CORRESPONDENCIA ENVIADA

* 21 DE OCTUBRE ENTREGA DISEÑO ESTRUCTURAL AJUSTADO
* 21 DE OCTUBRE ENTREGA DE PROGRAMACION SEMANAL
*21 DE OCTUBRE ENTREGA FICHAS AMBIENTALES
*23 DE OCTUBRE ENTREGA INFORME SEMANAL N°13
*23 DE OCTUBRE ENTREGA HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA CIVIL
*24 DE OCTUBRE ENTREGA DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
N/A	N/A	N/A
Total Acumulado	$ 0.00	

Valor Total Contrato Obra
$ 2,471,685,007.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0.00
% Avance facturado Acumulado
0.00%


AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
N/A	N/A	N/A
Total Acumulado	$ 0.00	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855,375,978.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0.00
% Avance facturado Acumulado
0.00%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



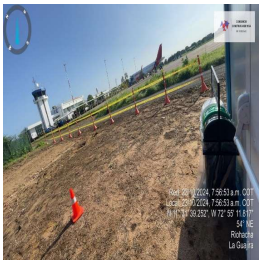






OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL.
	ING. GERMAN DAVID BANQUETH VERBEL
