AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	10 de diciembre de 2024
Semana No.	**21**	**Del :**	2 de diciembre de 2024	**al**	8 de diciembre de 2024

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	145	días	**Tiempo restante**	311 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	31,80%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	4,58%	28,73%	**(%) Ejecutado**	1,171%	5,37%
Valor programado ($)	$113.308.518,83	$710.207.094,31	**Valor ejecutado ($)**	$28.935.703,00	$132.748.531,19
			Porcentaje Adelanto/Atraso		-23,36%
			Evaluación		
			Valor Adelanto/Atraso		-$ 577.458.563,12

OBSERVACIONES

De acuerdo con la programación, a continuación se detallan las actividades sin iniciar, las ya iniciadas pero que no han culminado

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**67,40%**	**40,71%**	**-26,69%**	**en ejecución**
Dia de trasiego - 2 ayudantes	0,00%	100,00%	**100,00%**	**terminada**
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	100,00%	47,16%	**-52,84%**	**en ejecución - con retraso**
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100,00%	58,99%	**-41,01%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100,00%	20,78%	**-79,22%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 20 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	43,01%	**-56,99%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Corte de losa de piso e= 3 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	33,33%	**-66,67%**	**en ejecución - con retraso**
Piso en adoquin referencia Piazza liso 15 x 15. (incluye cama de arena de 5 cm)	77,78%	0,00%	**-77,78%**	**sin iniciar**
Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vias vehiculares).	100,00%	44,62%	**-55,38%**	**en ejecución - con retraso**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**100,00%**	**3,06%**	**-96,94%**	**en ejecución - con retraso**
TUBERIA PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
S/CODO PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
CODO PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
YEE PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
TEE PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
UNIÓN PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO LAVAMANOS 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO SIFÓN 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
TRAGANTE 4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
EXCAVACION EN CONGLOMERADO	100,00%	7,81%	**-92,19%**	**en ejecución - con retraso**
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
RETIRO DE SOBRANTES	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
SUMINISTRO Y CONFORMACION ARENA DE PEÑA	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO SIFÓN 4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**

VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Equipo Hidroneumático 1 hp 60 Litros Horizontal Horiz	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
VÁLVULA DE CORTE 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BRIDA 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
CHEQUE 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TUBERIA PVC-P 1"	100,00%	95,75%	-4,25%	en ejecución - con retraso
CODO PVC-P 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TEE PVC-P 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 3/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
ADAPTADOR MACHO 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
CODO PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TEE PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
ADAPTADOR MACHO 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
UNIÓN PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
PUNTO SANITARIO 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
PUNTO LAVAMANOS 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
PUNTO DUCHA 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**56,16%**	0,00%	-56,16%	sin iniciar
Suministro e instalacion de Alimentador 3x350N + 4/0T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalacion de Alimentador 3x350F + 4/0N + 4/0T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	83,33%	0,00%	-83,33%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Bajante apantallamiento 1/0 AWG Cu - 3/4" IMC	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra apantallamiento (sin soldadura, ni electrodo) incluye grapa de conexión bimetalica y curva IMC 3/4	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2.471.685.007,00	**Valor Inicial:**	$ 855.375.978
Valor Anticipo:	$ 535.395.600	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.471.685.007	**Valor total actual del contrato**	$ 855.375.978

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ:
1. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS No.18
2. SE PROCESARON ORDENES DE SOLICITUD DE ANTICIPO No. 1 Y SE REVISAN LAS ORDENES DE DESEMBOLSO 2 Y 3
3. SE REVISA Y PROYECTA ACTADE COBRO No. 01 DEL CONTRATISTA

LUNES 2 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Compactación y solado de Zapatas * Armado de Acero *Trasiego de materiales desde Alfa 4 * Cubrimiento de excavaciones con el mismo material que fue removido- Reutilización de material de corte- * Fundido de solado registro 4, ubicado en la zona verde
MARTES	TURNO DIURNO	* Armado de acero * Excavaciones para registros

3 de diciembre de 2024	6:00 AM a 6:00 PM	* Drenaje de aguas lluvias de las excavaciones * Armado de formaletas
MIÉRCOLES 4 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	* Prueba de cilindros * Excavación para registros * Solado de registros * Fundido de Zapatas (A1, A2 Y B1) y pedestales (A1, B1, C1, C2, C3) * Solado de registro No. 6
JUEVES 5 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	* Figurado de acero * Fundido de pedestales (A2, A3, B2 Y B3) * Fundido de solado * Prueba de cilindro * Relleno y compactación a nivel de pedestal * Excavaciones de registros * Solado de registros No. 4 y 3
VIERNES 6 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Los trabajadores no se presentaron a la obra
SÁBADO 7 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 PM a 3:00 AM	* Compactación de relleno calificado. * Figurado de Hierro *Trasiego de material
DOMINGO 8 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Día festivo - no laboral

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Lunes 02/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “Actos inseguros y condidiones inseguras”
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de compactacion de zapatas
- Se realiza socialización - programación de vuelos
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de seguridad
- Se realiza acompañamiento SST durante las actividades defundida de solado en zona verde
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de trasiego de materiales

Martes 03/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “Pequeños habitos grandes habitos”
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de figurado de acero
- Se realiza apoyo SST durante la actividad de excavacion de reistros
- Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de manejo de agua de excavación de canalización
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de seguridad
- Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de armado de formaletas
- Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de trasiego de materiales

Miércoles 04/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “Fundida de concreto”
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza apoyo SST durante la actividad de excavacion de registros
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de fundida de solado
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades defun didas de zapatas y pedestales A1, A2, B1
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de seguridad

Jueves 05/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Tipos de señalizacion"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de fugurado de acero
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de relleno y compactacion
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de excavacion de registros
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad defundida de solado
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Viernes 06/12/2024
- se reporta que para ese dia el personal operativo no asistio a obra, por ende no se reportan actividades de seguiminto y control en materia de SST

Sábado 07/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Corregir los errore4s pequeños antes que se crezcan"
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de trasiego de material
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de figurado de acero

Domingo 08/12/2024
- Día no laborado

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO

Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
1. Trasiego de material, ubicado en Alfa 4. **2.** Excavaciones en el área de jardín **3.** Instalación de Tuberías **4.** Figurado de Hierro **5.** Compactación de Excavaciones de Las zapatas. **6.** Solado de zapatas. **7.** Desagüe de aguas lluvias **8.** Relleno de Canalización	**MANEJO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN - MACA-** **MACA #1 Remoción de Cobertura vegetal, descapote y disposición de suelos** **MACA #3 - Manejo de Materiales de Construcción** **MACA # 6 - Señalización en áreas de Construcción**	**1. **Protección de materiales**** Los materiales de construcción en el sitio de obra se resguardan mediante un cerramiento provisional que incluye cinta de advertencia, malla de protección y señalización conforme al programa establecido de seguridad y señalización, garantizando la prevención de riesgos asociados. **2. **Socialización en Seguridad Aeroportuaria de peligro Aviario **** Como parte del programa de capacitación y con el próposito de dar a conocer lineamientos, acciones y prevenciones del peligro aviario en el aereopuerto, se realiza socialización en seguridad aeroportuaria a los trabajadores vinculados en obra. **3. **Manipulación segura de materiales**** La manipulación de materiales se realiza de manera controlada, asegurando que no representen peligro para los transeúntes, el personal de obra y terceros, al tiempo que se evitan impactos negativos sobre los elementos ambientales circundantes. **4. **Demarcación de áreas de advertencia**** Las áreas de trabajo se señalizan mediante cinta de advertencia colocada a una altura de 1.5 metros, de acuerdo con las normativas de seguridad, para delimitar zonas críticas y evitar accesos no autorizados. **5. **Gestión de material orgánico**** Todo el material orgánico extraído durante las actividades de descapote es almacenado temporalmente en áreas designadas dentro de los límites del proyecto. Este material será reutilizado en labores de cubrimiento y estabilización de las áreas intervenidas, en línea con las prácticas sostenibles y de restauración ambiental. **6. **Protección de la vegetación existente**** Se toman medidas estrictas para evitar daños a los árboles y la vegetación circundante, manteniéndose dentro de los límites de excavación y construcción señalados en los planos del proyecto. **7. **Control de límites de excavación**** Los trabajos de excavación se ejecutan respetando los límites establecidos en cuanto a largo, ancho y profundidad, con el propósito de evitar movimientos innecesarios de material. Este proceso es verificado y validado por el inspector de interventoría, asegurando el cumplimiento de los planos y especificaciones. **8. ** Manejo de aguas lluvias** Ante de continuar con las actividades en las excavaciones existentes, se utilizan métodos de drenaje de aguas lluvias con el funcionamiento de una motobomba , las cuales son conducidas al sistema de canales de drenaje en concreto de aguas lluvias paralelos a la pista de aterrizaje.
9. Capacitación Seguridad aeroportuaria de peligro Aviario	**SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL**	**10.** Como parte del programa de capacitación y con el próposito de dar a conocer lineamientos, acciones y prevenciones del peligro aviario en el aereopuerto, se realiza socialización en seguridad aeroportuaria a los trabajadores vinculados en obra.
10. Disposición final de Residuos Sólidos	**SUBPROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS** **PGR #1 - Gestión Integral de Residuos sólidos.**	**11.** Los residuos sólidos generados durante las actividades de obra son clasificados según su tipo y cuantificados, registrando un peso 11 kg . Posteriormente, los residuos orgánicos son trasladados a la bodega de almacenamiento temporal de residuos sólidos, ubicada estratégicamente cerca de la entrada Alfa 4, en cumplimiento de las normativas de manejo ambiental y del plan de gestión de residuos del proyecto.


ACTIVIDADES TÉCNICAS


1. SE CULMINA LA FUNDIDA DE CONCRETO DE ZAPATAS
2. SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES, ARMADO DE ACERO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
3. SE INICIA MEJORAMIENTO EN FONDO DE EXCAVACIÓN DE REGISTOS PARA INICIAR SU CONSTRUCCIÓN
4. SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN EN CANALIZACIONES


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
NA	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Roto Martillo:** 1 **Apisonador tipo canguro:** 1 **Cortadora De Concreto**: 1 **Mezcladora de concreto:** 1
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	19
Total Personal	25

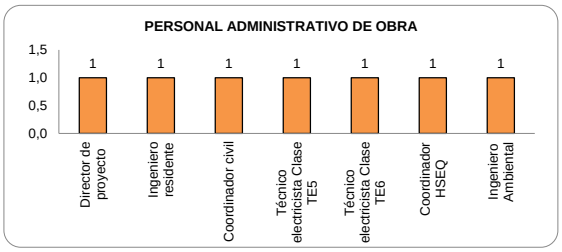



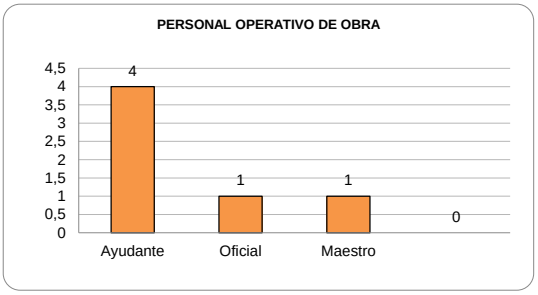

CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. CS. UAAC-INT-518-080-2024 Remisión informes semanales de interventoría dle 01 al 19
2. CS. UAAC-INT-518-081-2024 Remisión informes mensuales de interventoría dle 01 al 03
3. CS. UAAC-INT-518-082-2024 Interrupción injustificada de trabajos
4. CS. UAAC-INT-518-083-2024 Solicitud documentación para TA

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72.340.149,00
Total Acumulado	**$ 72.340.149,00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2.471.685.007,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 72.340.149,00
% Avance facturado Acumulado
2,93%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27.115.133,00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11.466.118,00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11.466.118,00
Total Acumulado	**$ 50.047.369,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855.375.978,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 50.047.369,00
% Avance facturado Acumulado
5,85%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Revision documental, AST, preoperacional de equipos y herramientas



Acompañamiento SST durante la actividad de desencofre de pedestales



Excavaciones para registros y Drenaje de aguas lluvias



Charla de seguridad

	
Mejoramiento fondo excavacion registros para construcción de los mismos	zapatas en concret ode 3000 psi fundidas y formaleta pedestal
	
pedestal de concreto fundido	valla del proyecto instalada

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se recalaca al contratita la importancia de que se aplique un plan de acción efectivo para nivelar la ejecución. Se exige cumplimiento en las fechas de entrega de los compromisos, lo cual se ha mejrado en pa resente semana.	ING. OMAR TRIGOS LACERA
