INFORME FINAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. HA-SA-002-2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL TERCER ORDEN EN SECTORES DE MESITAS Y MARACAIBO EN MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.

DICIEMBRE 2024

INTRODUCCIÓN

En el presente informe, se describen las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre al 13 de diciembre de 2024, del proyecto contratado a través del Municipio de Hacarí, mediante el proceso contractual menor cuantía No. HA-SA-002-2024 para la ejecución de obras de mejoramiento y mantenimiento de vías del tercer orden en sectores de Mesitas y Maracaibo en municipio de Hacarí, Norte de Santander.


Se relacionan las diferentes actividades desarrolladas en este periodo de trabajo, sabiendo que el acta de inicio se suscribió el día 31 de octubre de 2024 para el contrato de obra, explicando los acontecimientos, dificultades, avance físico, inversión y todo lo referente a las labores desarrolladas para el buen cumplimiento del objetivo trazado para este proyecto.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Localización del proyecto:

El Proyecto se encuentra localizado en el municipio de Hacarí, subregión occidental del Departamento Norte de Santander, 8° 19' 17" Norte, 73° 8' 44" Oeste. Limita al norte con San Calixto, al sur con La Playa de Belén y Ábrego, al este con Sardinata y al oeste con San Calixto y La Playa. El municipio tiene superficie de 410 kilómetros cuadrados, equivalente al 1.92% del área total del departamento. El casco urbano tiene una extensión aproximada de 3 kilómetros cuadrados, y dista aproximadamente 266 kilómetros de Cúcuta, capital departamental. En su geografía predomina el terreno montañoso.

Las actividades se desarrollarán en las veredas Berlín, vereda La Loma, vereda Guaimaral, vereda Mesa de Laguneta, vereda La Esperanza, vereda La Estación, vereda Mesitas, vereda El Brillante, vereda Manzanares, vereda Limoncitos, vereda Palo Cruzal, vereda Castrillón, vereda Buenos Aires, vereda Bélgica, vereda Maracaibo, vereda Maracaibito, vereda Santa Marta, vereda Platillos, vereda La Laguna y vereda El Cerro del municipio.

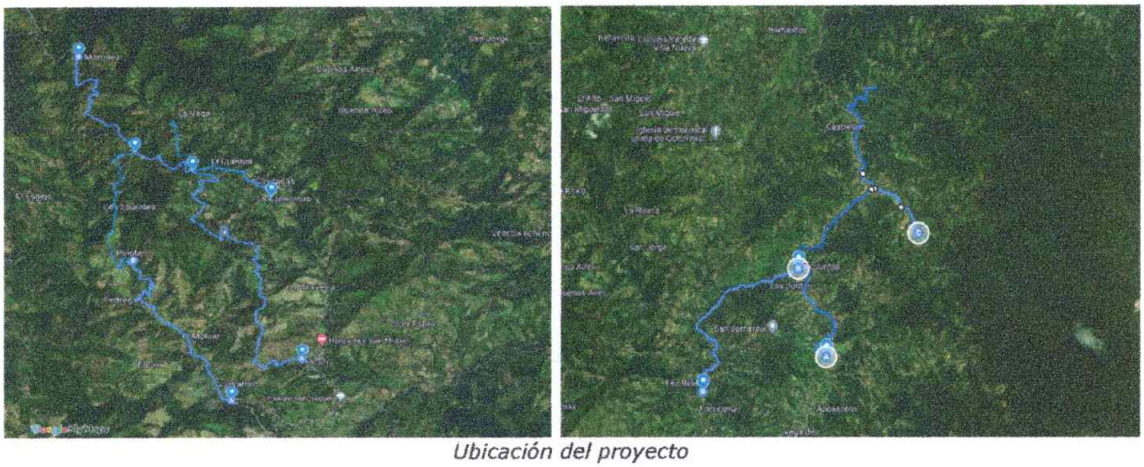

Ubicación del proyecto

1.2 Características del Sitio.

El municipio de Hacarí ubicado en el departamento Norte de Santander región del Catatumbo, se sitúa a 266 km de Cúcuta. Limita al norte con San Calixto, al sur con La Playa de Belén y Ábrego, al este con Sardinata y al oeste con San Calixto y La Playa. Conformado por 7 corregimientos que son San José del Tarra, Laureles, Astilleros, San Miguel, Maracaibo, Las Juntas y Mesitas; el municipio es montañoso, quebrado y posee diversidad climática.

El proyecto contempla el mejoramiento y mantenimiento de la subrasante de la vía de las siguientes veredas, Berlín, vereda La Loma, vereda Guaimaral, vereda Mesa de Laguneta, vereda La Esperanza, vereda La Estación, vereda Mesitas, vereda El Brillante, vereda Manzanares, vereda Limoncitos, vereda Palo Cruzal,

vereda Castrillón, vereda Buenos Aires, vereda Bélgica, vereda Maracaibo, vereda Maracaibito, vereda Santa Marta, vereda Platillos, vereda La Laguna y vereda El Cerro zonas rurales del municipio, incluye el mejoramiento de la subrasante de la vial dentro del alcance de los recursos presupuestales.

En el proceso de mejoramiento con la intervención en donde se comunica con las veredas, Berlín, vereda La Loma, vereda Guaimaral, vereda Mesa de Laguneta, vereda La Esperanza, vereda La Estación, vereda Mesitas, vereda El Brillante, vereda Manzanares, vereda Limoncitos, vereda Palo Cruzal, vereda Castrillón, vereda Buenos Aires, vereda Bélgica, vereda Maracaibo, vereda Maracaibito, vereda Santa Marta, vereda Platillos, vereda La Laguna y vereda El Cerro del municipio, lo cual comprende intervenciones lineales y puntuales, con la intervención el mejoramiento de 90131.85 metros cuadrados Conformación de calzada existente (incluye cuneteo), de igual manera 450,00 m3 de Relleno con material seleccionado para el sector priorizado, los cuales permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad de este sector importante para el comercio y la movilidad en el municipio de Hacarí. Intervención importante en el sector rural, beneficiando alrededor de 3.400 personas, de las cuales 1900 son beneficiarios directos que transitan en dicho sector.

1.3 Descripción General del Proyecto

La Administración Municipal de Hacarí Norte de Santander, en procura de mejorar la malla vial del municipio, priorizo el proceso para el mejoramiento de las vías terciarias a través de la intervención de en donde se comunica con las veredas de los corregimiento de Macaraibo y Mesitas, lo cual comprende intervenciones lineales y puntuales, con la intervención el mejoramiento de 90131.85 metros cuadrados Conformación de calzada existente (incluye cuneteo), de igual manera 450,00 m3 de Relleno con material seleccionado para el sector priorizado.

Estos son sectores importantes para la movilidad y el comercio del municipio, los cuales por su mal estado de conservación y funcionamiento demandan una intervención en el mantenimiento y mejoramiento de la subrasante y la Conformación de calzada existente de referencia.

En cuanto a la localización de la obra pública, es de precisarse que la intervención se ejecutara en la zona rural de los corregimientos Maracaibo y Mesitas del municipio de Hacarí, malla vial que sirve para el transporte de los vehículos por vía terciaria, es por ello que con la priorización del proyecto para el sector se pretende mejorar las condiciones presentadas en el municipio de la infraestructura vial terciaria.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. HA-SA-002-2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL TERCER ORDEN EN SECTORES DE MESITAS Y MARACAIBO EN MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER.
CONTRATANTE	Municipio de Hacarí, Norte De Santander
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ SAS - R/L MAYDA ALEXANDRA MARQUEZ GUERRERO
NIT	901.393.877-6
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($299.107.156,50) MONEDA LEGAL
CDP	DP 374 del 05 de julio de 2024
RUBRO (S)	2.3.2.02.02.005 servicios de la construcción
RP	RP 509 del 22 de octubre de 2024
PLAZO	dos (02) mes
SUPERVISIÓN	Sec. PLANEACIÓN E INFRAESTRUTURA Ing. YEISA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ

a. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

En el desarrollo de las actividades no se presentaron dificultades y se desarrolló en el tiempo estimado cumplimiento en un 100% de ejecución a las actividades contempladas en la obra.

b. CONTROL ADMINISTRATIVO

2.3.1 Actas

Durante la ejecución del proyecto se han suscrito las siguientes actas:

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	21 DE OCTUBRE DE 2024
PLAN INVERSION DEL ANTICIPO	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE RECIBO FINAL	13 DE DICEMBRE DE 2024

2.3.3 PERSONAL EN OBRA

Se han realizado los respectivos controles de afiliaciones a sistema general de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensión, aportes parafiscales.

El 100% del personal se encuentra afiliado.

2.4 DIFICULTADES PRESENTADAS

En el desarrollo de las actividades no se presentaron dificultades y se desarrolló en el tiempo.

2.5 ITEM DESARROLLADOS

- **Conformación de Calzada existente (incluye cuneteo) (artículo 310-22)**

Esta actividad consiste en la conformación, la renivelación y la compactación del afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado o de sub – base granular; así como la confirmación o reconstrucción de cunetas.

- **Relleno con material seleccionado (artículo 230-22)**

Este trabajo consiste en la disgregación del material de la subrasante existente, el eventual retiro de parte de este material, la adición de materiales, la mezcla, el humedecimiento o la aireación, la compactación y el perfilado final, de acuerdo con la presente especificación, y con las dimensiones, los alineamientos y las pendientes señalados en los documentos del proyecto.

2.5 OBRAS CONTRATADAS Y EJECUTADAS

A continuación, se relaciona las cantidades de obra contratada y ejecutadas.

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ SAS

ACTA DE RECIBO FINAL

MUNICIPIO: HACARI

ACTA DE RECIBO FINAL

Periodo : 01 de Noviembre al 12 de Diciembre de 2024

Fecha del acta : 13-12-2024

Contrato No.: No. HA-SA-002-2024

Contratista: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ SAS

Supervisor del Proyecto: Secretearia de planeaccion e infraestructura

Fecha de inicio : 01 de Noviembre de 2024

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL TERCER ORDEN EN SECTORES DE MESITAS Y MARACAIBO EN MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER

Fecha Terminación inicial : 31 de Diciembre de 2024

Plazo Contractual: Dos (02) Meses

Interventor: N.A

PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO 50%

$ 149,553,578.25

Ítem	Descripción	UND	CONDICIONES CONTRACTUAL			ACUMULADA ANTERIOR		Presente Acta			OBRA A EJECUTAR		
			Cantidad	Vr. Unitario	Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	%	Cantidad	Valor Parcial	%
1.0	**Vías Mejoradas**												
1.1	Conformación de Calzada existente (incluye cuneteo)	M2	90131.85	$ 2,490.00	$ 224,428,306.50			90131.85	$ 224,428,306.50	100%	0.000	$ -	0%
1.2	Relleno con material seleccionado	M3	450.000	$ 165,953.00	$ 74,678,850.00			450.000	$ 74,678,850.00	100%	0.000	$ -	0%
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 230,082,428.08				$ 230,082,428.08			$ -	
	ADMINISTRACIÓN (25%)				$ 57,520,607.02				$ 57,520,607.02			$ -	
	IMPREVISTOS (1%)				$ 2,300,824.28				$ 2,300,824.28			$ -	
	UTILIDAD (4%)				$ 9,203,297.12				$ 9,203,297.12			$ -	
	TOTAL PRESUPUESTO:				$ 299,107,156.50				$ 299,107,156.50	100%		$ -	0%

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CUADRO RESUMEN DE LAS ACTAS PARCIALES DE PAGO

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato	$ 299,107,156.50	
Adiccion		
Valor Acta No. 01		
Valor Acta No. 02		
Valor Acta Final		$ 299,107,156.50
Saldo Contrato		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 299,107,156.50	$ 299,107,156.50
RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo	149,553,578.25	
Amort. Acta No. 01		
Amort. Acta No. 02		
Saldo Anticipo		149,553,578.25
SUMAS IGUALES	149,553,578.3	149,553,578.25
TOTAL A PAGAR		$ 149,553,578.25

TOTAL A PAGAR: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

Mayda A. Marquez G

CONTRATISTA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ SAS
MAYDA ALEXANDRA MARQUEZ GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACCION E INFRAESTRUCTURA
YEISA TORRES RODRÍGUEZ
SUPERVISOR DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTARTISTA














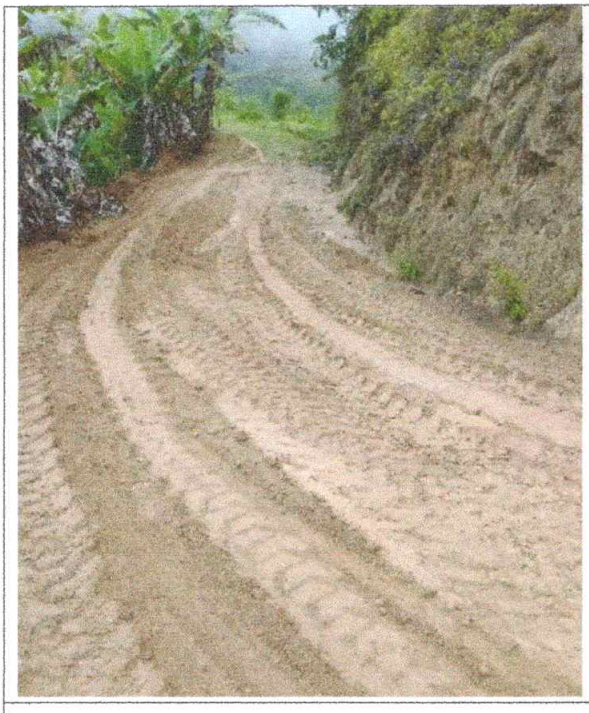






























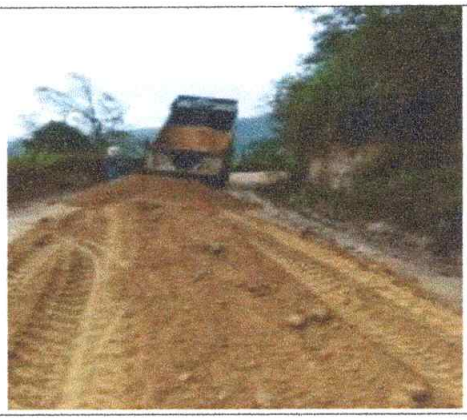




























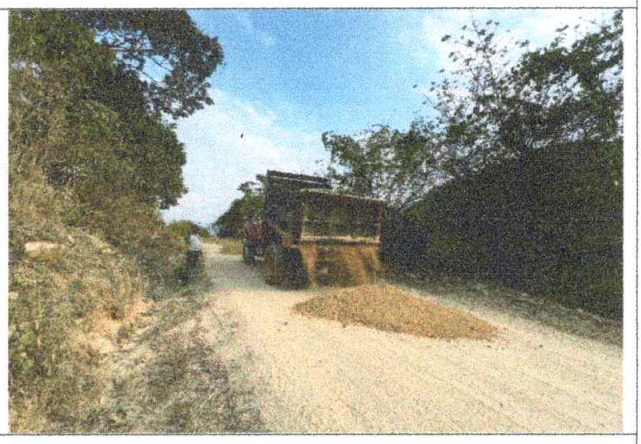





























Mayda A. Marquez G

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ SAS
R/L MAYDA ALEXANDRA MARQUEZ GUERRERO
Contratista

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901393877	6	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CA KDX F2-300	HACARI-NORTE DE SANTANDER	5110032	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1123586117	9478897197	E	2025/01/21	2024/12/13	NEQUI		$805,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1090375809	MARQUEZ GUERRERO MAYDA ALEXANDRA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	6664316	RODRIGUEZ GERSON ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$181,000	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$104,000	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,000
TOTAL				2	$805,000	$0	$805,000

2024/12/13 12:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901393877	6	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CA KDX F2-300	HACARI-NORTE DE SANTANDER	5110032	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1047518997	9477230431	E	2024/11/21	2024/11/13	BANCOLOMBIA		$805,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1090375809	MARQUEZ GUERRERO MAYDA ALEXANDRA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	6664316	RODRIGUEZ GERSON ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$181,000	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$104,000	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,000
TOTAL				2	$805,000	$0	$805,000

2024/12/13 12:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901393877	6	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CA KDX F2-300	HACARI-NORTE DE SANTANDER	5110032	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100425985	9478194094	E	2024/12/18	2024/12/04	NEQUI		$805,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1090375809	MARQUEZ GUERRERO MAYDA ALEXANDRA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	6664316	RODRIGUEZ GERSON ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$181,000	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$104,000	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,000
TOTAL				2	$805,000	$0	$805,000

2024/12/13 12:18 PM

Consultoria y construcciones rodriguez sas
NIT 901.393.877-6
KDX F2 - 300 BARRIO 20 DE JULIO
Tel: (607) 3102719248
Hacarí - Colombia
juansebastian@ccrodriguezsas.com

Factura electrónica de venta
No. FCCR 31

Señores	MUNICIPIO DE HACARÍ		
NIT	800.099.241-6	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	ED PLACIO MUNICIPAL HACARI KDX B1-340	**Ciudad**	Hacarí - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 12:32
Expedición	13/12/2024, 12:32
Vencimiento	13/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ADMINISTRACION 25%	1.00	57,520,607.02
2	IMPREVISTOS 1%	1.00	2,300,824.28
3	UTILIDAD 4%	1.00	9,203,297.12
4	COSTO DIRECTO	1.00	230,082,428.08

Total items: 4

Total Bruto	299,107,156.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	299,107,156.50

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve millones ciento siete mil ciento cincuenta y seis pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 299,107,156.50

Observaciones:
PAGO FINAL CONTRATO No HA-SA-002-2024 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL TERCER ORDEN EN SECTORES DE MESITAS Y MARACAIBO EN MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER"

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079673451 aprobado en 20240917 prefijo FCCR desde el número 28 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 6c8ca13d1a941520fe9b0405619e47fc86586ef63e4a96b6b7de1ba5e9b467bbbdc2c9ceecc5967efd48f9b1753bab35
