Al contestar por favor cite estos datos
Radicado No: **20245250271401**
14/11/2024

VAM-PYC-IPA-PY/24-11/00455
San Jerónimo de Montería, 14 de noviembre de 2024.

Doctor
ANDRES ALQUICHIRE GALVIS
Director Departamental de Proyectos
Correos:planeacion@cordoba.gov.co
Ciudad

Ref: Su comunicación **DAP No. 00824** con radicado **20240278472** del **8/11/2024**
Asunto: Inventario y estados de redes existentes en las vías señaladas en su pasada comunicación

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud anexamos la relación de las redes colindantes al área de influencia del proyecto señalado en el asunto.

➔ **Barrio Recreo**

Redes de acueducto		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calle 68 entre carreras 1a y 1b Club Campestre	Existe red 4” PVC en el andén derecho (sentido norte-sur)	**Bueno**
Calle 68 entre carreras 1b y 1c Club Campestre	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**
Calle 68 entre carreras 1c y 2 Club Campestre	Existe red 3” PEAD en el andén derecho (sentido norte-sur)	**Bueno**
Carrera 3 entre calles 71 y 72	Existe red 16” PEAD carril derecho (sentido norte-sur)	**Bueno**
	existe red de 8” PVC en el bulevar	**Bueno**
Carrera 3 entre calles 72 y 73	Existe red 16” PEAD carril derecho (sentido norte-sur)	**Bueno**
	Existe red de 8” PVC en el bulevar	**Bueno**
Carrera 2 entre calles 71 y 72	Existe red 3” PEAD carril derecho (sentido norte-sur)	**Bueno**
Carrera 2 entre calles 72 y 73	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**

Calle 72 con carrera 3	Existe red 16” PEAD carril derecho (sentido norte-sur)	**Bueno**
	Existe red de 8” PVC en el bulevar	**Bueno**
Calle 68 entre carreras 3 Y4	Existe red 3” PEAD andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
	Existe red 6” PVC en el bulevar (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
	Existe red 3” PEAD andén izquierdo (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Carrera 4 entre calles 62B Y 63	Existe red 4” PVC andén derecho (sentido sur-norte)	**Bueno**
Carrera 4 entre calles 63 Y 64	Existe red 4” PVC andén derecho (sentido sur-norte)	**Bueno**
Carrera 3 entre calles 62B Y 63	Existe red 4” PVC andén derecho (sentido sur-norte)	**Bueno**
	Existe red 18” PEAD andén derecho (sentido sur-norte)	**Bueno**
Carrera 4 entre calles 69 Y 71	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**

Ver Anexo 1.

Redes de Alcantarillado		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calle 68 entre carreras 1a y 1b Club Campestre	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**
Calle 68 entre carreras 1b y 1c Club Campestre	Existe colector de 8” PVC	**Bueno**
Calle 68 entre carreras 1c y 2 Club Campestre	Existen dos tramos de colector de 8” PVC	**Bueno**
Carrera 3 entre calles 71 y 72	Existe tramo de colector de 8” PVC hasta mitad de calle	**Bueno**
Carrera 3 entre calles 72 y 73	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**
Carrera 2 entre calles 71 y 72	Existen dos tramos de colector de 8” PVC	**Bueno**
Carrera 2 entre calles 72 y 73	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**
Calle 72 con carrera 3	Existen dos tramos de colector de 8” PVC	**Bueno**
Calle 68 entre carreras 3 Y4	Existen dos tramos de colector de 8” PVC	**Bueno**
Carrera 4 entre calles 62B Y 63	Existe colector de 8” PVC	**Bueno**
Carrera 4 entre calles 63 Y 64	Existe colector de 10” PVC	**Bueno**
Carrera 3 entre calles 62B Y 63	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**

Carrera 4 entre calles 69 Y 70	Existe colector de 10” PVC	**Bueno**
Carrera 4 entre calles 70 Y 71	Existe colector de arranque de 8” PVC a 45 metros de la calle 71 sobre la carrera 4	**Bueno**

Ver Anexo 2.

➔ **IMAT**

Redes de acueducto		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calle 68 entre carrera 9 y 10	Existe red 8” PVC andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Carrera 13 entre calles 68 y 72	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**
Calle 73 entre avenida circunvalar y carrera 7	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**
Carrera 7 hasta la calle 73	Existe red 4” PVC	**Bueno**

Ver Anexo 3.

Redes de alcantarillado		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calle 68 entre carrera 9 y 10	Existe colector de 8” PVC	**Bueno**
Carrera 13 entre calles 68 y 72	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**
Calle 73 entre avenida circunvalar y carrera 7	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**
Carrera 7 hasta la calle 73	Existen dos tramos de colector de 8” PVC	**Bueno**

Ver Anexo 4.

➔ **BARRIO CANTACLARO**

Redes de acueducto		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calle 15a entre carreras 34a y 36	Existe red 3" PEAD andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Calle 18 entre carreras 34a y 36	Existe red 3" PEAD andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Carrera 36 entre calle 15a y 18	Existe red 3" PEAD andén derecho (sentido norte-sur)	**Bueno**

Ver Anexo 5.

Redes de alcantarillado		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calle 15a entre carreras 34a y 36	Existen dos tramos de colector de 8" PVC	**Bueno**
Calle 18 entre carreras 34a y 36	Existe colector de 14" PVC	**Bueno**
Carrera 36 entre calle 15a y 18	Existen dos tramos de colector de 8" PVC	**Bueno**

Ver Anexo 6.

➔ **BARRIO 6 DE MARZO**

Redes de acueducto		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Carrera 17a entre calles 22 y 11C	Existe red 3" PVC andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Calle 11C entre carreras 15a Y 15B	Existe red 3" PVC andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Calle 11C entre carreras 15b Y 16	Existe red 3" PVC andén izquierdo (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Calle 11C entre carreras 16 Y 17	Existe red 3" PVC andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Carrera 15a entre calles 11B y 11C	Existe red 6" PVC andén derecho (sentido norte-sur)	**Bueno**
Carrera 15B entre calles 11C y 12a	Existe red 3" PVC andén derecho (sentido norte-sur)	**Bueno**
Calle 12a entre carreras 15B y 17a	Existe red 3" PVC andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**

Ver Anexo 7.

Redes de alcantarillado		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Carrera 17a entre calles 22 y 11C	Existen dos tramos de colector de 8” PVC	**Bueno**
Calle 11C entre carreras 17a y 15a	Existen cuatro tramos de colector de 8” PVC	**Bueno**
Carrera 15a entre calles 11B y 11C	Existe colector lateral de 8” PVC, en el lado derecho de la calle (sentido norte-sur)	**Bueno**
Carrera 15B entre calles 11C y 11D	Existen colectores laterales de 8” PVC, en ambos costados de la calle	**Bueno**
Carrera 15B entre calles 11D y 12	Existen colectores laterales de 8” PVC, en ambos costados de la calle	**Bueno**
Calle 12a entre carreras 15B y 17a	Existen cuatro tramos de colector de 8” PVC	**Bueno**

Ver Anexo 8.

➔ BARRIO PASATIEMPO

Redes de acueducto		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calle 22C entre carreras 18a y 16	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**

Ver Anexo 7.

Redes de alcantarillado		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calle 22C entre carreras 18a y 16	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**

Ver Anexo 8.

➔ VILLA ROCIO

Redes de acueducto		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Carrera 27b entre calles 22 y calle 9	Existe red 3” PVC andén derecho (sentido norte-sur)	**Bueno**

Ver Anexo 9.

Redes de alcantarillado		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Carrera 27b entre calles 9 y calle 9c	Existen dos colectores de 8” PVC	**Bueno**
Carrera 27b entre calles 9 y calle 9c	Existencia de colectores laterales en ambos costados de la calle, la cual vierten en pozo de inspección sobre la calle 9c	**Bueno**
Carrera 27b entre calles 9c y calle 22	Existen un colector de 8” PVC	**Bueno**
Carrera 27b entre calles 9c y calle 22	Existencia de colectores laterales en ambos costados de la calle, la cual vierten en pozo de inspección sobre la calle 9c	**Bueno**

Ver Anexo 10.

➔ BARRIO MONTEVERDE

Redes de acueducto		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calle 54 entre carreras 11 y 11a	Existe red 3” PEAD andén izquierdo (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Calle 54 entre carreras 11a y 12	Existe red 3” PEAD andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Calle 54 entre carreras 12 y 13	Existe red 3” PEAD de 25 metros de longitud desde la carrera 12	**Bueno**
Calle 53 entre carrera 11 y 12	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**
Calle 53 entre carrera 11 y 13	Existe red de 3” PEAD en el andén izquierdo (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Calle 53 entre carrera 13 y 15 B	Existe red de 6” PEAD en el andén izquierdo (sentido oriente-occidente)	**Bueno**

Calle 53 entre carrera 15B y 15	Existe red de 4” PVC en el andén izquierdo (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Carrera 11 entre calles 55 y 53a	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**
Carrera 12a entre calles 53 y 54	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**
Calle 53 entre carreras 12 y 14D	Existe red de 3” PEAD en el andén izquierdo(sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Calle 52 entre carrera 12 y 14B	Existe red de 3” PVC en el andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Calle 52 entre carrera 14B y 15B	Existe cruce de calle en 3” PVC y red de 3” PVC en el andén izquierdo (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Carrera 14D entre calles 52 y 53	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**
Carrera 14D entre calles 51 y 52	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**

Ver Anexo 11.

Redes de alcantarillado		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calle 54 entre carreras 11 y 12	Existen tres colectores de 8” PVC	**Bueno**
Calle 54 entre carreras 12 y 13	Existen dos colectores de 8” PVC	**Bueno**
Calle 53 entre carreras 11 y 12A	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**
Calle 53 entre carreras 12A y 15B	Existen cuatro colectores de 8” PVC	**Bueno**
Calle 53 entre carreras 15B y 15	Existen dos colectores de 8” PVC	**Bueno**
Carrera 11 entre calles 55 y 53a	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**
Carrera 12a entre calles 53 y 54	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**
Calle 53 entre carreras 12 y 12A	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**
Calle 53 entre carreras 12A y 14D	Existen cuatro colectores de 8” PVC	**Bueno**
Calle 52 entre carrera 12 y 14B	Existe colector lateral de 8” PVC del lado derecho de la calle (sentido oriente-occidente)	**Bueno**
Calle 52 entre carrera 14B y 15B	Existen cuatro colectores de 8” PVC	**Bueno**
Carrera 14D entre calles 52 y 53	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**
Carrera 14D entre calles 51 y 52	Existen dos colectores de 8” PVC	**Bueno**

Ver Anexo 12.

➔ ***TAPAO***

Redes de acueducto		
Dirección	**Observación**	***Estado***
El tapao	Existe red 6” PVC andén derecho (sentido oriente-occidente)	**Bueno**

Ver Anexo 13.

Redes de alcantarillado		
Dirección	**Observación**	***Estado***
El tapao	No hay existencia de redes de alcantarillado	**N/A**

➔ ***RANCHOS DEL INAT***

Redes de acueducto		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calles Ranchos del Inat desde la calle 60 hasta la 76	No hay existencia de redes de acueducto	**N/A**

Ver Anexo 14.

Redes de alcantarillado		
Dirección	**Observación**	***Estado***
Calles Ranchos del Inat desde la calle 60 hasta la 76	Existe cruce de 40” PFV cerca de la calle 60 sobre la calle de INAT	**Bueno**

Ver Anexo 15.

En los casos en donde hay disponibilidad pero se requiere la intervención de las redes deben coordinar con Veolia Aguas de Montería S.A E.S.P (VAM) las actividades de reposición de las redes simultáneamente con el proyecto de pavimentación. Si es necesario reubicar o realzar a cotas necesarias por el nuevo pavimento alguna red de acueducto y/o alcantarillado incluyendo accesorios o estructuras en concreto, cajas o registros o MHs, esta actividad debe ser incluida dentro del contrato de pavimentación con el fin de ser ejecutada por el contratista, VAM realizará acompañamiento y efectuará los empalmes requeridos resultantes de esta actividad.

De igual manera, se deberán realizar los respectivos apiques de las redes en cada punto a intervenir, con el fin de verificar su ubicación exacta y profundidad, con el objetivo de salvaguardar su integridad durante los trabajos de pavimentación. Estos apiques deben ser ejecutados con anticipación y de manera coordinada con VAM para que podamos realizar el debido acompañamiento.

Contactos de VAM para el acompañamiento de interventoría:

- ➔ Paula Ghisays- Residente de interventoria (320 512 7144)
- ➔ Apolinar Cordero- Inspector de interventoria (310 432 9583)

Reiteramos nuestro compromiso con el Municipio y el alcance de los propósitos de la Administración Municipal.

Atentamente,

URIEL GARCIA PEREIRA
Gerente General
Veolia Aguas de Montería S.A E.S.P.

Anexos:
Anexo 1. Plano de redes de acueducto barrio el Recreo. pdf
Anexo 2. Plano de redes de alcantarillado barrio el Recreo. pdf
Anexo 3. Plano de redes de acueducto IMAT. pdf
Anexo 4. Plano de redes de alcantarillado IMAT. pdf
Anexo 5. Plano de redes de acueducto barrio Cantaclaro. pdf
Anexo 6. Plano de redes de alcantarillado barrio Cantaclaro. pdf
Anexo 7. Plano de redes de acueducto en los barrios 6 de Marzo y Pasatiempo. pdf
Anexo 8. Plano de redes de alcantarillado en los barrios 6 de Marzo y Pasatiempo. pdf
Anexo 9. Plano de redes de acueducto barrio Villa Rocio. pdf
Anexo 10. Plano de redes de alcantarillado barrio Villa Rocio. pdf
Anexo 11. Plano de redes de acueducto barrio Monteverde. pdf
Anexo 12. Plano de redes de alcantarillado barrio Monteverde. pdf
Anexo 13. Plano de redes de acueducto Tapao. pdf
Anexo 14. Plano de redes de acueducto Ranchos del INAT. pdf
Anexo 15. Plano de redes de alcantarillado Ranchos del INAT. pdf

Aprobó: Yanuar Diaz Rosso - Gerente Planeación y Construcción
Miguel Hernández Cogollo - Gerente de Operaciones
Revisó: Sylvana Mendoza Manotas - Jefe de Planeación
Alvaro Bonfante- Jefe de Acueducto (E)
Luisa Alarcon- Jefe de Alcantarillado (E)
Carlos Zuccardi - Jefe de interventoria

Proyectó/ Sindy Solano Agudelo - Ing. Proyectos.

PLANO DE REDES DE ACUEDUCTO

N
W E
S

Policloruro Vinilo/4"
Hierro Ductil/10"
Polietileno de Alta Densidad/12"
Polietileno de Alta Densidad/8"
Policloruro Vinilo/8"
C.C. BUENAVISTA
HOMECENTER
CARRERA 9

VEOLIA

PLANO DE REDES DE ACUEDUCTO

CARRERA 32
CALLE 20
CALLE 21
CARRERA 35A
CARRERA 36
CARRERA 36A
CALLE 19
CARRERA 34A
CALLE 20
CALLE 18
CALLE 19
COLEGIO VICTORIA MANZUR
CARRERA 35A
COLEGIO BEMPOSTA NACIONAL DE MUCHACHO
CALLE 17
CALLE 18
CARRERA 37
CALLE 16
CALLE 17
PLAZA CESAR GAVIRIA
CARRERA 37A
CALLE 15A
CARRERA 34A
CALLE 15
CARRERA 36
CALLE 14
CALLE 13
CALLE 12A
CALLE 12

Polietileno de Alta Densidad/3"
Polietileno de Alta Densidad/8"
Polietileno de Alta Densidad/12"
Hierro Ductil/12"
Hierro Ductil/2"

VEOLIA

PLANO DE REDES DE ALCANTARILLADO


CARRERA 32
CALLE 20
CALLE 21
CARRERA 25A
CARRERA 36
CARRERA 36A
CALLE 19
CARRERA 34A
CALLE 20
CALLE 21
CALLE 18
CALLE 19
COLEGIO VICTORIA MANZUR
CARRERA 35A
COLEGIO BEMPOSTA NACIONAL DE MUCHACHO
CALLE 21
CALLE 17
CALLE 18
CARRERA 36A
CARRERA 37
CALLE 16
CALLE 17
CALLE 18
CARRERA 37A
CALLE 15A
PLAZA CESAR GAVIRIA
CALLE 15
CARRERA 34A
CARRERA 36
CARRERA 36A
CALLE 14
CALLE 15
CALLE 13
CALLE 14
CALLE 13
CARRERA 36
CARRERA 34A
CALLE 12A
CALLE 12A
CALLE 12
CALLE 12
CARRERA 36
CALLE

Policloruro Vinilo Ø8"
Policloruro Vinilo Ø10"
Policloruro Vinilo Ø12"
Policloruro Vinilo Ø14"
Policloruro Vinilo Ø16"
Policloruro Vinilo Ø18"


N
W
E
S

VEOLIA

PLANO DE REDES DE ACUEDUCTO

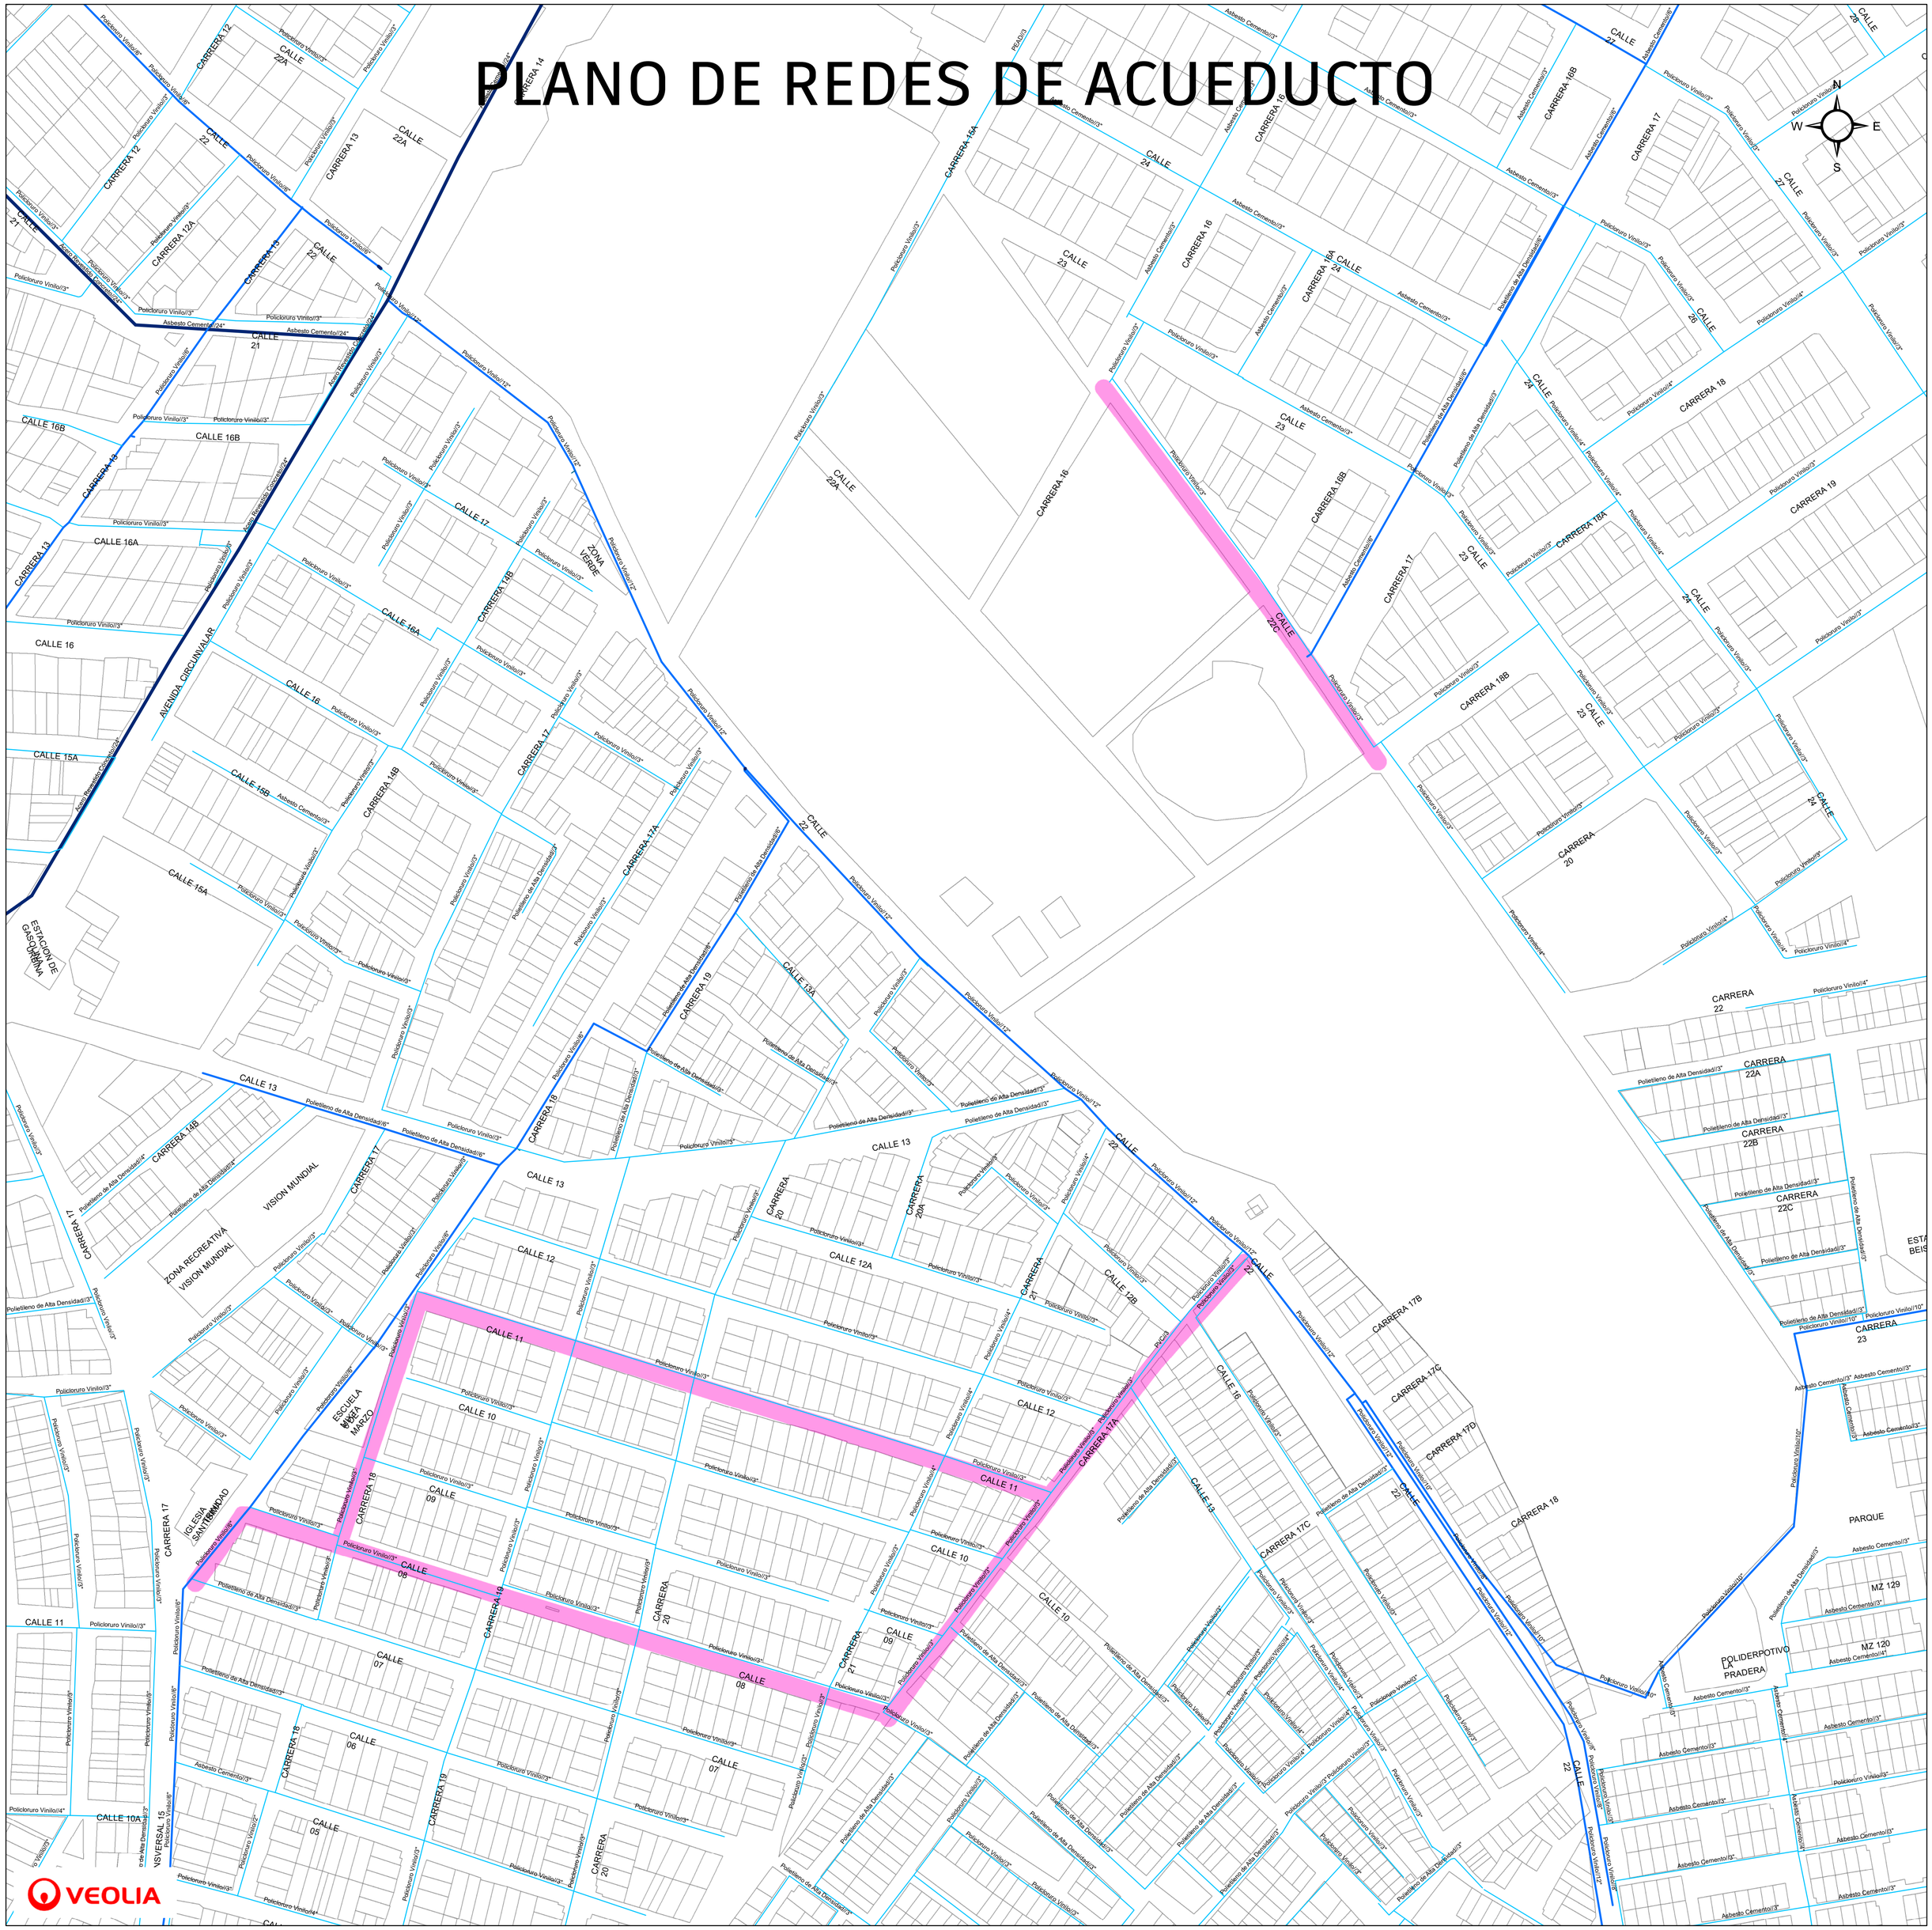

PLANO DE REDES DE ALCANTARILLADO

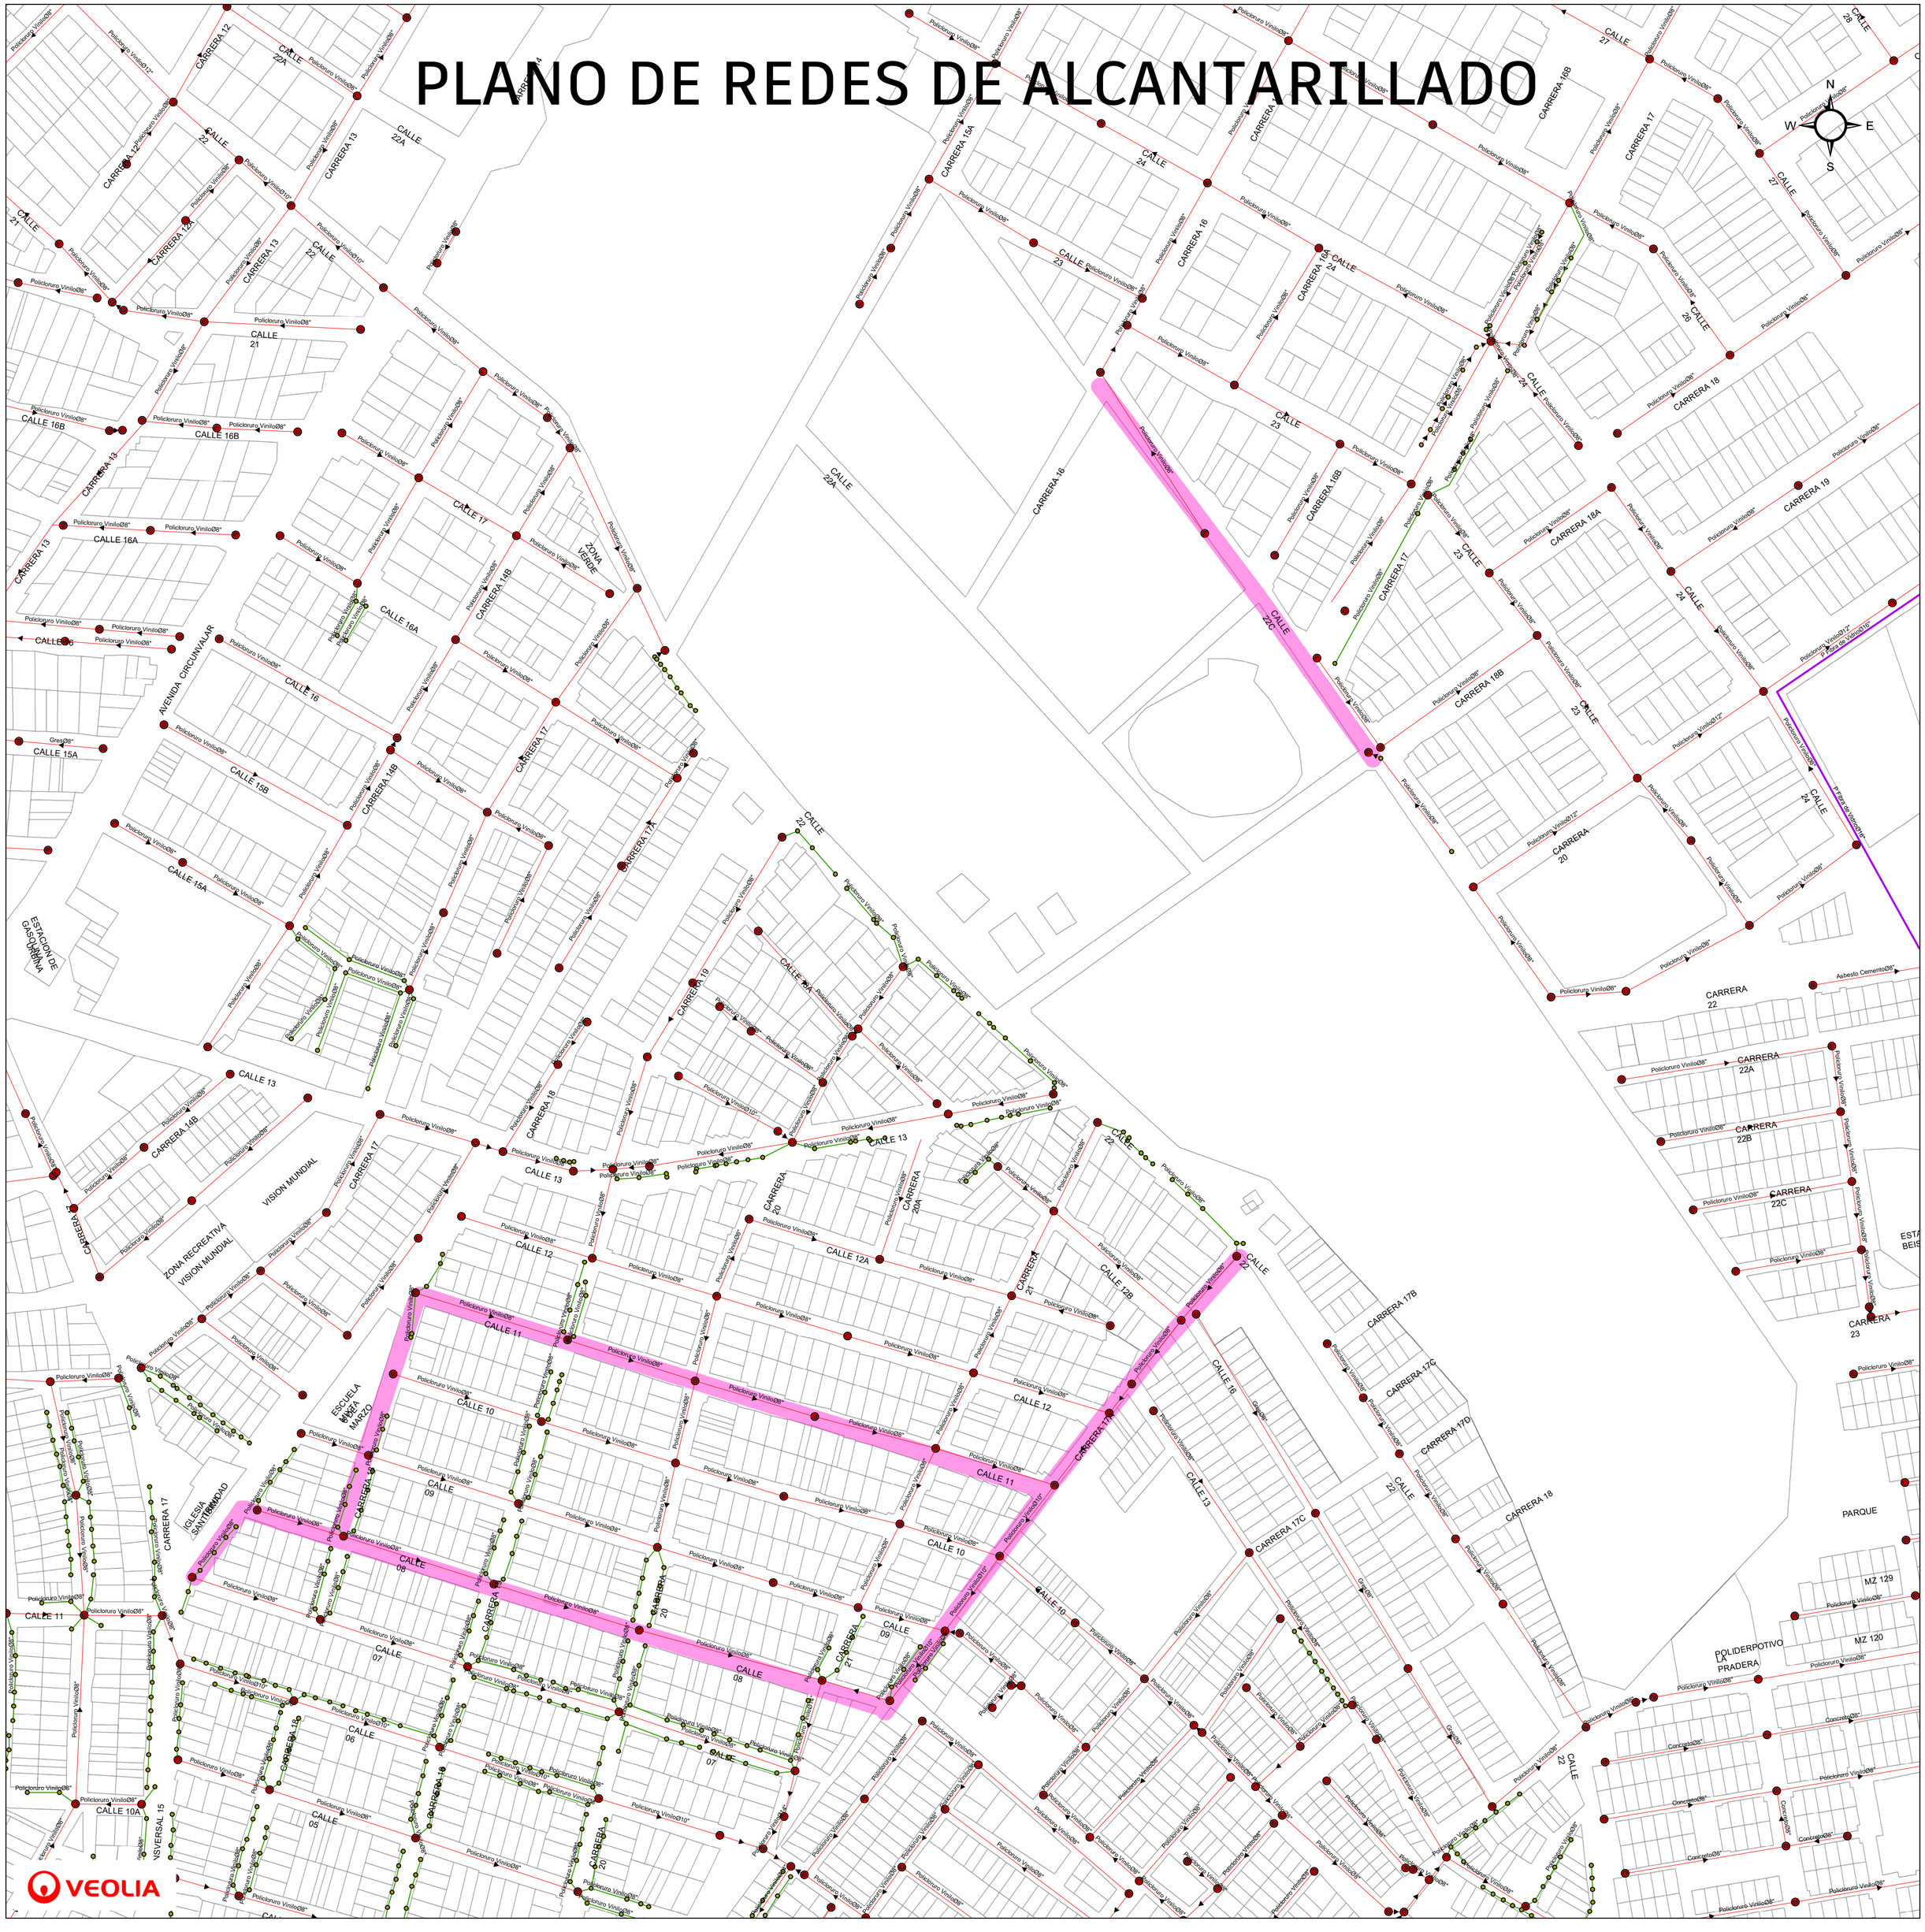

PLANO DE REDES DE ACUEDUCTO

N
W E
S

CALLE 10
CARRERA 26B
IGLESIA PERPETUO SOCORRO
CARRERA 27
CALLE 10
CARRERA 27A
LICEO DE LOS ANDES
IGLESIA BAUTISTA EMANUEL
CALLE 22
CARRERA 27
CALLE 26
CALLE 27B
CALLE 27C
CARRERA 30
CALLE 28
SANCHOPAN
CALLE 28A
CALLE 28B
CALLE 28C
ZONA VERDE
CALLE 9
CALLE 9A
CARRERA 26
CARRERA 26B
CARRERA 27
DIAGONAL 18
DIAGONAL 17
CALLE 8B
CALLE 8A
CARRERA 30
CALLE 29
6
7


Polietileno de Alta Densidad/3"
Policloruro Vinilo/3"
Policloruro Vinilo/12"
Policloruro Vinilo/8"
Hierro Dúctil/12"

VEOLIA


PLANO DE REDES DE ACUEDUCTO




PLANO DE REDES DE ACUEDUCTO

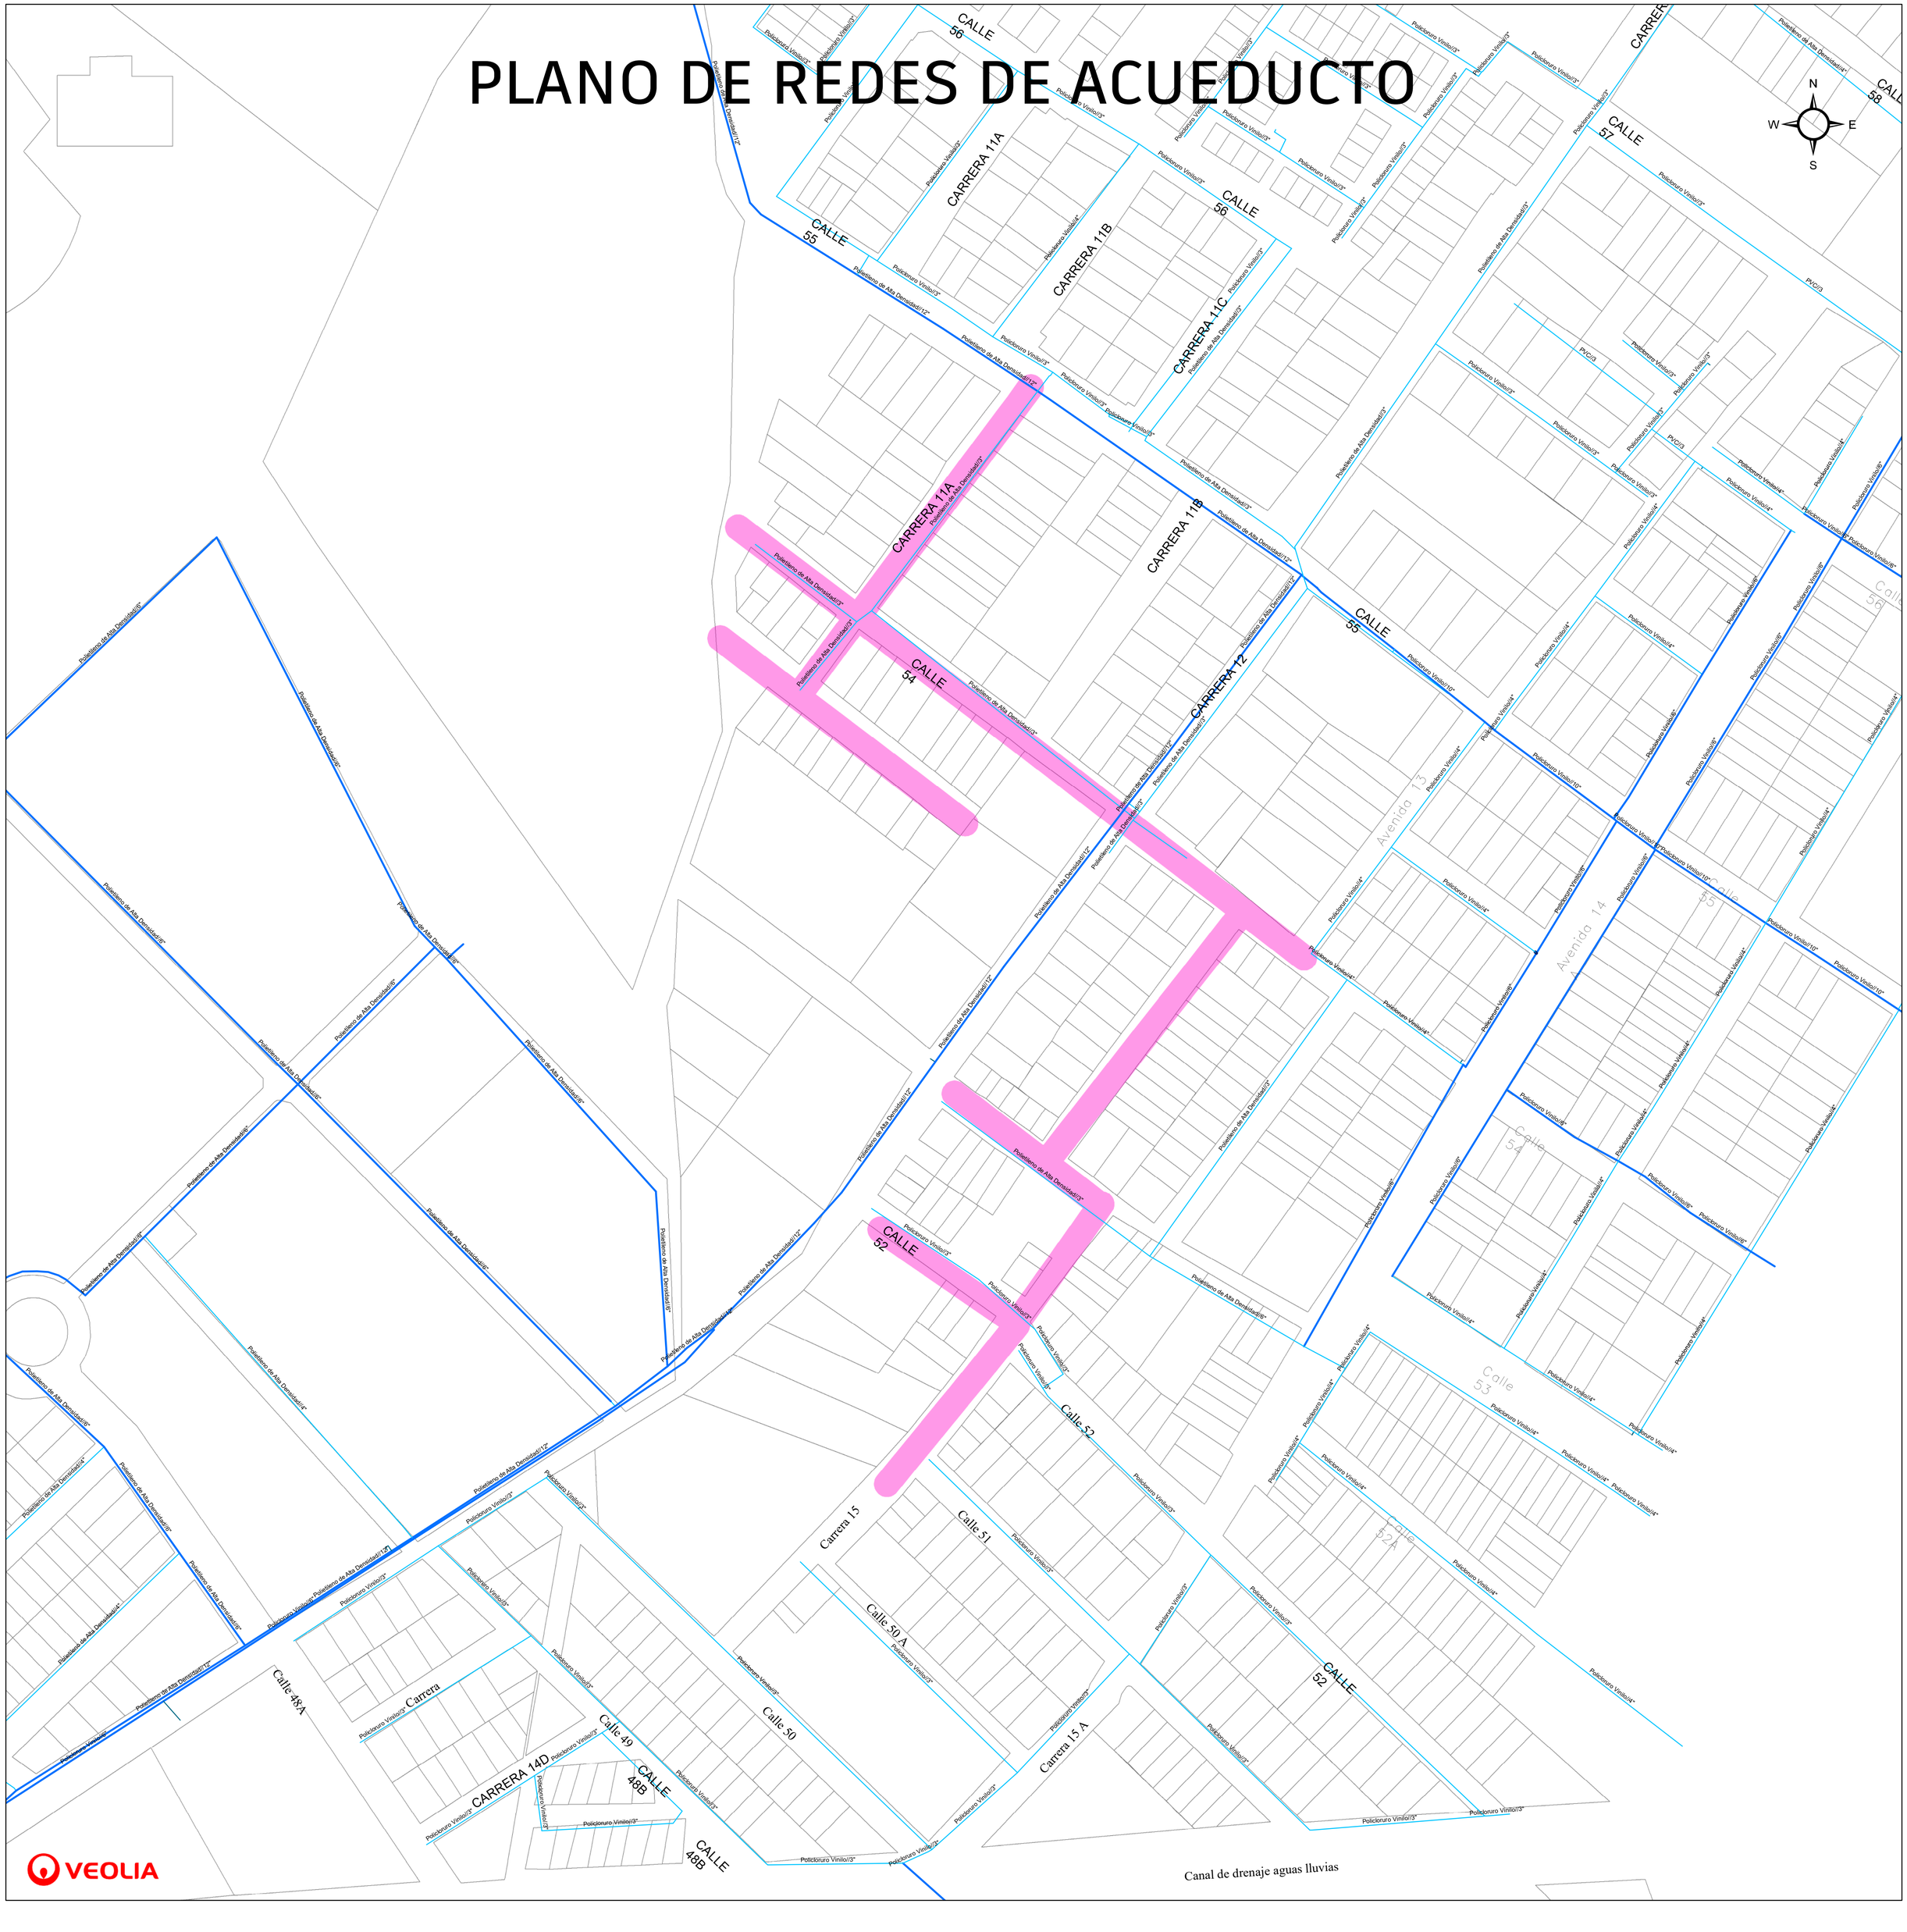

PLANO DE REDES DE ALCANTARILLADO

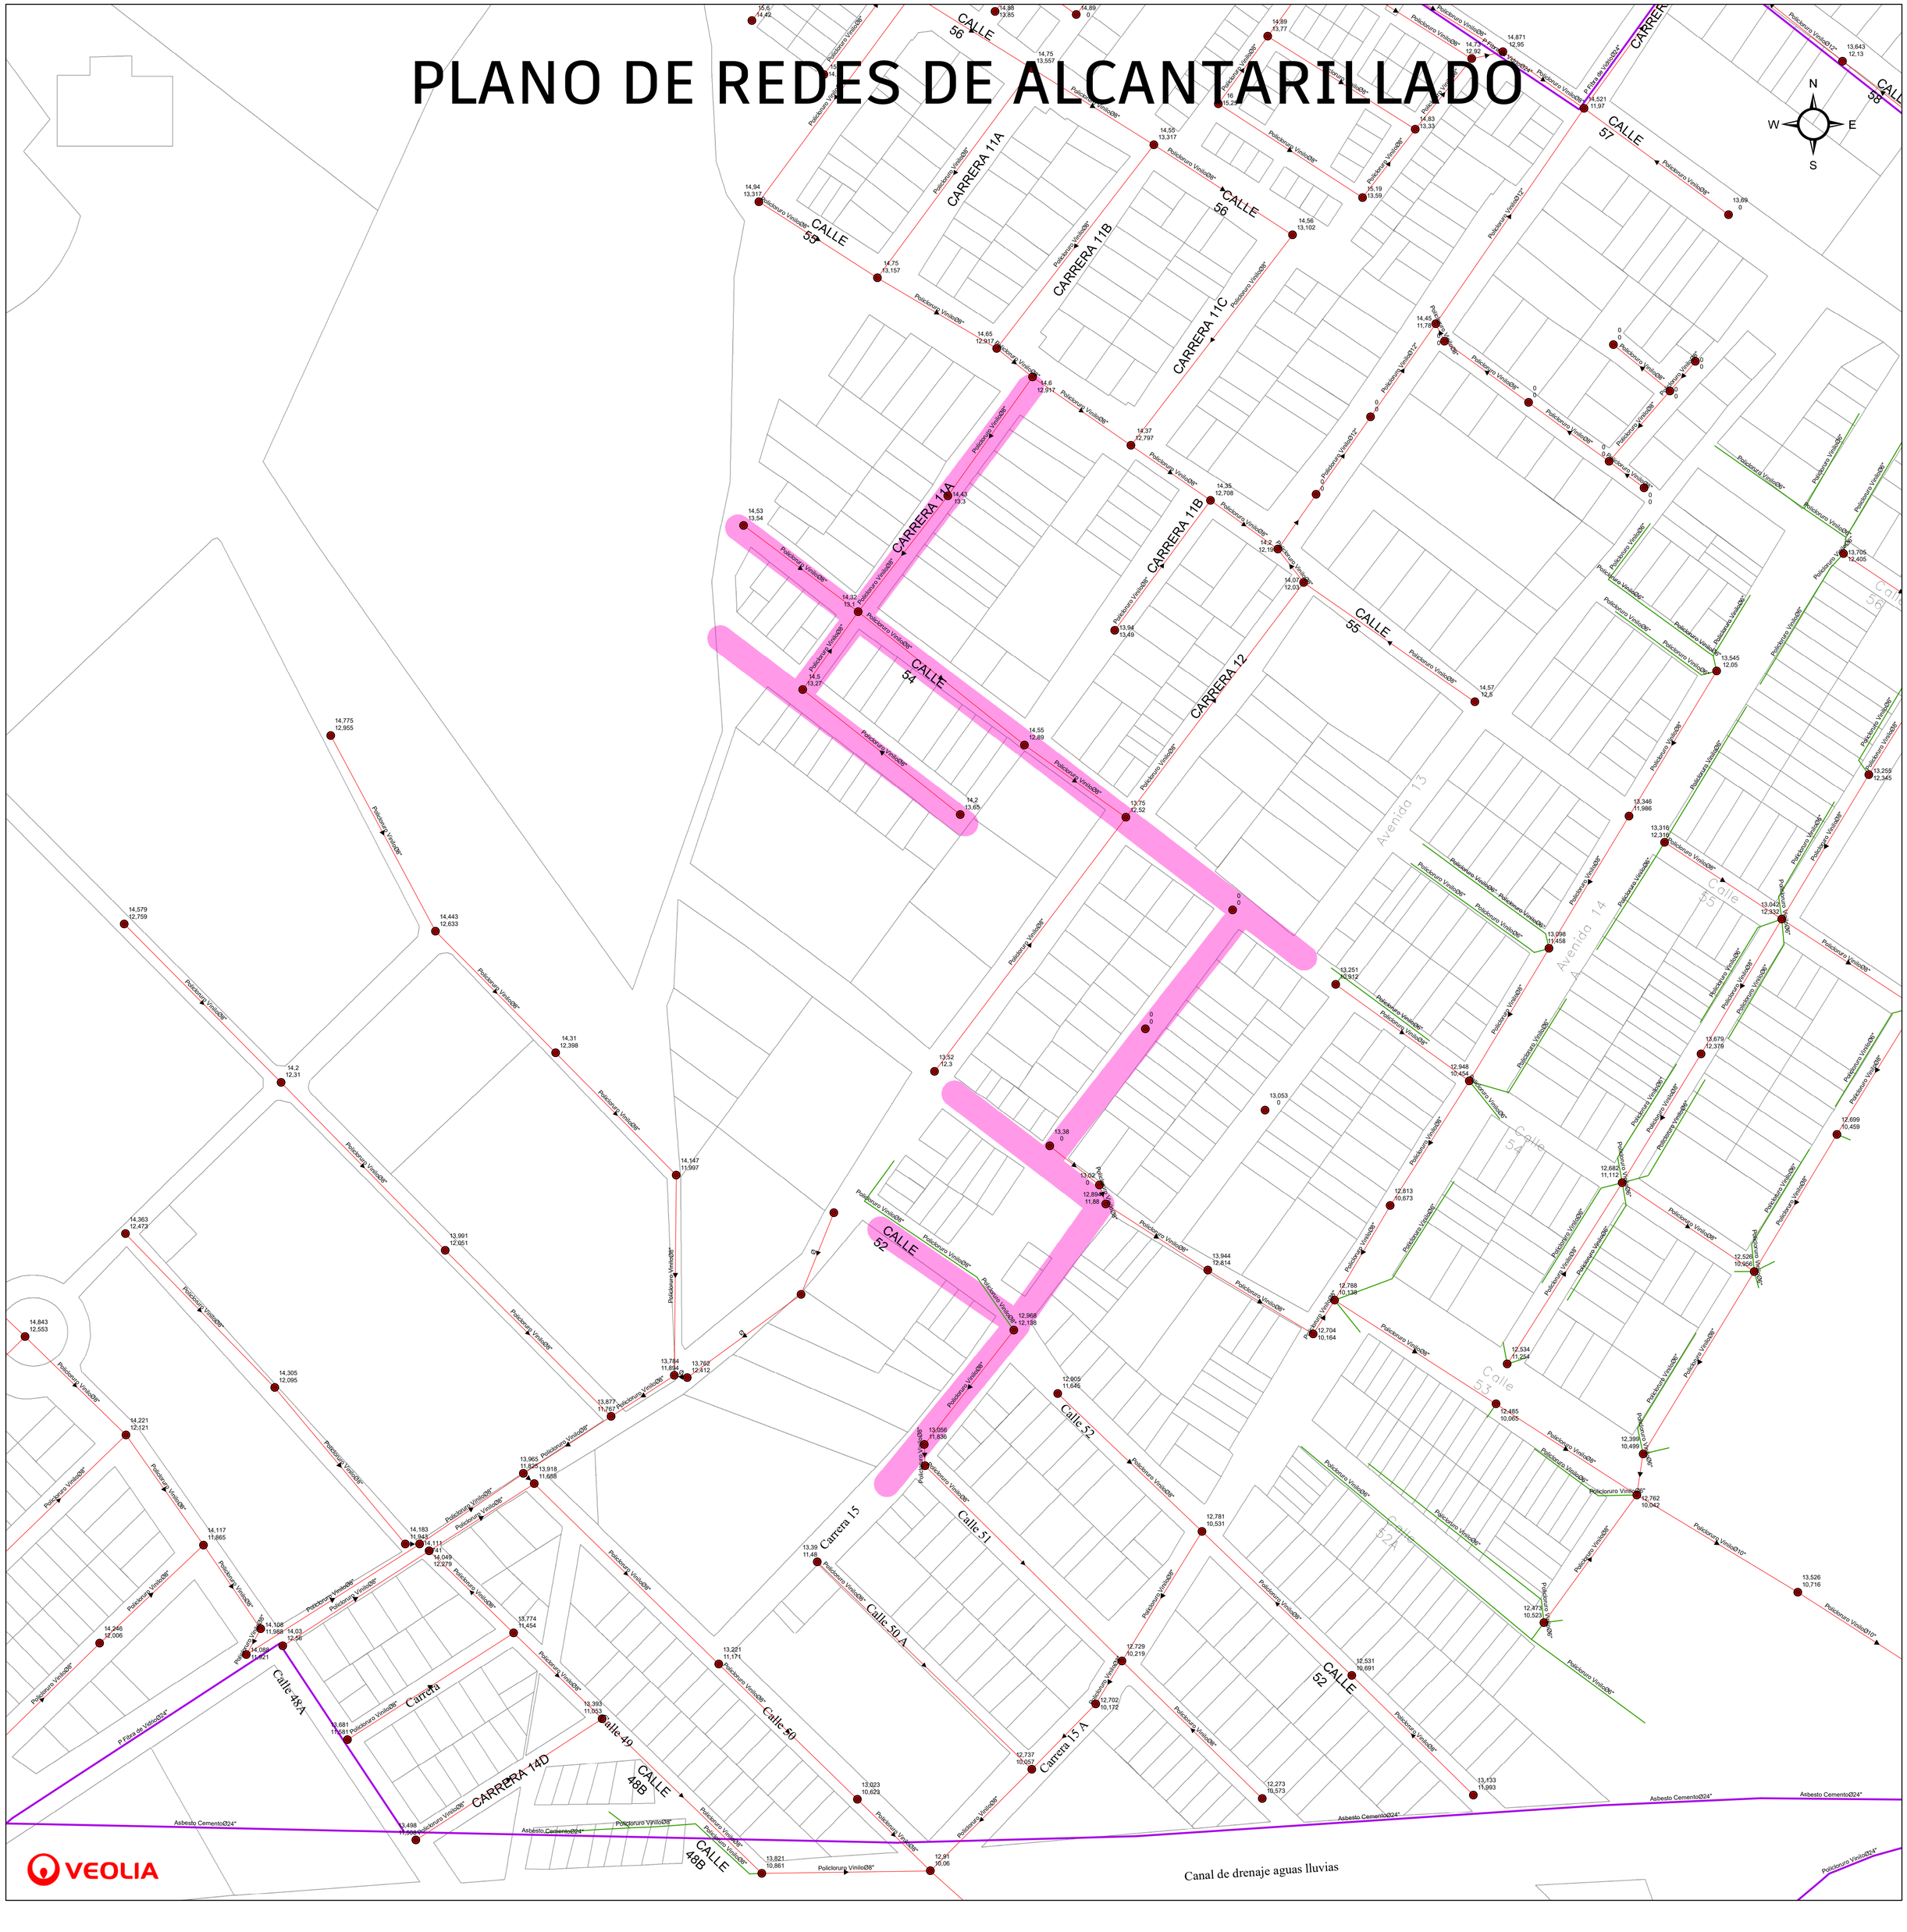

PLANO DE REDES DE ACUEDUCTO



PLANO DE REDES DE ALCANTARILLADO

N
W
E
S

VEOLIA
