CORPAEZCOL

CORPORACION PAEZ COLOMBIANA – CORPAEZCOL
NIT 900230935-2

INFORME DE ACTIVIDADES
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CONV ASO-180-2024

INFORME DE ACTIVIDADES

No. Contrato/Convenio	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CONV ASO-180-2024
Nombre del contratista	CORPORACION PAEZ COLOMBIANA EN ADELANTE "CORPAEZCOL"
Fecha de inicio	10 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha inicial de terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2024
Prórroga No.	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A
Nombre del supervisor	HAROL HERNAN PRIAS MOLINA
Cargo del supervisor	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
Periodo de actividades	10 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024
Meta Plan	N/A
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL ALQUILER, INSTALACION, OPERACIÓN Y DESINSTALACION DE LOS BIENES Y OBJETOS QUE SE EXHIBIRAN COMO ALUMBRADO NAVIDEÑO DURANTE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

ACTIVIDADES DETALLADAS DURANTE EL PERIODO

De acuerdo con la CLAUSULA SEGUNDA del convenio, las ACTIVIDADES a desarrollarse por parte de COORPORACION PAEZ COLOMBIANA "CORPAEZCOL" fueron las siguientes:

ITEM	1.1
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: ILUMINACIÓN DE ÁRBOLES Iluminación de árboles con luz LED potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos, tipo gargantilla.
UND	UND
CANTIDAD	3
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

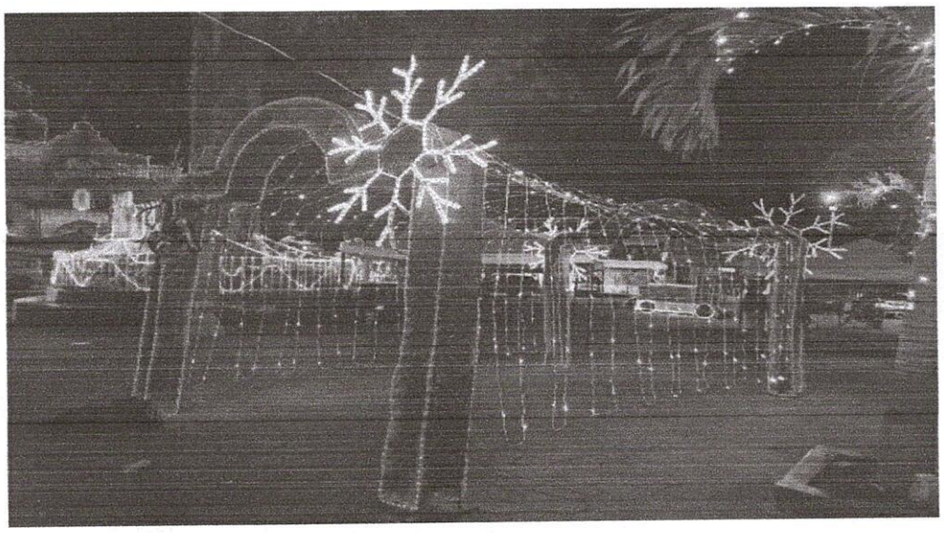
CORPAEZCOL

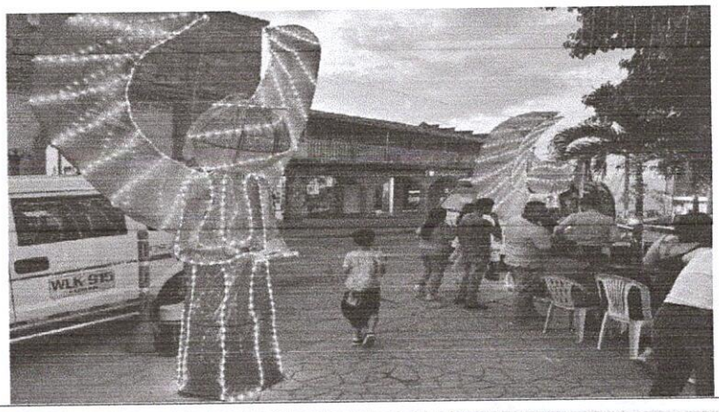
CORPORACION PAEZ COLOMBIANA – CORPAEZCOL
NIT 900230935-2

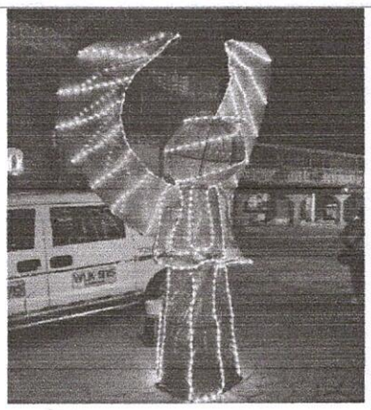
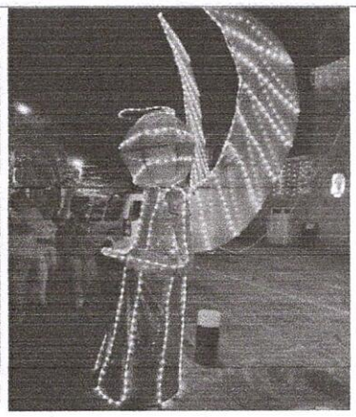
ITEM	1.2.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: ÁRBOL DE 4 Mts Figura tridimensional elaborada en tubo de acero Coldrolled de 1" Cal. 18, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal. 18, alambrón de 4mm y 5mm. Acabado superficial en pintura anticorrosiva e iluminado con ratán LED potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos. Incluye figuras de flores 2D y estrellas iluminadas de 5 puntas, estrella iluminada de 5 puntas de 1m x 1m.
UND	UND
CANTIDAD	1
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

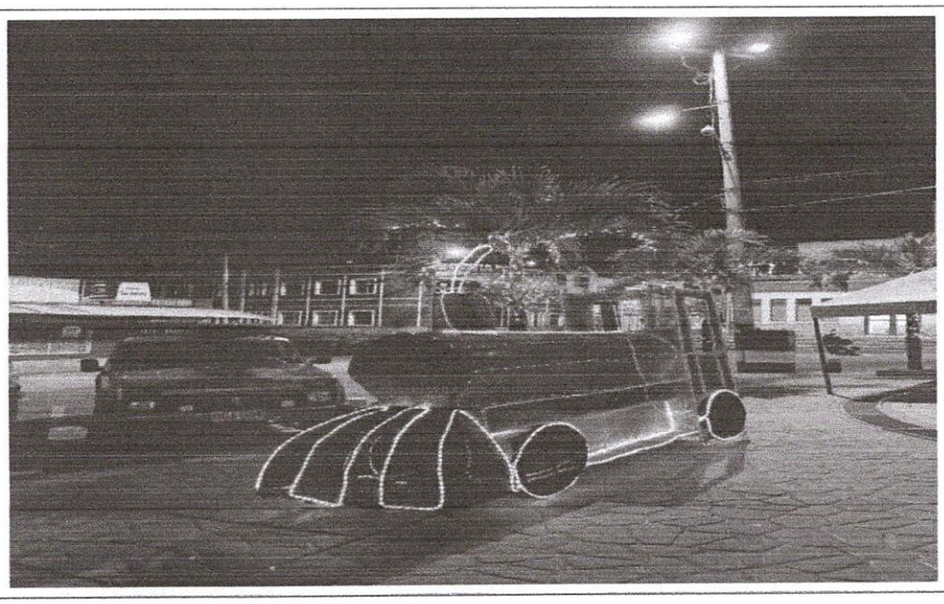
ITEM	1.3.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: REGALO MEDIANO Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela e iluminado con manguera LED de potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos. Con Medidas: 0,93X1X1 Mts.
UND	UND
CANTIDAD	5
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

ITEM	1.4.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: TUNEL DE LUCES elaborado en tubo cuadrado de acero Coldrolled de 1" cal. 18, reforzado en tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" cal. 18, alambrón de 5mm. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; iluminado con luz LED potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos. Con Medidas: 6x6 Mts.
UND	UND
CANTIDAD	1
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

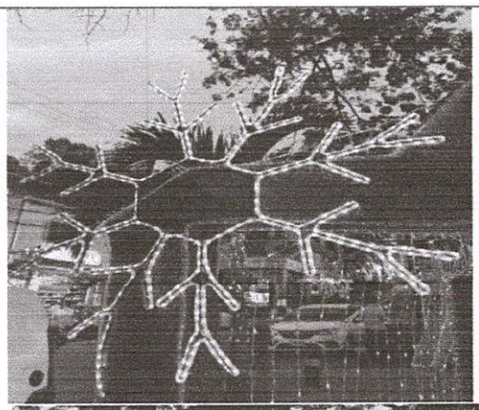
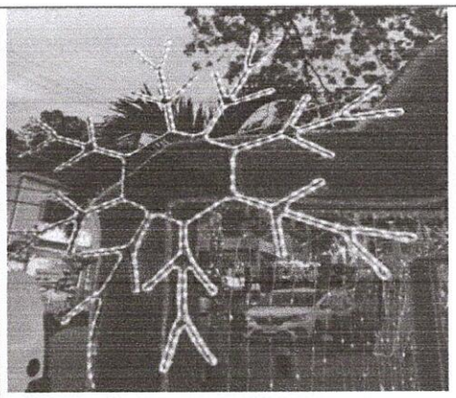
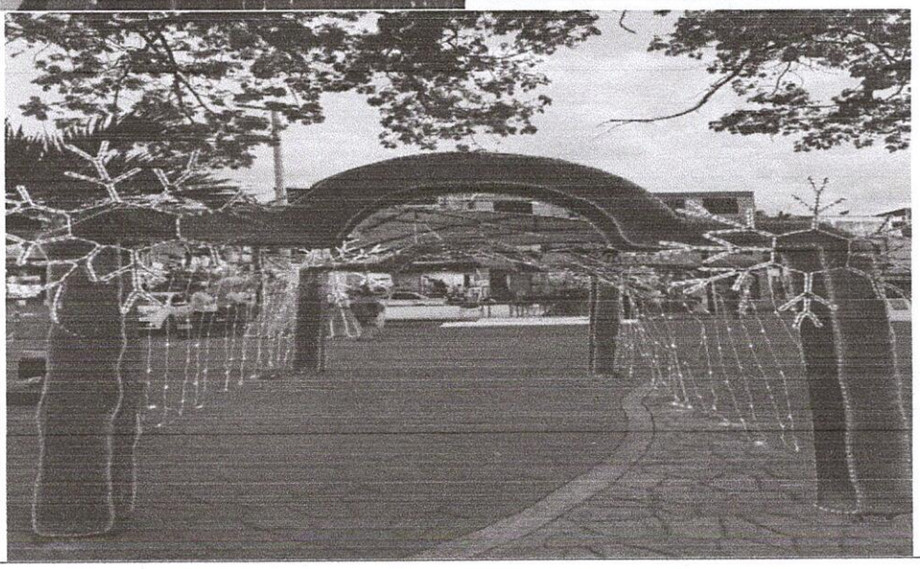
ITEM	1.5.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: ANGEL GRANDE Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela e iluminado con manguera LED potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos. Con Medidas: 1X1,27Mts.
UND	UND
CANTIDAD	2
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

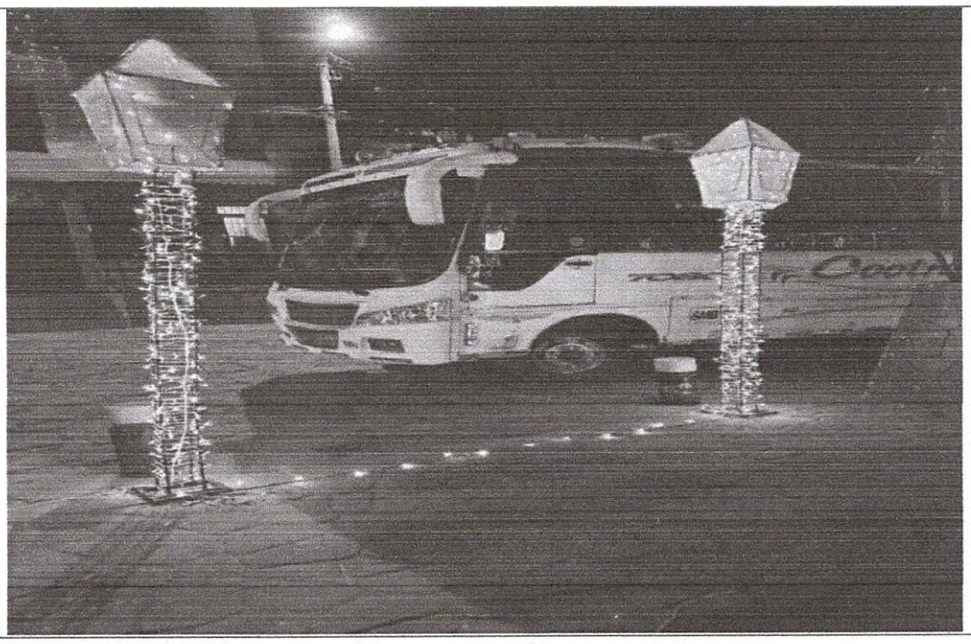
ITEM	1.6.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: TREN LOCOMOTORA Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela e iluminado con manguera led potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos. Con Medidas: 4 Mts de largo X 3 Mts de alto.
UND	UND
CANTIDAD	1
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

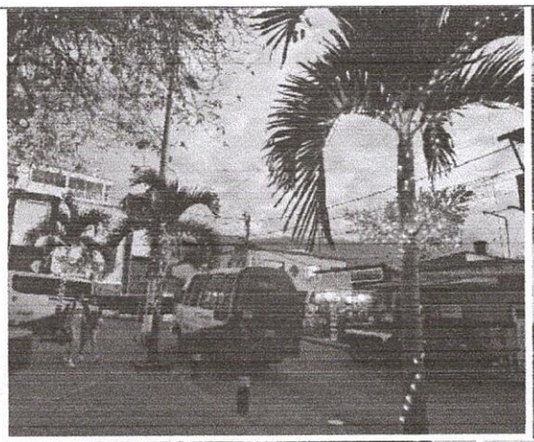
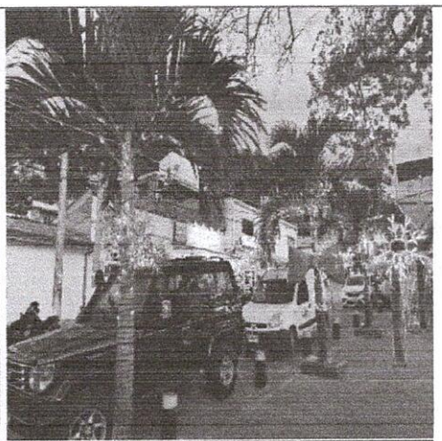
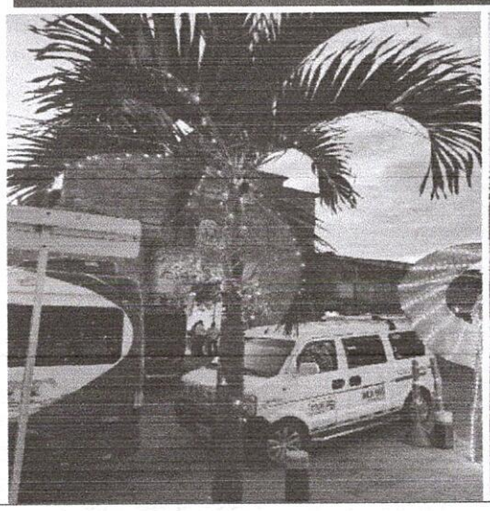
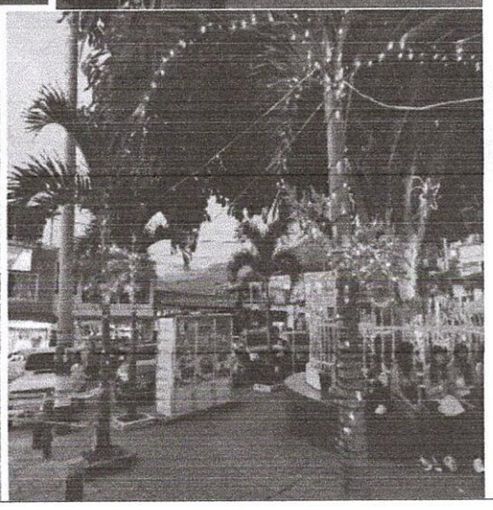
ITEM	1.7.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: SILLA TRONO CON LAMPARA Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, tubo cuadrado de acero Coldrolled de 3/4" Cal.18. Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela e iluminado con manguera led potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos. Con Medidas: 2X3 Mts.
UND	UND
CANTIDAD	1

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

ITEM	1.8.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: COPO DE NIEVE Iluminación s con luz LED potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos.
UND	UND
CANTIDAD	4
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	  

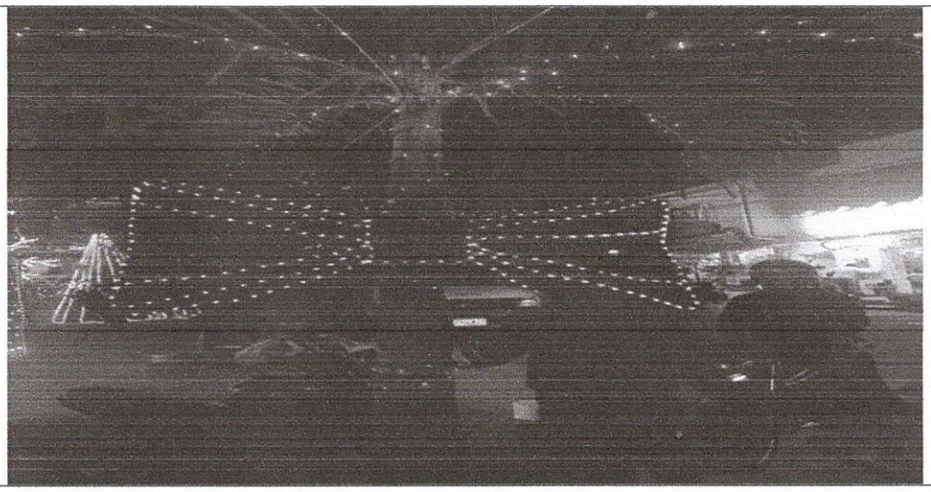
ITEM	1.9.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: FAROLES ILUMINADOS Figura tridimensional elaborada en alambrón de 4mm y 5mm, Acabado superficial en pintura anticorrosiva; tapizado con tela e iluminado con

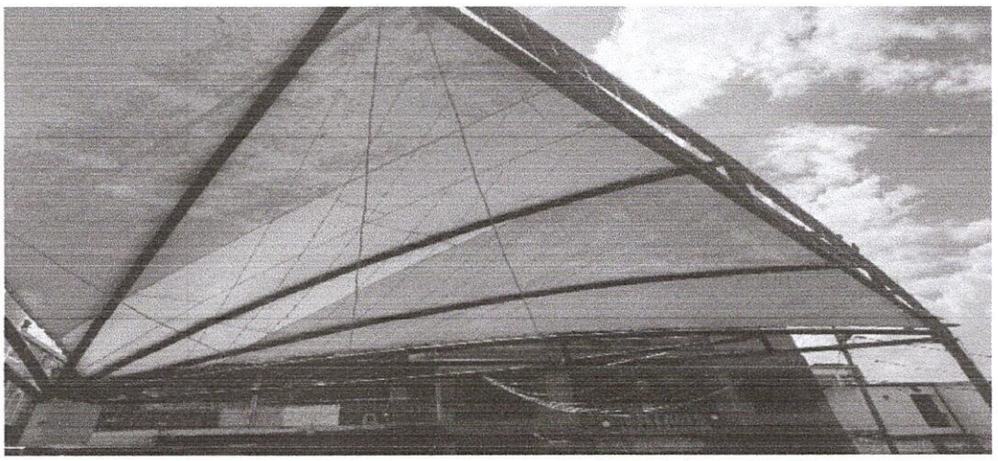
	manguera LED de potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos. Con Medidas: 2.5X0.20 Mts.
UND	UND
CANTIDAD	2
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

ITEM	1.10.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: ILUMINACIÓN DE PALMERAS Iluminación de árboles con luz LED potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos, tipo gargantilla.
UND	UND
CANTIDAD	15
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	   

CORPAEZCOL

CORPORACION PAEZ COLOMBIANA – CORPAEZCOL
NIT 900230935-2

ITEM	1.11.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: MOÑO NAVIDEÑO Iluminación s con luz LED potencia máxima de 75 wats con 3200 bombillos.
UND	UND
CANTIDAD	1
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

ITEM	2.1.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA: CORTINA NAVIDEÑA Iluminación s con luz LED potencia máxima de 48 wats con 1120 bombillos.
UND	UND
CANTIDAD	1
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

ITEM	2.2.
DESCRIPCION	ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE ILUMINACION DE VENTANALES Iluminación s con luz LED potencia máxima de 48 wats con 1120 bombillos.
UND	UND
CANTIDAD	1

CORPAEZCOL

CORPORACION PAEZ COLOMBIANA – CORPAEZCOL
NIT 900230935-2

EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

NOTA ACLARATORIA: La desinstalación de los bienes y objetos que se exhibieron como alumbrado navideño en el municipio de San Antonio del Tequendama, se realizará una vez la supervisión realice la solicitud, ya que como es costumbre el alumbrado navideño se extiende hasta máximo la segunda semana del mes de enero del año siguiente, razón por la cual CORPORACION PAEZ COLOMBIANA EN ADELANTE "CORPAEZCOL", se compromete expresamente, y bajo la gravedad del juramento a realizar el retiro de estos elementos acatando todas las normas de bioseguridad, y dejando en el estado inicial en el que se encontraban las instalaciones del parque principal y del palacio municipal antes de la instalación del alumbrado, máxime cuando los bienes fueron entregados e instalados en calidad de alquiler y es de nuestro total interés que estos retornen a nuestro almacén.

Sin otro en particular.

Cordialmente,

Corporación Páez Colombiana
LEONARDO ANDREY ROBAYO GARZÓN
Cargo: Representante legal CORPAEZ

Firma:
