TEXVN-ARQ S.A.S ***NIT. 900634286-5***
DISEÑO Y CONSTRUCCION

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO - ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO – DEMOLICION - PREPARACION DEL TERRENO - INSTALACIONES ELECTRICAS - INSTALACIONES DE FONTANERIA,CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO - AMPLIACIONES Y REFORMA COMPLETAS DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL –TODAS LAS DEMAS INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

Bogotá 17 de diciembre de 2024.

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Sr. Jorge González Herrera
Supervisor del contrato
Subdirección de Empleo y Formación
jgonzalez@desarrolloeconomico.gov.co
contactenos@desarrolloeconomico.gov.co
Carrera 10 No. 28 - 49 - Torre A. Bogotá, D.C
Teléfonos: 3693777 - 3693750 Fax: 2695402

Ref: **ID DEL CONTRATO EN SECOP:** ***CO1.SLCNTR.13598315***

CONTRATO: 1314-2024

OBJETO "REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO."

ASUNTO: ***OFC – SDDE – No 36-2024 – ENTREGA DE RE-PROGRAMACIÓN DE OBRA V-2.0.***


Respetados señores:

En atención a lo solicitado y en concordancia de la solicitud de prorroga No. 2 al contrato de la referencia, me permito por medio de la presente hacer entrega de la programación actualizada "reprogramación de obra V-2.0", para su revisión y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Arq. Gilvert Parra
ESP. GERENCIA DE OBRAS.
TEXVN-ARQ S.A.S
Representante Legal

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**SDDE-IPMC 12-2024 REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.**	**52 días**	**lun 28/10/24**	**mar 7/01/25**	
2		**INICIO**	**52 días**	**lun 28/10/24**	**mar 7/01/25**	
3		ACTIVIDADES PRELIMINARES DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRATIVAS Y DEMAS PROPIAS DEL INICIO DE OBRA	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24	
4		**ACTIVIDADES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL KIOSKO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN SEDE SERVITA**	39,38 días	mié 30/10/24	vie 20/12/24	
30		**ACTIVIDADES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL KIOSKO UBICADO EN LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**	28 días	vie 15/11/24	vie 20/12/24	
55		**ACTIVIDADES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL KIOSKO UBICADO EN LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL**	25 días	mar 19/11/24	vie 20/12/24	
80		**ACTIVIDADES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL KIOSKO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR SEDE UNIVERSIDAD DISTRITAL**	25 días	mar 19/11/24	vie 20/12/24	
105		**ACTIVIDADES PROPIAS DEL DESMONTE, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL KIOSKO UBICADO EN PLAZA DE LOS ARTESANOS**	30 días	mié 27/11/24	mar 7/01/25	
106		**ADECUACIONES**	**30 días**	**mié 27/11/24**	**mar 7/01/25**	
107		Señalizacion, organización de personal y acopio de mobiliario	1 día	mié 27/11/24	mié 27/11/24	3FC+20 días
108		Desmonte de piso en caucho	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	107
109		Suministro e instalacion piso caucho de color	1 día	mar 7/01/25	mar 7/01/25	122
110		Pintura perimetral del pefil base en color negro esmalte mate	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	131
111		Desmonte y montaje techo en Upvc Kiosco	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	107
112		Desmonte y montaje de paneles laminas madera plastica Deck (Plaza Artesanos)	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	107
113		Desmonte de marcos y ventanas (Plaza de artesanos)	1 día	vie 29/11/24	vie 29/11/24	111
114		Desmonte de ventanas montantes (Plaza de artesanos)	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	107
115		Desmonte de luces y redes electricas (Plaza de artesanos)	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	107
116		Desmonte de estructura metalica de cubierta y base (Plaza de artesanos)	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	107
117		Desmonte de piso en lamina de madera Deck (Plaza de artesanos)	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	107
118		Desmonte de estructura metalica de kiosko (Plaza de artesanos)	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	107
119		Traslado del mobiliario a otro punto	1 día	mié 18/12/24	jue 19/12/24	111FC+15 días
120		**MODERNIZACION**	**9 días**	**lun 23/12/24**	**sáb 4/01/25**	
121		Restauración muros panel Deck	5 días	lun 23/12/24	lun 30/12/24	132
122		Lavado y restauracion de fachadas en Deck a dos caras	6 días	vie 27/12/24	sáb 4/01/25	128
123		Lavado y restauracion de pisos en Deck	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24	128
124		Lavado instalación y ajuste de cubierta teja upvc.	4 días	lun 23/12/24	vie 27/12/24	108;132
125		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**1 día**	**mar 7/01/25**	**mar 7/01/25**	
126		Suministro e instalacion lamparas	1 día	mar 7/01/25	mar 7/01/25	134;136
127		**CARPINTERIA EN ALUMINO**	**8 días**	**jue 26/12/24**	**mar 7/01/25**	
128		Ajuste limpieza e instalación de ventanas y montantes	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24	124CC+2 días
129		Ajustes limpieza e instalacion de puerta corrediza incluye cerradura tipo pico de loro	1 día	mar 7/01/25	mar 7/01/25	128;140
130		**CARPINTERIA METALICA**	**14 días**	**mié 4/12/24**	**sáb 21/12/24**	
131		Suministro e instalacion de rampas en lamina alfajor incluye pintura	3 días	mié 4/12/24	sáb 7/12/24	107CC+6 días
132		Instalación y armada de estructura para kiosko (Plaza de Artesanos)	2 días	jue 19/12/24	sáb 21/12/24	119
133		**OTROS**	**2 días**	**sáb 28/12/24**	**mar 31/12/24**	
134		Acometida final para Kiosco (traslado Plaza de Artesanos)	2 días	sáb 28/12/24	mar 31/12/24	124
135		**OTRAS ACTIVIDADES**	**10 días**	**lun 23/12/24**	**mar 7/01/25**	
136		Suministro e instalación de salida de iluminación para posterior instalación de lamparas, incluye derivacion desde el punto actual mas cercano y canaleta tipo dexson plastica blanca.	1 día	vie 3/01/25	sáb 4/01/25	134CC+4 días
137		Limpieza y brillado de estructura portante existente en acero inoxidable.	5 días	lun 23/12/24	lun 30/12/24	132
138		Suministro e instalación de manijas para puerta ventana en aluminio.	1 día	mar 7/01/25	mar 7/01/25	128;140
139		Selección y corte de ser necesario en material deck existente para posterior reinstalacion en paneles interiores.	5 días	lun 30/12/24	mar 7/01/25	121
140		Suminstro e instalacion de vidrio tipo laminado 3 + 3 incoloro para fijos en kioskos, incluye desmonte del actual y cambio de empaques de ser necesarios.	4 días	lun 30/12/24	sáb 4/01/25	132CC+7 días
141		Suministro e instalación de perfil para remate superior para la correcta instalación del wall panel en fachadas de kioskos de forma vertical con junta.	1,5 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24	121
142		FIN	0 días	mar 7/01/25	mar 7/01/25	8;9;13;16;25;26;27;

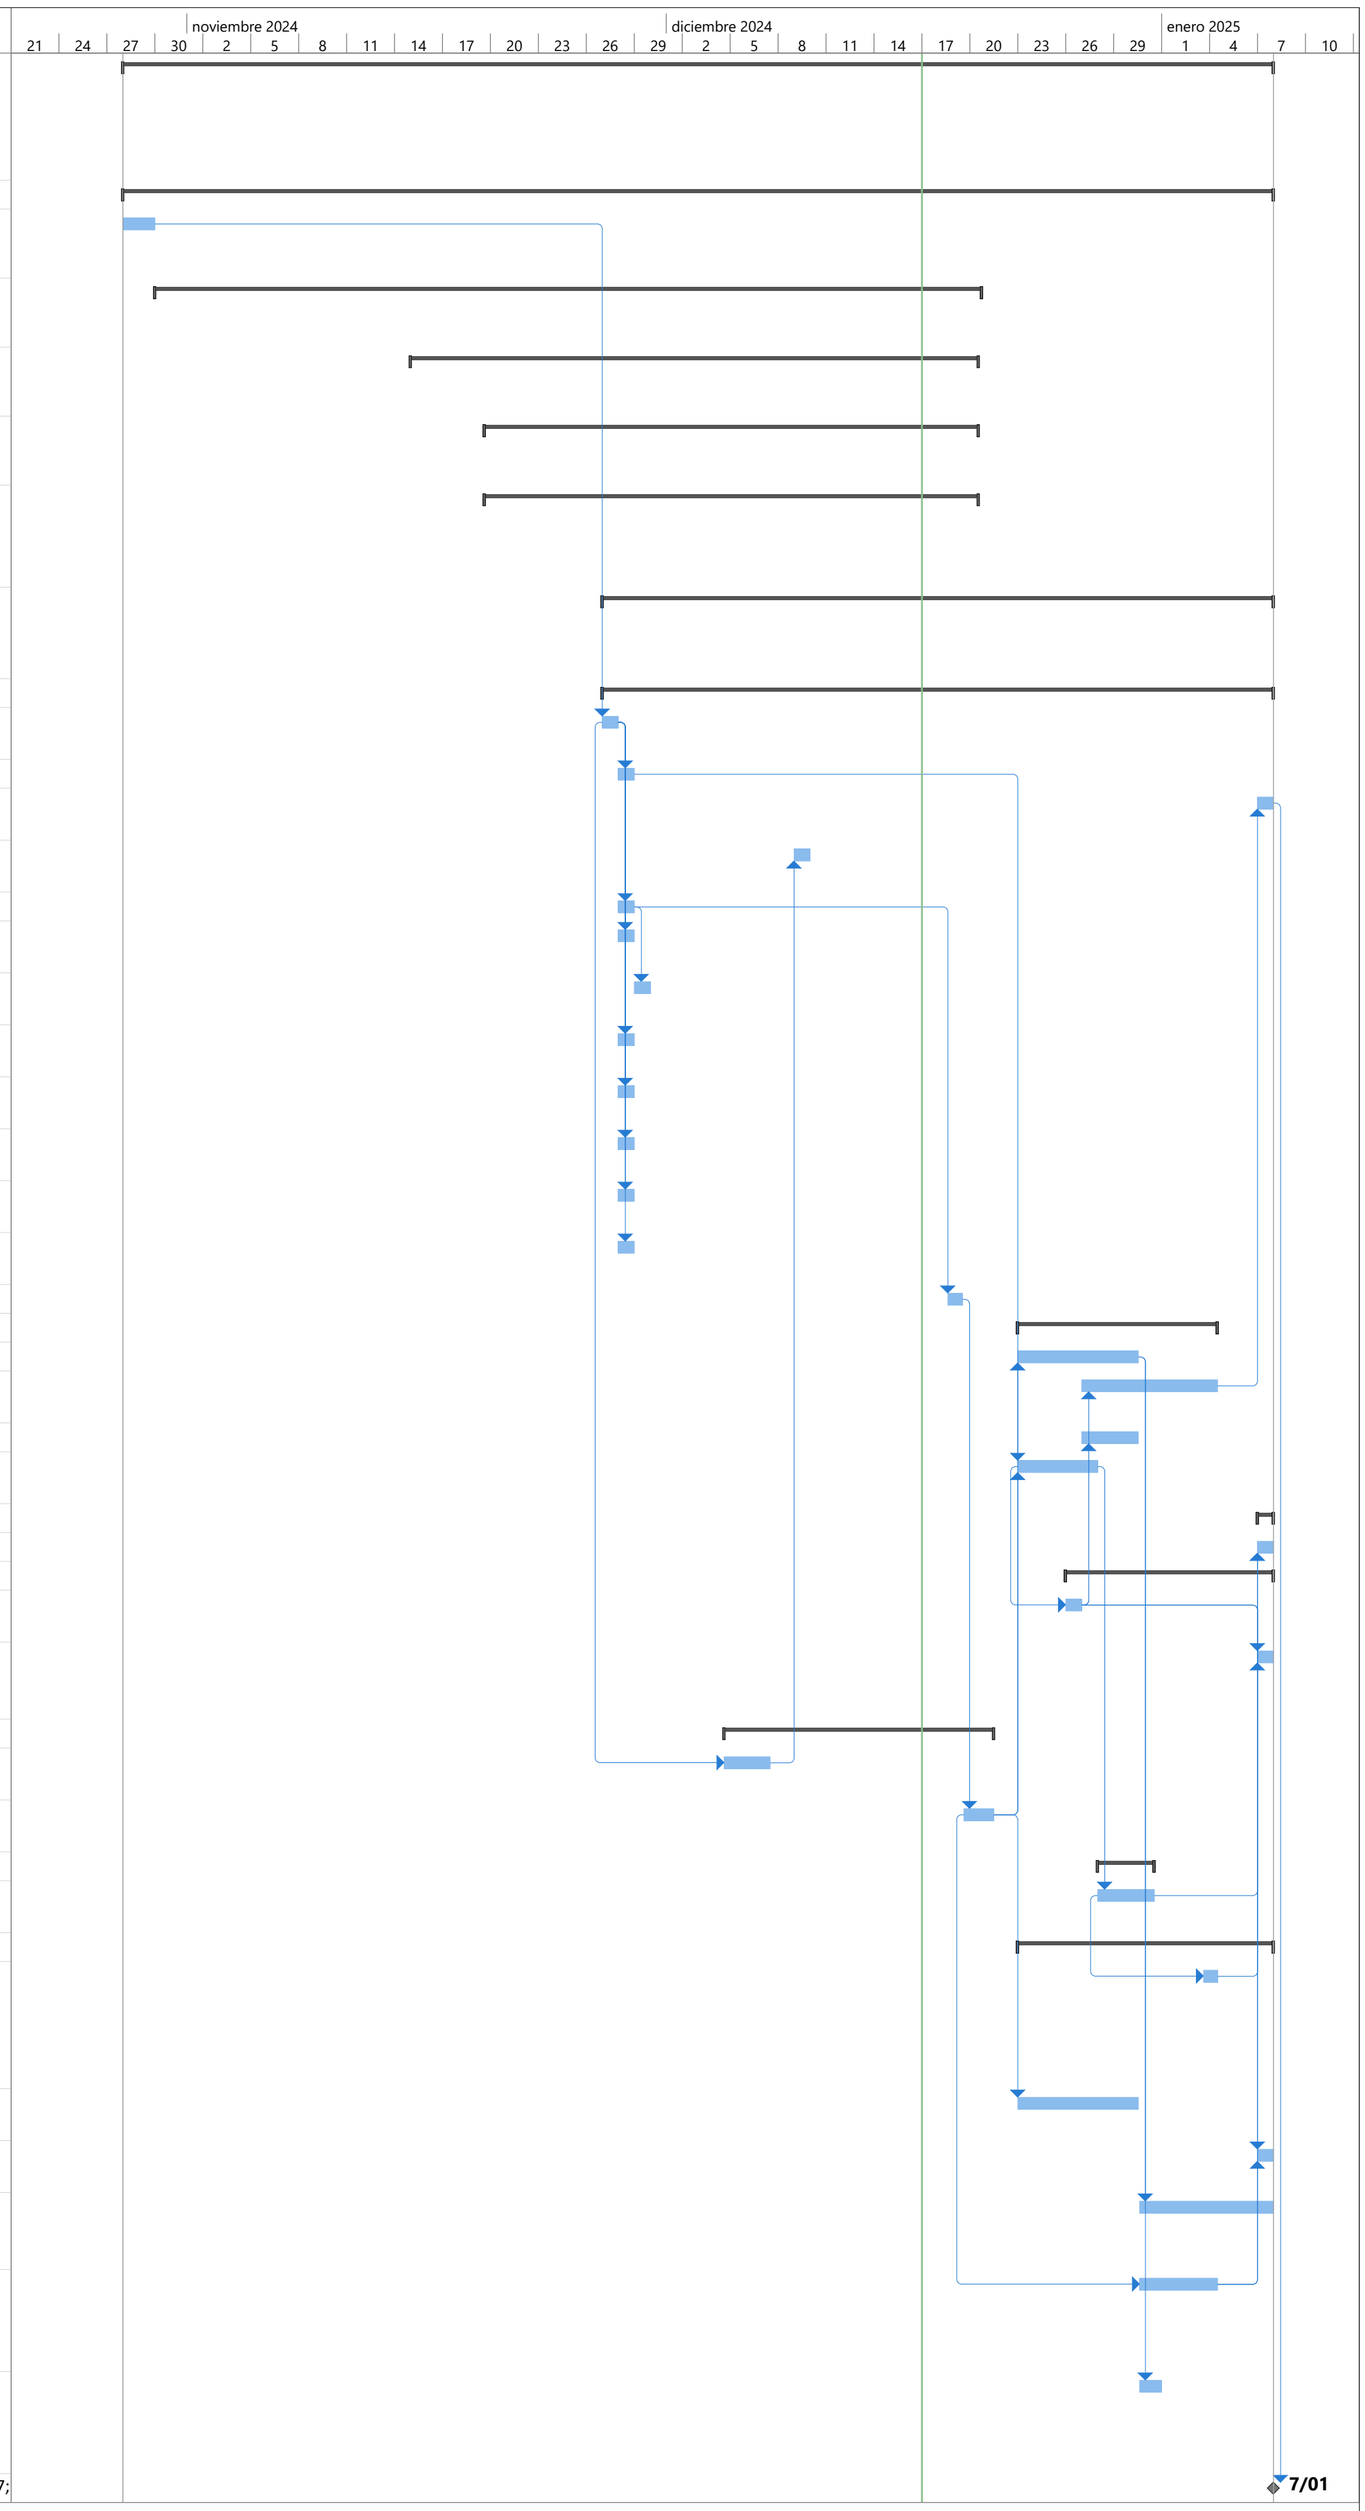

Proyecto: MANTENIMIENTO DE
Fecha: mar 17/12/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
